H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACIÓN No.01 (UNO Y FINIQUITO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO).**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 4179**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) **: 12001 0001 4179**

ORIGINAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL FINAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2022**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

OF. AUTORIZACION:

OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**

SUBPROGRAMA:

PROYECTO SOCIAL:

DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**

No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO:

AVANCE FINANCIERO:

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			5 AL MILLAR	5 AL MILLAR	AHORRO PRESUP. O	SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	C.M.I.C.	INSP. Y VIG.	SANCION	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,196,516.92	2,187,049.17	2,196,516.92	0.00	9,467.75	0.00	0.00

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,196,516.92	1,528,094.09	2,187,049.17	9,467.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	23-dic.-23	MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V. FACT. B5C7A	2,196,516.92	668,422.83	1,528,094.09
		SUBTOTAL $	2,196,516.92	668,422.83	1,528,094.09
		TOTAL $	2,196,516.92	668,422.83	1,528,094.09

miércoles 27 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 987

27 DE FEBRERO DE 2024

Paguese vía transferencia a: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

La cantidad de: 1,528,094.09

(** UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
		27/02/2024 987	1,528,094.09
	Cuenta		

Concepto

Pago de solicitudes : 1501-1338, PAGO FACTURA NO.B5C7A EST. 01 (UNO Y FINIQUITO) REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (A REAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCOCOL. COMERCIA

Facturas: 96D008D4-8B7F-434A-B217-61E76DDB5C7A,

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00234		Generado por cuenta por pagar	1,528,094.09	
11120-00000-02005-00005		MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A		1,528,094.09
			1,528,094.09	1,528,094.09

Solicitud de pago 504 - 653

Póliza 11 2 112

OPERADO FISM 2023

Elaboró	Revisó	Autorizó
JCM	EMO	CAMR

Santander

987

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 1U728

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 6129809

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 072261011890909892 - MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Importe: $ 1,528,094.09 MXN

Concepto: R33FIII FB5C7A EST1 FIN REHAB MERCADO

Fecha y hora de Alta: 27/02/2024 15:40:15

Fecha y hora de Liquidación: 27/02/2024 15:40:17

Clave de Rastreo: 2024022740014 BET0000461298090

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

OPERADO
FAISMUN - 2023

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLinea Empresarial SuperLinea PyME

RFC emisor:	MRA2107282J2	**Folio fiscal:**	96D008D4-8B7F-434A-B217-61E76DDB5C7A
Nombre emisor:	MONRROY REYES ARQUITECTOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000514302175
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-12-23 15:05:29
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		
Código postal del receptor:	39350	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	1,325,484.34	1,325,484.34	9,467.75	Si objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO 3 RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/574-2023/AD DON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.	IVA	Traslado	1,325,484.34	Tasa	16.00%	212,077.50

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 1,325,484.34
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Descuento**		$ 9,467.75
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 212,077.50
		Total		**$ 1,528,094.09**

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

Sello digital del CFDI:

Xcneb1A/HNaWs8y0HkV6i5IEMOP9OWc8k5WWJirRKWLoqtc8h/VOBgy7slnE1W+aS6TjWywfQqptTeA+NK6NABcnRzaTK3GU9/+bqj+UbnjHN+oDXOrRZJDpIbfcGvcRYxoTORGb9xn9cskcmcl2NknFOXcVa/KqnP7CnRkfwLE/t3yioh9x/SXCLSM5PrBeUD1B19Elh0jgWG0gBF5D3Ax0/hK4U9L9/uPex8q0YsCqCJhgTf5L6KD2Rm8bI4sInoy4vjUgahfBXwOe6ID+iGIOn1TUTiSR5DN0P5fB4VgrbQOe/hIuniHnI7/wuzNzYLTYlkdmWrBbZ9viMguxCA==

Sello digital del SAT:

Ix2d5Lkmd5chLzCwOk54x32eI11Dx+ai1jL5gmFXVvwlcz8rjXc9Jbu1w8sorhb7MICmhN2javkwaREhqM1JrU5vIec9hIj8kB/NItMvRVu4L30rhFIhnryBmYhwjplqelor7qOYQD8IKFRImFEKhCWX6YrjgjZZfLkAOkjL4H/hZ1qMJfkMIKLYRLDUyiSWxCslCkgICpua7ndiPGY6VH3ES3sU0I8uNBe1ah82AGpz5WTuByBnWKISJy9MvtVmDpQ59KPtIMdLHcGg7y3UmO1XPynpMNchhqzeYaeWdr6sJrvNrqdOdMVbDhwXavI77uCEID3D+jgAolVhmqCtQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96D008D4-8B7F-434A-B217-61E76DDB5C7A|2023-12-23T15:05:45|SAT970701NN3|Xcneb1A/HNaWs8y0HkV6i5IEMOP9OWc8k5WWJirRKWLoqtc8h/VOBgy7slnE1W+aS6TjWywfQqptTeA+NK6NABcnRzaTK3GU9/+bqj+UbnjHN+oDXOrRZJDpIbfcGvcRYxoTORGb9xn9cskcmcl2NknFOXcVa/KqnP7CnRkfwLE/t3yioh9x/SXCLSM5PrBeUD1B19Elh0jgWG0gBF5D3Ax0/hK4U9L9/uPex8q0YsCqCJhgTf5L6KD2Rm8bI4sInoy4vjUgahfBXwOe6ID+iGIOn1TUTiSR5DN0P5fB4VgrbQOe/hIuniHnI7/wuzNzYLTYlkdmWrBbZ9viMguxCA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-23 15:05:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

RFC EMISOR: **MRA2107282J2**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350**

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO:	**06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO:	**10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023**
PERIODO ESTIMADO:	**10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA:	**$ 2,196,516.92**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA:	**$ 658,955.08**
TIPO DE OBRA:	**DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS:	**1,300 M2**
METAS ALCANZADAS:	**100%**
No. DE OBRA:	**MAJ/574**

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE $ 1,528,094.09 (UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACION No. 01 (UNO) Y FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

DEDUCCIONES

AMORTIZACION DE ANTICIPO	$	658,955.08
5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	$	9,467.75
TOTAL DE DEDUCCIONES	$	668,422.83

CALCULO DE LA ESTIMACION

ESTIMACION CON IVA:	$	2,196,516.92
MENOS DEDUCCIONES:	$	668,422.83
SALDO A PAGAR:	$	1,528,094.09

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2021 2024

Subtotal:		$ 1,325,484.34
Descuento:		$ 9,467.75
Impuestos Trasladados		
Más IVA 16.00%		$ 212,077.50
TOTAL		$ 1,528,094.09

(UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 09/100 M.N.)

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRA2107282J2	MONRROY REYES ARQUITECTOS	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
96D008D4-8B7F-434A-B217-61E76DDB5C7A	2023-12-23T15:05:29	2023-12-23T15:05:45	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$1,528,094.09	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-12-23T15:05:29"
Sello="Xcneb1A/HNaWs8y0HkV6i5IEMOP9OWc8k5WWJirRKWLoqtc8h/VOBgy7slnE1W+aS6TjWywfQqptTeA+NK6NABcnRzaTK3GU9/+bqj+UbnjHN+oDXOrRZJDpIbfcGvcRYxoTORGb9xn9cskcmc
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000514302175"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzMDIxNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="1325484.34" Descuento="9467.75" Moneda="MXN" Total="1528094.09" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="MRA210728212" Nombre="MONRROY REYES ARQUITECTOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ESTIMACION 1 (UNO) Y FINIQUITO DE
    LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL
    FONDO 3 RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/574-2023/AD CON FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10
    DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="1325484.34" Importe="1325484.34" Descuento="9467.75" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1325484.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="212077.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="212077.50">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1325484.34" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="212077.50"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="96D008D4-8B7F-434A-B217-61E76DDB5C7A"
    FechaTimbrado="2023-12-23T15:05:45" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="Xcneb1A/HNaWs8y0HkV6i5IEMOP9OWc8k5WWJirRKWLoqtc8h/VOBgy7slnE1W+aS6TjWywfQqptTeA+NK6NABcnRzaTK3GU9/+bqj+UbnjHN+oDXOrRZJDpIbfcGvcRYxoTORGb9xn
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="Ix2d5Lkmd5chLzCwOk54x32eI11Dx+ai1jL5gmFXVvwIcz8rjXc9Jbu1w8sorhb7MICmhN2javkwaREhqM1JrU5vIec9hIj8kB/NItMvRVu4L30rhFlhnryBmYhwjplqelor7qOYQD8
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

OPERADO
FAISMUN - 2023

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 21 del mes de DICIEMBRE del año 2023 a las 13:00 horas en el domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO., localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
Nombre de la obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS: 403037	Monto total planeado:	$2'196,516.92
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/11/2023	Fecha de conclusión: 21/12/23
Entidad: **GUERRERO**	Municipio: **ACAPULCO DE JUAREZ**	Localidad: COL. COMERCIAL ACAPULCO.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Daniel Hernández Gómez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Castro
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Sara Lima Macario
Sara Lima Macario
Vocal
Nombre completo y firma

María de la Cruz Alvarez Escobar
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Quiroz Patricio
Vocal
Nombre completo y firma

Julisa Ruiz Guadarrama
Testigo

ESTEH BARRANCA NAVA
ESTEH BARRANCA NAVA
Testigo

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 21 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. COL. COMERCIAL ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS: 403037	Monto total planeado: $2'196,516.92	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/11/2023	Fecha de conclusión: 21/12/23
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO DE JUAREZ	Localidad: COL. COMERCIAL ACAPULCO.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[3]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí.	[✓]
b) No, concluyó antes de la fecha informada.	[ ]
c) No, concluyó después de la fecha informada.	[ ]
d) No ha concluido.	[ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega-recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN.

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [✓]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

- UNO DE LOS SECTORES PRINCIPALES DE LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO
- EL MAS IMPORTANTE EN CUANTO A VALOR DE MERCADO

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Daniel Hernández Gómez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Castro
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Sara Lima Macario
Sara Lima Macario
Vocal
Nombre completo y firma

María de la Cruz Alvarez Escobar
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Quirez Patricio
Vocal
Nombre completo y firma

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO		ESTIMACION No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 2,196,516.92	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023, AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	$ 658,955.08	15 DE DICIEMBRE DEL 2023

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO) Y FINIQUITO	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	1,893,549.07	302,967.85	0.00	9,467.75	658,955.08	668,422.83	1,528,094.09
TOTAL		1,893,549.07	302,967.85		9,467.75	658,955.08	668,422.83	1,528,094.09
SALDO		$0.00	SALDO POR AMORTIZAR			$0.00		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	ESTIMACION No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A01	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	49,370.51
A02	PRELIMINARES	135,924.50
A03	LOCALES DE CONCRETO	114,061.60
A04	ALBAÑILERIAS	363,703.98
A05	ACABADOS	526,924.14
A06	ROTULACION	0.00
A07	BAJA TENSION	531,318.49
A08	DRENAJES	64,046.90
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	108,198.95
	TOTAL DE PARTIDAS $	1,893,549.07
	SUBTOTAL $	1,893,549.07
	16 % IVA $	302,967.85
	TOTAL $	2,196,516.92

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.)

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL 100.00%
AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No.	1 (UNO) Y FINIQUITO
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 1	DE: 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A01	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS								
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	580.00	11.08	0.00	13.14	13.14	2.06	7,621.20
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	1,063.37	11.14	0.00	15.47	15.47	4.33	16,450.33
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	34.63	267.81	0.00	363.44	363.44	95.63	12,585.93
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	120.00	26.08	0.00	16.00	16.00	0.00	1,920.00
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	79.73	118.60	0.00	135.37	135.37	16.77	10,793.05
	TOTAL:	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS							49,370.51
A02	PRELIMINARES								
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	631.75	67.20	0.00	24.13	24.13	0.00	15,244.13
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	28.85	1,086.00	0.00	1,047.38	1,047.38	0.00	30,216.91
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	255.00	42.55	0.00	90.58	90.58	48.03	23,097.90
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	152.50	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 117,929.45

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H[illegible]UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JU[illegible]Z

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
				AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	HOJA:	DE:
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	2	7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	438.90	8.05	0.00	128.42	128.42	120.37	56,363.54
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	468.57	8.94	0.00	23.48	23.48	14.54	11,002.02
	TOTAL:	PRELIMINARES							135,924.50
A03	LOCALES DE CONCRETO								
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	2,265.00	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	15,855.00
11-0167*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	657.22	34.82	0.00	21.40	21.40	0.00	14,064.51
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	624.00	32.40	0.00	26.10	26.10	0.00	16,286.40
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	490.41	20.20	0.00	11.92	11.92	0.00	5,845.69
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	1,350.00	34.82	0.00	21.40	21.40	0.00	28,890.00
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	1,500.00	35.00	0.00	22.08	22.08	0.00	33,120.00
	TOTAL:	LOCALES DE CONCRETO							114,061.60
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 181,427.16

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H[illegible]UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JU[illegible]Z

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	HOJA: 3	DE: 7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A04	ALBAÑILERIAS								
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	336.46	35.00	0.00	264.57	264.57	229.57	89,017.22
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	502.65	36.00	0.00	34.70	34.70	0.00	17,441.96
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	274.81	161.98	0.00	92.90	92.90	0.00	25,529.85
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	118.00	359.00	0.00	395.28	395.28	36.28	46,643.04
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	610.80	267.81	0.00	286.68	286.68	18.87	175,104.14
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	481.07	21.00	0.00	20.72	20.72	0.00	9,967.77
	TOTAL:	ALBAÑILERIAS							363,703.98
A05	ACABADOS								
29-0431	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.	M2	1,454.49	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	3,702.15	81.90	0.00	77.01	77.01	0.00	285,102.57
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2,961.72	37.51	0.00	23.00	23.00	0.00	68,119.56
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 716,926.11

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	HOJA: 4 DE: 7
	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
LAM-01*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	1,119.60	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	122.00	1,319.78	0.00	1,196.43	1,196.43	0.00	145,964.46
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	138.66	32.00	0.00	200.04	200.04	168.04	27,737.55
	TOTAL:	ACABADOS							526,924.14
A06	ROTULACION								
ROT-01	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.	PZA	2,500.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-02	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.	PZA	2,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-03	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.	PZA	2,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-04	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.	PZA	4,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)	PZA	1,800.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-06	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	652.08	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)	PZA	352.68	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	ROTULACION							0.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	$ 173,702.01

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	HOJA:	DE:
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	5	7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A07	**BAJA TENSION**								
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.	PZA	4,191.43	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,191.43
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.	JGO	657.36	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	3,286.80
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	111.40	105.00	0.00	105.55	105.55	0.55	11,758.27
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	196.00	46.50	0.00	51.11	51.11	4.61	10,017.56
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	651.00	115.00	0.00	205.55	205.55	90.55	133,813.05
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	159.60	115.00	0.00	105.55	105.55	0.00	16,845.78
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.	ML	50.00	997.00	0.00	929.42	929.42	0.00	46,471.00
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	49.01	48.00	0.00	63.01	63.01	15.01	3,088.12
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	150.47	498.50	0.00	140.95	140.95	0.00	21,208.75
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A, INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN	PZA	10,050.59	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	10,050.59
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 260,731.35**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES	M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

/UNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	HOJA:	DE:
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	6	7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	31,099.39	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	186,596.34
EL-BT-012	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	PZA	7,000.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	28,000.00
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	2,600.00	6.00	0.00	5.00	5.00	0.00	13,000.00
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	4,940.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	4,940.00
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	PZA	1,361.08	11.00	0.00	10.00	10.00	0.00	13,610.80
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.	PZA	24,440.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	24,440.00
	TOTAL:	**BAJA TENSION**							**531,318.49**
A08	**DRENAJES**								
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	379.53	41.72	0.00	58.09	58.09	16.37	22,046.90
37-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.	ML	233.88	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	6,000.00	5.00	0.00	7.00	7.00	2.00	42,000.00
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 334,634.04**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I Ó N				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	DEL:	10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	AL:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	HOJA:	DE:
		TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	7	7

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	6,000.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	**DRENAJES**							**64,046.90**
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	10.55	1,086.00	0.00	998.399	998.399	0.00	10,533.11
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	101.73	95.68	0.00	217.05	217.05	121.37	22,080.50
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	30.93	287.04	0.00	868.20	868.20	581.16	26,853.43
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	336.00	46.16	0.00	110.04	110.04	63.88	36,973.44
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	10.55	1,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	8.80	1,300.00	0.00	1,336.19	1,336.19	36.19	11,758.47
	TOTAL:	**ACARREOS Y LIMPIEZA**							**108,198.95**
								SUBTOTAL ESTA HOJA:	**$ 108,198.95**
								TOTAL ESTIMADO	**$ 1,893,549.07**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** HOJA: 1

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92** DE: 7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA No. DE OBRA: MAJ/574
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**														
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	11.08	580.00	6,426.40	13.14	580.00	7,621.20	0.00	580.00	0.00	2.06	580.00	1,194.80	1 (UNO) Y FINIQUITO
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.14	1,063.37	11,845.94	15.47	1,063.37	16,450.33	0.00	1,063.37	0.00	4.33	1,063.37	4,604.39	1 (UNO) Y FINIQUITO
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	267.81	34.63	9,274.26	363.44	34.63	12,585.93	0.00	34.63	0.00	95.63	34.63	3,311.67	1 (UNO) Y FINIQUITO
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.08	120.00	3,129.60	16.00	120.00	1,920.00	10.08	120.00	1,209.60	0.00	120.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	118.60	79.73	9,455.98	135.37	79.73	10,793.05	0.00	79.73	0.00	16.77	79.73	1,337.07	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**				**40,132.18**			**49,370.51**			**1,209.60**			**10,447.93**	
A02	**PRELIMINARES**														
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	67.20	631.75	42,453.60	24.13	631.75	15,244.13	43.07	631.75	27,209.47	0.00	631.75	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	1,086.00	28.85	31,331.10	1,047.38	28.85	30,216.91	38.62	28.85	1,114.19	0.00	28.85	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	42.55	255.00	10,850.25	90.58	255.00	23,097.90	0.00	255.00	0.00	48.03	255.00	12,247.65	1 (UNO) Y FINIQUITO
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	30.12	152.50	4,593.30	0.00	152.50	0.00	30.12	152.50	4,593.30	0.00	152.50	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA No. DE OBRA: MAJ/574

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** HOJA: 2

MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92** DE: 7

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						ESTIMACION
									VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	8.05	438.90	3,533.15	128.42	438.90	56,363.54	0.00	438.90	0.00	120.37	438.90	52,830.39	1 (UNO) Y FINIQUITO
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.94	468.57	4,189.02	23.48	468.57	11,002.02	0.00	468.57	0.00	14.54	468.57	6,813.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**PRELIMINARES**				**96,950.42**			**135,924.50**			**32,916.96**			**71,891.04**	
A03	**LOCALES DE CONCRETO**														
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	7.00	2,265.00	15,855.00	7.00	2,265.00	15,855.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	2,265.00	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0167*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	34.82	657.22	22,884.40	21.40	657.22	14,064.51	13.42	657.22	8,819.89	0.00	657.22	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	32.40	624.00	20,217.60	26.10	624.00	16,286.40	6.30	624.00	3,931.20	0.00	624.00	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	20.20	490.41	9,906.28	11.92	490.41	5,845.69	8.28	490.41	4,060.59	0.00	490.41	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	34.82	1,350.00	47,007.00	21.40	1,350.00	28,890.00	13.42	1,350.00	18,117.00	0.00	1,350.00	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	35.00	1,500.00	52,500.00	22.08	1,500.00	33,120.00	12.92	1,500.00	19,380.00	0.00	1,500.00	0	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**LOCALES DE CONCRETO**				**168,370.28**			**114,061.60**			**54,308.68**			**0.00**	
A04	**ALBAÑILERIAS**														
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.00	336.46	11,776.10	264.57	336.46	89,017.22	0.00	336.46	0.00	229.57	336.46	77241.12	1 (UNO) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA No. DE OBRA: MAJ/574

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** HOJA: 3

MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92** DE: 7

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						ESTIMACION
									VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	36.00	502.65	18,095.40	34.70	502.65	17,441.96	1.30	502.65	653.44	0.00	502.65	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	161.98	274.81	44,513.72	92.90	274.81	25,529.85	69.08	274.81	18,983.87	0.00	274.81	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	359.00	118.00	42,362.00	395.28	118.00	46,643.04	0.00	118.00	0.00	36.28	118.00	4,281.04	1 (UNO) Y FINIQUITO
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	267.81	610.80	163,578.35	286.68	610.80	175,104.14	0.00	610.80	0.00	18.87	610.80	11,525.79	1 (UNO) Y FINIQUITO
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	21.00	481.07	10,102.47	20.72	481.07	9,967.77	0.28	481.07	134.70	0.00	481.07	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ALBAÑILERIAS**				**290,428.04**			**363,703.98**			**19,772.01**			**93,047.95**	
A05	**ACABADOS**														
29-0431	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.	M2	10.00	1,454.49	14,544.90	0.00	1,454.49	0.00	10.00	1,454.49	14,544.90	0.00	1,454.49	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	81.90	3,702.15	303,206.09	77.01	3,702.15	285,102.57	4.89	3,702.15	18,103.52	0.00	3,702.15	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	37.51	2,961.72	111,094.12	23.00	2,961.72	68,119.56	14.51	2,961.72	42,974.56	0.00	2,961.72	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA No. DE OBRA: MAJ/574

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** HOJA: 4

MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92** DE: 7

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
LAM-01*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	18.00	1,119.60	20,152.80	0.00	1,119.60	0.00	18.00	1,119.60	20,152.80	0.00	1,119.60	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1,319.78	122.00	161,013.16	1,196.43	122.00	145,964.46	123.35	122.00	15,048.70	0.00	122.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	32.00	138.66	4,437.12	200.04	138.66	27,737.55	0.00	138.66	0.00	168.04	138.66	23,300.43	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACABADOS**				**614,448.19**			**526,924.14**			**110,824.48**			**23,300.43**	
A06	**ROTULACION**														
ROT-01	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-02	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-03	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-04	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.	PZA	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)	PZA	3.00	1,800.00	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	3.00	1,800.00	5,400.00	0.00	1,800.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-06	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.40	652.08	1,564.99	0.00	652.08	0.00	2.40	652.08	1,564.99	0.00	652.08	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
ROT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)	PZA	12.00	352.68	4,232.16	0.00	352.68	0.00	12.00	352.68	4,232.16	0.00	352.68	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ROTULACION**				**21,697.15**			**0.00**			**21,697.15**			**0.00**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
No. DE OBRA: MAJ/574
CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**
No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**
MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92**
MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**
FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
HOJA: 5
DE: 7

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						
									VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A07	**BAJA TENSION**														
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.	PZA	1.00	4,191.43	4,191.43	1.00	4,191.43	4,191.43	0.00	4,191.43	0.00	0.00	4,191.43	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.	JGO	5.00	657.36	3,286.80	5.00	657.36	3,286.80	0.00	657.36	0.00	0.00	657.36	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	105.00	111.40	11,697.00	105.55	111.40	11,758.27	0.00	111.40	0.00	0.55	111.40	61.27	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	46.50	196.00	9,114.00	51.11	196.00	10,017.56	0.00	196.00	0.00	4.61	196.00	903.56	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	115.00	651.00	74,865.00	205.55	651.00	133,813.05	0.00	651.00	0.00	90.55	651.00	58,948.05	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	115.00	159.60	18,354.00	105.55	159.60	16,845.78	9.45	159.60	1,508.22	0.00	159.60	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.	ML	997.00	50.00	49,850.00	929.42	50.00	46,471.00	67.58	50.00	3,379.00	0.00	50.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	48.00	49.01	2,352.48	63.01	49.01	3,088.12	0.00	49.01	0.00	15.01	49.01	735.64	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Co-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	498.50	150.47	75,009.30	140.95	150.47	21,208.75	357.55	150.47	53,800.55	0.00	150.47	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMÁN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA No. DE OBRA: MAJ/574

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** HOJA: 6

MONTO CONTRATADO: **$ 2,196,516.92** DE: 7

MONTO TOTAL ESTIMADO: **$ 2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - VOLUMENES NO EJECUTADOS			VARIACIONES + VOLUMENES EXCEDENTES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN	PZA	1.00	10,050.59	10,050.59	1.00	10,050.59	10,050.59	0.00	10,050.59	0.00	0.00	10,050.59	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	31,099.39	186,596.34	6.00	31,099.39	186,596.34	0.00	31,099.39	0.00	0.00	31,099.39	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-012	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	PZA	4.00	7,000.00	28,000.00	4.00	7,000.00	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEMARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	6.00	2,600.00	15,600.00	5.00	2,600.00	13,000.00	1.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEMARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	4,940.00	4,940.00	1.00	4,940.00	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	PZA	11.00	1,361.08	14,971.88	10.00	1,361.08	13,610.80	1.00	1,361.08	1,361.08	0.00	1,361.08	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.	PZA	1.00	24,440.00	24,440.00	1.00	24,440.00	24,440.00	0.00	24,440.00	0.00	0.00	24,440.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**BAJA TENSION**				**533,318.82**			**531,318.49**			**62,648.85**			**60,648.52**	
A08	**DRENAJES**														
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	41.72	379.53	15,833.99	58.09	379.53	22,046.98	0.00	379.53	0.00	16.37	379.53	6,212.91	1 (UNO) Y FINIQUITO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

FINIQUITO DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONSTRUCTORA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

HOJA: 7

ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO) Y FINIQUITO

MONTO CONTRATADO: $ **2,196,516.92**

DE: 7

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA

No. DE OBRA: MAJ/574

MONTO TOTAL ESTIMADO: $ **2,196,516.92**

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES						
									VOLUMENES NO EJECUTADOS			VOLUMENES EXCEDENTES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
37-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.	ML	37.00	233.88	8,653.56	0.00	233.88	0.00	37.00	233.88	8,653.56	0.00	233.88	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	5.00	6,000.00	30,000.00	7.00	6,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2.00	6,000.00	12,000.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**DRENAJES**				**60,487.55**			**64,046.90**			**14,653.56**			**18,212.91**	
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**														
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,086.00	10.55	11,457.30	998.399	10.55	10,533.11	87.601	10.55	924.19	0.00	10.55	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	95.68	101.73	9,733.53	217.05	101.73	22,080.50	0.00	101.73	0.00	121.37	101.73	12,346.97	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	287.04	30.93	8,878.15	868.20	30.93	26,853.43	0.00	30.93	0.00	581.16	30.93	17,975.28	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	46.16	336.00	15,509.76	110.040	336.00	36,973.44	0.000	336.00	0.00	63.880	336.00	21,463.68	1 (UNO) Y FINIQUITO
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,014.00	10.55	10,697.70	0.00	10.55	0.00	1,014.00	10.55	10,697.70	0.00	10.55	0.00	1 (UNO) Y FINIQUITO
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	1,300.00	8.80	11,440.00	1,336.19	8.80	11,758.47	0.00	8.80	0.00	36.19	8.80	318.47	1 (UNO) Y FINIQUITO
TOTAL	**ACARREOS Y LIMPIEZA**				**67,716.44**			**108,198.95**			**11,621.89**			**52,104.40**	
				SUBTOTAL	$1,893,549.07			$1,893,549.07			$329,653.18			$329,653.18	
				IVA	$302,967.85			$302,967.85			$52,744.51			$52,744.51	
				TOTAL	$2,196,516.92			$2,196,516.92			$382,397.69			$382,397.69	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 18 de Diciembre del 2023

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E .

Por medio de la presente, le solicito a usted de la manera más atenta la revisión y la autorización de los conceptos excedentes de la obra denominada REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, Ubicada en la COL. COMERCIAL ACAPULCO, con el número de contrato: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

V O L U M E N E S A D I C I O N A L E S

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	11.08	13.14	2.06
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.14	15.47	4.33
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	267.81	363.44	95.63
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	118.60	135.37	16.77
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	42.55	90.58	48.03
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	8.05	128.42	120.37
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.94	23.48	14.54
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.00	264.57	229.57
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	359.00	395.28	36.28
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	267.81	286.68	18.87
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	32.00	200.04	168.04
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE	ML	105.00	105.55	0.55
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE	ML	46.50	51.11	4.61
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	115.00	205.55	90.55
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	48.00	63.01	15.01

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	41.72	58.09	16.37
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	5.00	7.00	2.00
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	95.68	217.05	121.37
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	287.04	868.20	581.16
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	46.16	110.04	63.88
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	1,300.00	1,336.19	36.19

Sin mas por el momento quedo de usted para cualquier aclaracion

ATENTAMENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

OFICIO: DOP/2489-1/2023.
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 19 de diciembre de 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
C. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

En relación a su similar de fecha **18 de diciembre del 2023**, mediante el cual solicita la autorización para los volúmenes adicionales a **21 (veintiún) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**, formalizado a favor de su representado con fecha **06 de noviembre del 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, en mi carácter de **Residente de Obra**, una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera **procedente autorizar** las cantidades adicionales a los **21 (veintiún) conceptos de obra**, asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico,** No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33. Aportaciones Federales para las Entidades Federativas y Municipios, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2023 (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ,** por un importe de Contrato de **$ 2,196,516.92 (Dos millones ciento noventa y seis mil quinientos dieciséis pesos 92/100 m. n.).**

Con fecha 06 de noviembre del 2023, fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**, entre la **Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Publicas** y la empresa contratista **"MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V."** para la ejecución de la obra **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO, EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución del 10 de noviembre al 21 de diciembre de 2023.

Con fecha 18 de diciembre del 2023, fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **"MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V."**, para los volúmenes adicionales en **21 (veintiún)** conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD, solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. En referencia a los trabajos que la contratista en conjunto con el residente de obras públicas, se llegó al acuerdo de cambiar el recorrido de las instalaciones, así mismo se colaron pisos adicionales, también se elaboraron entortados.

2 Por tal motivo unos conceptos del catálogo autorizado por esta dependencia, se incrementan volúmenes de obra ejecutada algunos conceptos descritos en la Bitácora de obra en la nota 21.

- Con fecha 18 de diciembre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 21, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes, de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de estos volúmenes ya que fueron necesarios para la correcta terminación de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

- A través de la nota de bitácora No. 22 con fecha 19 de diciembre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los **21 (veintiún)** conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD.

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) **21 (veintiún)** conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISM/574-2023/AD.**

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los **21 (veintiún)** conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el **artículo 59, párrafo onceavo** de la **Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**, y los **artículos 105 y 106** de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los **21 (veintiún)** conceptos de obra mencionados en el **anexo 2**.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los **Artículos 112 y 113** del **Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas**. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como **anexo 3.**

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ.

C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	$ 580.00	11.08	13.14	2.06	$ 1,194.80
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	$ 1,063.37	11.14	15.47	4.33	$ 4,604.39
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	$ 34.63	267.81	363.44	95.63	$ 3,311.67
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	$ 79.73	118.60	135.37	16.77	$ 1,337.07
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	$ 255.00	42.55	90.58	48.03	$ 12,247.65
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	$ 438.90	8.05	128.42	120.37	$ 52,830.39
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	$ 468.57	8.94	23.48	14.54	$ 6,813.01
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$ 336.46	35.00	264.57	229.57	$ 77,241.12
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	$ 118.00	359.00	395.28	36.28	$ 4,281.04
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	$ 610.80	267.81	286.68	18.87	$ 11,525.80
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	$ 138.66	32.00	200.04	168.04	$ 23,300.43
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	$ 111.40	105.00	105.55	0.55	$ 61.27
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	$ 196.00	46.50	51.11	4.61	$ 903.56
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	$ 651.00	115.00	205.55	90.55	$ 58,948.05
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	$ 49.01	48.00	63.01	15.01	$ 735.64
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	$ 379.53	41.72	58.09	16.37	$ 6,212.91
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	$ 6,000.00	5.00	7.00	2.00	$ 12,000.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	$ 101.73	95.68	217.05	121.37	$ 12,346.97
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	$ 30.93	287.04	868.20	581.16	$ 17,975.28
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	$ 336.00	46.16	110.04	63.88	$ 21,463.68
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	$ 8.80	1,300.00	1,336.19	36.19	$ 318.47

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**	
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,196,516.92**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DE EJECUCION: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023	

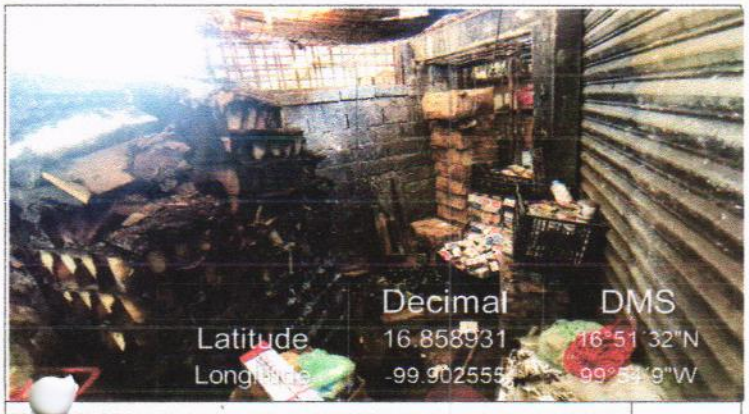

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	**2.06 M3**

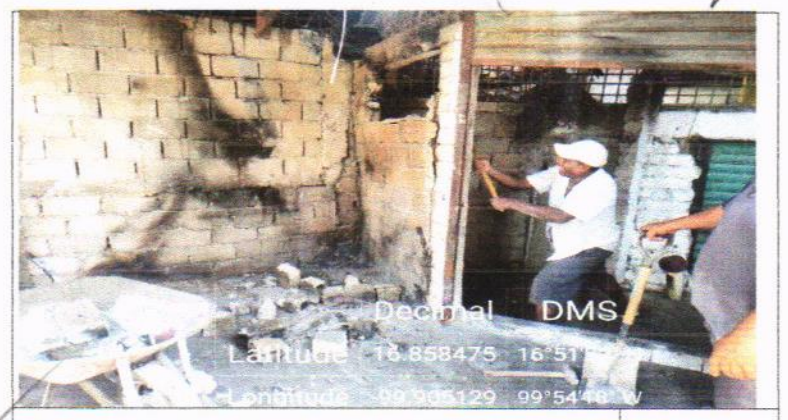

DEM-LOC DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	**4.33 M3**



1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	**95.63 M2**



DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	**16.77 M2**



EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	**48.03 M3**



9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR. INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	**120.37 M3**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**	
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,196,516.92**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DE EJECUCION: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023	



5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	**14.54 M3**

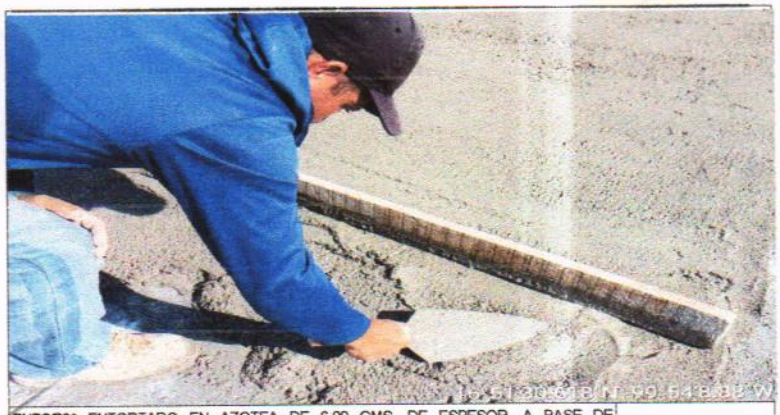


ENTOR3" ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**229.57 M2**

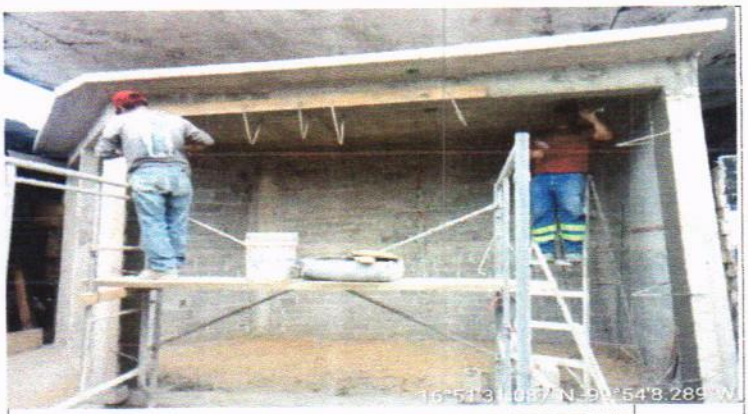

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	**36.28 ML**



12-0239 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	**18.87 M2**

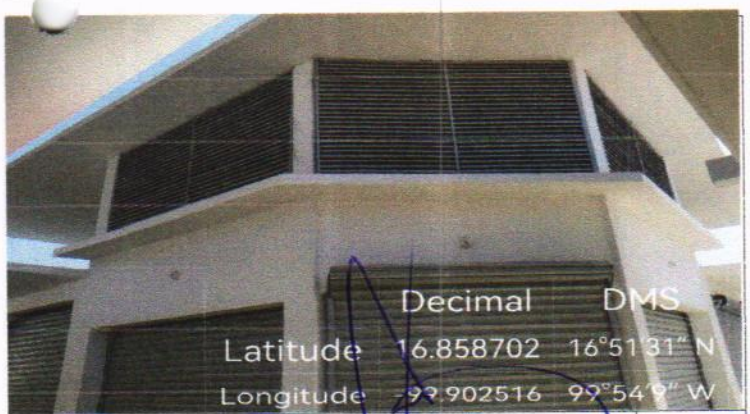

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA ESTACIÓN.	**168.04 M2**



EL-BT-003 INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	**0.55 ML**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**	
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,196,516.92**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	PERIODO DE EJECUCION: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023	




EL-BT-004 INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	**4.61 ML**




EL-BT-005 INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	**90.55 ML**

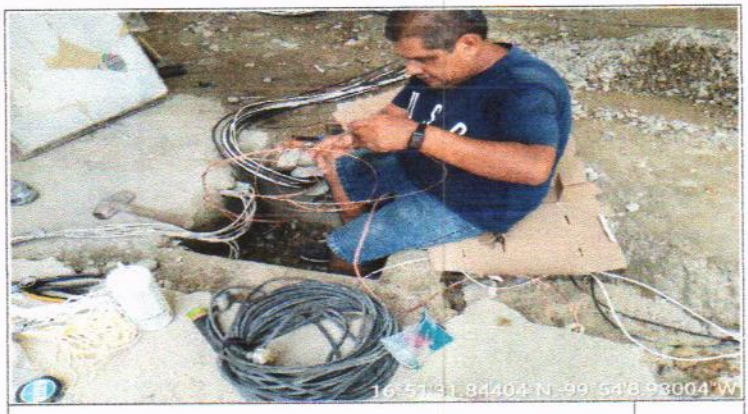

EL-BT-008 INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	**15.01 ML**

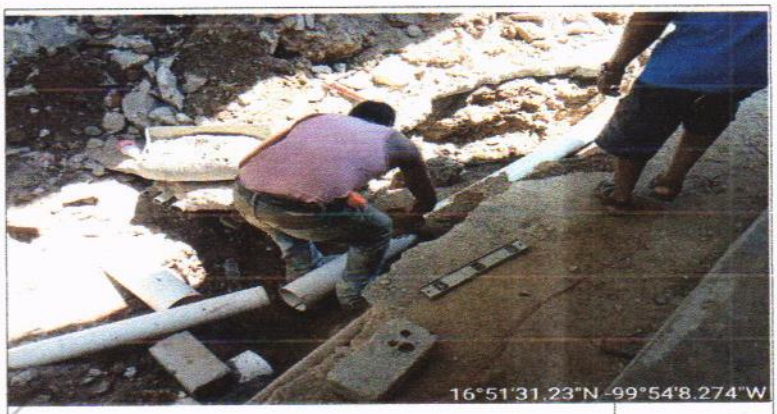

SUM-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	**16.37 ML**

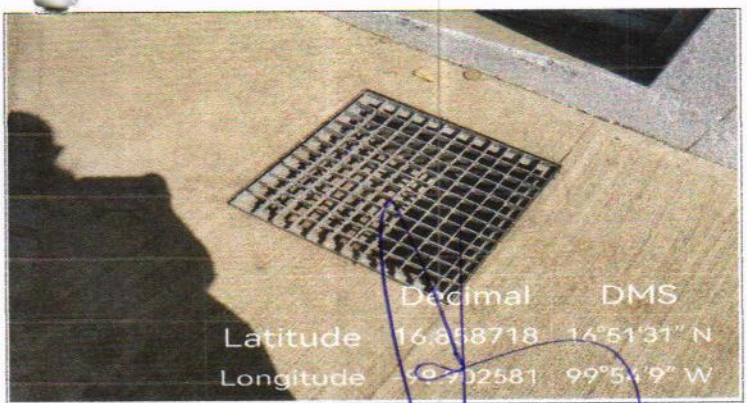

REG-PLUV REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO	**2 PZA**



33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	**121.37 M3**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PERIODO CONTRACTUAL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023

IMPORTE DE CONTRATO: $ 2,196,516.92


PERIODO DE EJECUCION: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023



33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	**581.16 M3**



33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	**63.88 M3**

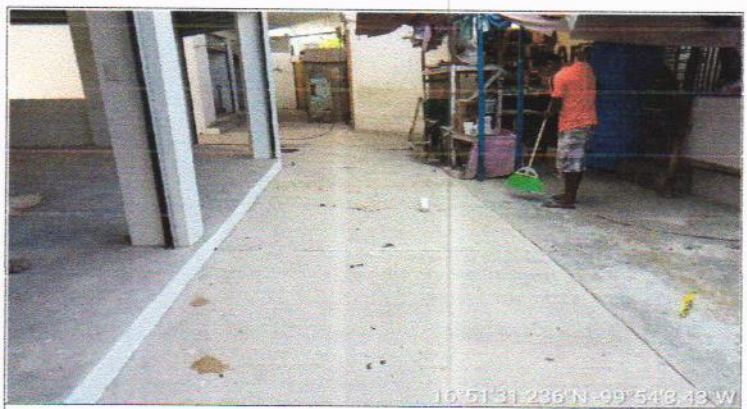

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	**36.19 M2**

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS **13:00** HORAS DEL DÍA **21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** CONSISTENTES EN LA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL: **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.**

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL: **ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE **$ 2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M. N.)** I.V.A. INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** FECHA DE TERMINACIÓN: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA ENTREGA Y RECEPCIÓN SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACIÓN NUM**: 1 (UNO) Y FINIQUITO** PERIODO DEL **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** AL **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**
IMPORTE: **$ 2,196,516.92** IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE, CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: : **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

BIENESTAR

EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, **LA FIANZA NUM. 2249557** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA **CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

SE REALIZO LA REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA LA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO, ASI COMO EL DESMANTELAMIENTO DE CORTINAS DE HERRERIA, DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE, POSTERIOR A ESTO SE HICIERON LAS EXCAVACIONES EN CEPAS, SE COLARON ZAPATAS AISLADAS, CADENAS DE CONCRETO, CASTILLOS DE CONCRETO, SE REALIZARON ACARREOS DE MATERIAL A MANO, SE ELABORARON MURO DE TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28 CM, SE APLANARON LOS MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.5 CM DE ESPESOR, SE COLARON PISOS DE CONCRETO DE 10CMS, ASI COMO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, DE BAJA TENSION Y LAS PLUVIALES, SE COLOCARON CORTINAS DE HERRERIA, PINTURA EN MUROS, CORTINAS, Y POR ULTIMO SE HIZO LIMPIEZA GENERAL.

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** Y CONVENIO No._____ RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en la **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** en el: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **29 DE DICIEMBRE DEL 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION LOS C.C. M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES **JEFE DE SUPERVISION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA Y/O** ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VERDIZ, **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.** Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** REPRESSENTADA POR EL C. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS, **EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.**

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: ZAPATA AISLADA DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 DE 10 CMS, MURO DE TABICON DE CEMENTO, INSTALACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y PLUVIAL.

SUB-ESTRUCTURA:

SUPERESTRUCTURA:

TERRACERIAS:

PAVIMENTOS:

OBRAS COMPLEMENTARIAS: ACARREO EN CARRETILLA, CARGA Y LIMPIEZA EN OBRA.

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____.; REFERENTE.. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FIRMA DE CONVENIO_____.

ANTICIPO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023

FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: **2249557** DE FECHA **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
- DE ANTICIPO: **2249556** DE FECHA **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
- DE VICIOS OCULTOS: **2249557** DE FECHA **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACION DE TRABAJOS: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

FINIQUITO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

ENTREGA - RECEPCION: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: $ 2,196,516.92 I.V.A INCLUIDO

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $ 2,196,516.92 I.V.A INCLUIDO

SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **2249557** DE FECHA **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS,** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** Y CONVENIO No. _____.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **11:00** HORAS DEL DIA **29 DE DICIEMBRE DEL 2023**, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

POR LA EMPRESA

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
658,955.08	PESOS	2249556	0	0001

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 658,955.08 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACADULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $658,955.08 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA ASEGURADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;

B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;

E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ
OERM790425L77

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: aIDvo1gA94Ais8fq7XcHeLzZ4YpQPJumYkFRHcoB4XLtx6HENhcCnSSydrdkus4vyYpkmpMEIrW6/c6he30n/9SSx6eBLCYYZrHiUfnRmPMDdyIAvWlNVa6nHc+fDT6871ZM8GwfOQBi0f1LJahu1Q6CeqLriuyk+/+wH6i

iB03bYf1FB4/XpBUfatE93PvWAeRdgMT1AHL7/3Xk8QVZZ/p5+2lgkvq4+fmz4iejpjU1cL7UnJC+e6+NTyXVsInUQzvfLLGa4KAMWwom06PjX2Bg3/FQH0lIzFmCiDOcrWDAhOJs RHSNKVBc3F2KOHvFP7BEdu3qfvw==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION

0927 4F1D 0A

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
219,651.69	PESOS	2249557	0	0001

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 219,651.69 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA ASEGURADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ
OERM7904258L77

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

LINEA DE VALIDACION

0927 4F1D 6E

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Firma Digital: IrCDMGACVRXRfeEaZMd82P5FKhMLX4KucVJIRGFpBNw/3ZxXRuEyfuqxascyKNiDaCoQ2U8hqPbmvrPHYaYq0vOAoWmpnEt5TKDt+4nJUbsdOwMyruf+8gGPKQgw4cJeMIJW3grnOMDu5lSwYifYxCV2+bOChHXePvtgNPr6 4911SIZV75W1obvntBnrDbRdnoC+3uyDqwnjK6r=BsGFqYxmMY9hp5/FfDBOhcj+WxtMvE3CWDJSMDqVTa2Z1V4Tdk9h1EFegiKuM04pFWZsvpdg3xCS3zgn1x10qcZXHjZGEb7Du7/6V3DTt2FxLnvN/BopEdkScr2Eb TQ==

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 10 de Noviembre del 2023

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. hago constar que la obra denominada: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, se iniciará con fecha 10 de Noviembre del 2023, por lo que hacemos la recepcion de la misma, de conformidad con el contrato No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA	POR EL H. AYUNTAMIENTO
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	**ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ**
SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 21 de Diciembre del 2023

CARTA DE TERMINACION DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y de la manera mas respetuosa me dirijo a usted, para comunicarle la terminacion de la obra denominada: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD. La cual ha sido concluida al 100% con todos los requerimientos establecidos por el H. Ayuntamiento de Acapulco en lo referente a todos los conceptos de trabajo de esta obra.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE DE OBRA

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 21 de Diciembre del 2023

CARTA DE ENTREGA DE ESTIMACION

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 1 (UNO) Y FINIQUITO correspondiente a la obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.


A T E N T A M E N T E


ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

IDENTIFICACION OFICIAL

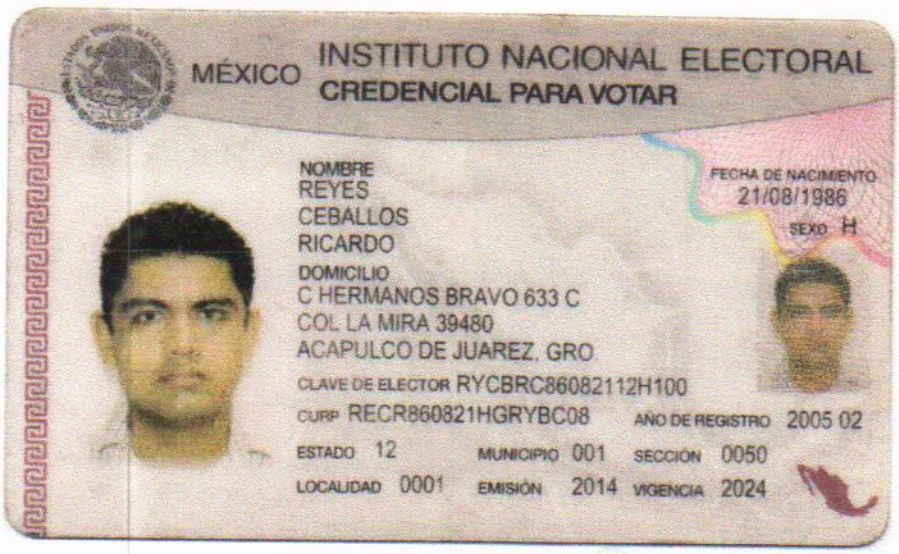

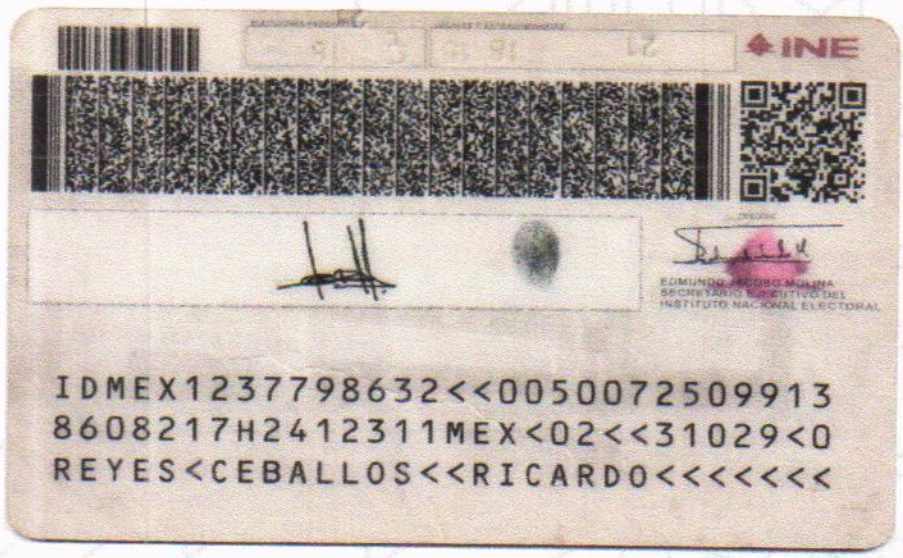

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. a 21 de Diciembre del 2023

CARTA DEL REPRESENTANTE TECNICO

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente hago entrega de la Estimacion No. 1 (UNO) Y FINIQUITO correspondiente a la obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, ubicada en: COL. COMERCIAL ACAPULCO, con No. de Contrato: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD. La cual ha sido revisada por el suscrito como Representante Tecnico de Obra de la Empresa ante el Municipio y con la cual estoy de acuerdo.

Asi mismo, certifico que he revisado fisicamente los trabajos terminados, comprendidos en esta estimacion y estoy de acuerdo en que cumplen con las especificaciones y calidad requeridos por el Municipio.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E


ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
CEDULA PROFESIONAL 6952505

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

CEDULA PROFESIONAL



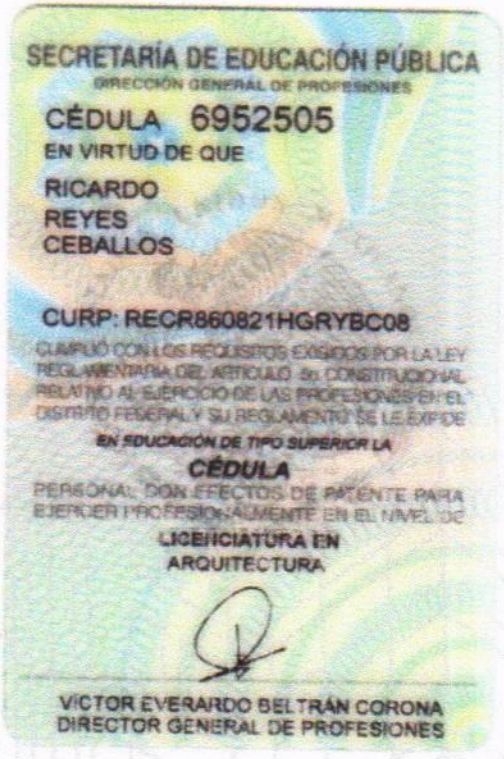

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO, GRO. A 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CARTA DE RECEPCION DE FINQUITO DE LA OBRA

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E .

POR ESTE MEDIO LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, A LAS 10:00 HRS. EN EL SITIO DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN LA **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, PARA CONCILIAR VOLUMENES DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p.- M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN - Director de Obras Públicas. - Mismo fin.
c.c.p.- Archivo / minutario.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



BITACORA SOCIAL




BITACORA SOCIAL


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

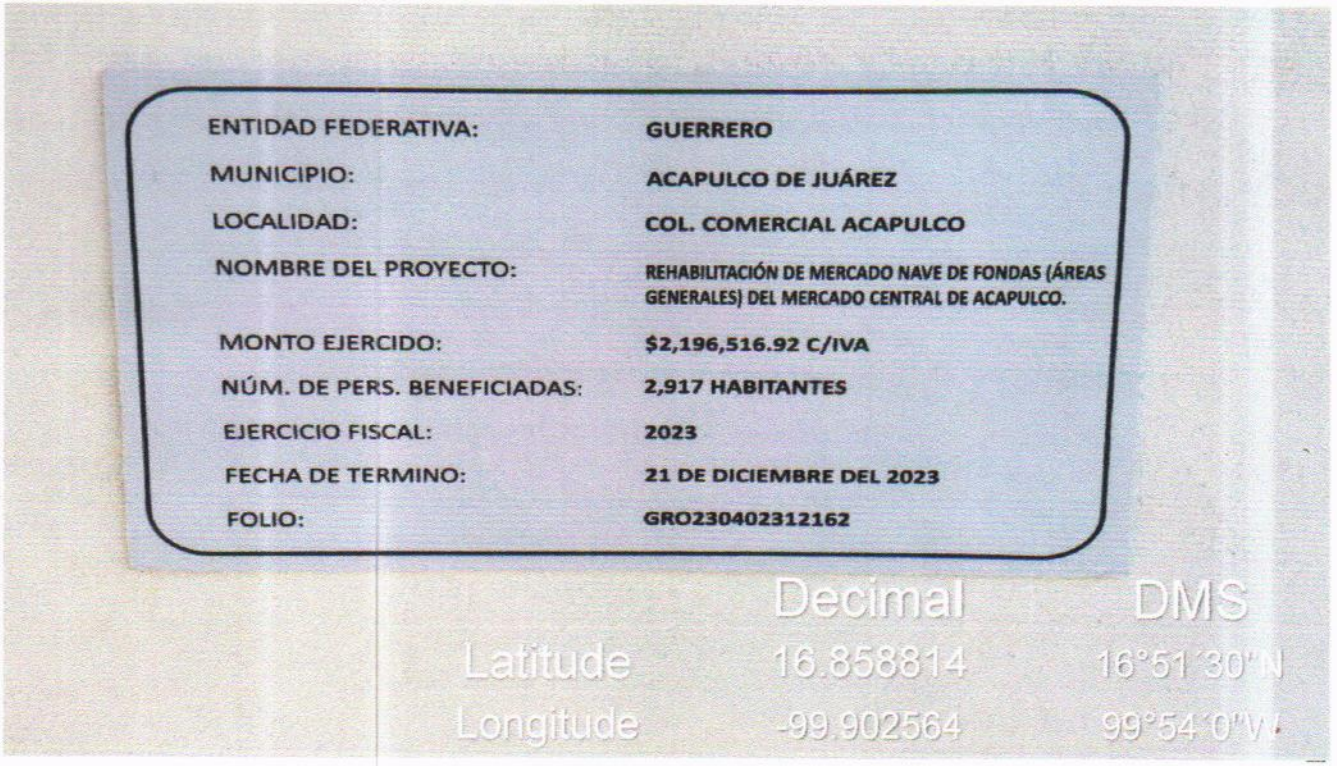

PLACA DE INAUGURACION

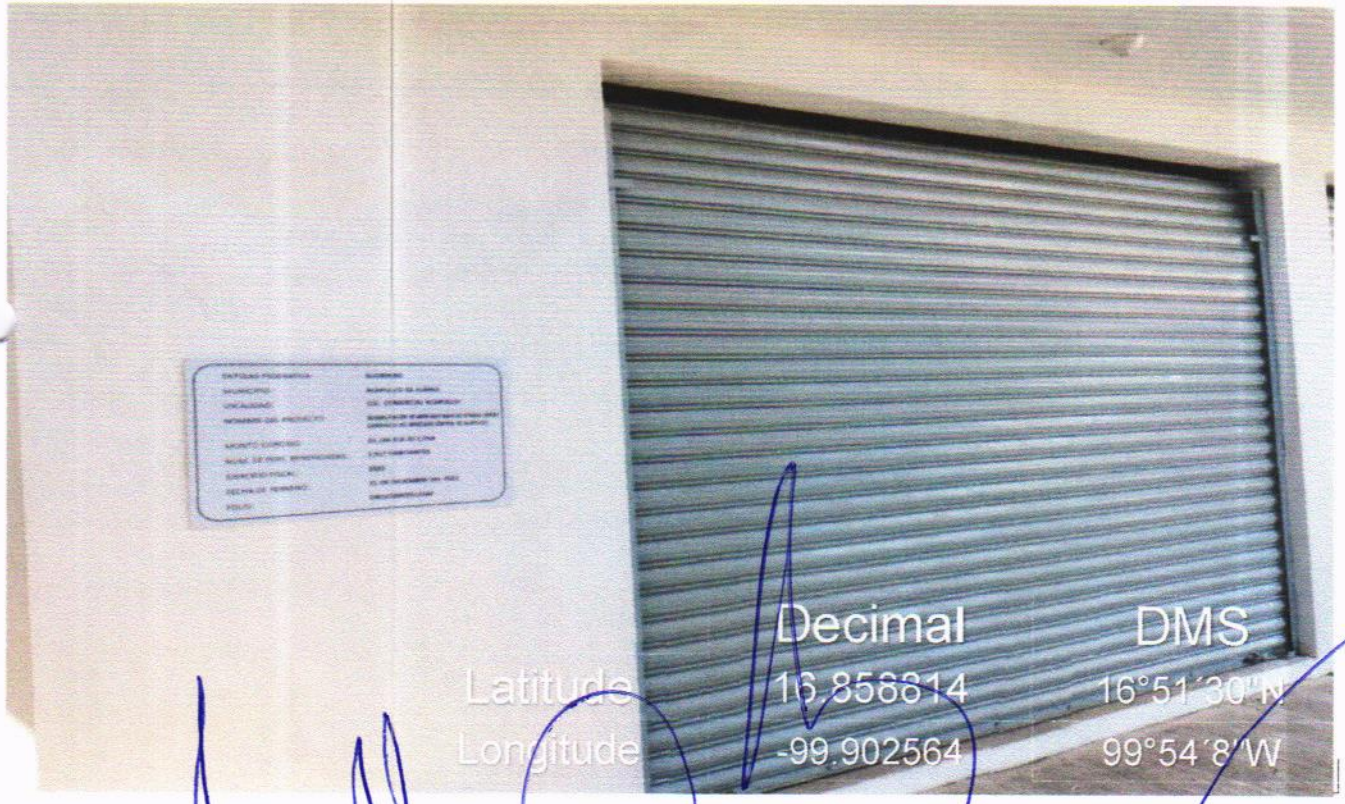

PLACA DE INAUGURACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



INICIO



INICIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



INICIO




INICIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

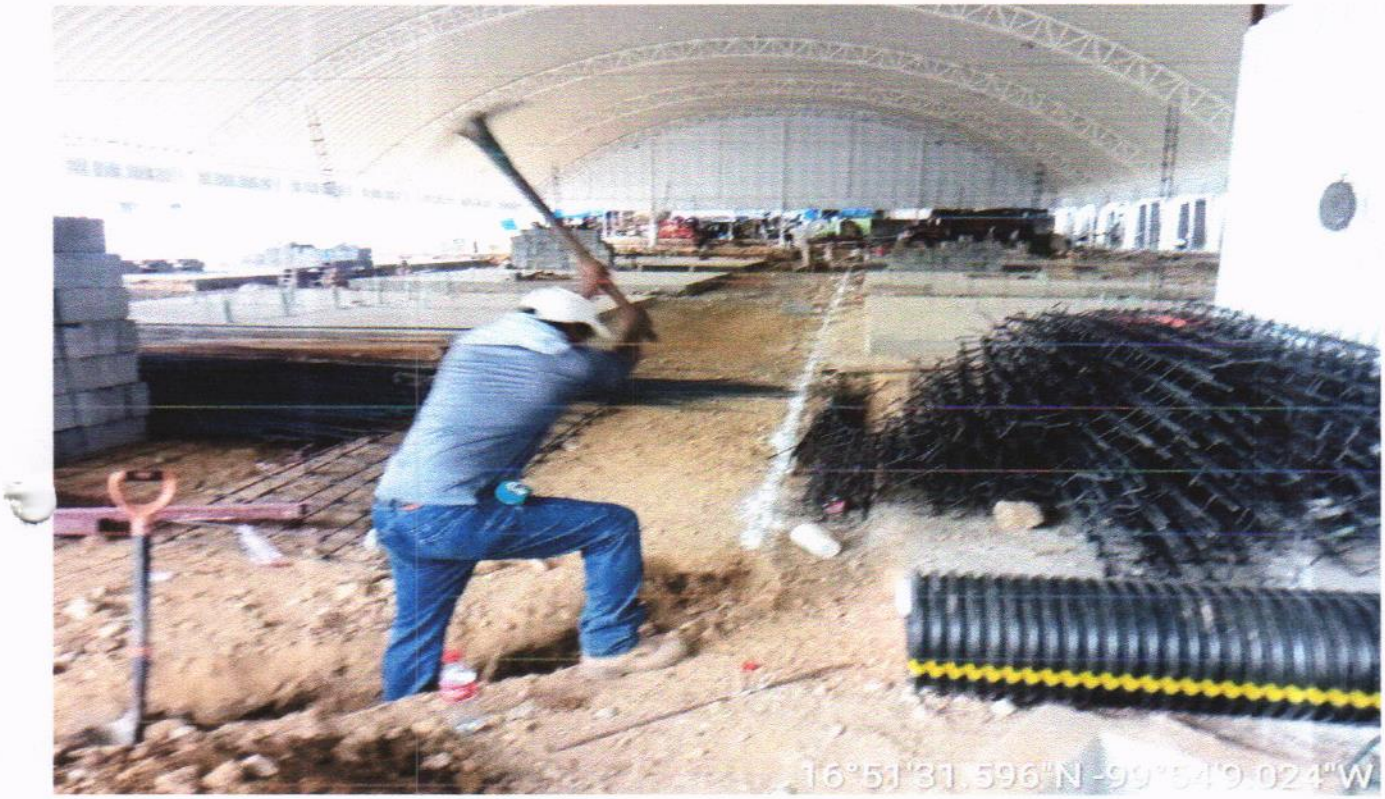

INICIO



INICIO


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



PROCESO

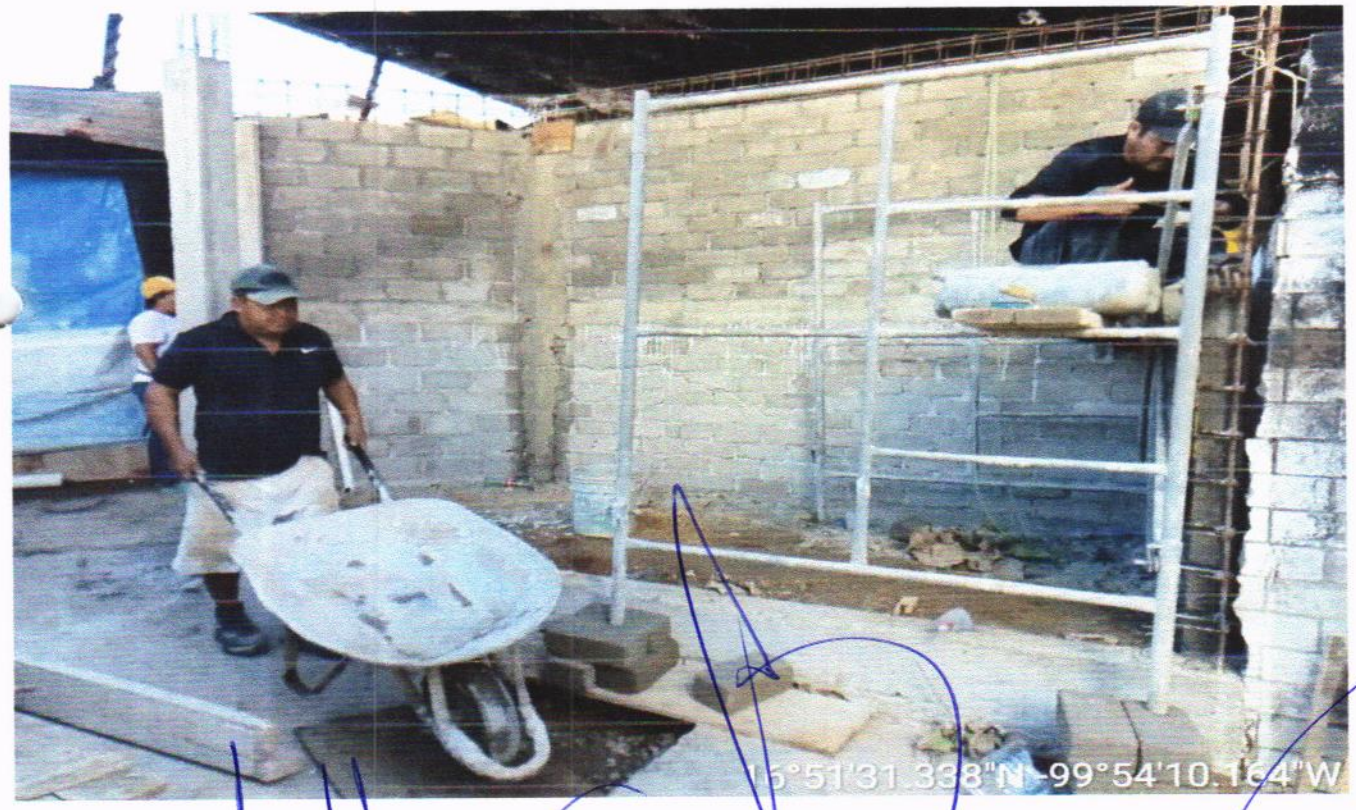

PROCESO


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



PROCESO

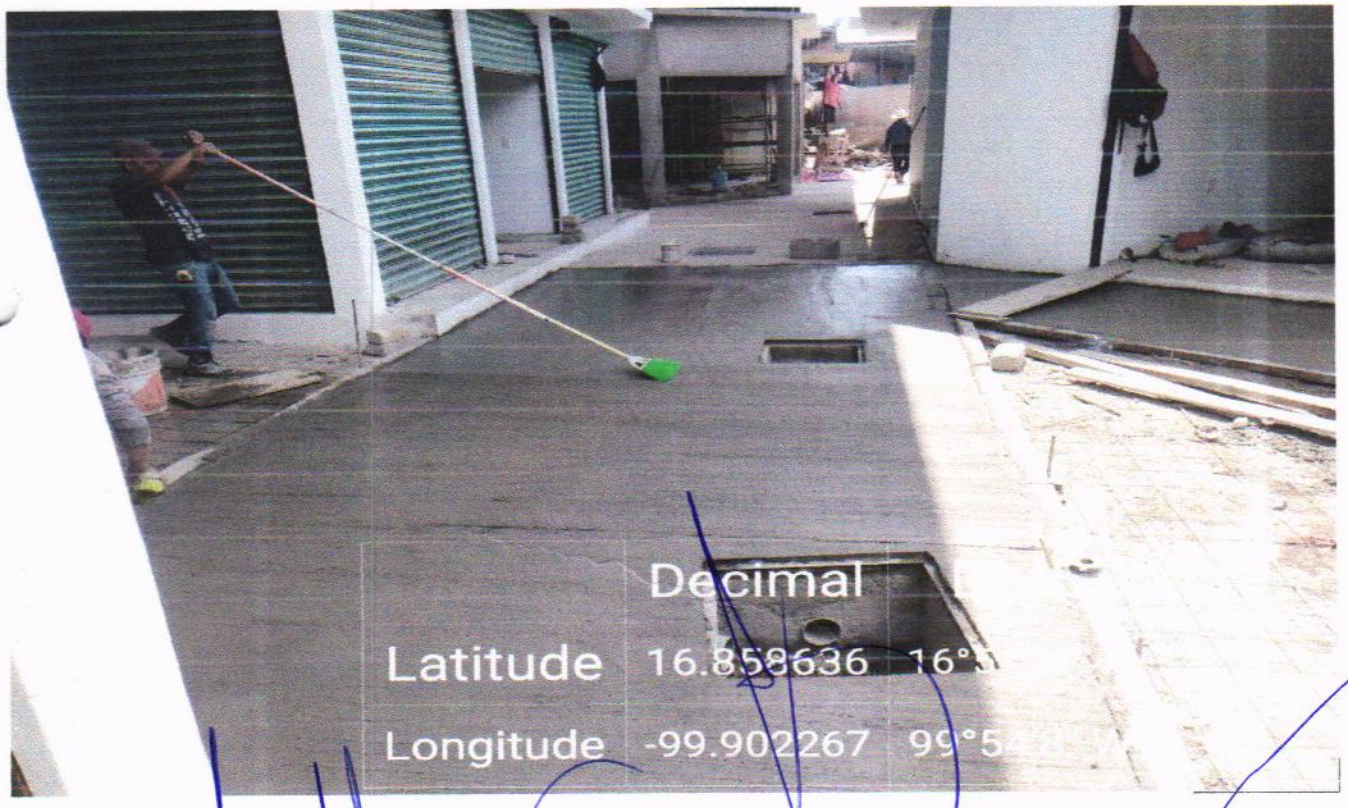

PROCESO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



PROCESO




PROCESO


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

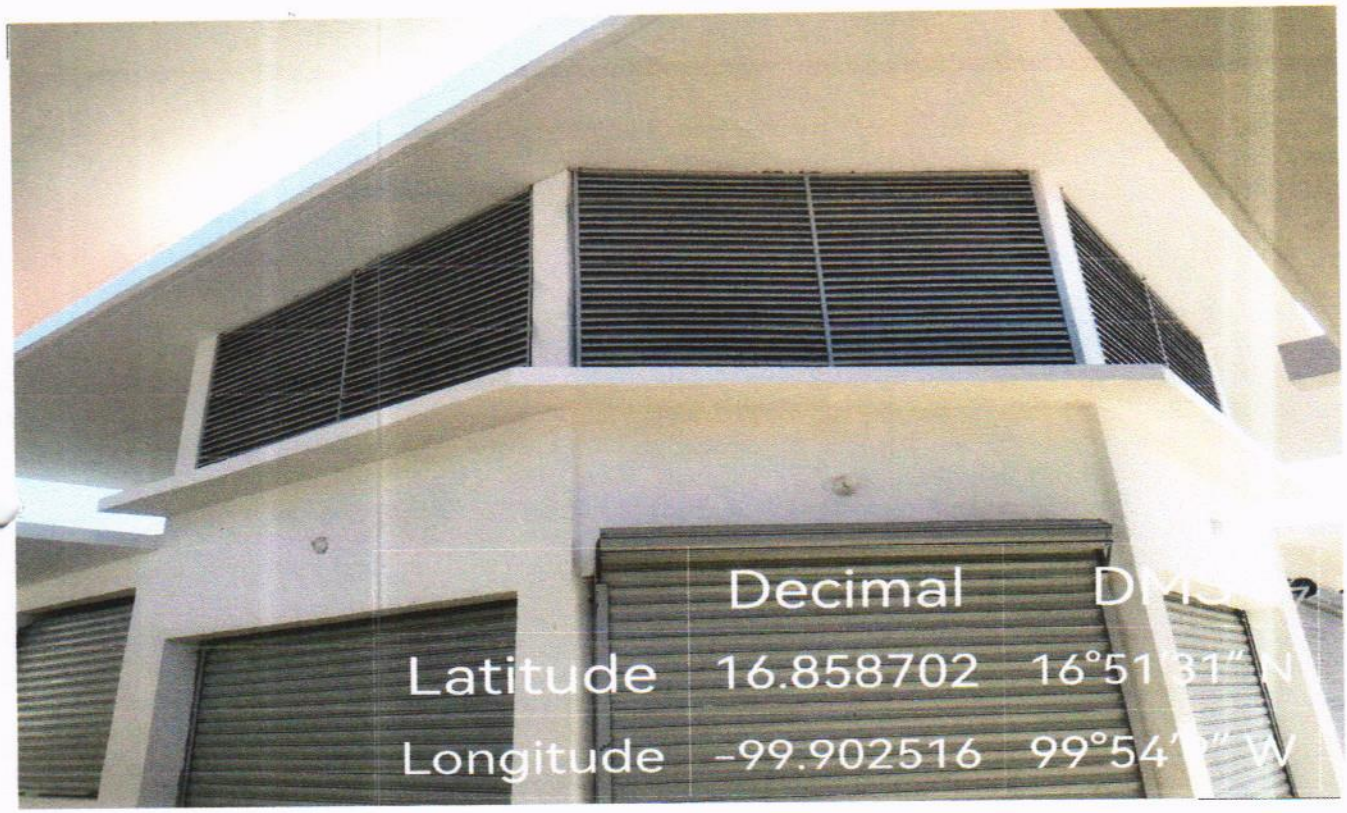

TERMINACION

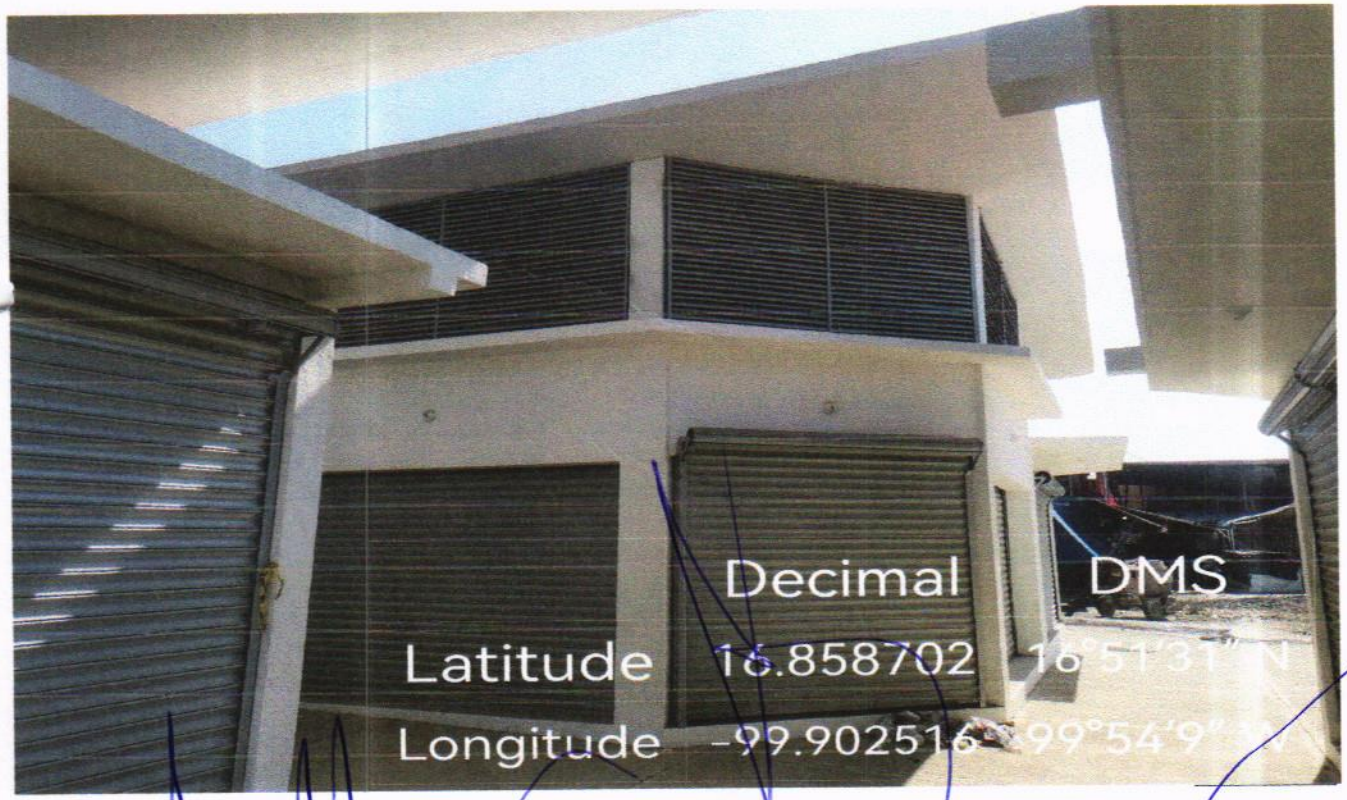

TERMINACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



TERMINACION



TERMINACION


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



TERMINACION

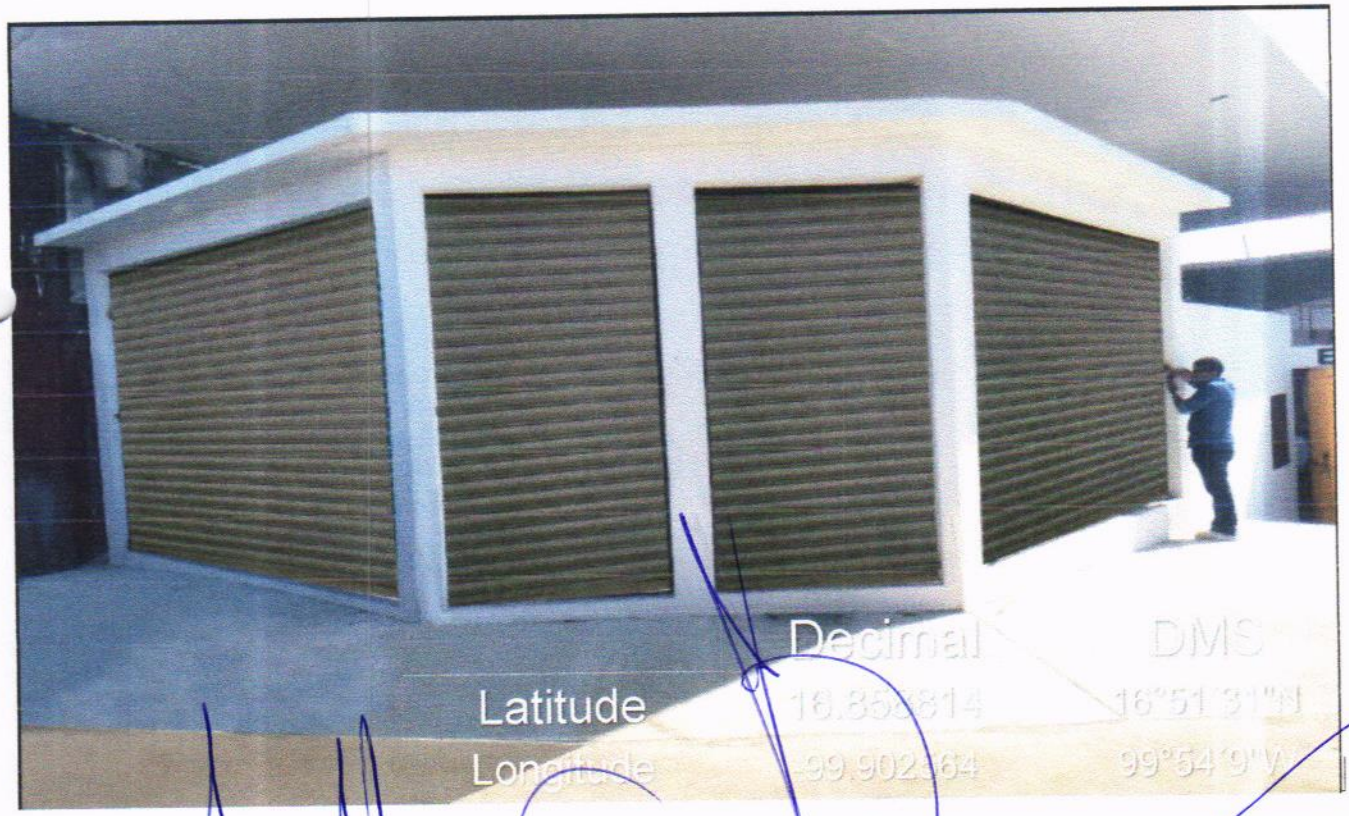

TERMINACION

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO

NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	**10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,196,516.92**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	**DEL 10-nov-23 AL 23-nov-23**

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	LOCALES DE CONCRETO	
4	ALBAÑILERIAS	
5	ACABADOS	

6	ROTULACION	
7	BAJA TENSION	
8	DRENAJES	
9	ACARREOS Y LIMPIEZA	


AVANCE TOTAL
25%



REMOCION DE ESCOMBRO

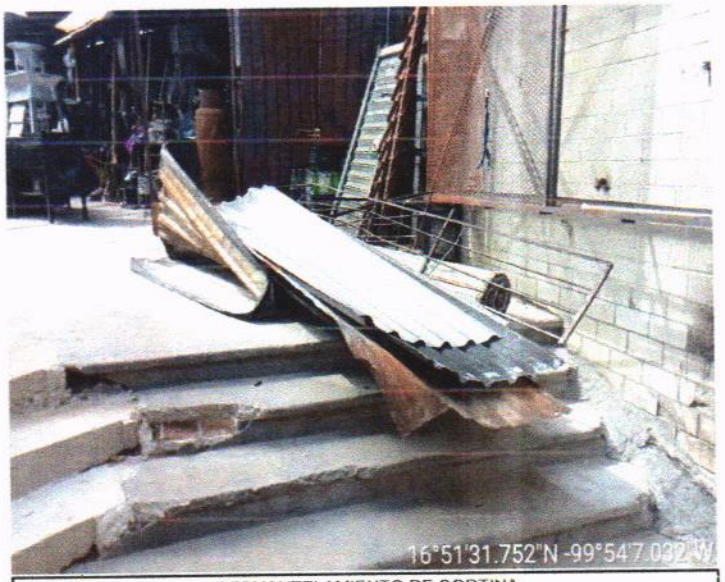

DESMANTELAMIENTO DE CORTINA

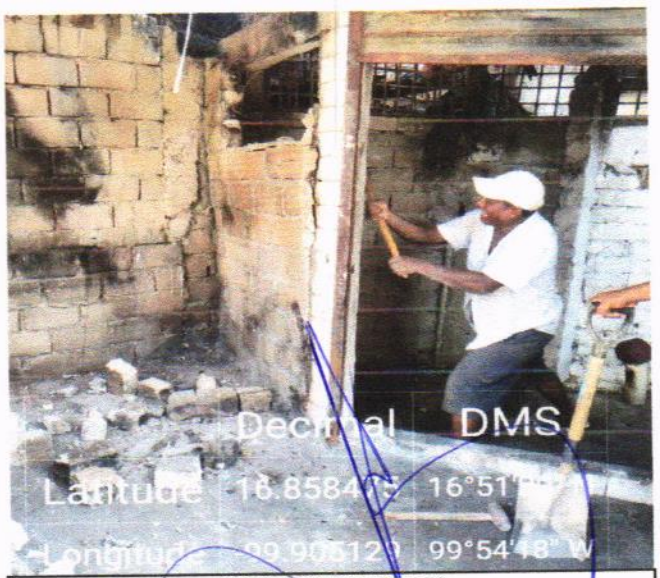

DEMOLICION DE LOCALES



DEMOLICION DE PISO

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	**10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**		
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$**	**2,196,516.92**	
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	**DEL 24-nov-23**	**AL**	**07-dic-23**

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	LOCALES DE CONCRETO	100%
4	ALBAÑILERIAS	100%
5	ACABADOS	

6	ROTULACION	
7	BAJA TENSION	50%
8	DRENAJES	50%
9	ACARREOS Y LIMPIEZA	

AVANCE TOTAL
63%

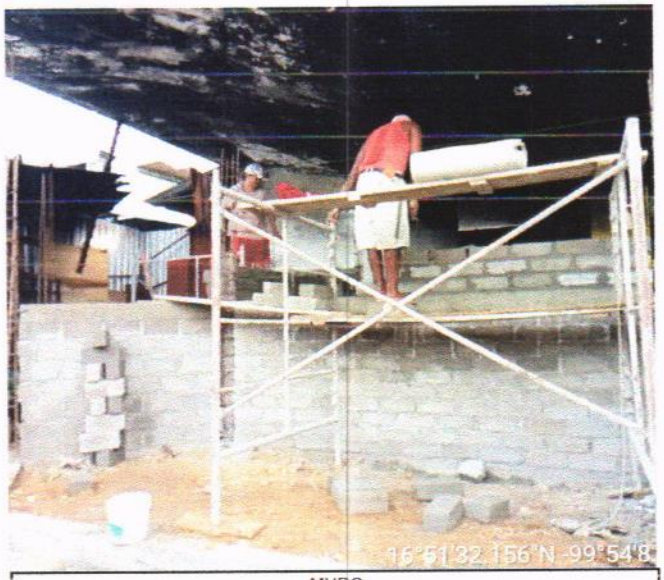

MURO

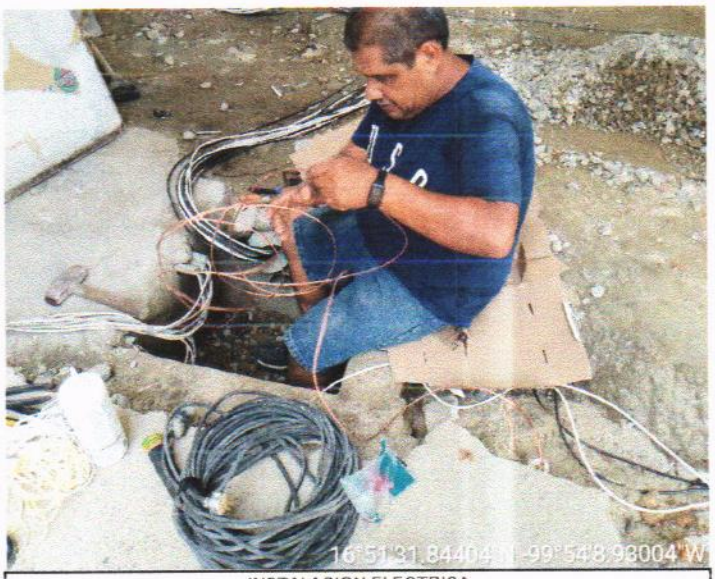

INSTALACION ELECTRICA



LOSA



CENTRO MODULAR

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISION CON SOPORTE FOTOGRAFICO


NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
CONTRATISTA:	MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	**PERIODO CONTRACTUAL:**	**10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRRE DEL 2023**
CONTRATO No. :	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	**IMPORTE DE CONTRATO:**	**$ 2,196,516.92**
UBICACIÓN:	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO:**	**DEL 08-dic-23 AL 21-dic-23**

AVANCES POR PARTIDAS:


1	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	100%
2	PRELIMINARES	100%
3	LOCALES DE CONCRETO	100%
4	ALBAÑILERIAS	100%
5	ACABADOS	100%

6	ROTULACION	
7	BAJA TENSION	100%
8	DRENAJES	100%
9	ACARREOS Y LIMPIEZA	100%


AVANCE TOTAL
100%

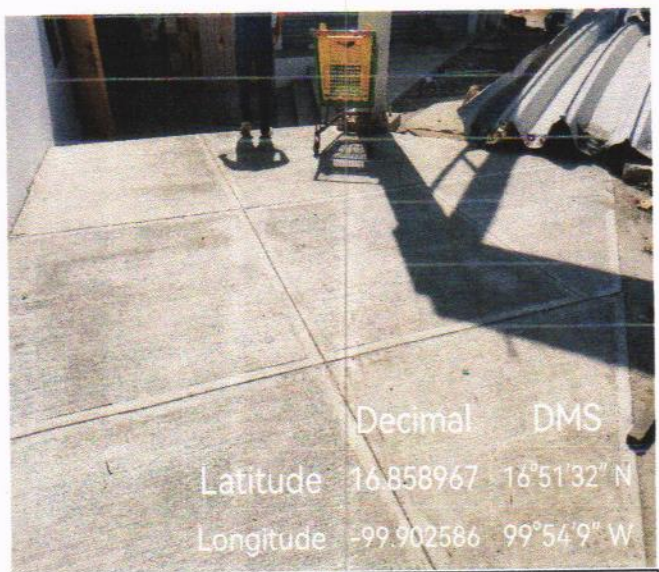


PISO

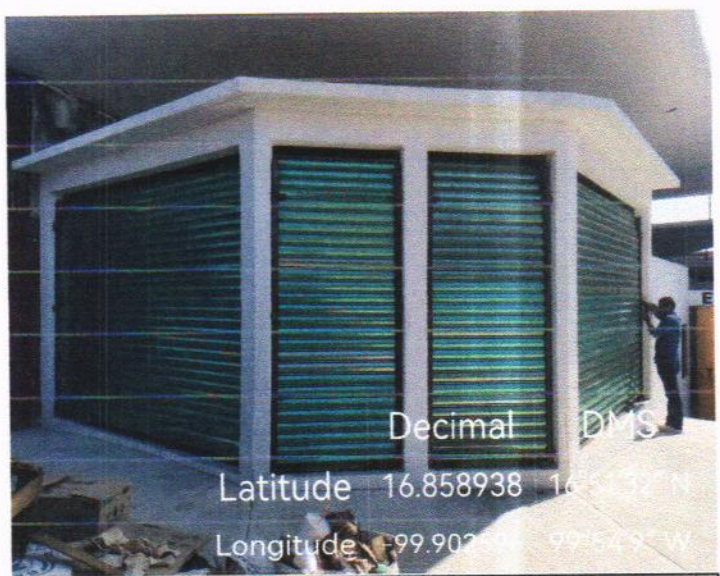

CORTINA

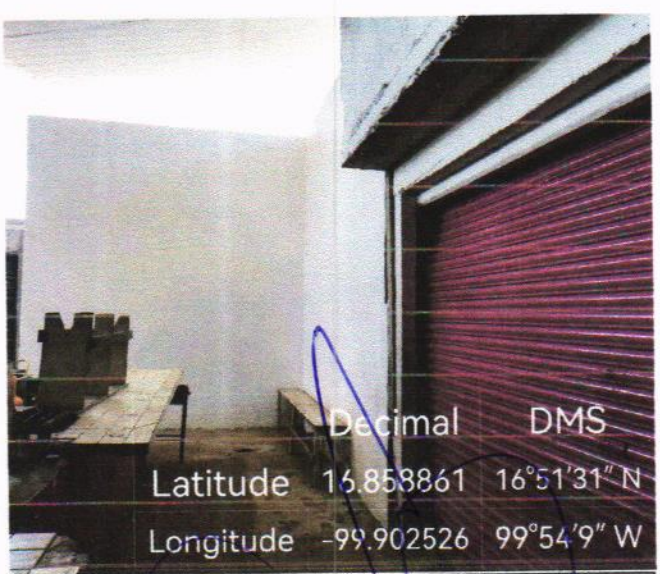

PINTURA

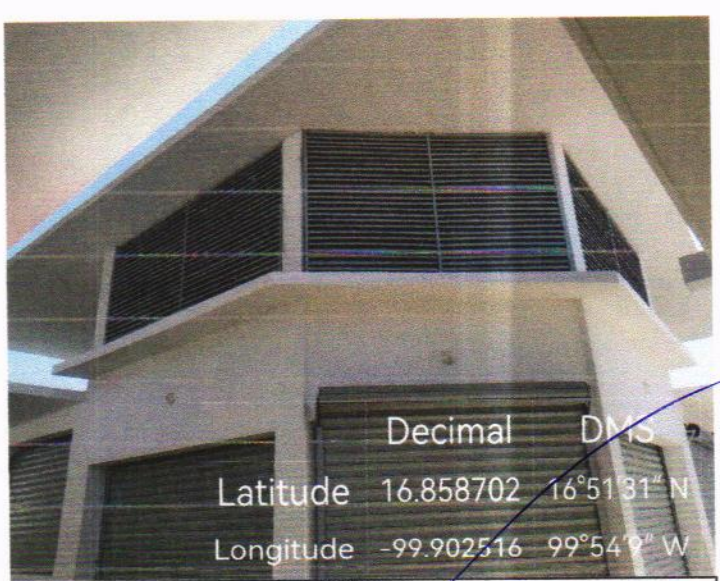

LOUVERS

RESIDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

COCRE CONSTRUCTOR, SA. DE C.V.

DIVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

PRIV. PUEBLA 18, COL. PROGRESO. ACAPULCO DE JUAREZ

GUERRERO. MEXICO. C.P. 39350

R.F.C. CC0200525C1A TEL: 7444087873 ecr-cortes@hotmail.com

INFORME DE PRUEBAS Y CONTROL DEL CONCRETO HIDRAULICO

AUTORIZO: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: CONSTRUCCION DEL MERCADO NAVE DE COMIDAS (LOCALES MODULO A) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REPRESENTANTE LEGAL:

RICARDO REYES CEBALLOS

EMPRESA: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

UBICACION: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

SUPERFICIE: 22.08 M2

PROCEDIMIENTO DE CURADO: IMERSION TOTAL EN AGUA (PILA)

CILINDRO No.	REMISION No.	REVOLVEDORA (OLLA) No	FECHA DE COLADO	FECHA DE RUPTURA	EDAD DIAS	REVENIMIENTO CMS	RESISTENCIA kg/cm2	PORCENTAJE DE f'c
COLADO DE LOSA TAPA DEL MODULO A								
*01	7320314	RE-3014	23/11/2023	30/11/2023	7 DIAS	18	195.00	78.0
*02	7320315	RE-3015	23/11/2023	07/12/2023	14 DIAS	18	238.00	95.2
*03	7320315	RE-3015	23/11/2023	21/12/2023	14 DIAS	18	255.00	102.0

DATOS DE PROYECTO: F'C=250 KG/CM2

REV. 14 +- 2.00 CM.

OBSERVACIONES: LOS RESULTADOS DE RESISTENCIAS OBTENIDOS SE ENCUENTRAN ACEPTABLES.

CEMENTO: MARCA: APASCO

CUMPE CON NORMA N-CMT-2-02-005/4

TIPO: NORMAL

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO EN LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS

SUMINISTRO: HECHO EN OBRA

FECHA DEL RESULTADO: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

COCRE CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. RFC CC0200525C1A CALLE PUEBLA No. 18 ACAPULCO

ELABORO:

ARQ. AURORA N. FLORES CARMONA

REPRESENTANTE LEGAL


ESTEFANIA CORTES RADILLA

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



PRUEBAS DE LABORATORIO

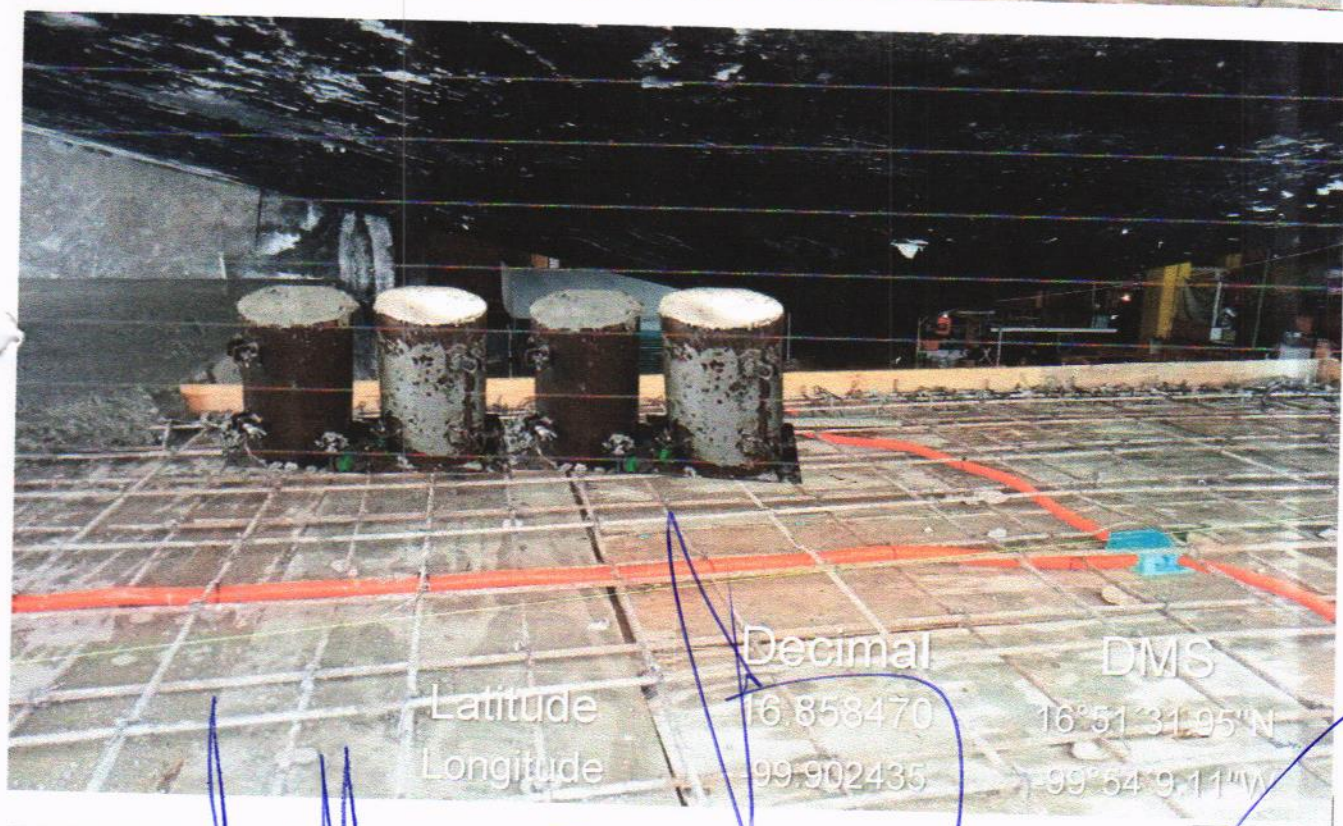

PRUEBAS DE LABORATORIO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**									
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	**Modulo E**		1305 Exterior	10.60	0.50			5.30	
		Modulo E		1305	7.84	0.60			4.70	
		Modulo E		1306	7.86	0.40			3.14	
							TOTAL	**M3**	**13.14**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

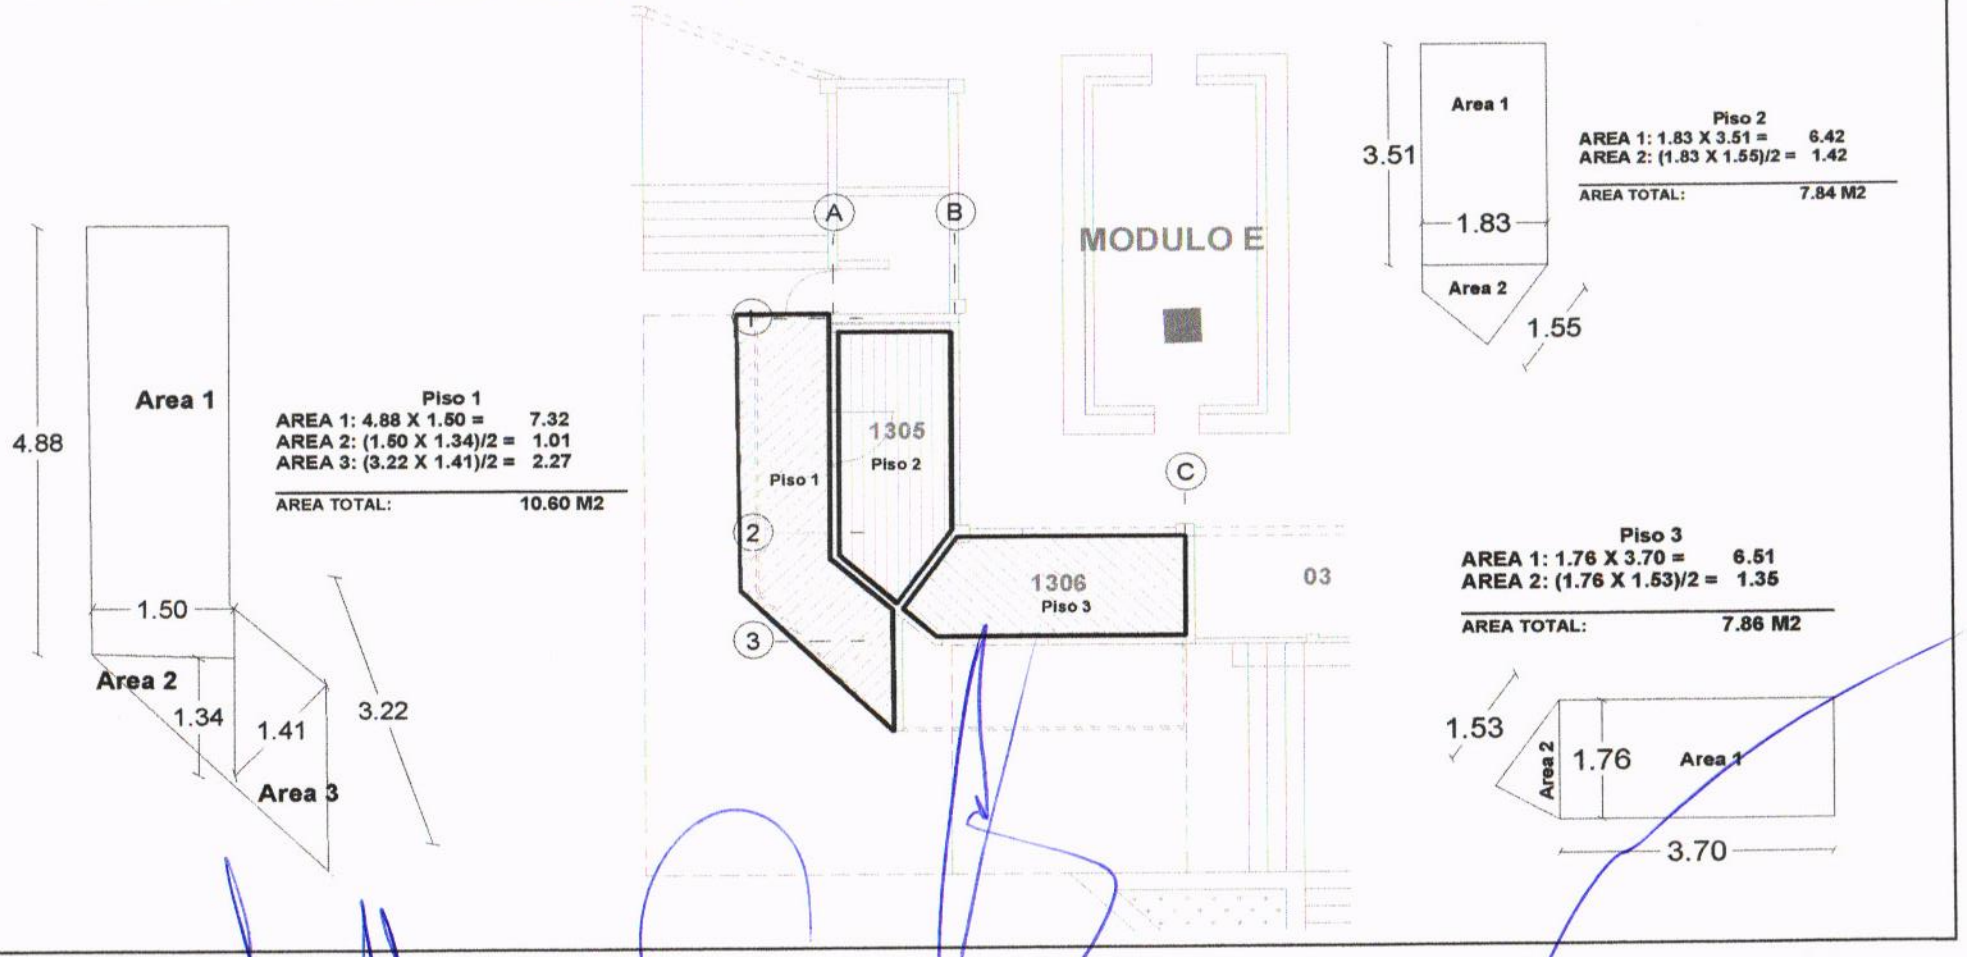

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**				Largo	Alto	Esp.			
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	Muro	1	A-B	1.78	2.50	0.15		0.67	
		Muro	2	B-C	0.70	2.50	0.15		0.26	
		Muro	3	B-C	2.05	2.50	0.15		0.77	
	L=1.36+1.83 = 3.19	Muro	A	1-3	3.19	2.50	0.15		1.20	
		Muro	B	1-2	3.37	2.50	0.15		1.26	
	L=1.36+0.71 = 2.07	Muro	A-B	2-3	2.07	2.50	0.15		0.78	
		Muro	A-B	2-3	1.55	2.50	0.15		0.58	
			Jardinera		3.80	0.50	0.50		0.95	
			Jardinera		3.70	0.50	0.50		0.93	
			Jardinera		5.30	0.50	0.50		1.33	
					Largo	Area	Pza			
	L=0.7+2.5 = 3.20	Des/Cerra	1	A-B	1.78	0.03	2.00		0.11	
	L=1.7+2.05 =3.75	Des/Cerra	2	B-C	3.20	0.03	2.00		0.19	
	L=3.73+1.83 = 5.56	Des/Cerra	3	B-C	3.75	0.03	2.00		0.23	
		Des/Cerra	A	1-2	5.56	0.03	2.00		0.33	
	L=1.36+0.71 = 2.07	Des/Cerra	B	1-2	3.37	0.03	2.00		0.20	
		Des/Cerra	A-B	2-3	2.07	0.03	2.00		0.12	
		Des/Cerra	A-B	2-3	1.55	0.03	2.00		0.09	
		Castillos			2.70	0.03	9.00		0.73	
		Columnas			2.70	0.09	1.00		0.24	
		Losa			4.50	1.00	1.00		4.50	
							TOTAL	**M3**	**15.47**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

DEM-LOC DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Muros

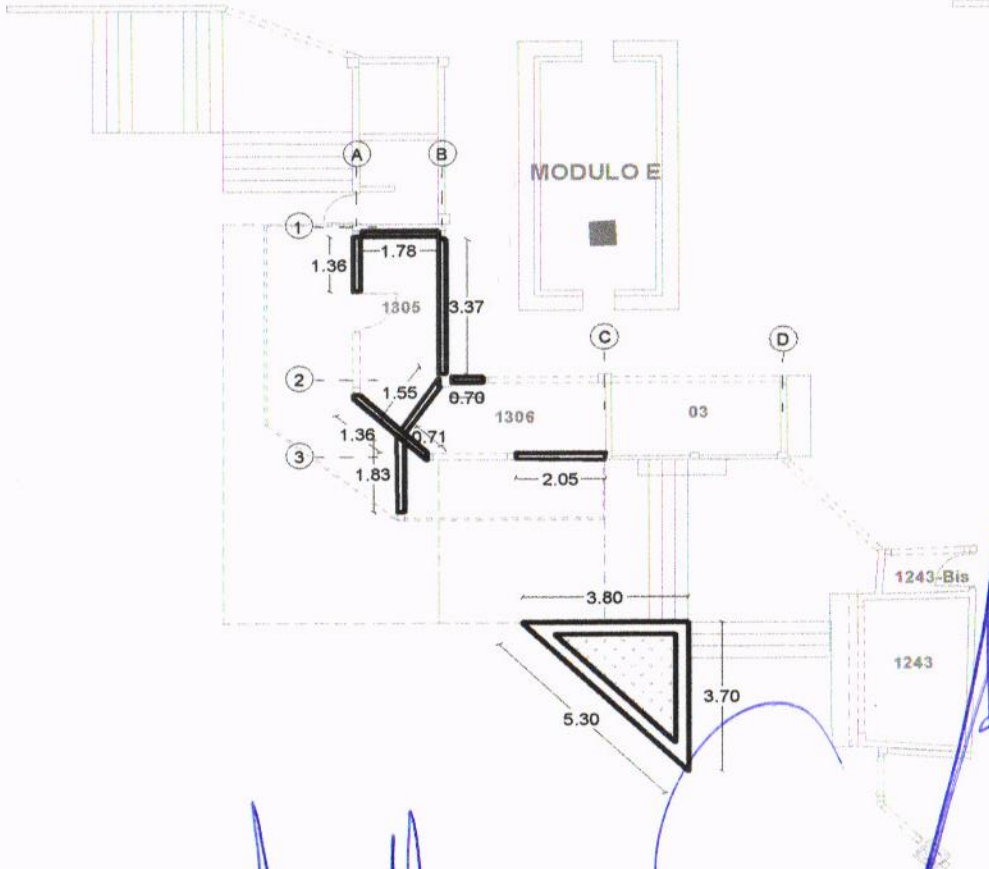

Contratabes y Cerramiento

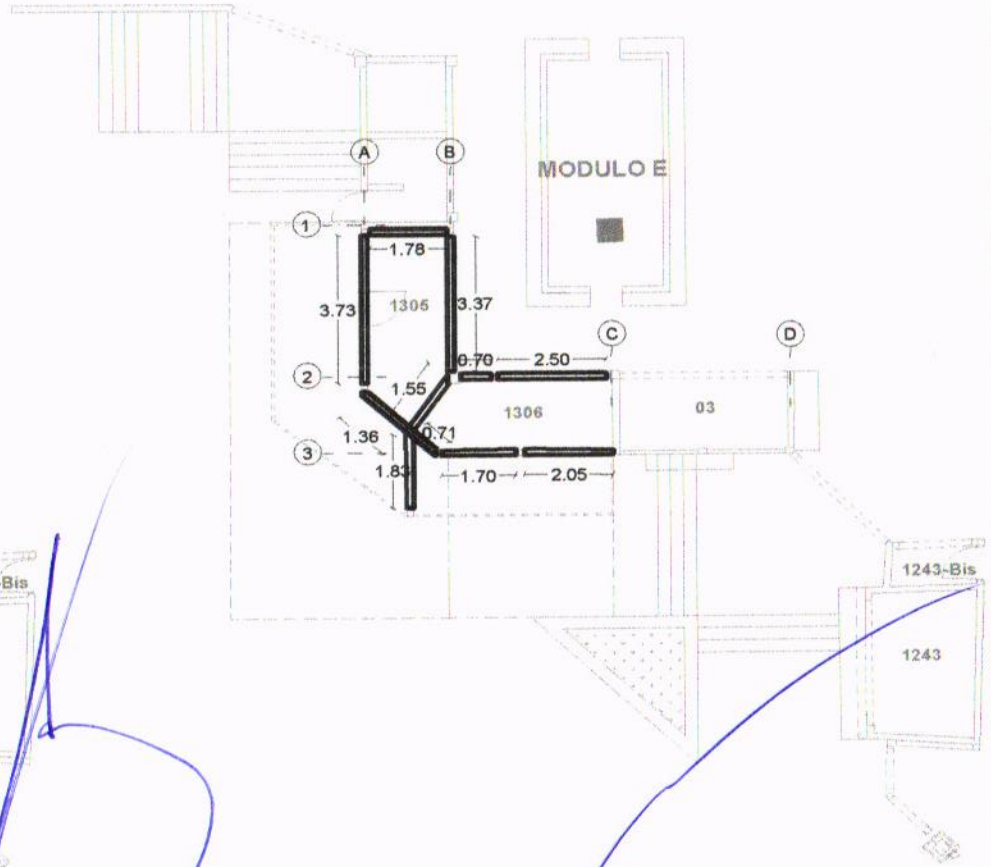

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

DEM-LOC DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Columnas

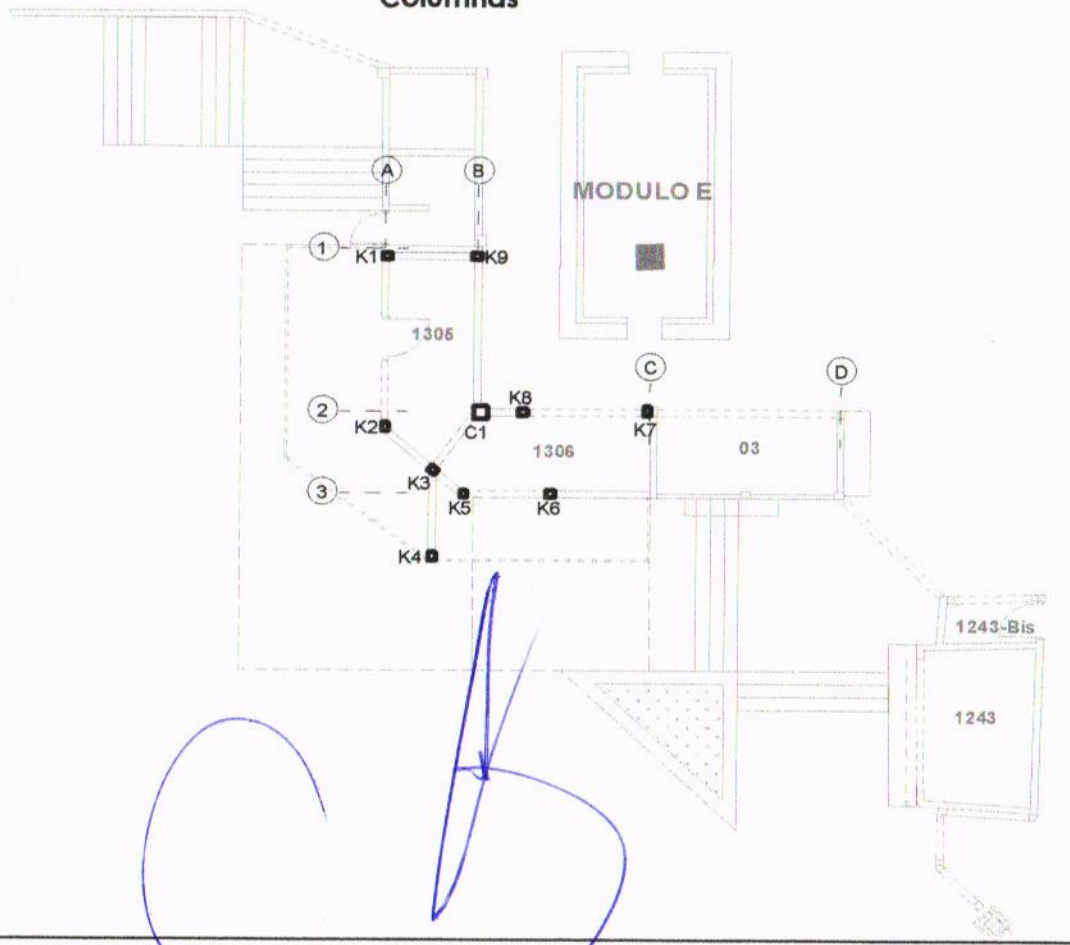

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

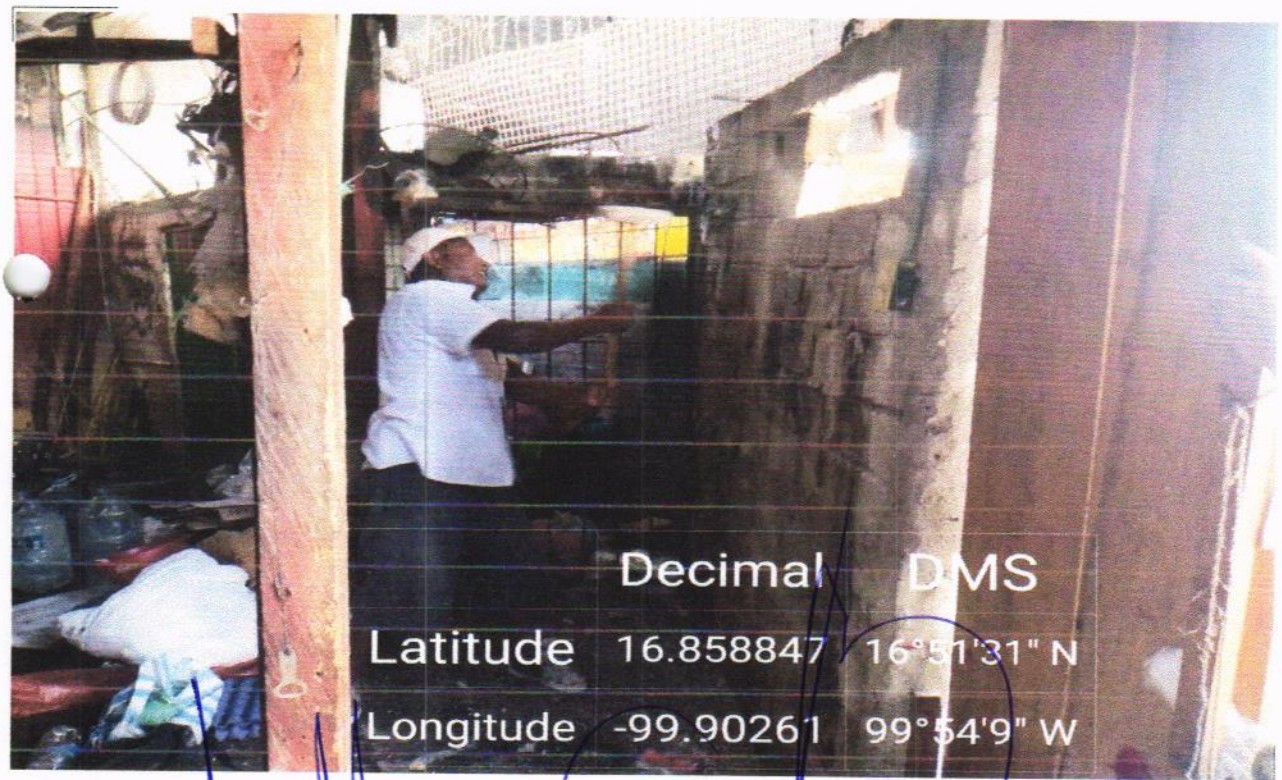

A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.


SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

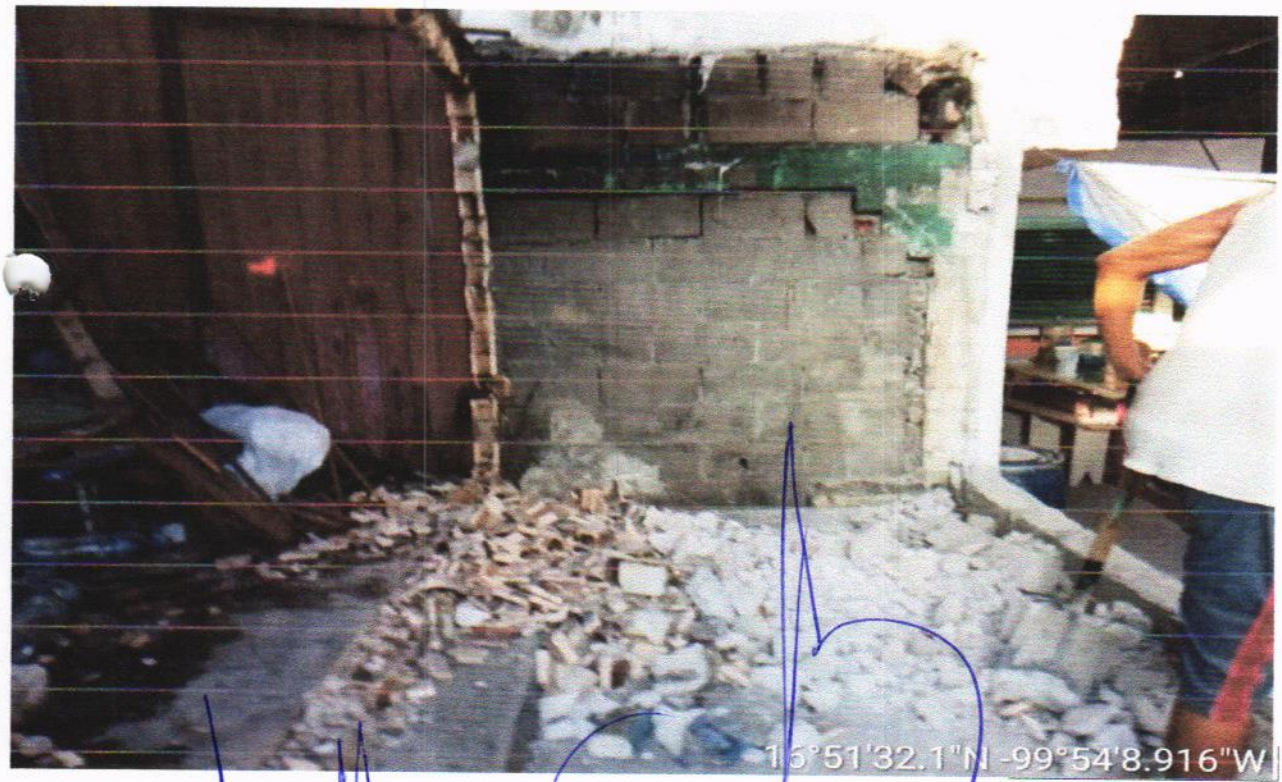

A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABICUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A01	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS									
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .		Piso 1		82.89	1.00			82.89	
			Piso 2		20.03	1.00			20.03	
			Piso 3		10.05	1.00			10.05	
			Piso 4		17.43	1.00			17.43	
			Piso 5		120.64	1.00			120.64	
			Piso 6		84.87	1.00			84.87	
			Piso 7		27.53	1.00			27.53	
							TOTAL	M2	363.44	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

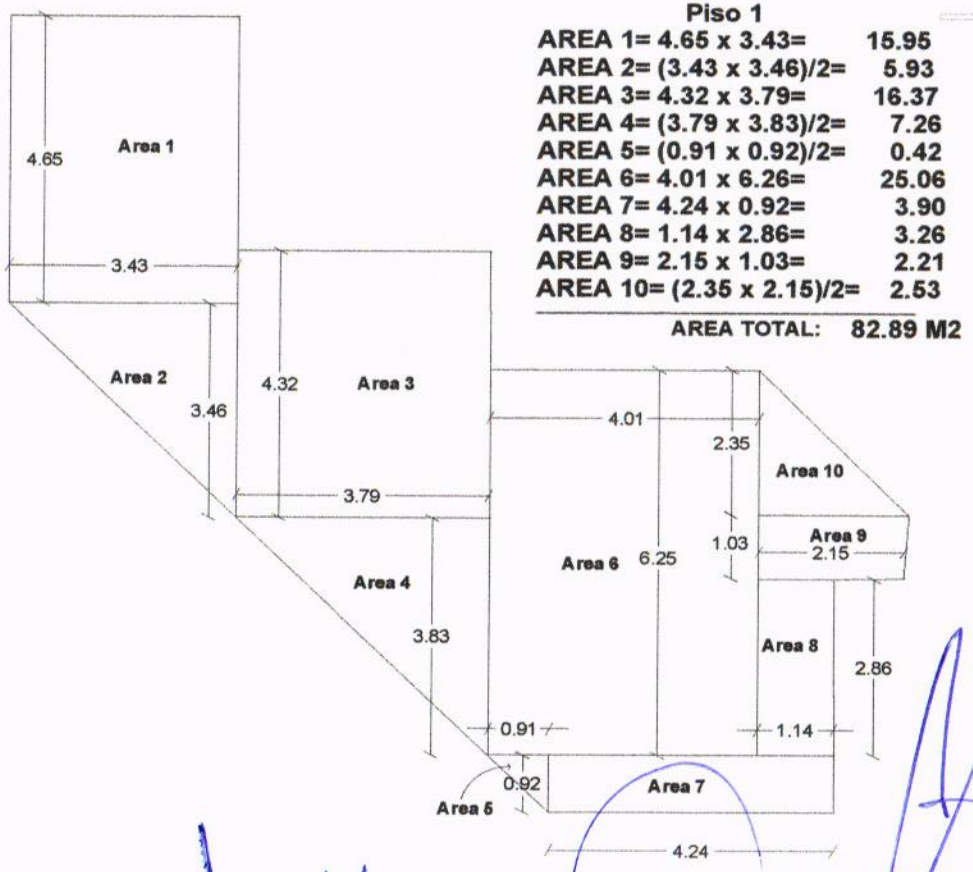

Piso 1

AREA 1= 4.65 x 3.43=	15.95
AREA 2= (3.43 x 3.46)/2=	5.93
AREA 3= 4.32 x 3.79=	16.37
AREA 4= (3.79 x 3.83)/2=	7.26
AREA 5= (0.91 x 0.92)/2=	0.42
AREA 6= 4.01 x 6.26=	25.06
AREA 7= 4.24 x 0.92=	3.90
AREA 8= 1.14 x 2.86=	3.26
AREA 9= 2.15 x 1.03=	2.21
AREA 10= (2.35 x 2.15)/2=	2.53
AREA TOTAL:	**82.89 M2**

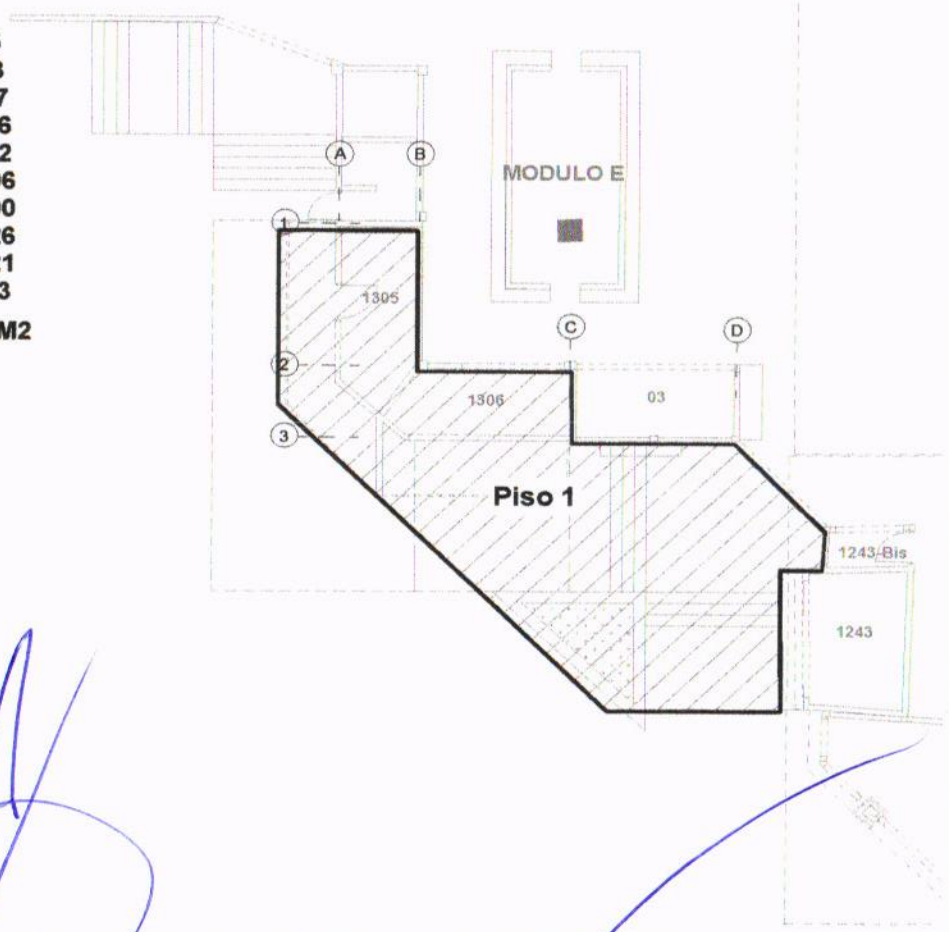

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023


C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS


1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

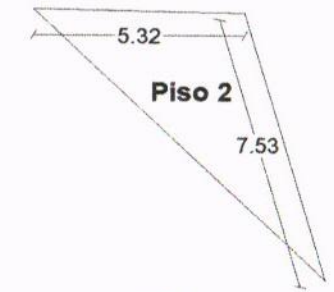


Piso 2
AREA= (5.32 x 7.53)/2= 20.03
AREA TOTAL: 20.03 M2

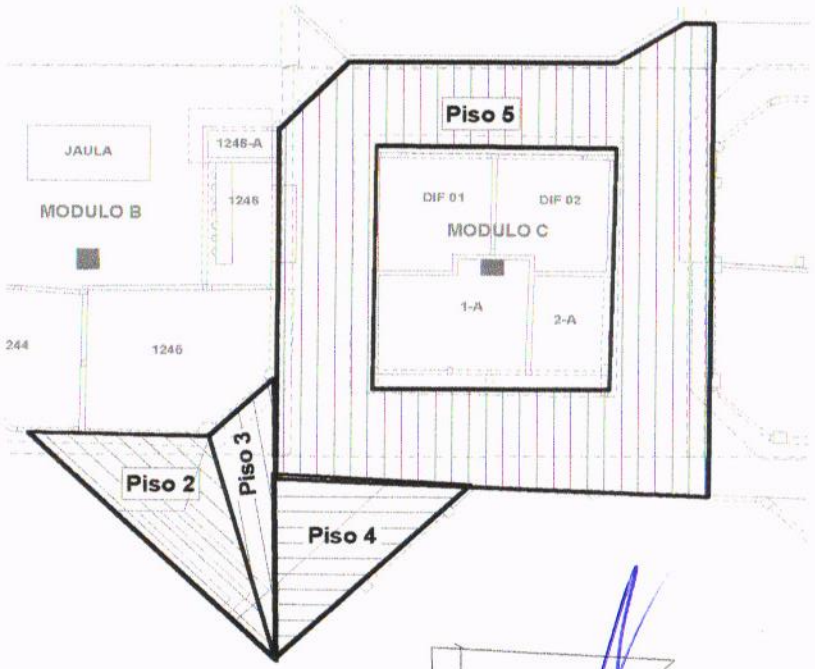

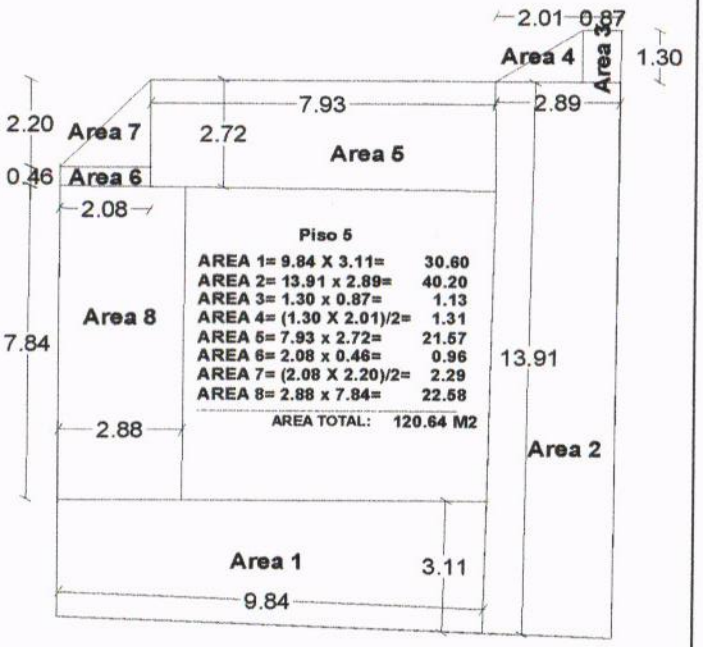



Piso 3
AREA= (7.53 x 2.67)/2= 10.05
AREA TOTAL: 10.05 M2



Piso 4
AREA= (5.94 x 5.87)/2= 17.43
AREA TOTAL: 17.43 M2

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS


1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

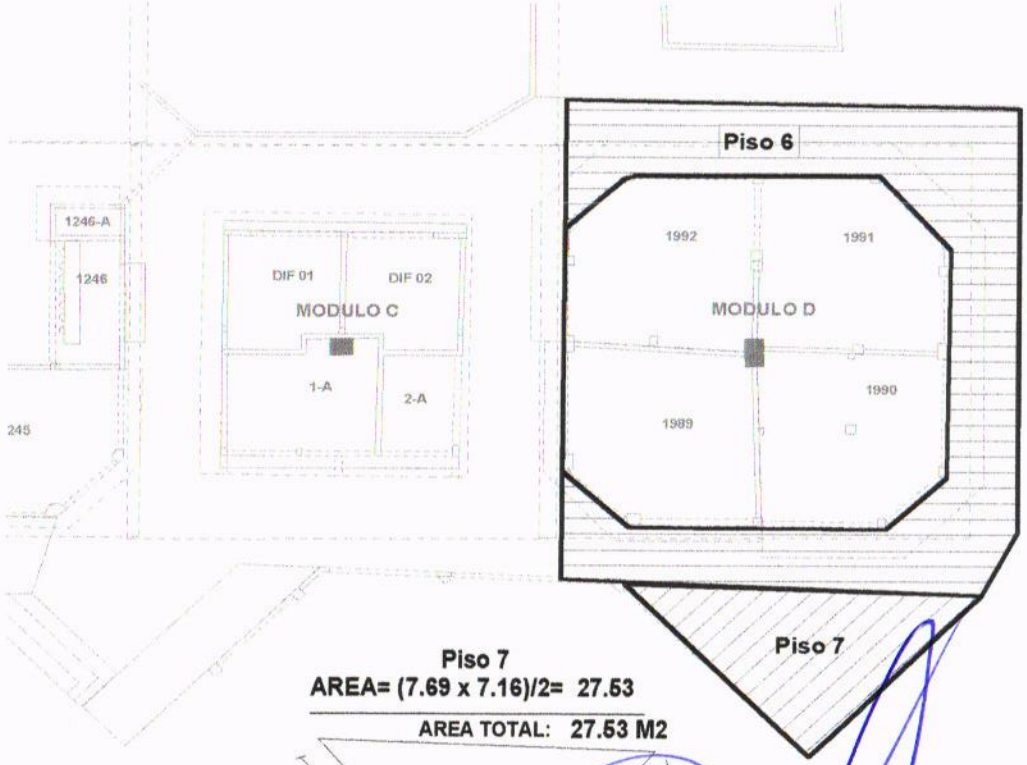

Piso 7
AREA= (7.69 x 7.16)/2= 27.53

AREA TOTAL: 27.53 M2



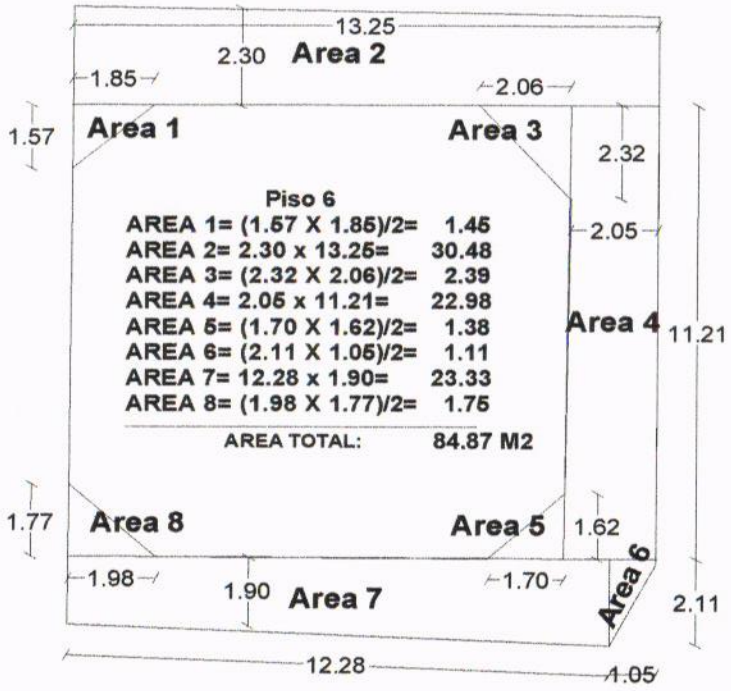

Piso 6

AREA 1= (1.57 X 1.85)/2=	**1.45**
AREA 2= 2.30 x 13.25=	**30.48**
AREA 3= (2.32 X 2.06)/2=	**2.39**
AREA 4= 2.05 x 11.21=	**22.98**
AREA 5= (1.70 X 1.62)/2=	**1.38**
AREA 6= (2.11 X 1.05)/2=	**1.11**
AREA 7= 12.28 x 1.90=	**23.33**
AREA 8= (1.98 X 1.77)/2=	**1.75**
AREA TOTAL:	**84.87 M2**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION.



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	
1-0016*		DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	
1-0016*		DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	N Ú M E R O S G E N E R A D O R E S								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**									
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Cortina 01			1.36		2.50		3.40	
		Cortina 02			1.70		2.50		4.25	
		Cortina 03			2.50		2.50		6.25	
		Puerta Local 1305			1.00		2.10		2.10	
							TOTAL	M2	16.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

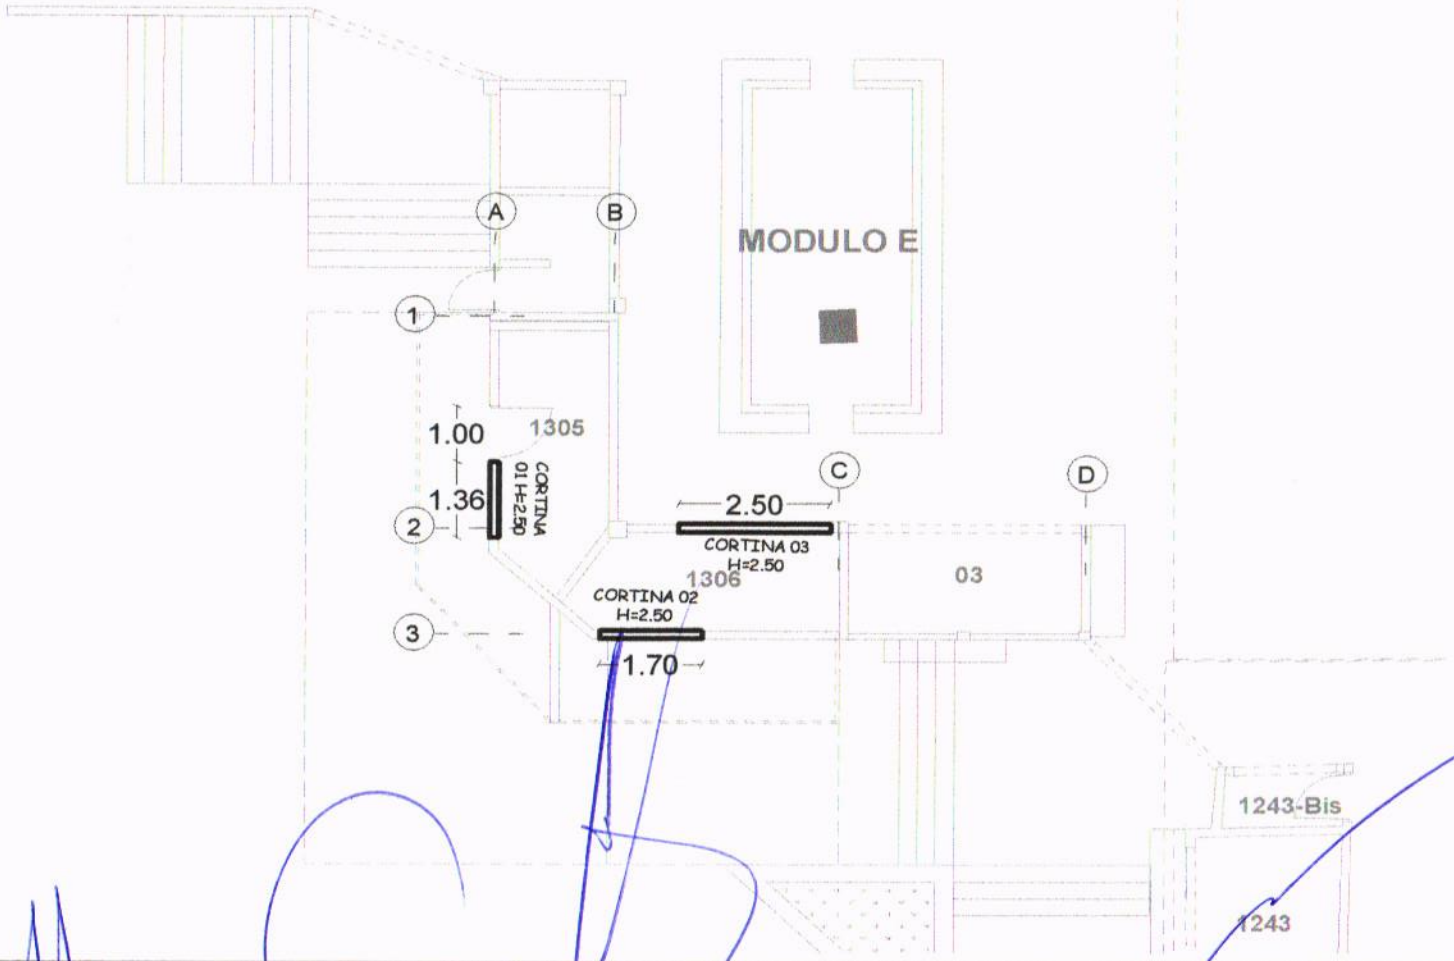

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



DESM-COR	A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
		DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



DESM-COR	A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**
		DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**									
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	Techado 01			9.61	4.97			47.76	
		Techado 02			5.95	3.80			22.61	
		Muro de Lamina		a	2.05	2.70			5.54	
				b	4.96	2.70			13.39	
				c	3.91	2.70			10.56	
				d	4.60	2.70			12.42	
				e	1.50	2.70			4.05	
				f	4.28	1.50			6.42	
				g	2.26	1.50			3.39	
				h	6.15	1.50			9.23	
							TOTAL:	**M2**	**135.37**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A01 DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

Techo de Lamina

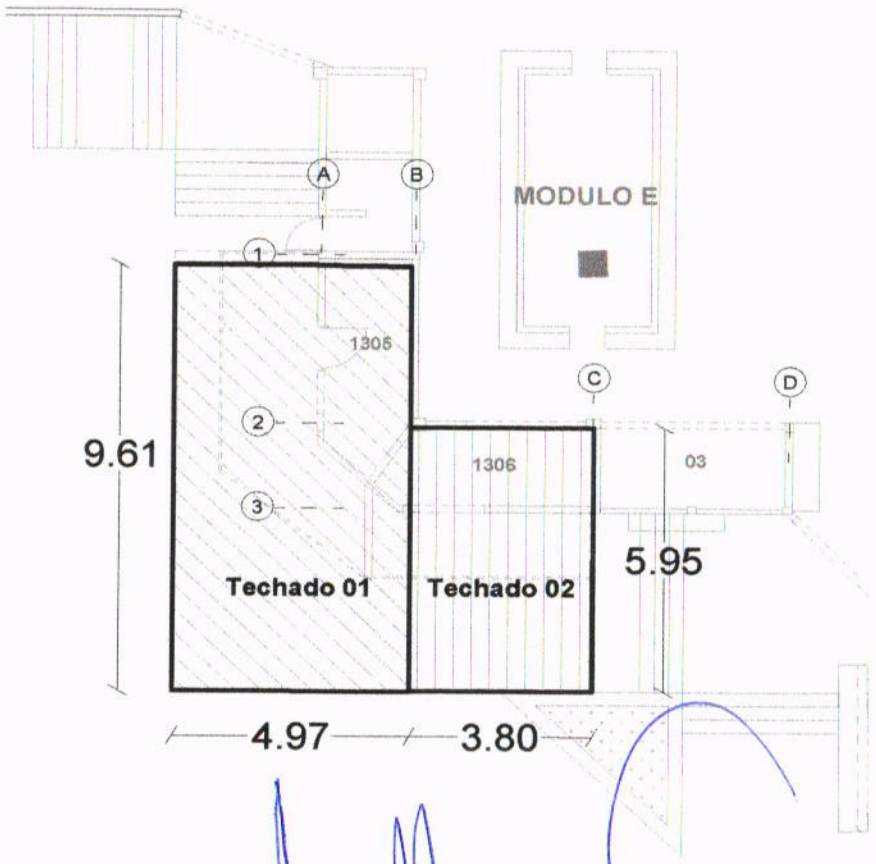

Paredes de Lamina

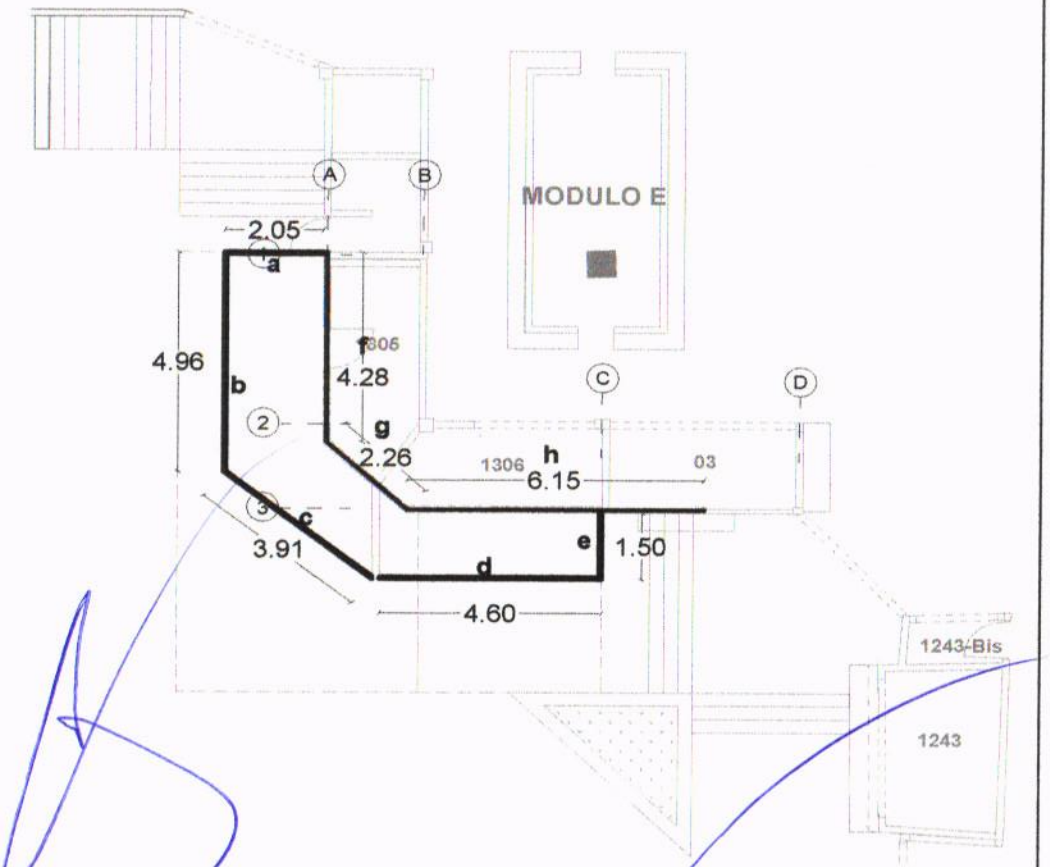

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
DES-LAM		




A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.
DES-LAM		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

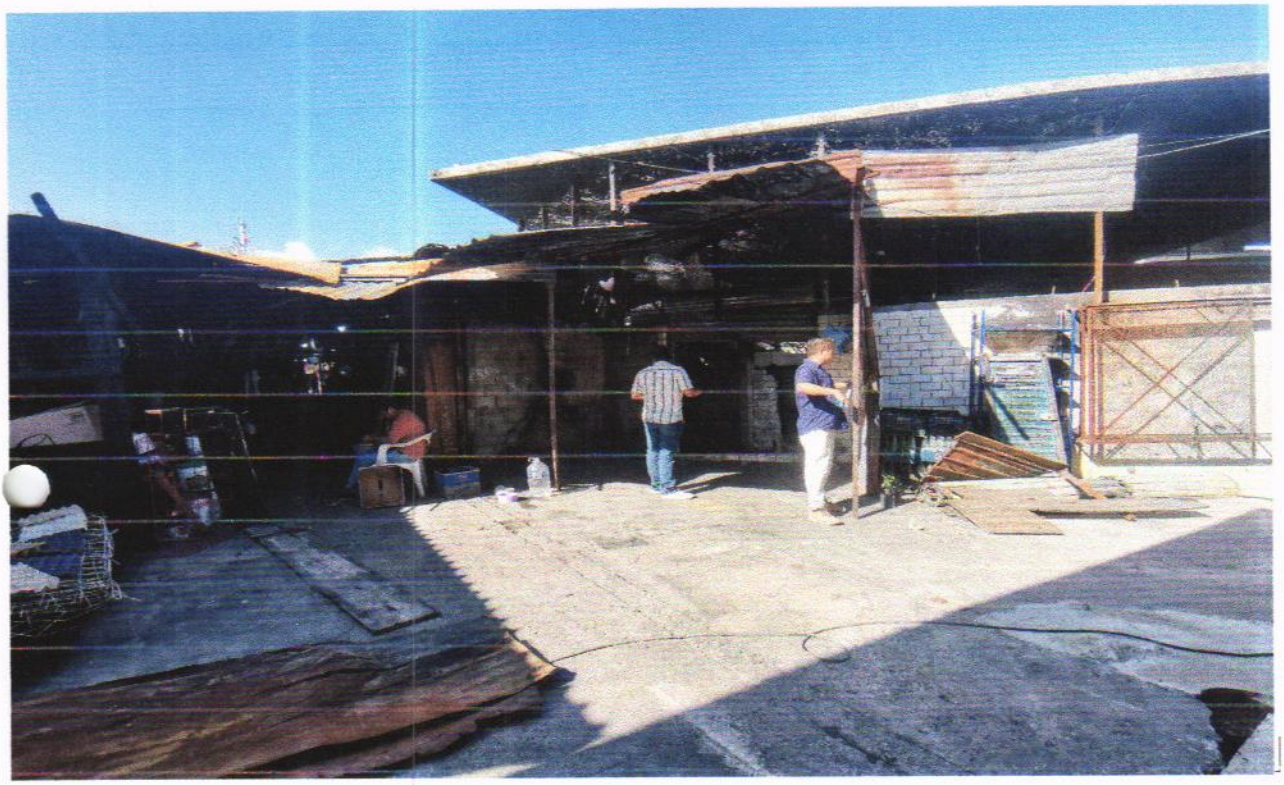

A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	
DES-LAM		DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

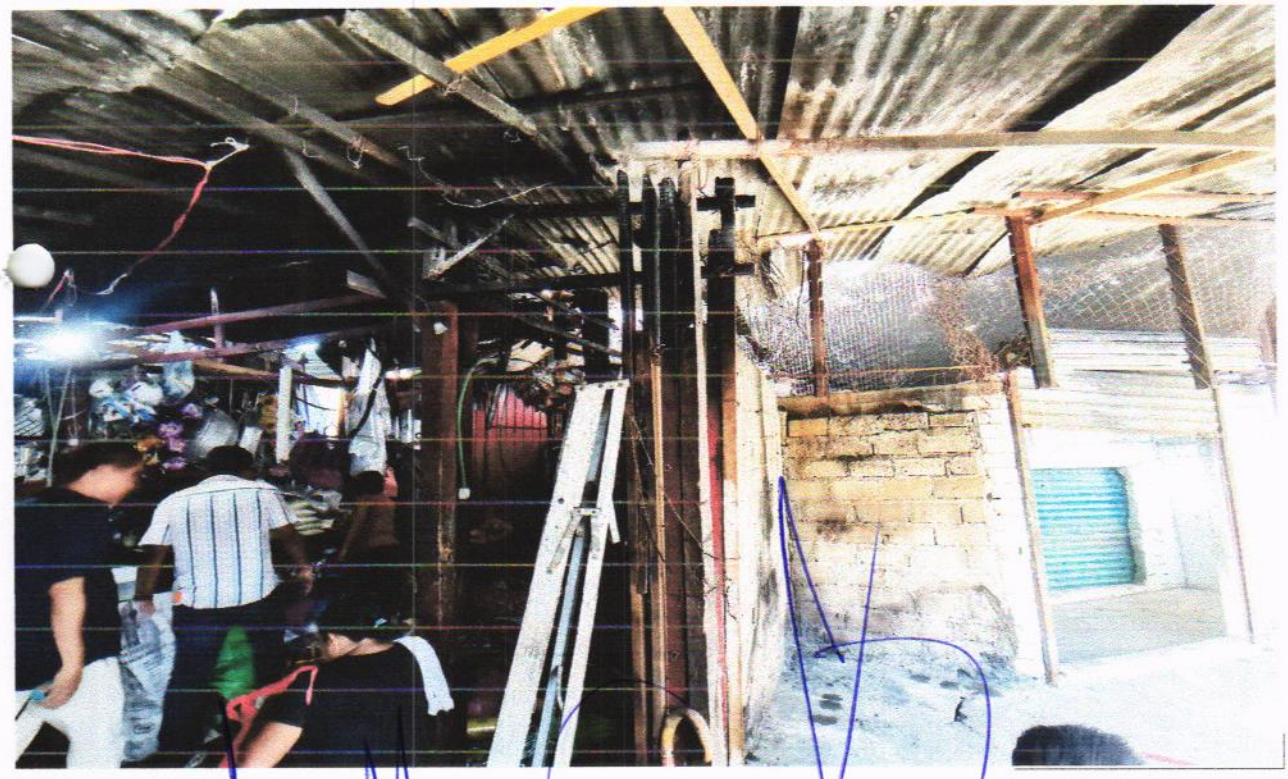

A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	
DES-LAM		DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA: **MAJ/574**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	**PRELIMINARES**									
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Modulo E			3.00				3.00	
					7.92				7.92	
					7.94				7.94	
					5.27				5.27	
							TOTAL	M3	24.13	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

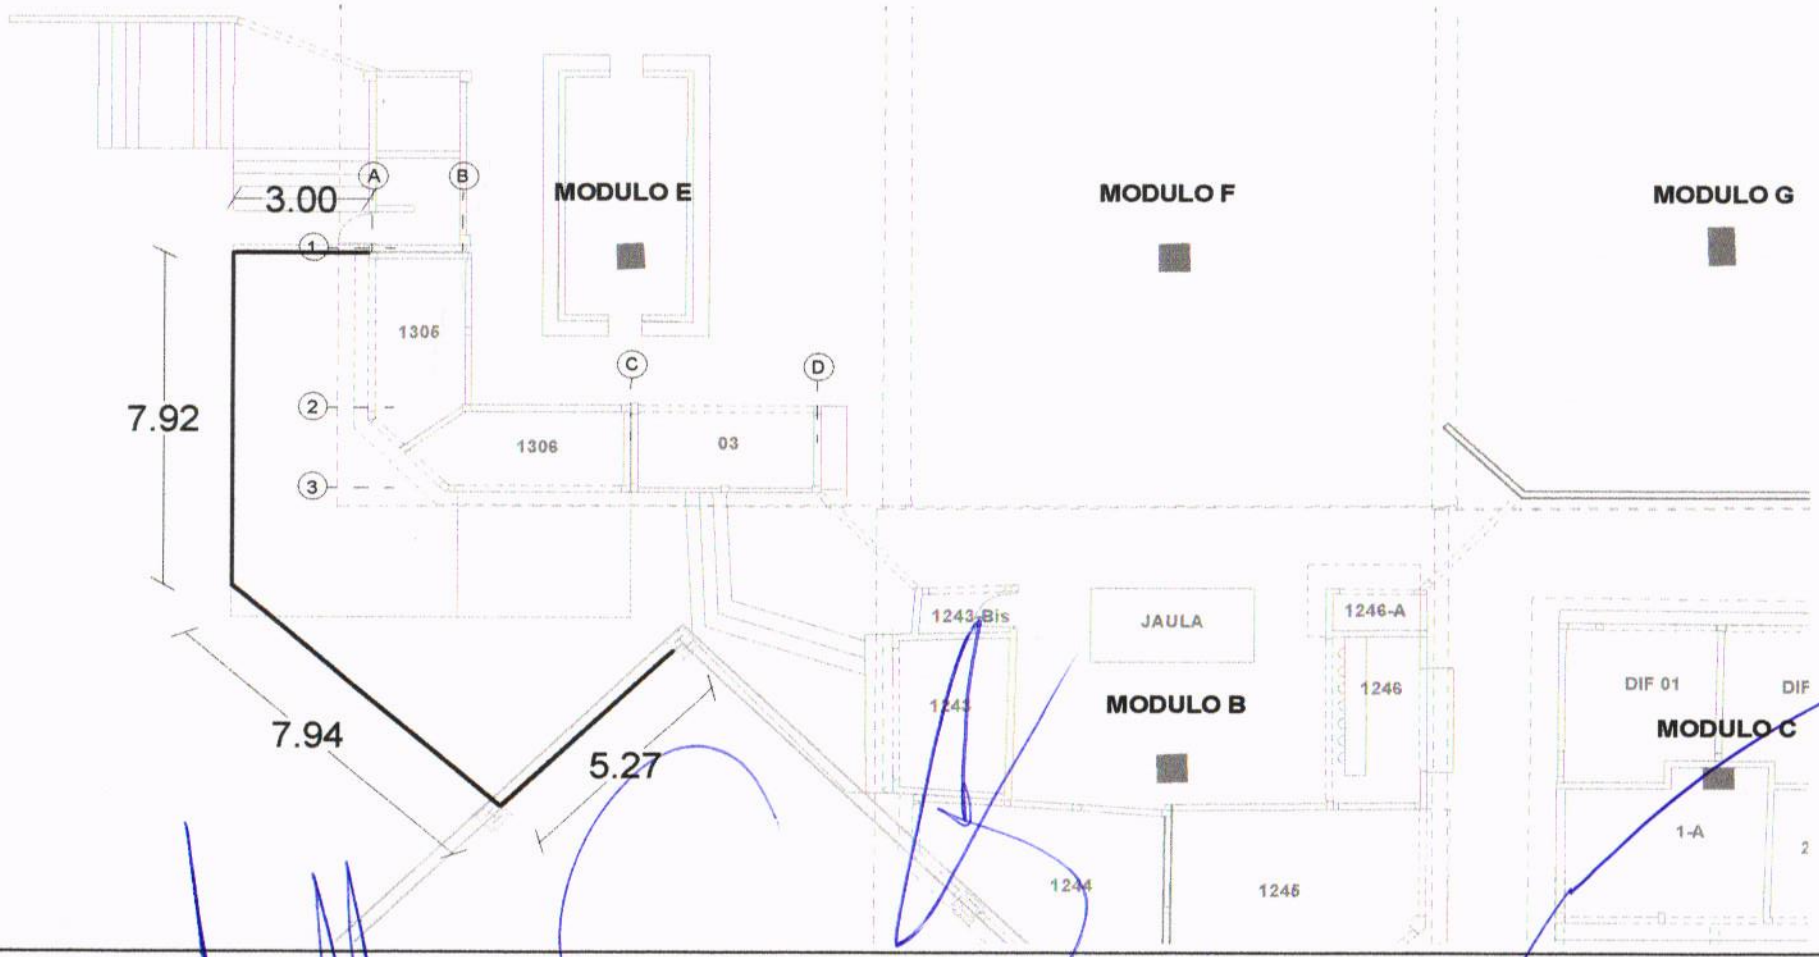

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUM-TAP	



A02	**PRELIMINARES**	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
	SUM-TAP	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A02	**PRELIMINARES**				**Largo**	**Ancho**	**Pza**				
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	Sombrilla B, C, D, E, F, G			13.00	13.00	6.00			1014.00	
		Columna E			3.80	2.40	1.00			9.12	
		Columna F			4.80	2.68	1.00			12.86	
		Columna G			3.80	3.00	1.00			11.40	
							TOTAL	**M2**		**1,047.38**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE, PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

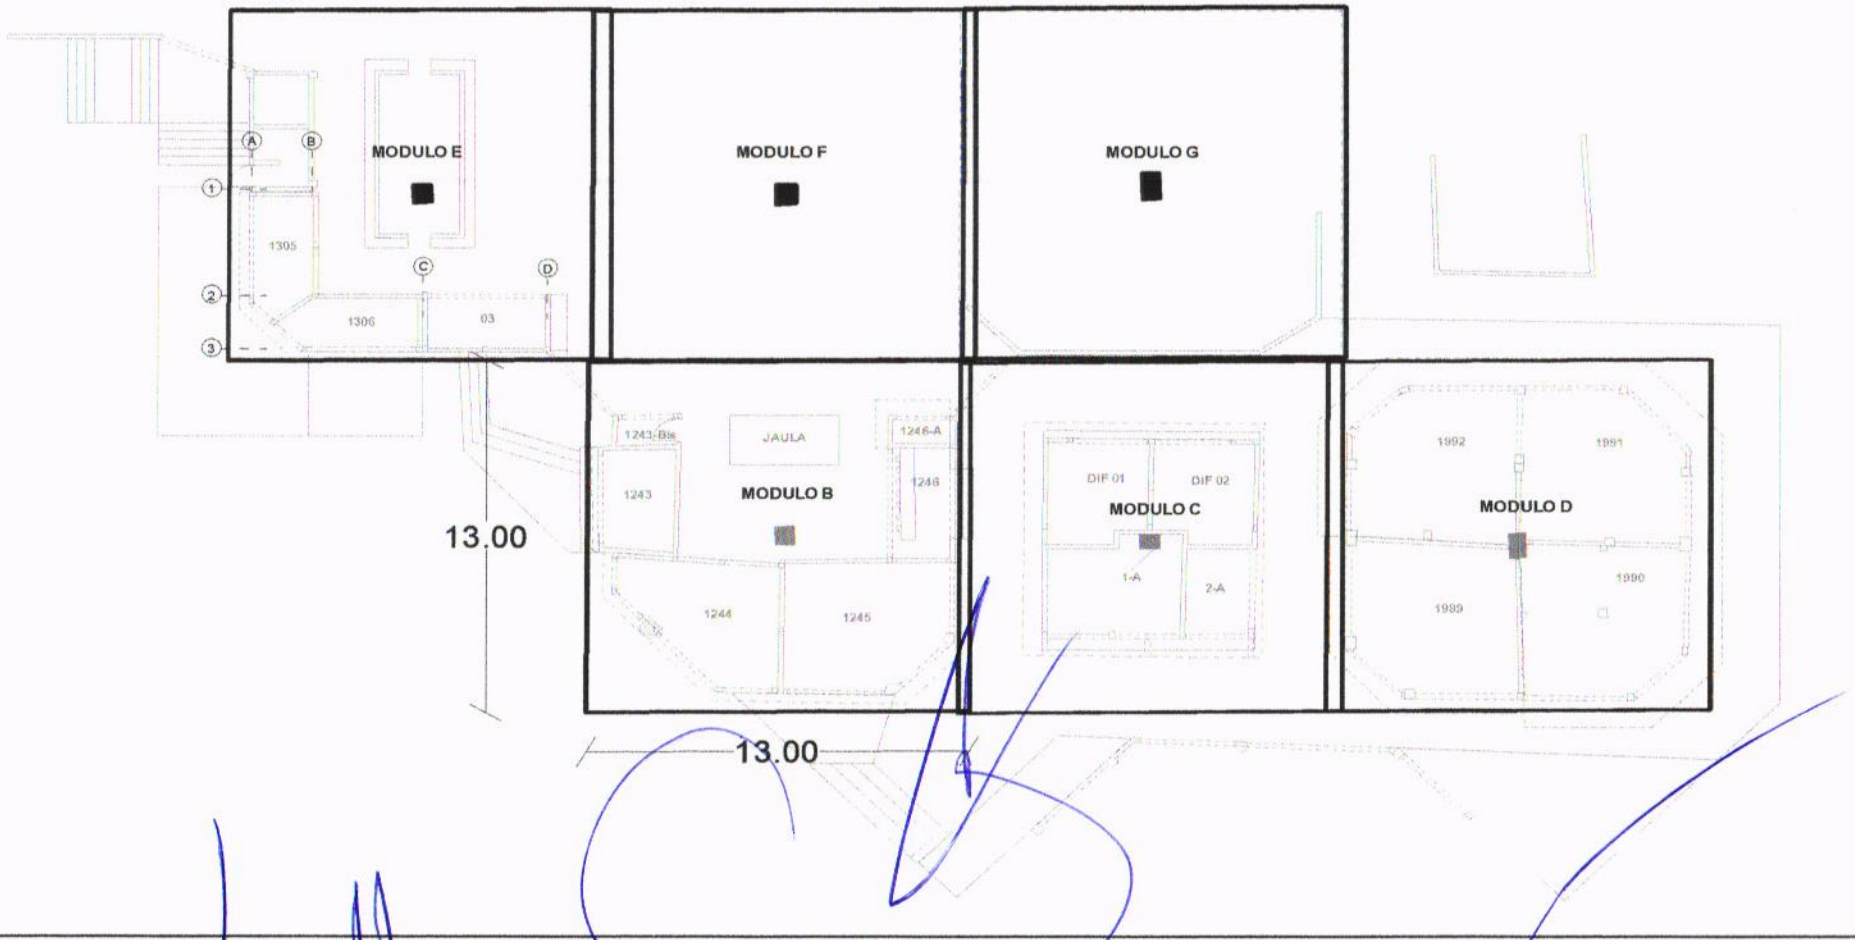

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.
PR-SUP		

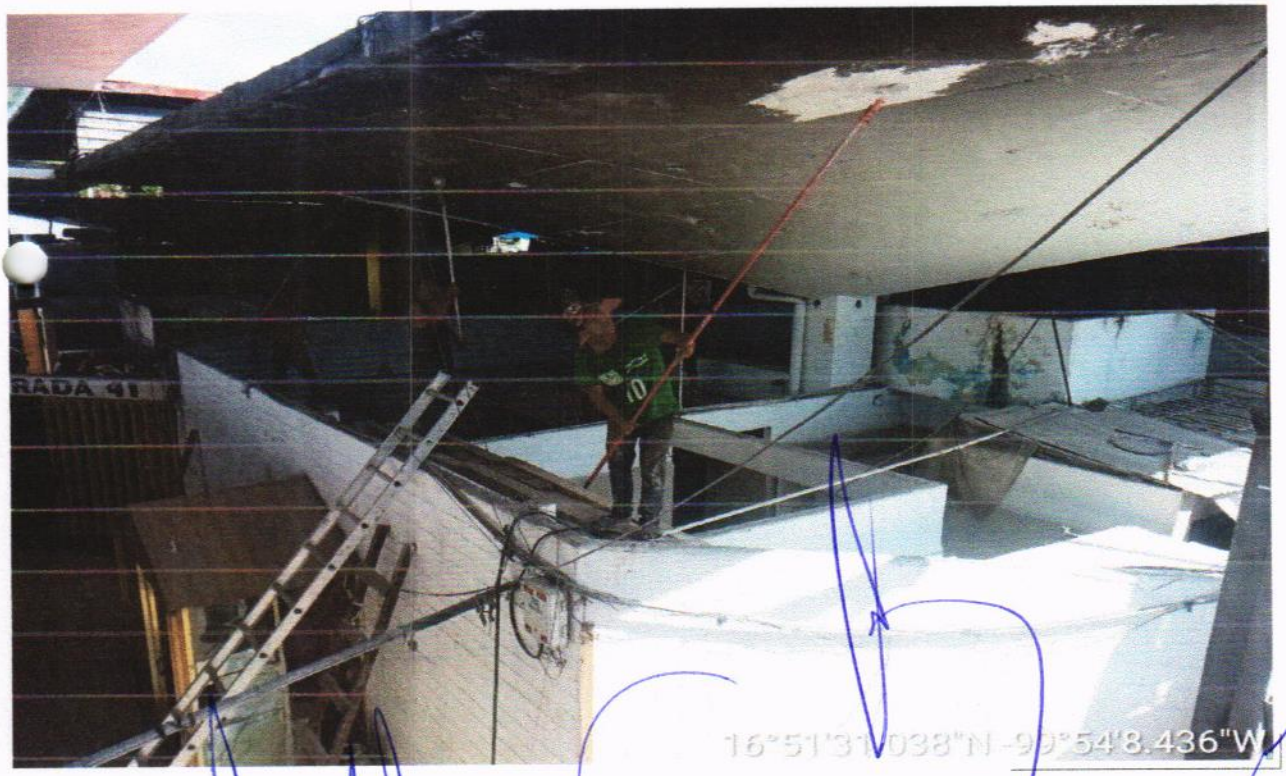


A02	**PRELIMINARES**	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.
PR-SUP		


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

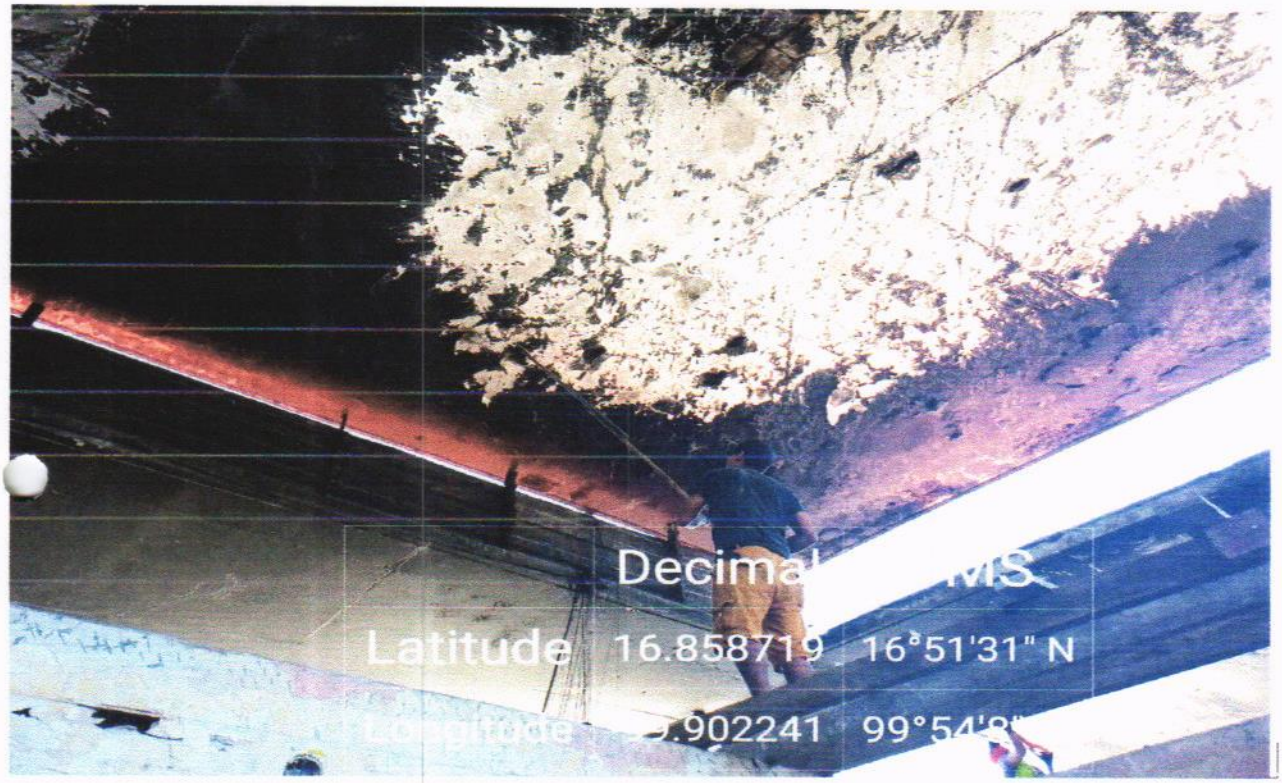

A02	**PRELIMINARES**	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.
	PR-SUP	

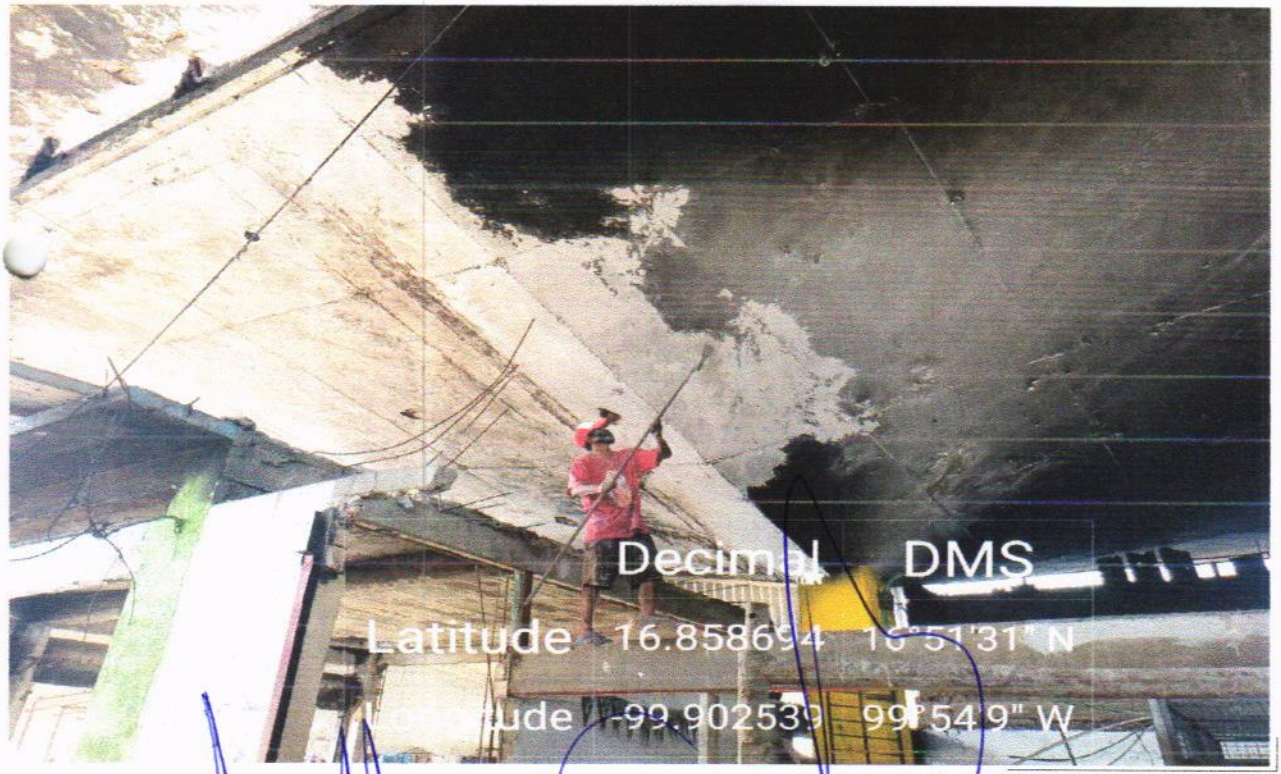

A02	**PRELIMINARES**	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.
	PR-SUP	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	**PRELIMINARES**				Largo	Ancho	Alto	Pza		
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	**Modulo E**	Zapatas		1.20	1.20	1.05	7.00	10.58	
			Cadena de Desplante		21.40	0.50	0.30	1.00	3.21	
		Electrica	L1 a R1		14.50	0.60	0.60	1.00	5.22	
			R1 a R2		7.85	0.60	0.60	1.00	2.83	
			R2 a R3		6.57	0.60	0.60	1.00	2.37	
			R3 a R4		7.48	0.60	0.60	1.00	2.69	
			R4 a R5		6.22	0.60	0.60	1.00	2.24	
			R3 a R6		8.49	0.60	0.60	1.00	3.06	
		Pluvial	P1 a P2		8.50	0.60	0.60	1.00	3.06	
			P2 a P3		8.93	0.60	0.60	1.00	3.21	
			P3 a P5		9.88	0.60	0.60	1.00	3.56	
			P5 a P6		3.13	0.60	0.60	1.00	1.13	
			P6 a P7		15.90	0.60	0.60	1.00	5.72	
			P3 a P4		11.75	0.60	0.60	1.00	4.23	
		Transformador		a R1	14.82	0.60	0.60	1.00	5.34	
			R1 a R2		35.97	0.60	0.60	1.00	12.95	
			R2 a R3		39.16	0.60	0.60	1.00	14.10	
			R3 a R4		14.10	0.60	0.60	1.00	5.08	
							TOTAL	M3	90.58	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

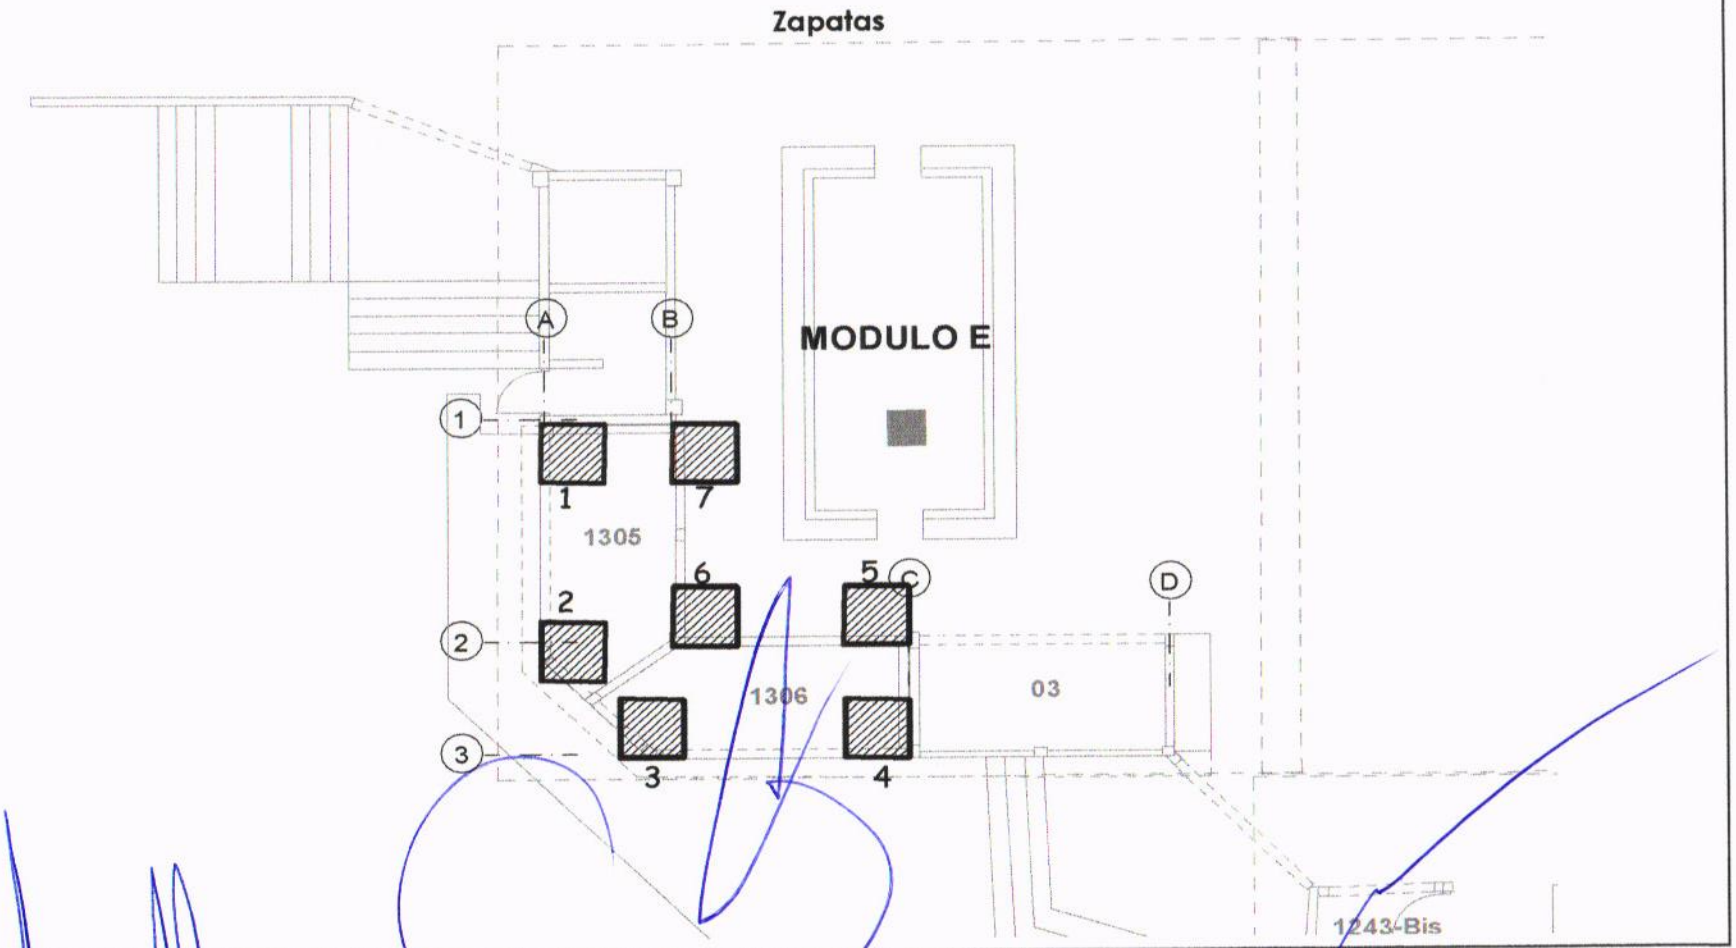

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

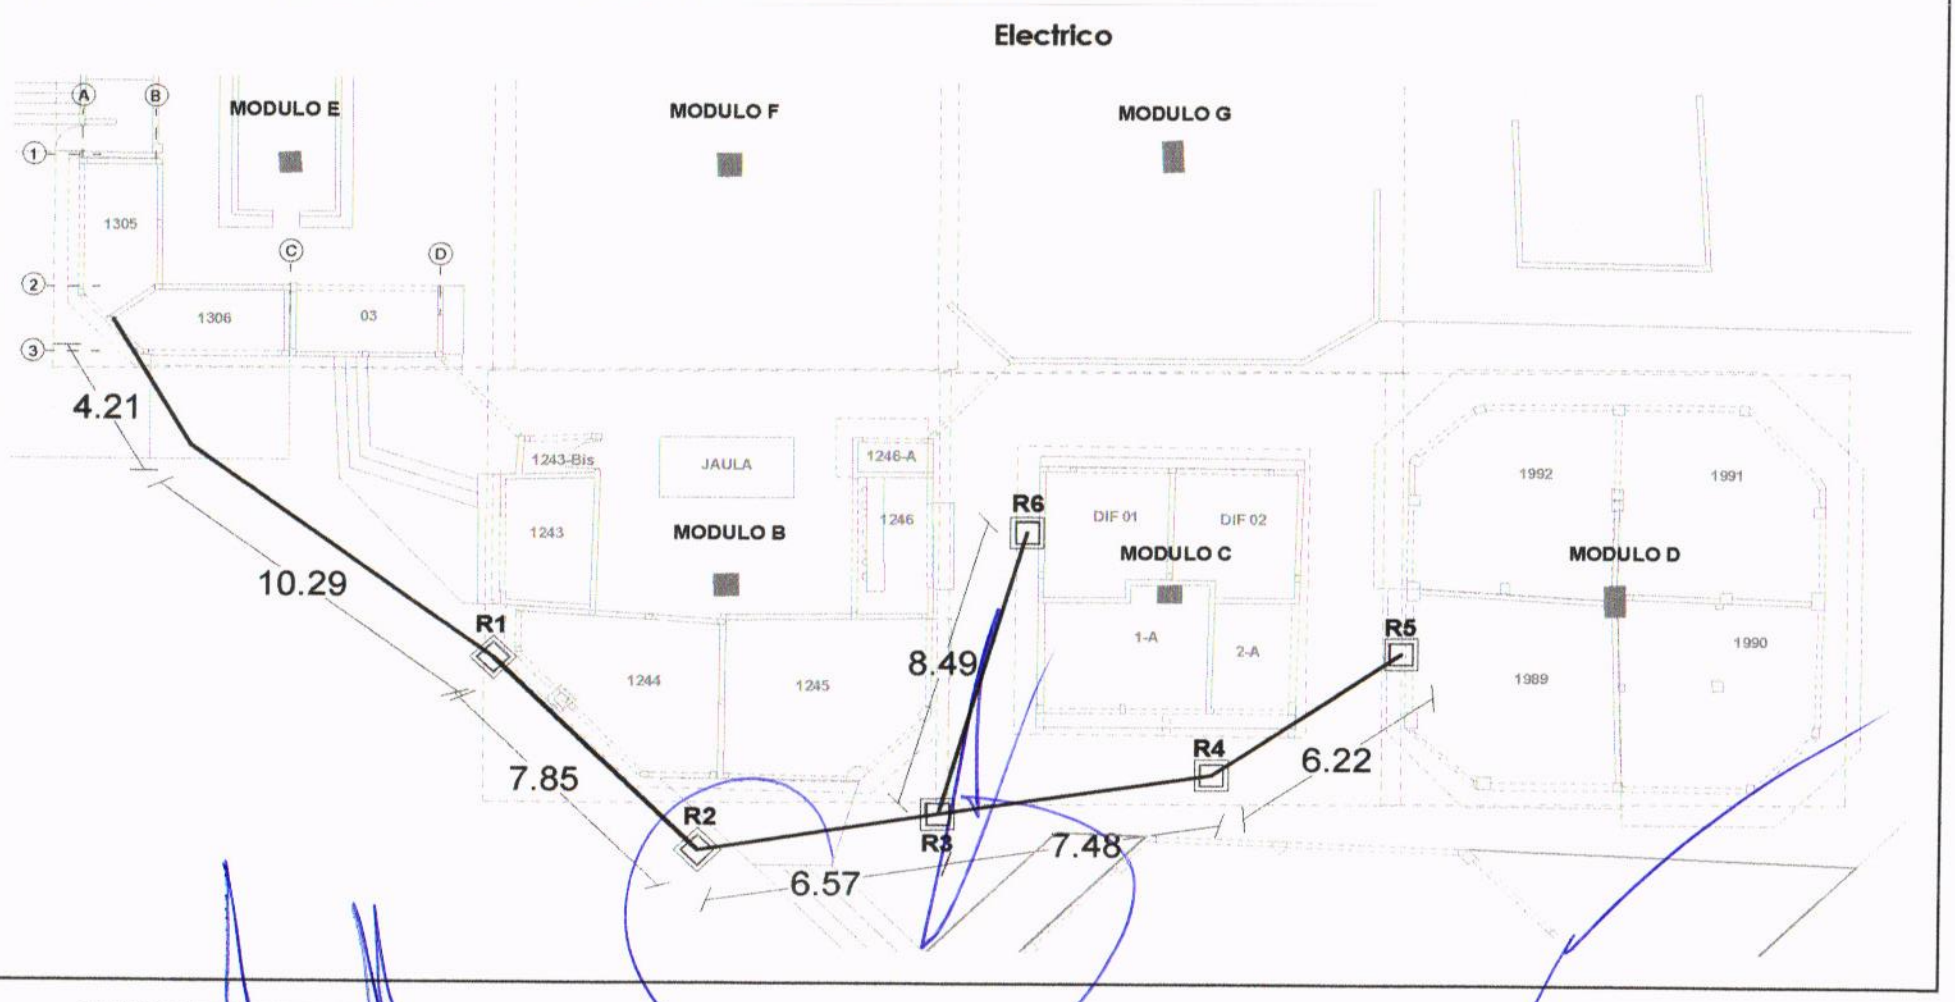

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

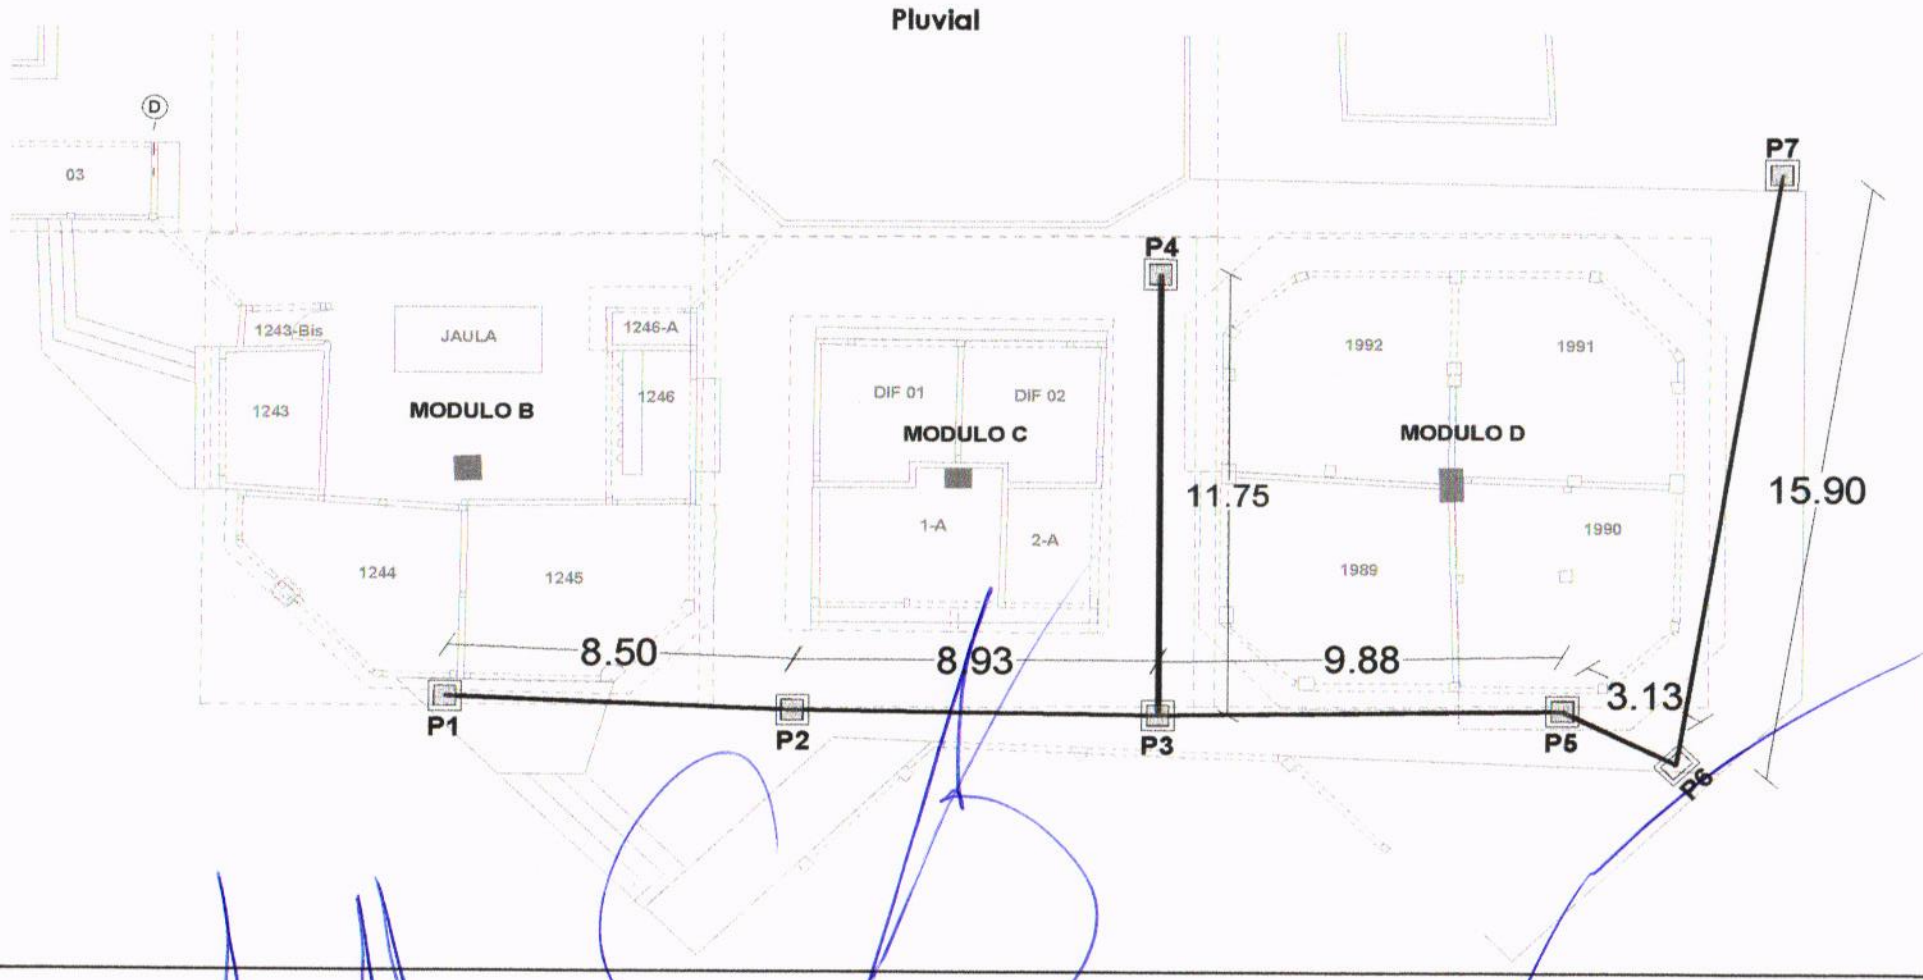

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

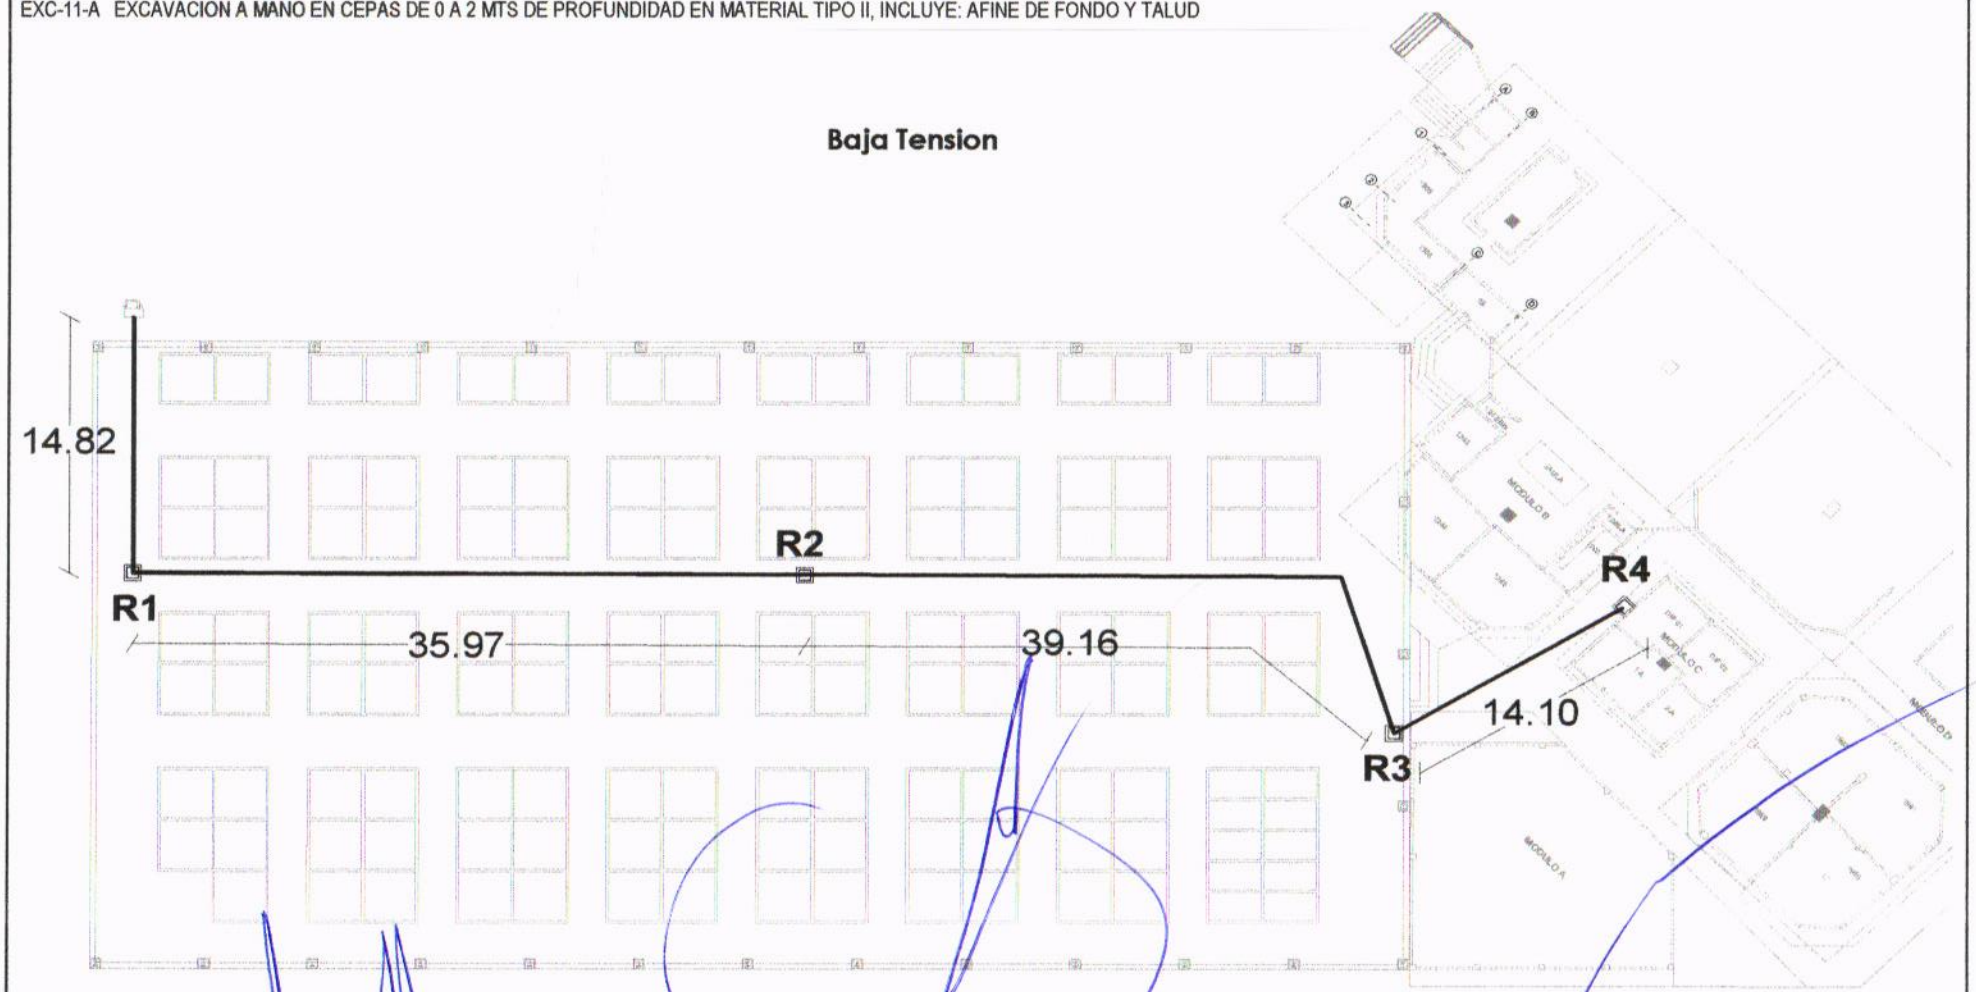

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	PRELIMINARES	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	



A02	PRELIMINARES	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
	EXC-11-A	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD



A02	**PRELIMINARES**
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES				Area	Alto				
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	Modulo E	Local 1305		8.42	1.00			8.42	
		Modulo E	Local 1306		7.98	1.00			7.98	
		VOLUMEN DE EXCAVACION							90.58	
		MENOS RELLENO DE ARENA							23.48	
		MENOS CONTRARABES			-21.40	0.15	0.20	1.00	-0.64	
		MENOS ZAPATAS			-1.00	1.00	0.20	7.00	-1.40	
							TOTAL	M3	128.42	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A02 PRELIMINARES

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

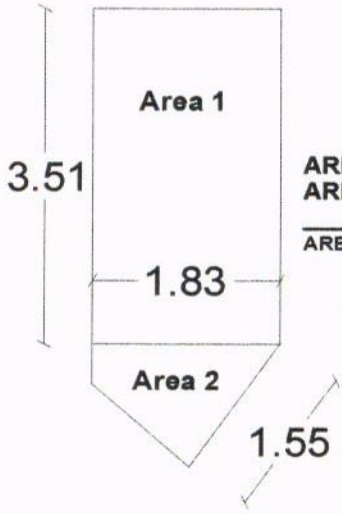


Piso 1
AREA 1: 1.83 X 3.51 = 6.42
AREA 2: (1.83 X 1.55)/2 = 1.42

AREA TOTAL: 7.84 M2

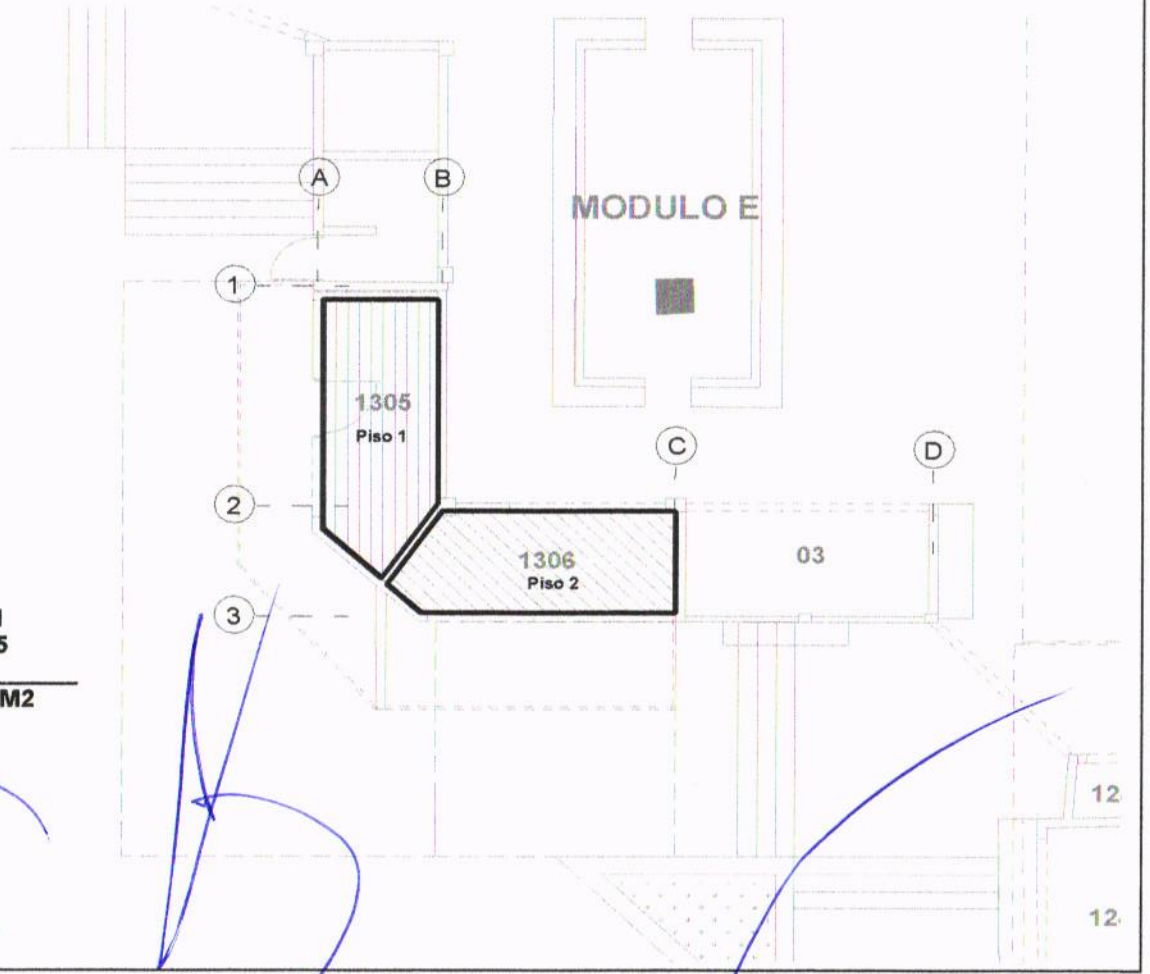

Piso 2
AREA 1: 1.76 X 3.70 = 6.51
AREA 2: (1.76 X 1.53)/2 = 1.35

AREA TOTAL: 7.86 M2

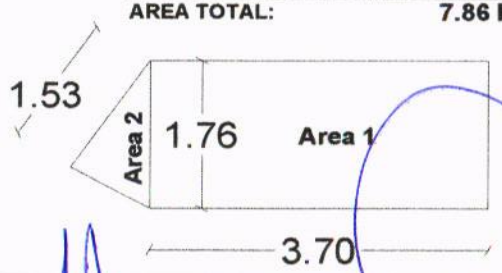

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

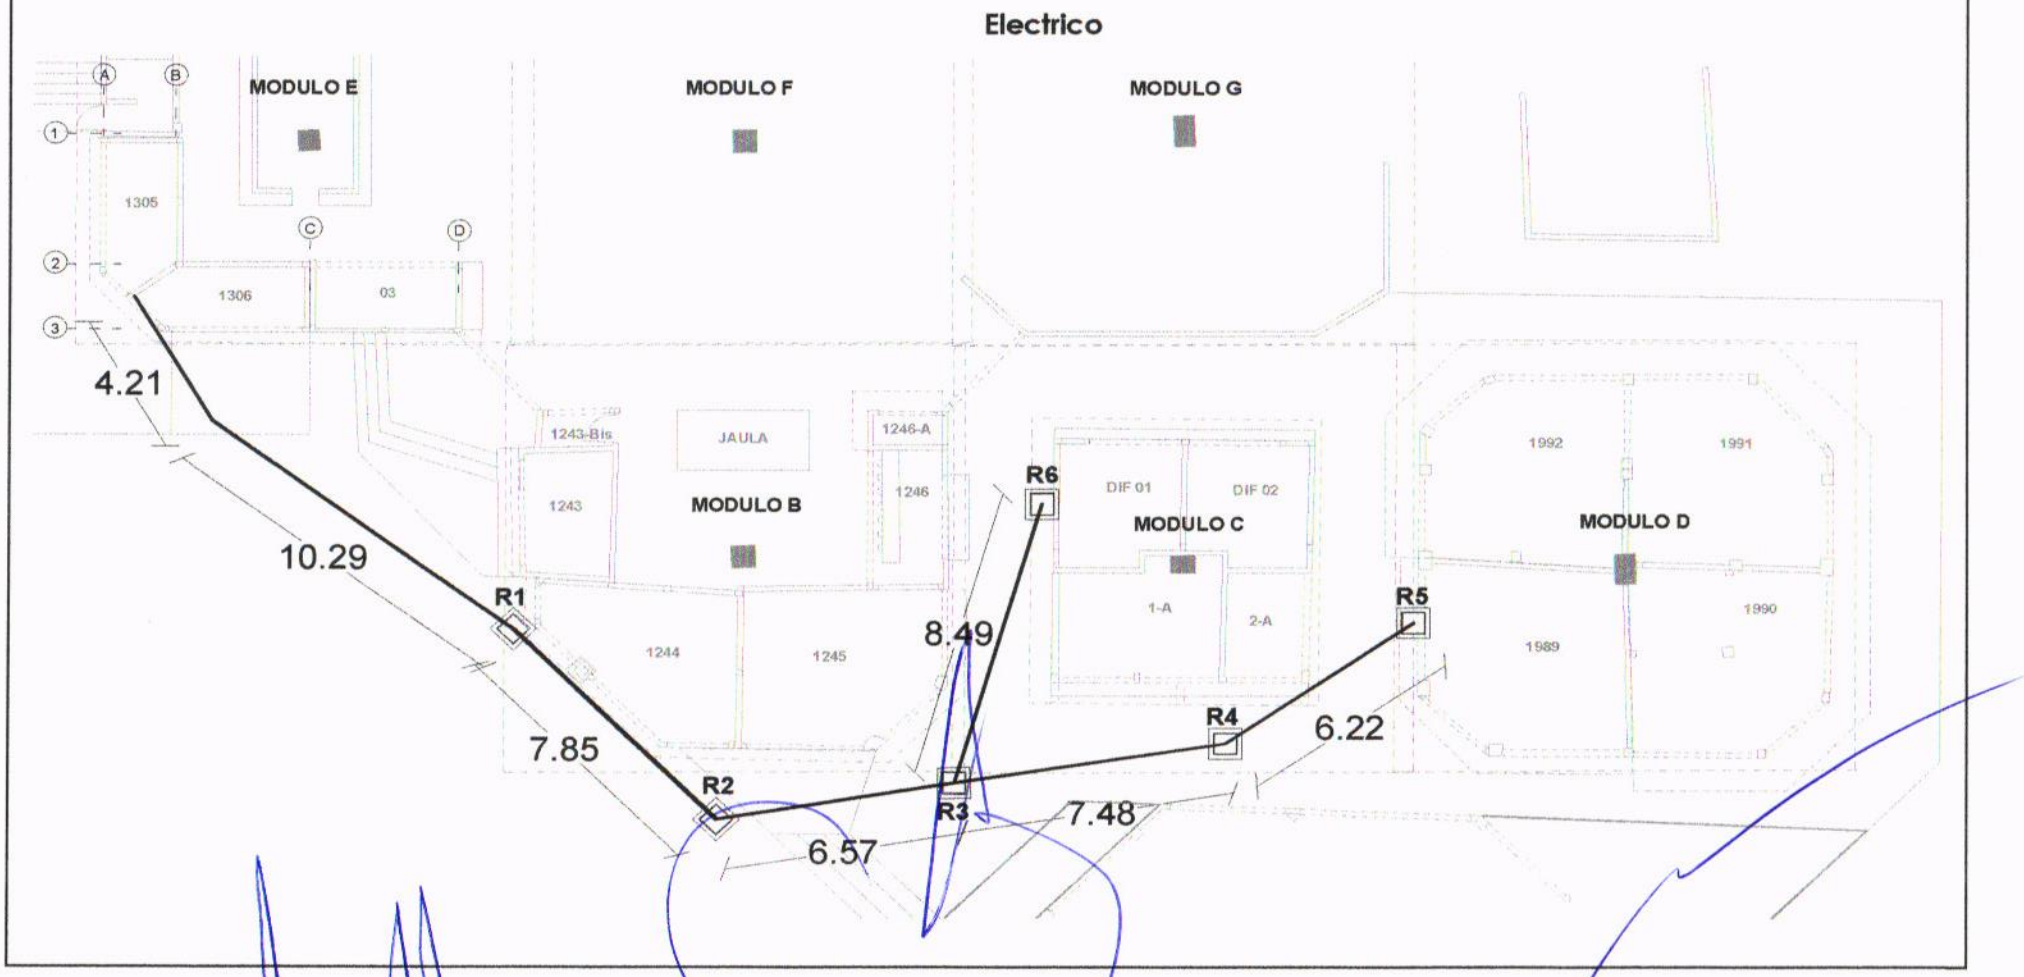

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

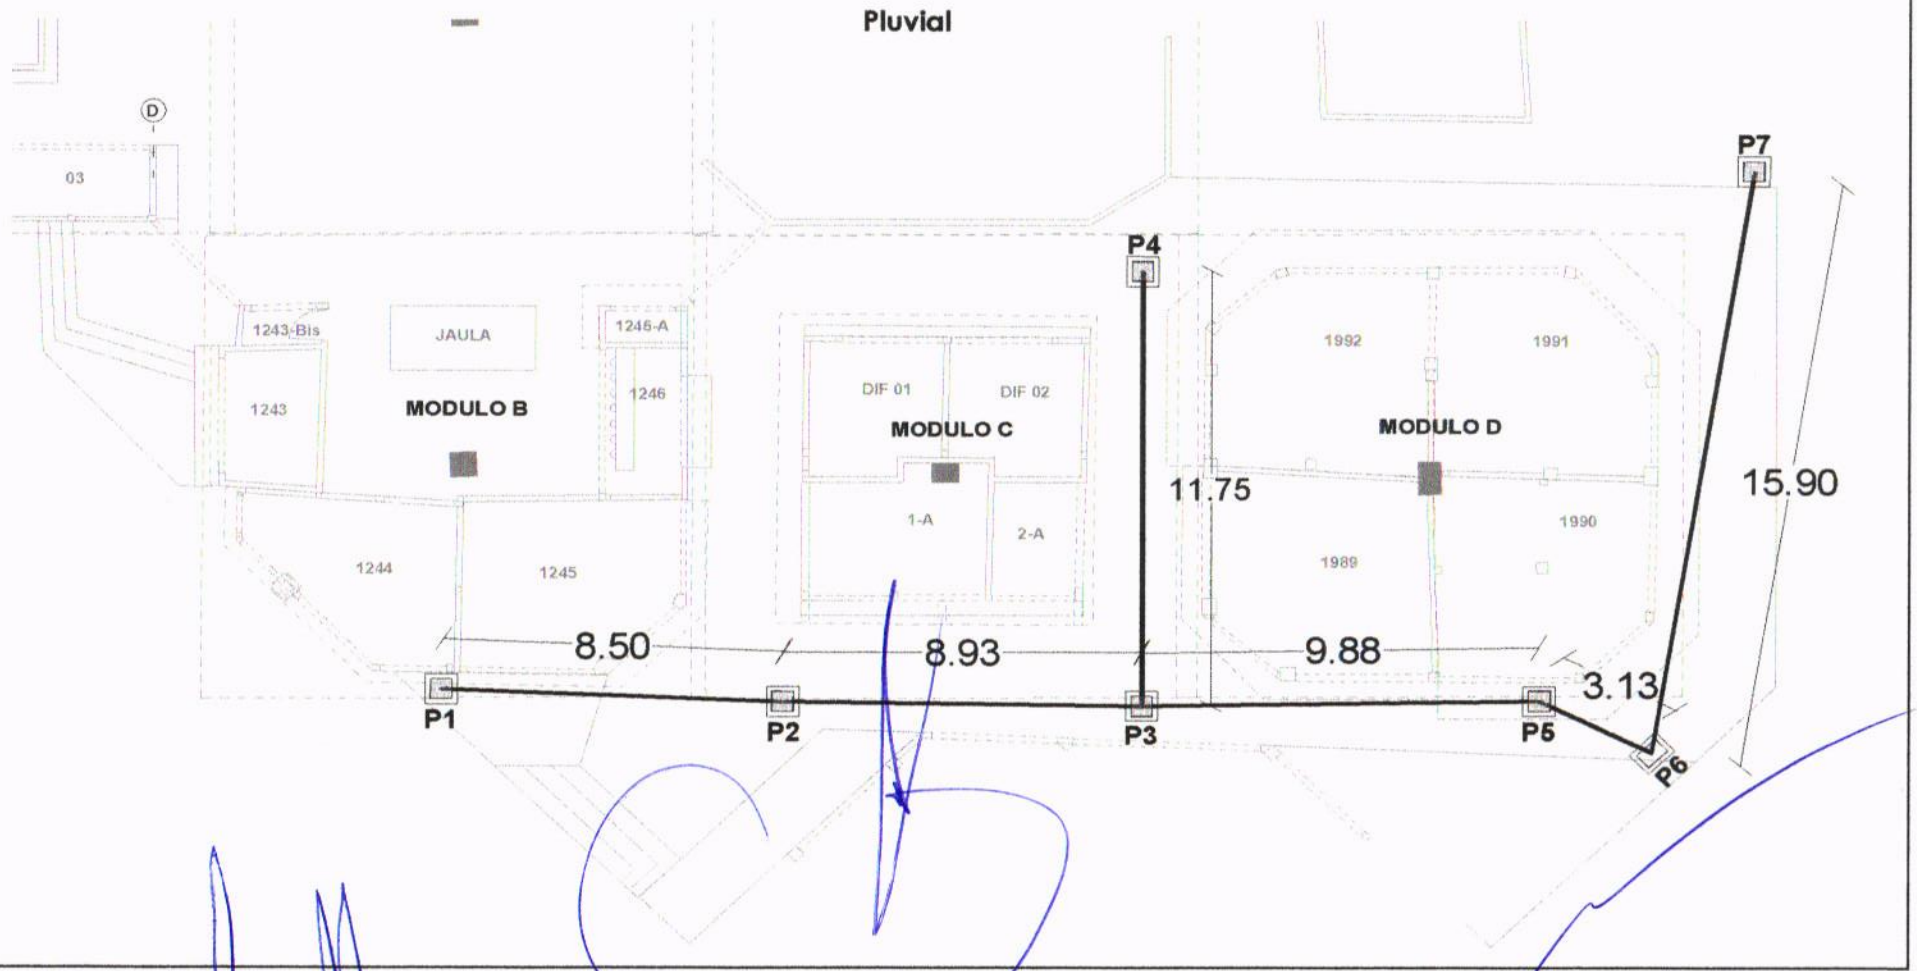

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A02 PRELIMINARES

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

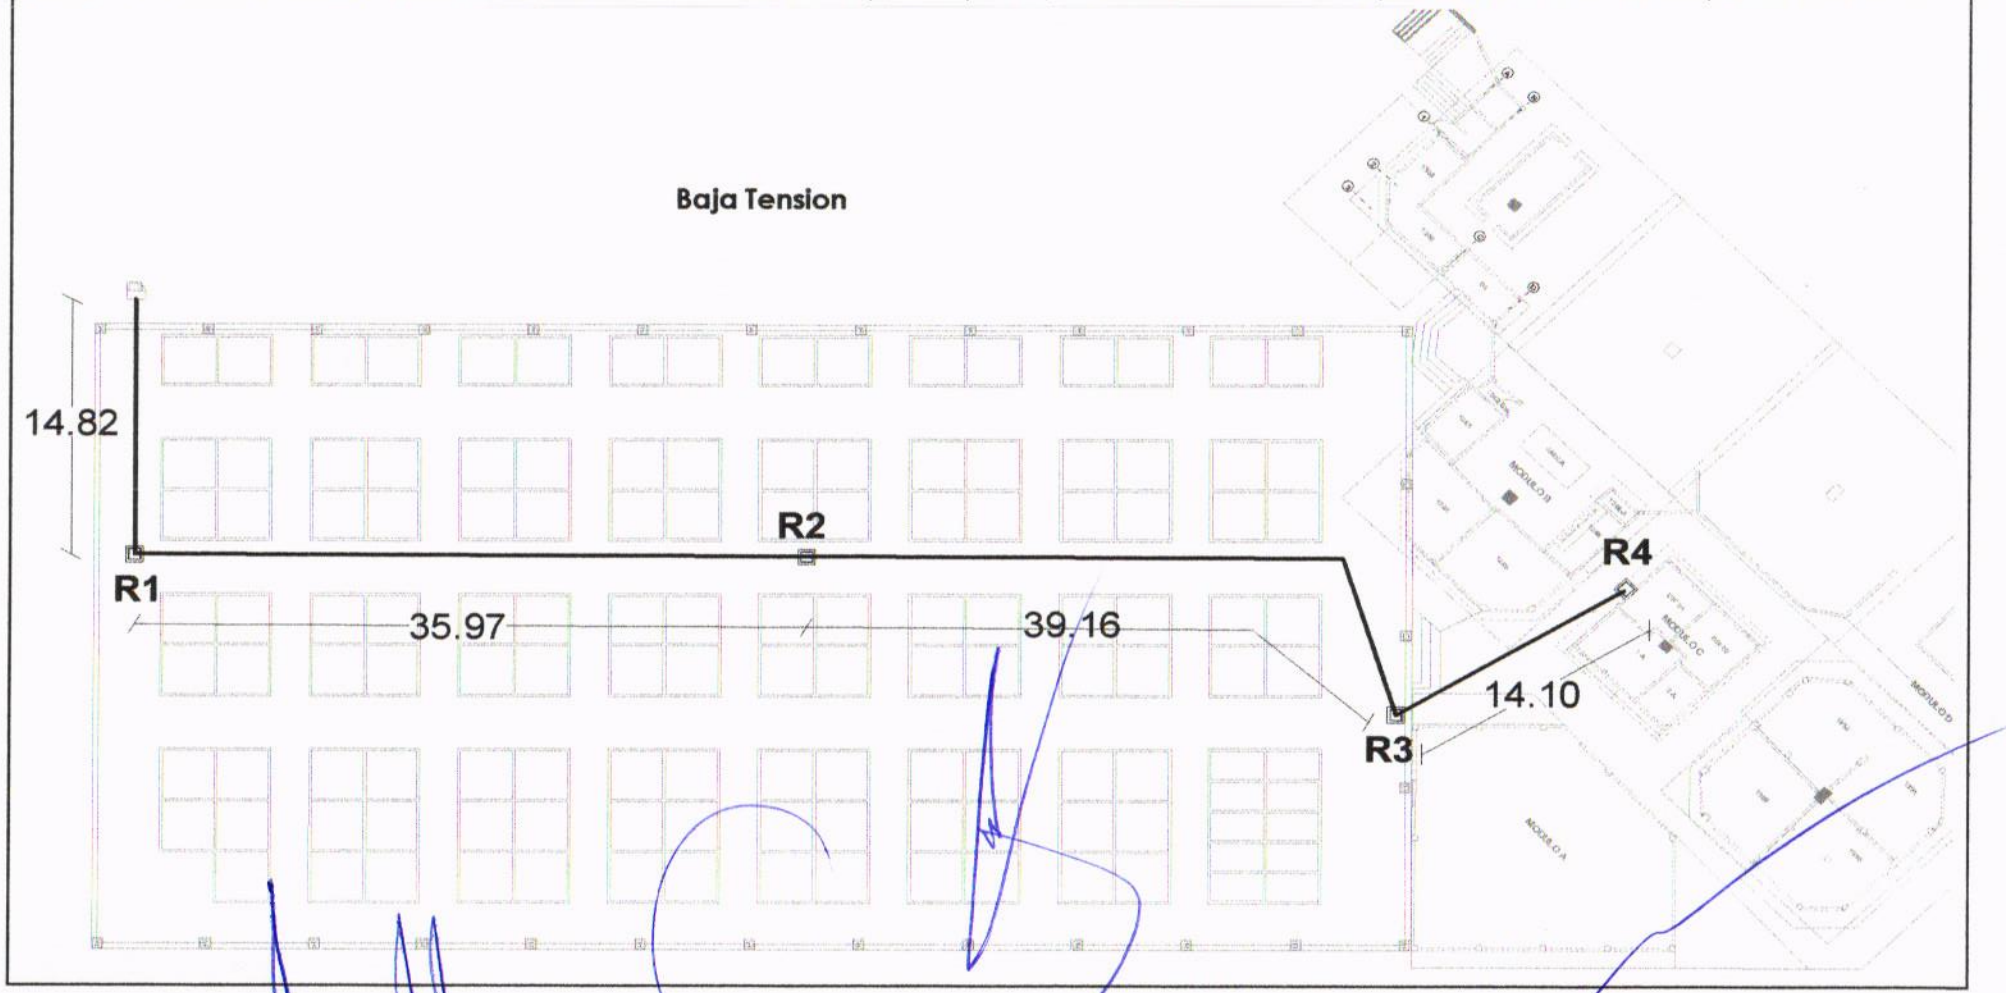

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A02 PRELIMINARES

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

Zapatas

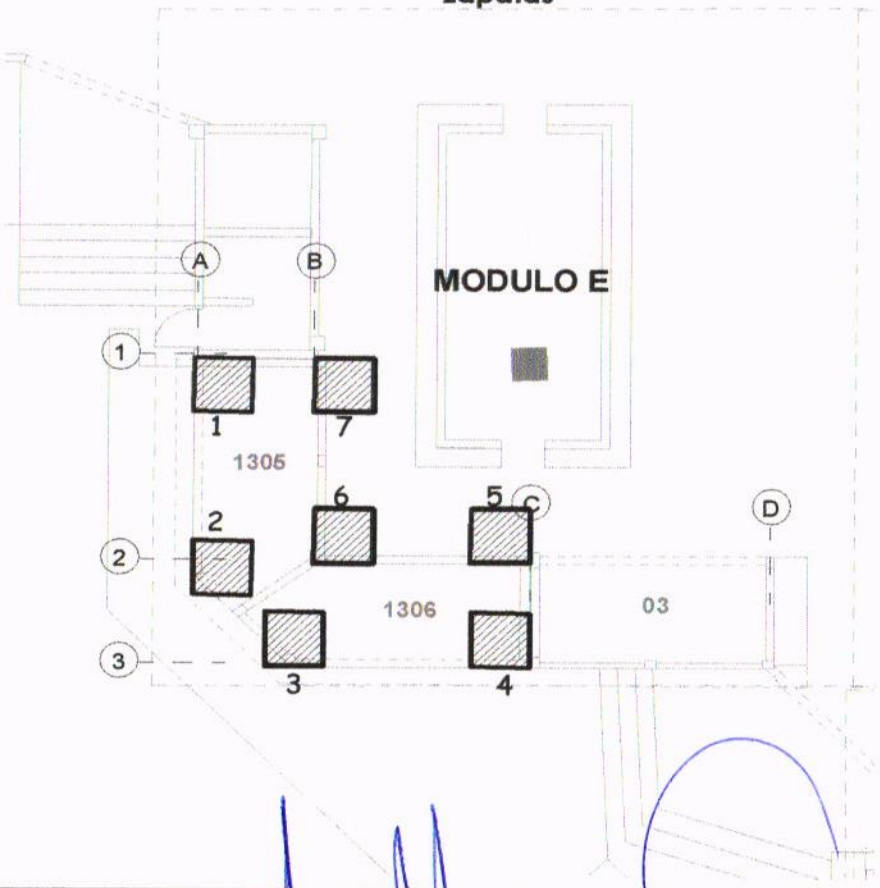

Cadena de Desplante

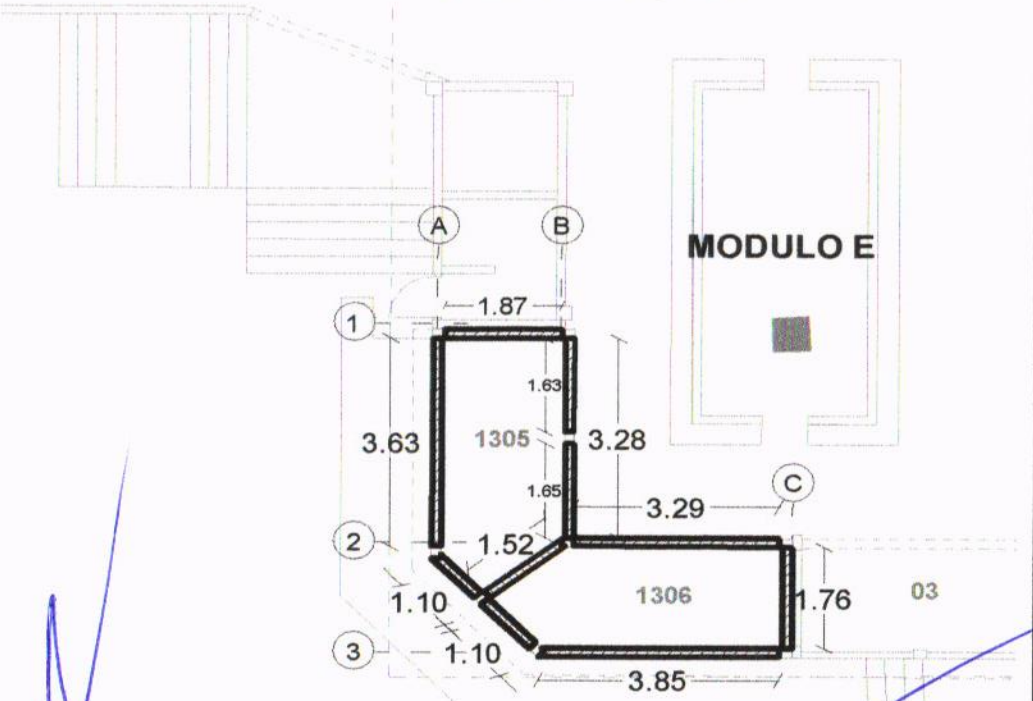

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	PRELIMINARES
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.




A02	PRELIMINARES
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

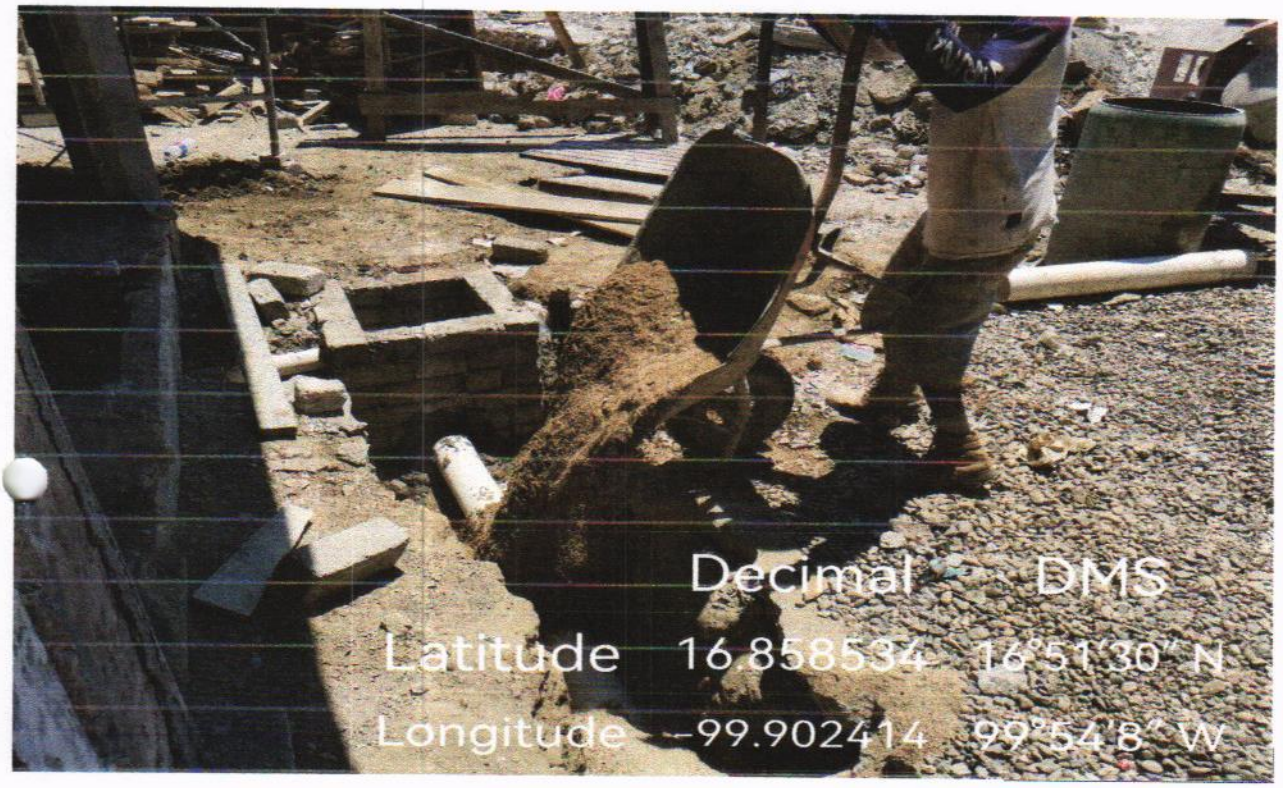

A02	**PRELIMINARES**
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.



A02	**PRELIMINARES**
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SIEMPRE PARA TRANSFORMARTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ — No. DE OBRA: MAJ/574 — ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO — TIPO DE OBRA: URBANIZACION — DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO — FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023 — AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. — No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A02	PRELIMINARES	Cepa p/Tuberia Electrica								
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.		L1 a R1		14.50	0.60	0.25		2.18	
			R1 a R2		7.85	0.60	0.25		1.18	
			R2 a R3		6.57	0.60	0.25		0.99	
			R3 a R4		7.48	0.60	0.25		1.12	
			R4 a R5		6.22	0.60	0.25		0.93	
			R3 a R6		8.49	0.60	0.25		1.27	
					LONG.	RADIO^2	PI			
		Menos Tubo Electrico			51.11	0.002500	3.1416		-0.40	
		Cepa p/Tuberia de Baja Tension								
		Transformador a R1			14.82	0.60	0.25		2.22	
			R1 a R2		35.97	0.60	0.25		5.40	
			R2 a R3		39.16	0.60	0.25		5.87	
			R3 a R4		14.10	0.60	0.25		2.12	
					LONG.	RADIO^2	PI			
		Menos Tubo Baja Tension			104.05	0.002500	3.1416		-0.82	
							SUBTOTAL 01:	M3	22.06	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A02	**PRELIMINARES**	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	5-0102	



A02	**PRELIMINARES**	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	5-0102	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A03	**LOCALES DE CONCRETO**									
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	Modulo E		7.00					7.00	
							TOTAL	**PZA**	7.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 LOCALES DE CONCRETO

11-0167* CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION

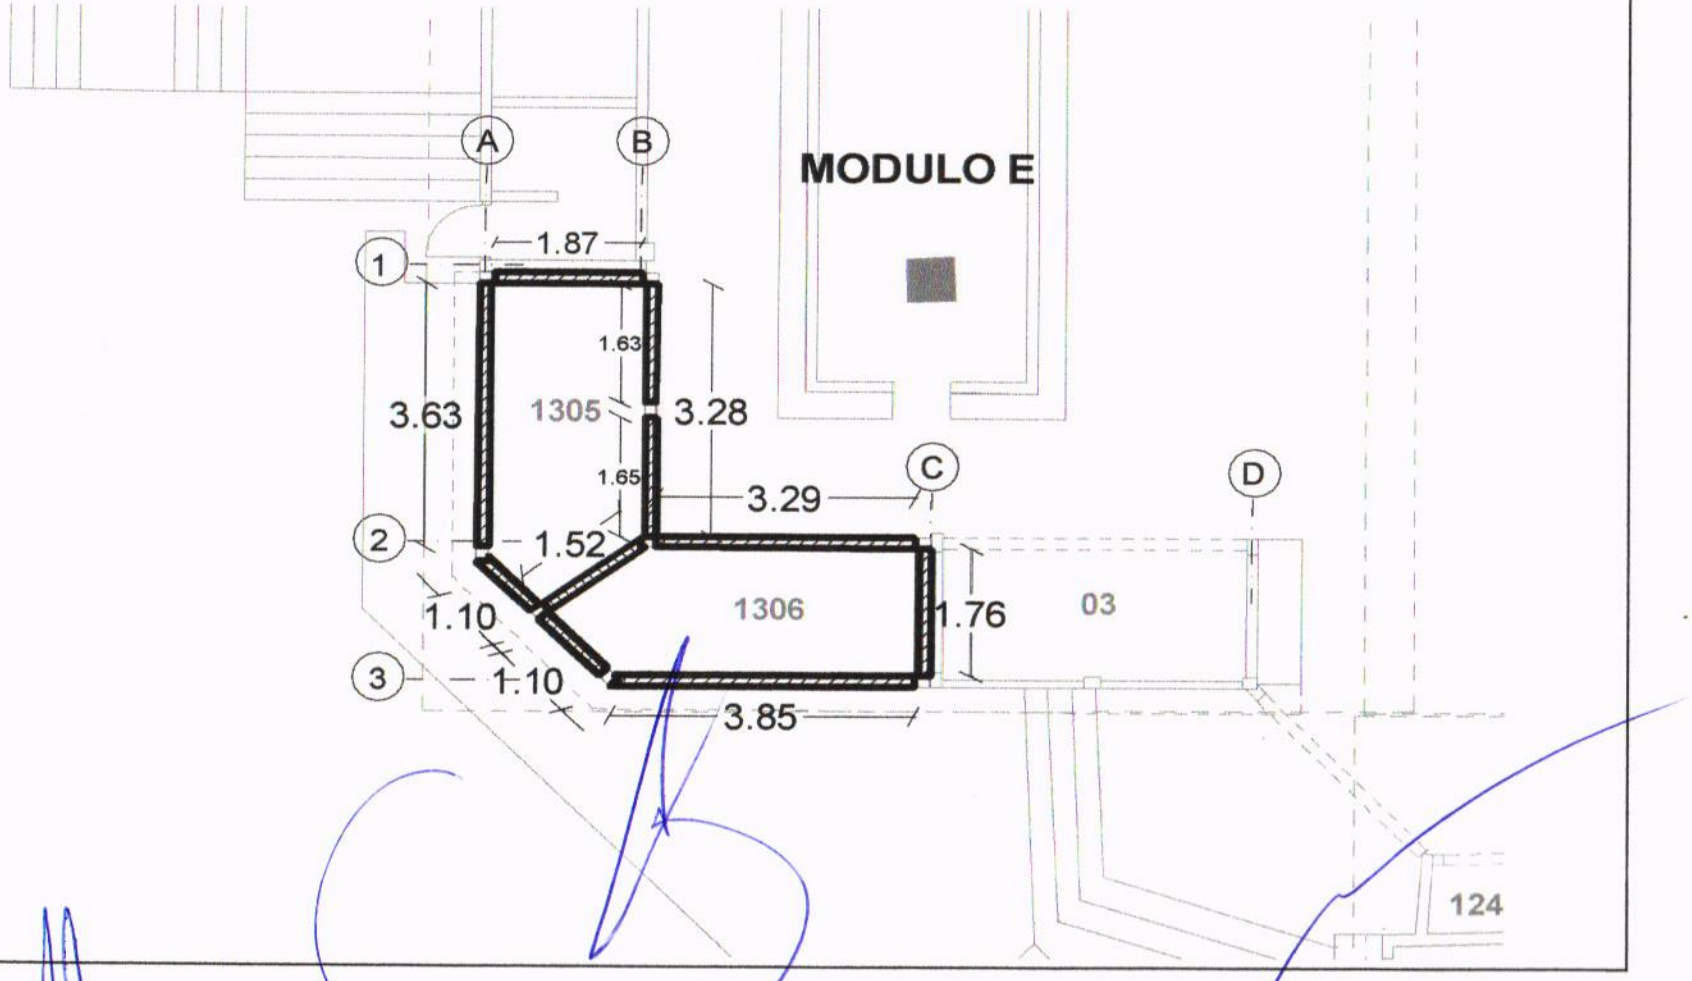

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0167*	



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0167*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0167*	



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
	11-0167*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A03	LOCALES DE CONCRETO										
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					PZA	ALTO				
		Modulo E				9.00	2.90			26.10	
							TOTAL	ML		26.10	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 LOCALES DE CONCRETO

CAST-1520 CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

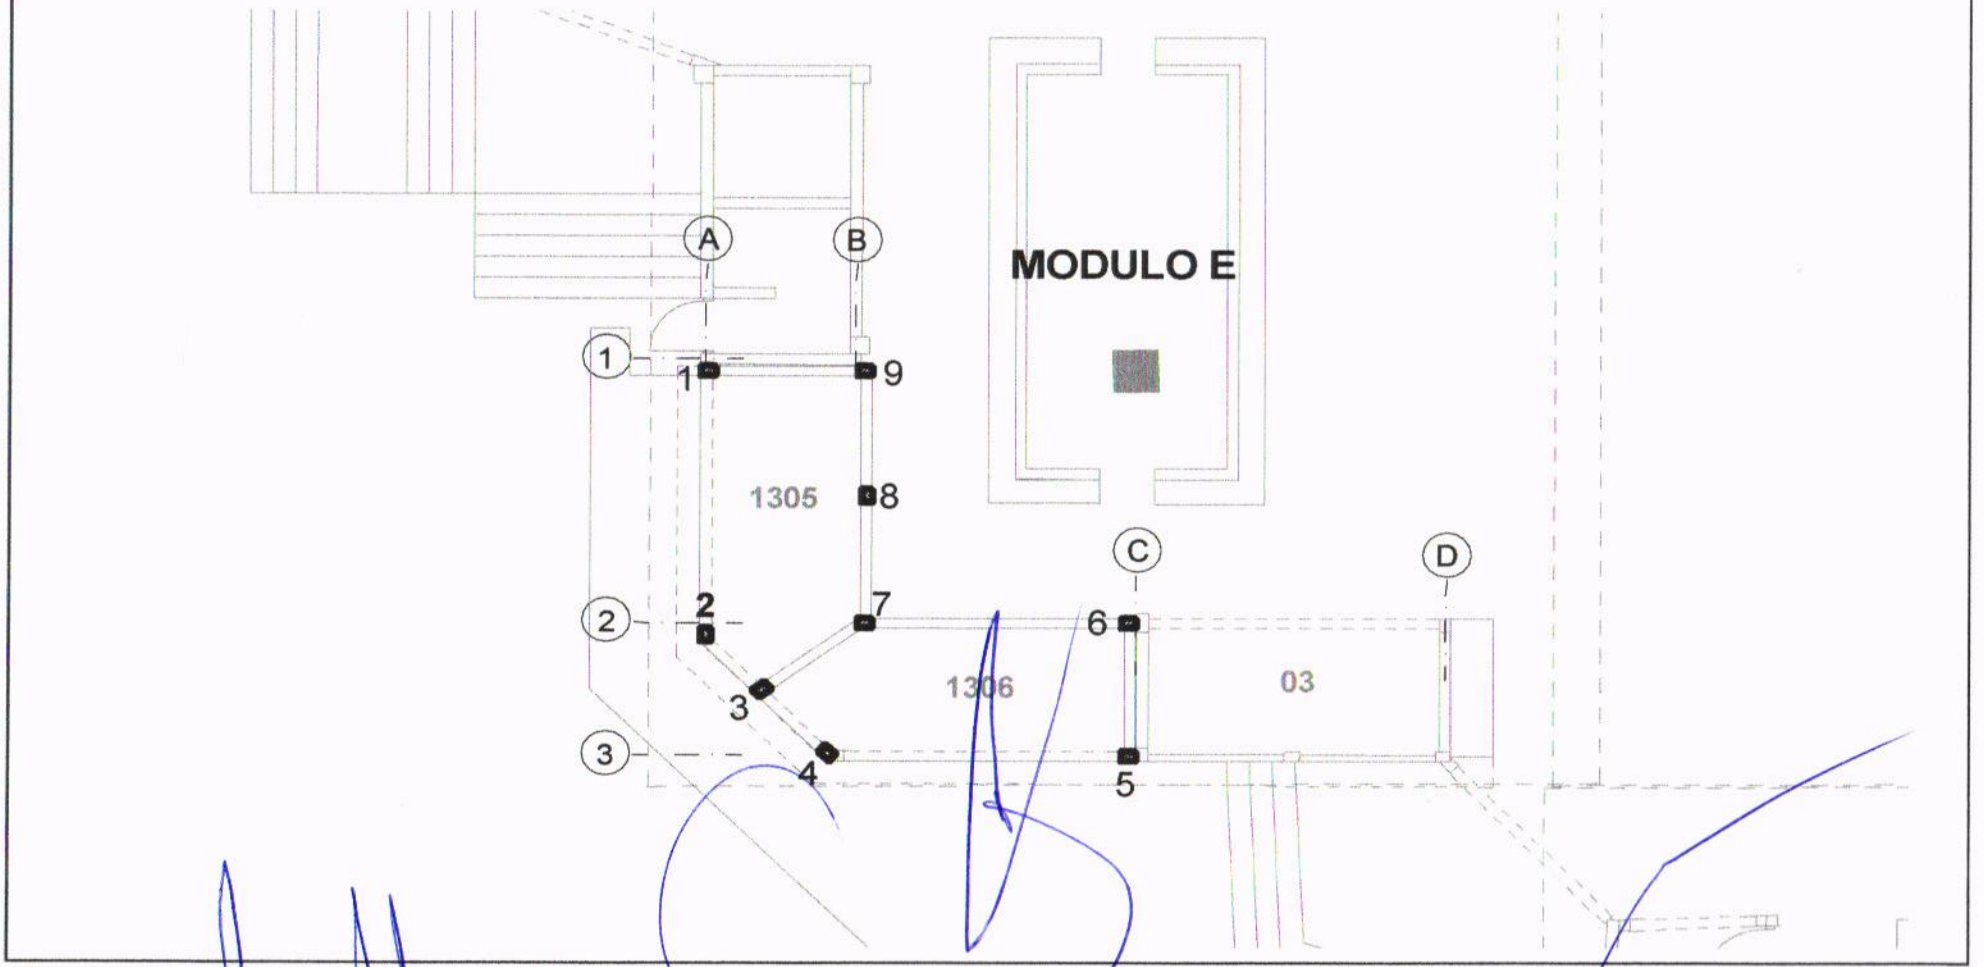

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

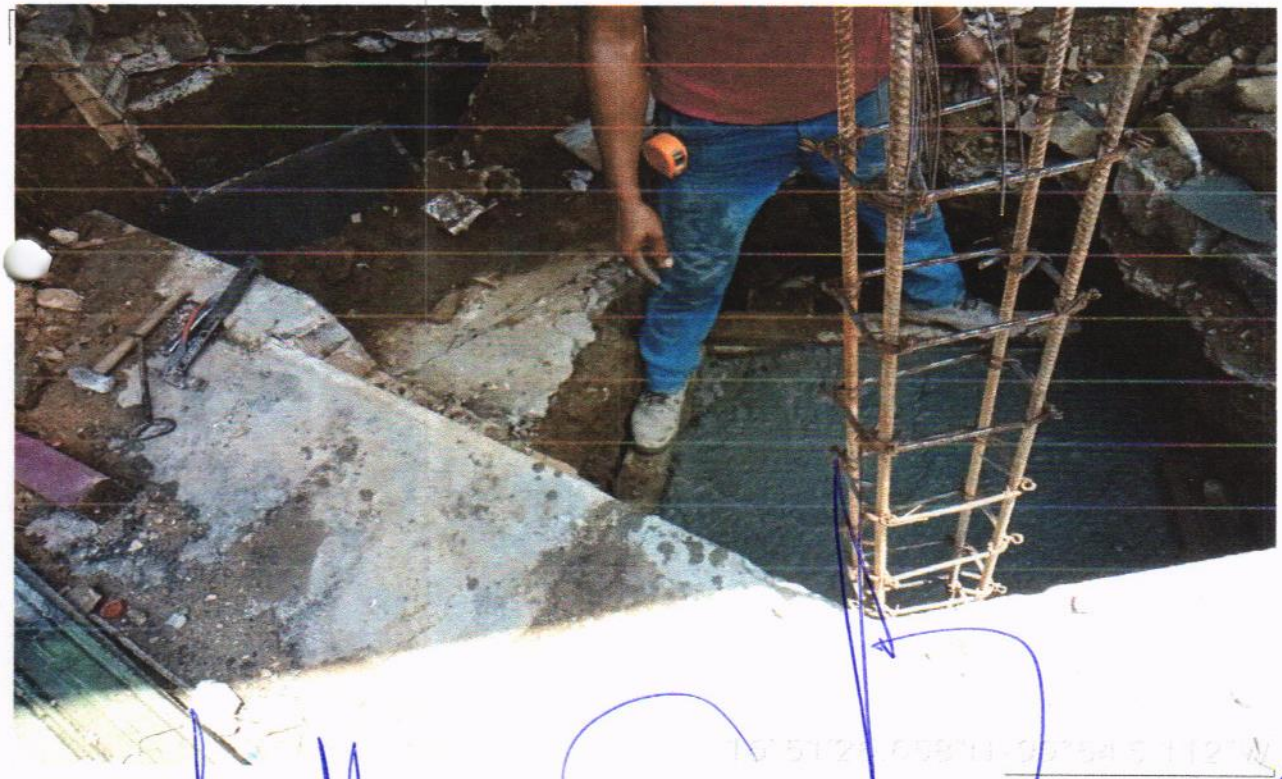

A03	**LOCALES DE CONCRETO**
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



LOCALES DE CONCRETO	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
A03	CAST-1520

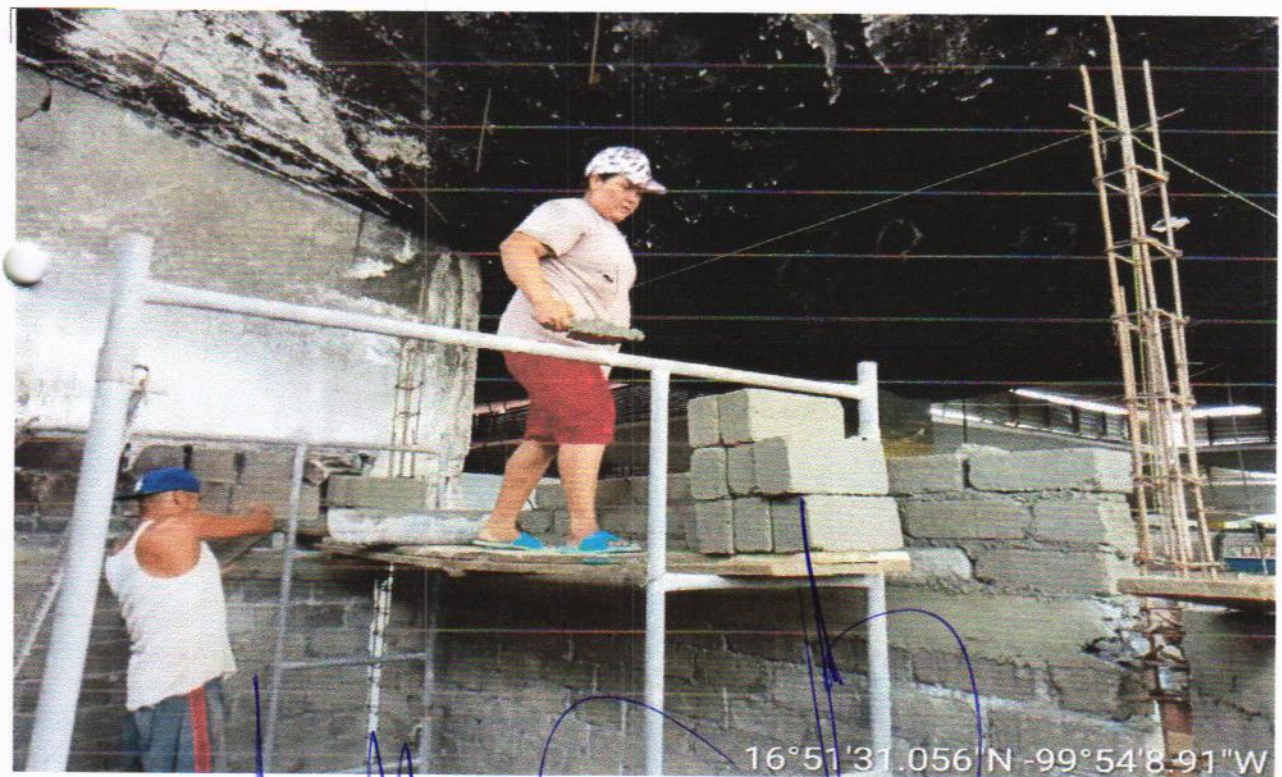

LOCALES DE CONCRETO	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
A03	CAST-1520

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**					ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**					DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**					AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**						
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A03	LOCALES DE CONCRETO										
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	1	A-B		1.87				1.87		
		2	B-C		3.29				3.29		
		B	1-2		3.48				3.48		
		C	2-3		1.76				1.76		
		A-B	2-3		1.52				1.52		
							TOTAL	ML	11.92		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 LOCALES DE CONCRETO

DC-15X15* CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.

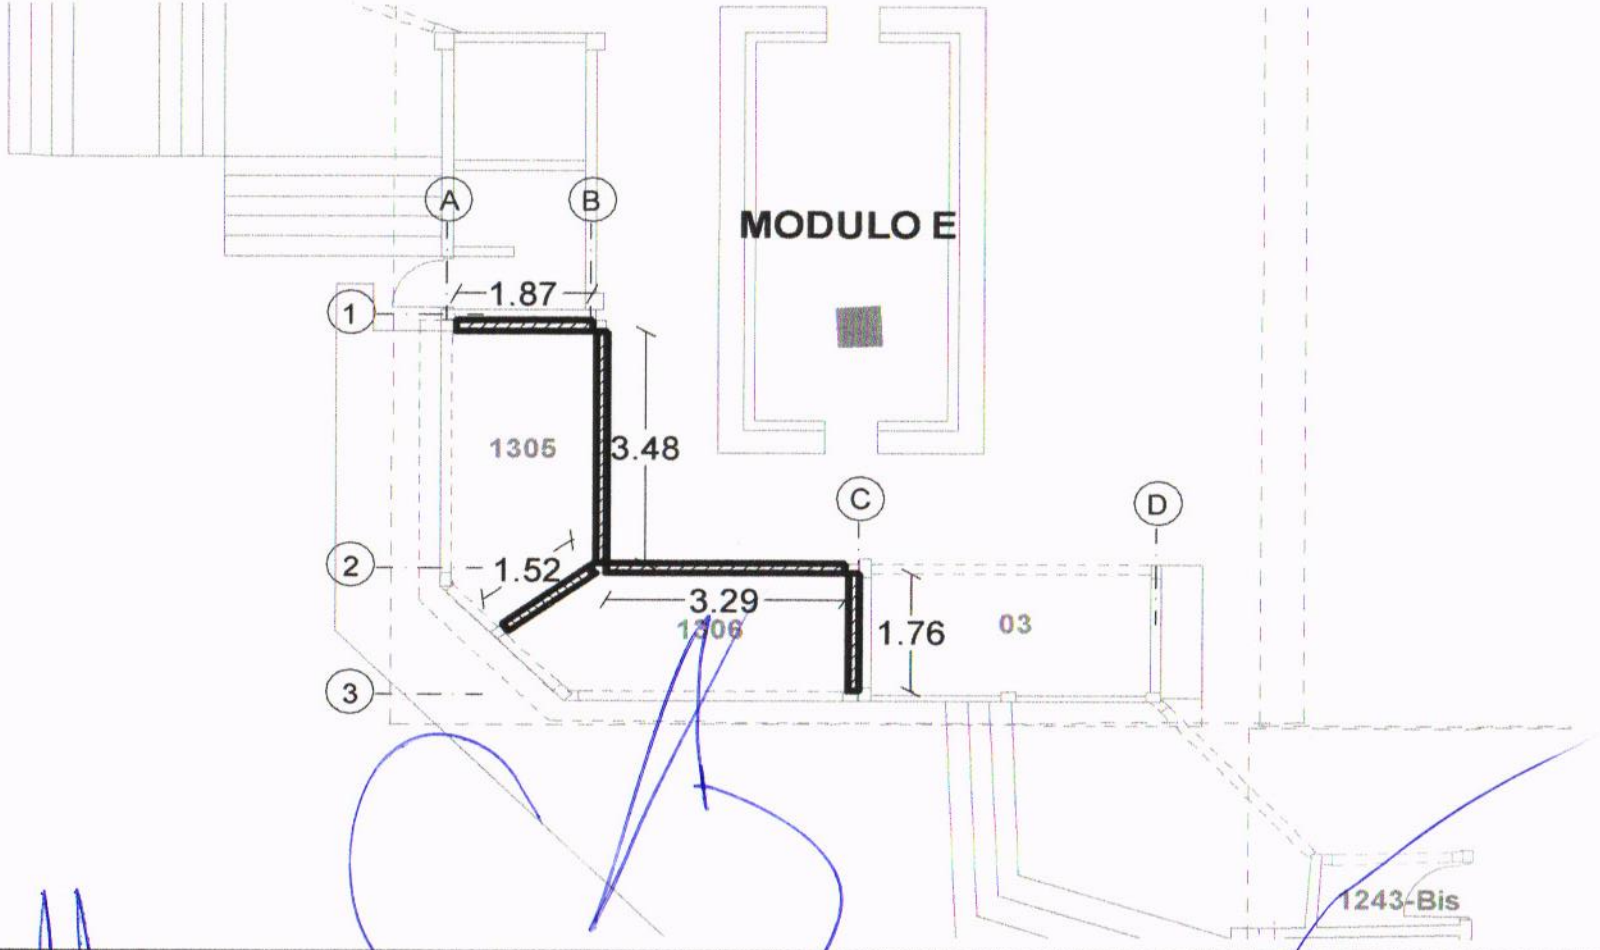

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	
DC-15X15*		CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.

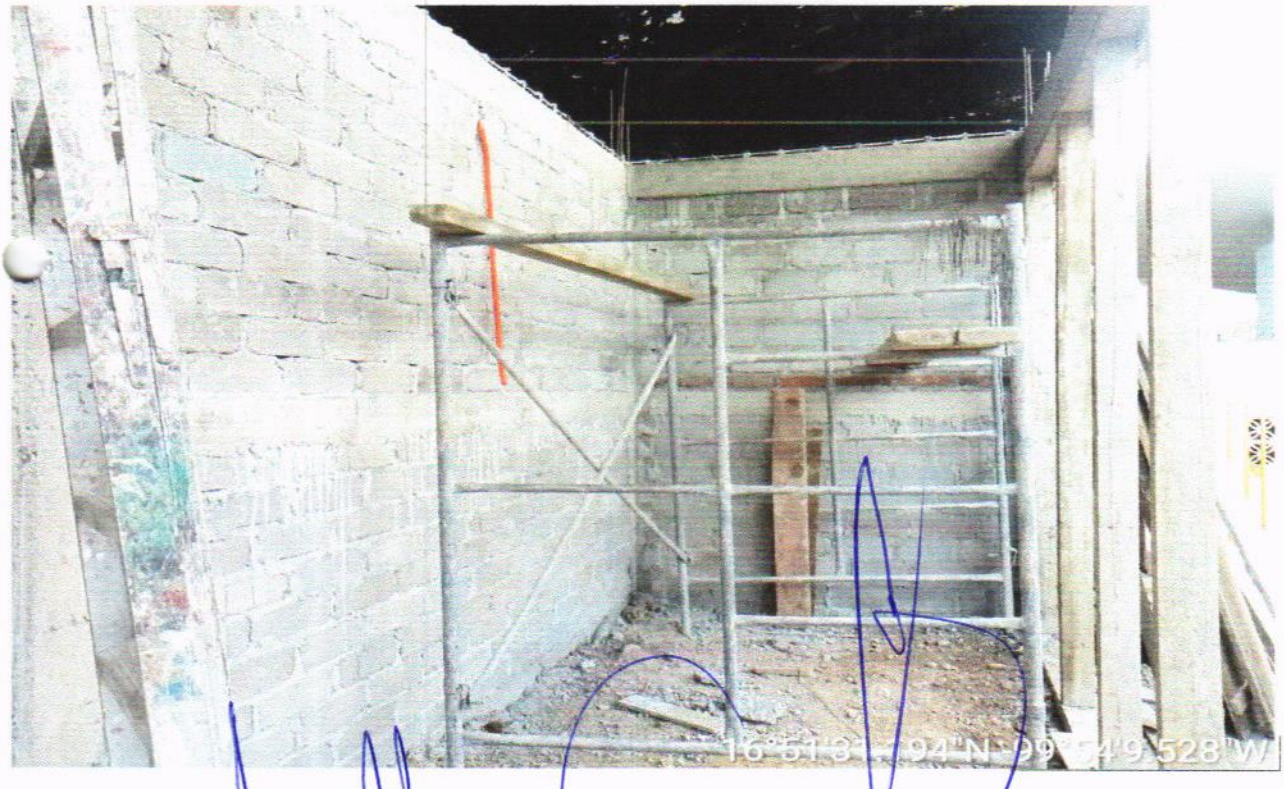

A03	**LOCALES DE CONCRETO**	
DC-15X15*		CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	LOCALES DE CONCRETO									
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	1	A-B		1.87				1.87	
		2	B-C		3.29				3.29	
		3	B-C		3.85				3.85	
		A	1-2		3.63				3.63	
		B	1-2		3.28	L=1.63+1.65= 3.28			3.28	
		C	2-3		1.76				1.76	
		A	2-3		2.20	L=1.10+1.10= 2.20			2.20	
		A-B	2-3		1.52				1.52	
							TOTAL	ML	21.40	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A03 LOCALES DE CONCRETO

TR-1530 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

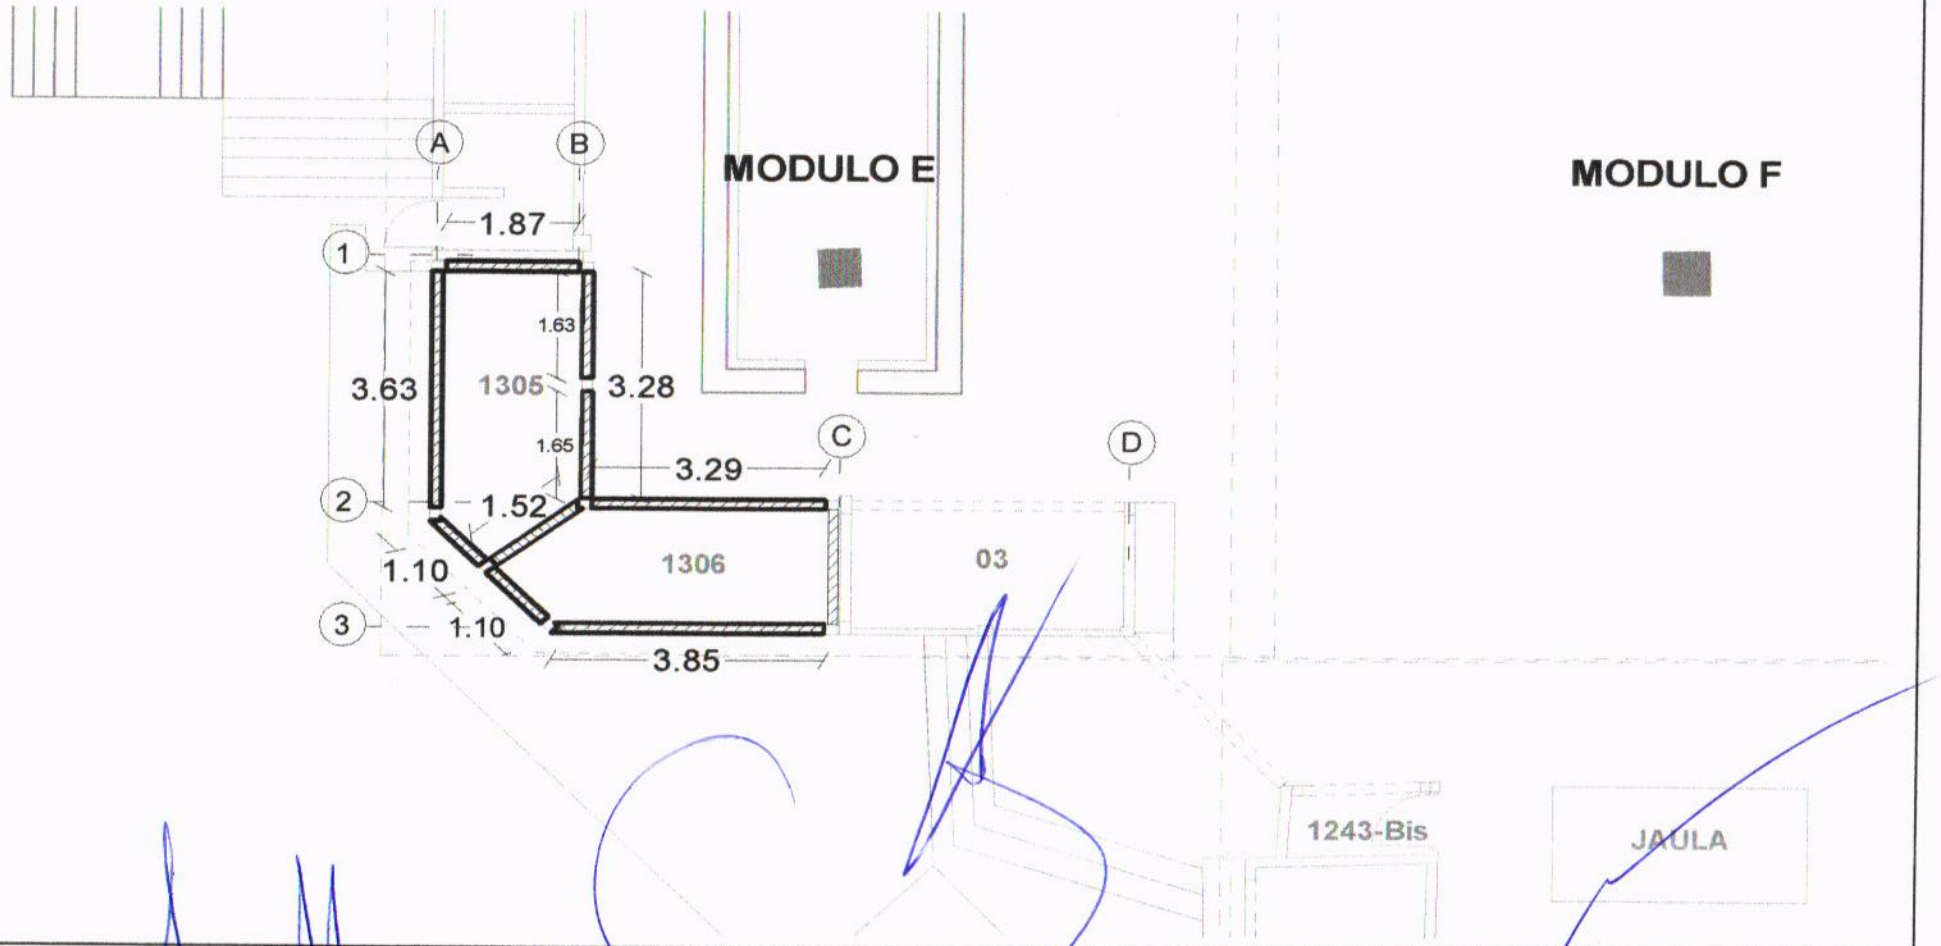

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

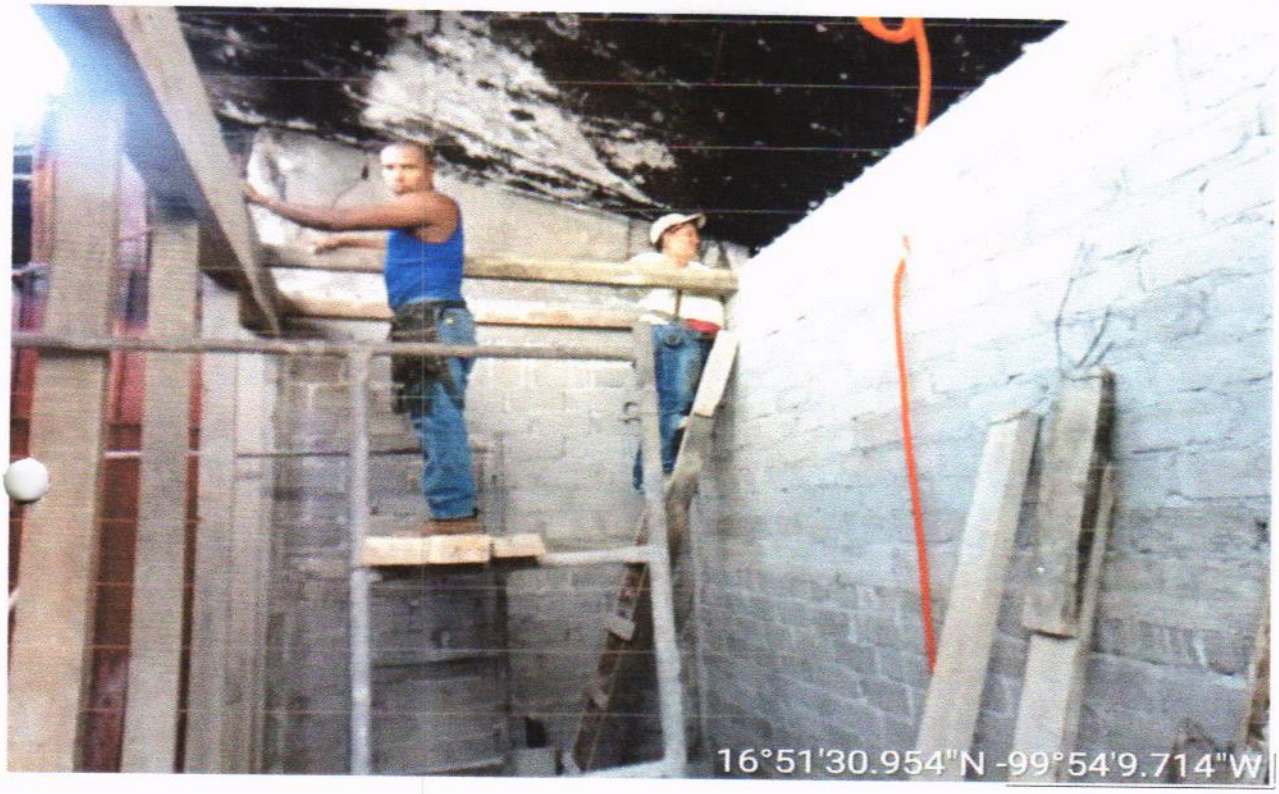

A03	LOCALES DE CONCRETO	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	TR-1530	

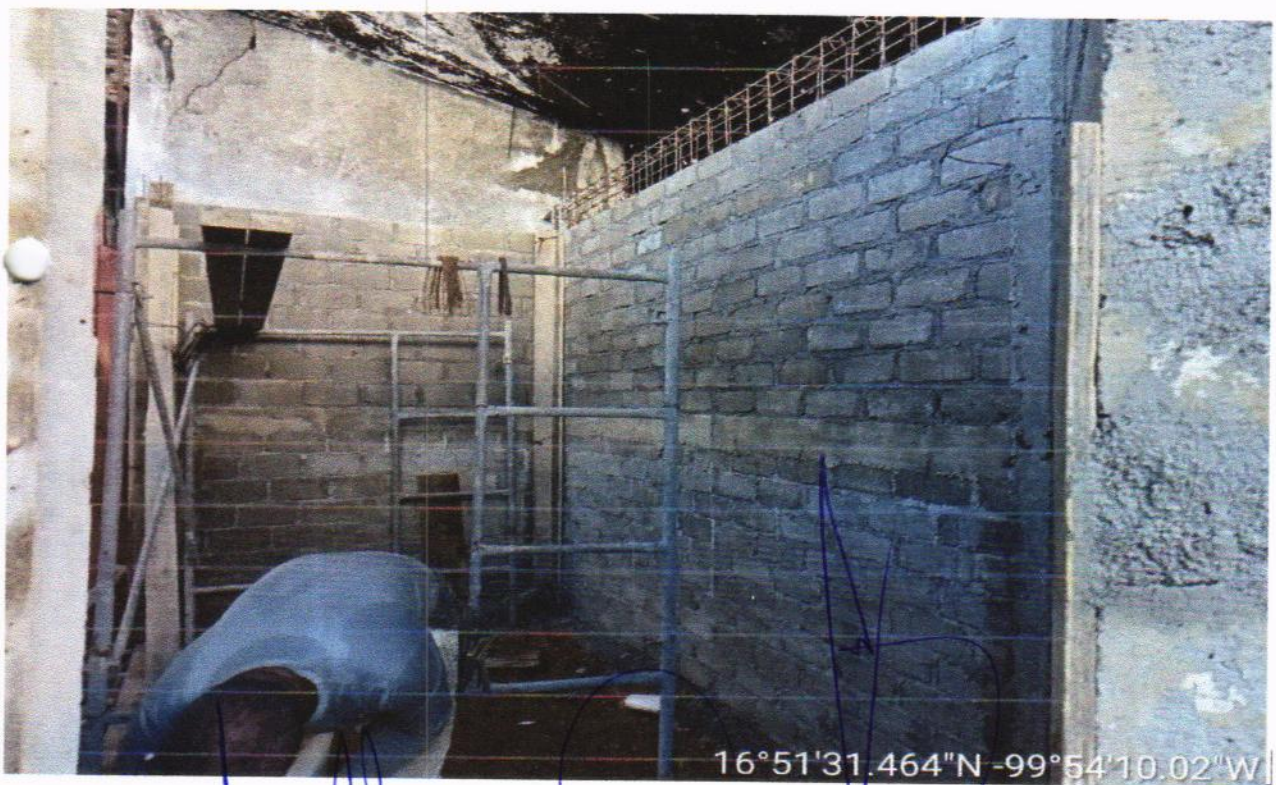

A03	LOCALES DE CONCRETO	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	TR-1530	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	TR-1530	



A03	**LOCALES DE CONCRETO**	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.
	TR-1530	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	LOCALES DE CONCRETO									
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	Modulo E			22.08	1.00			22.08	
							TOTAL	M2	22.08	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A03 **LOCALES DE CONCRETO**


11-0224 LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

LOSA

AREA 1: 2.57 X 4.18 = 10.74
AREA 2: 3.49 X 2.38 = 8.31
AREA 3: 0.76 X 1.82 = 1.38
AREA 4: (1.81 X 1.82) /2 = 1.65

AREA TOTAL: 22.08 M2

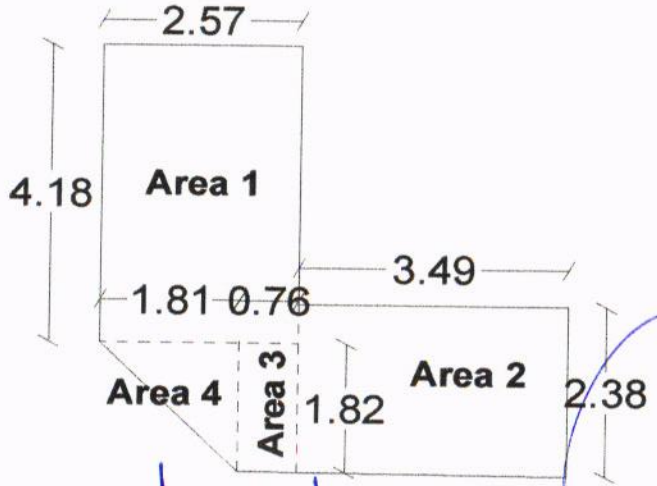

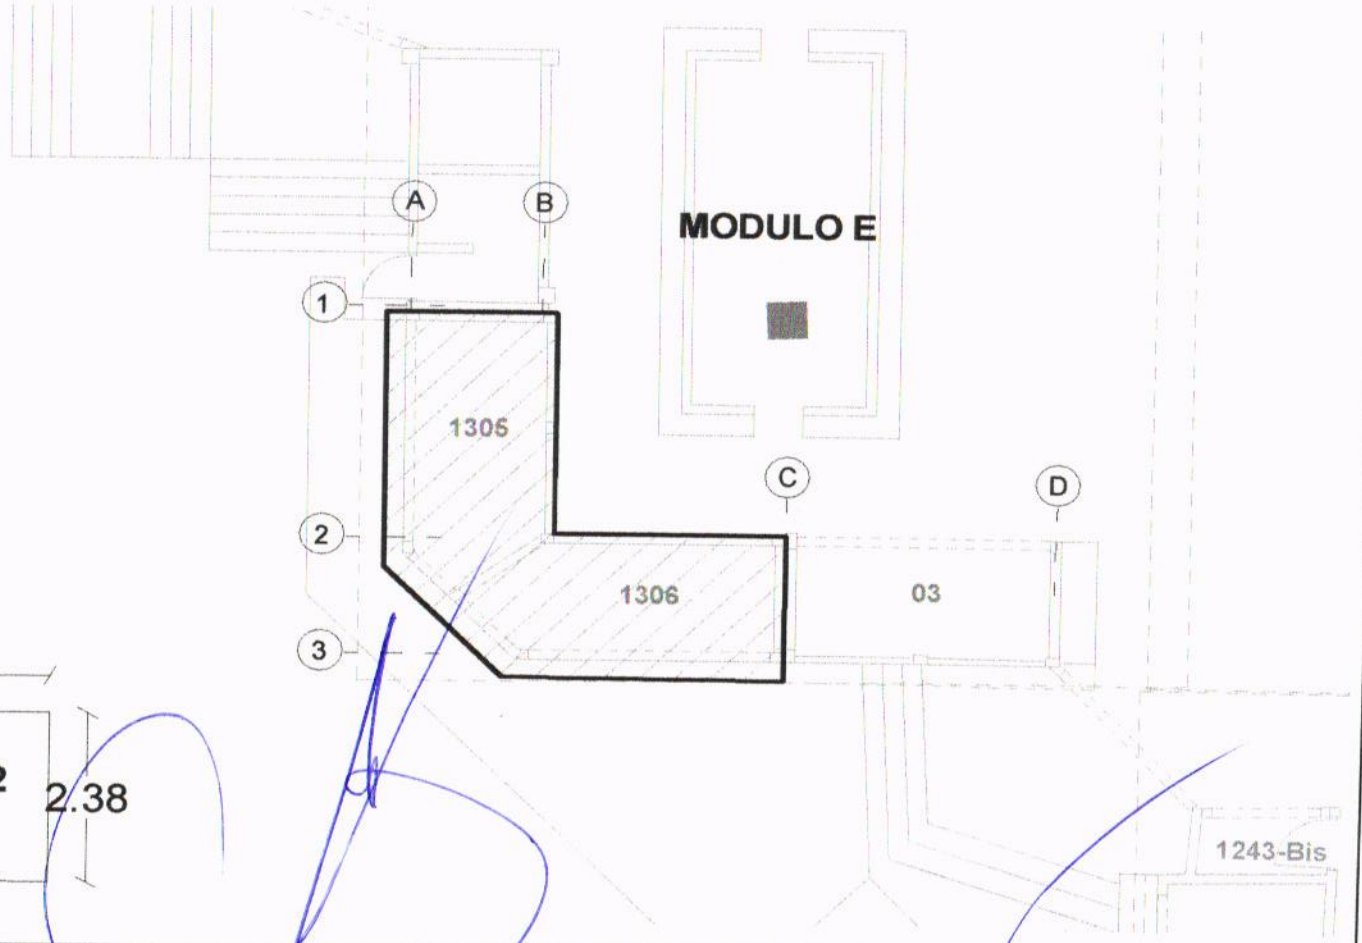

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *



A03	**LOCALES DE CONCRETO**
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS									
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Modulo E			22.08	1.00			22.08	
		Modulo B			52.66	1.00			52.66	
		Modulo C			7.87	8.69			68.39	
		Modulo D	1990		39.68	1.00			39.68	
			1991		41.11	1.00			41.11	
			1992		40.65	1.00			40.65	
							TOTAL	M2	264.57	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS


ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MODULO E

AREA 1: 2.57 X 4.18 = 10.74
AREA 2: 3.49 X 2.38 = 8.31
AREA 3: 0.76 X 1.82 = 1.38
AREA 4: (1.81 X 1.82) /2 = 1.65

AREA TOTAL: 22.08 M2

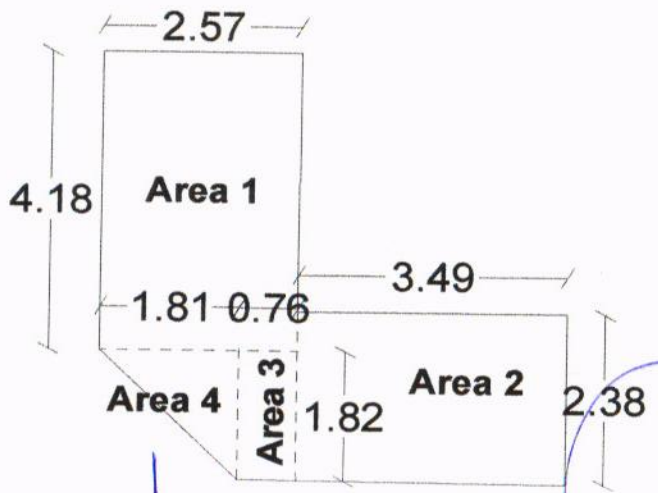

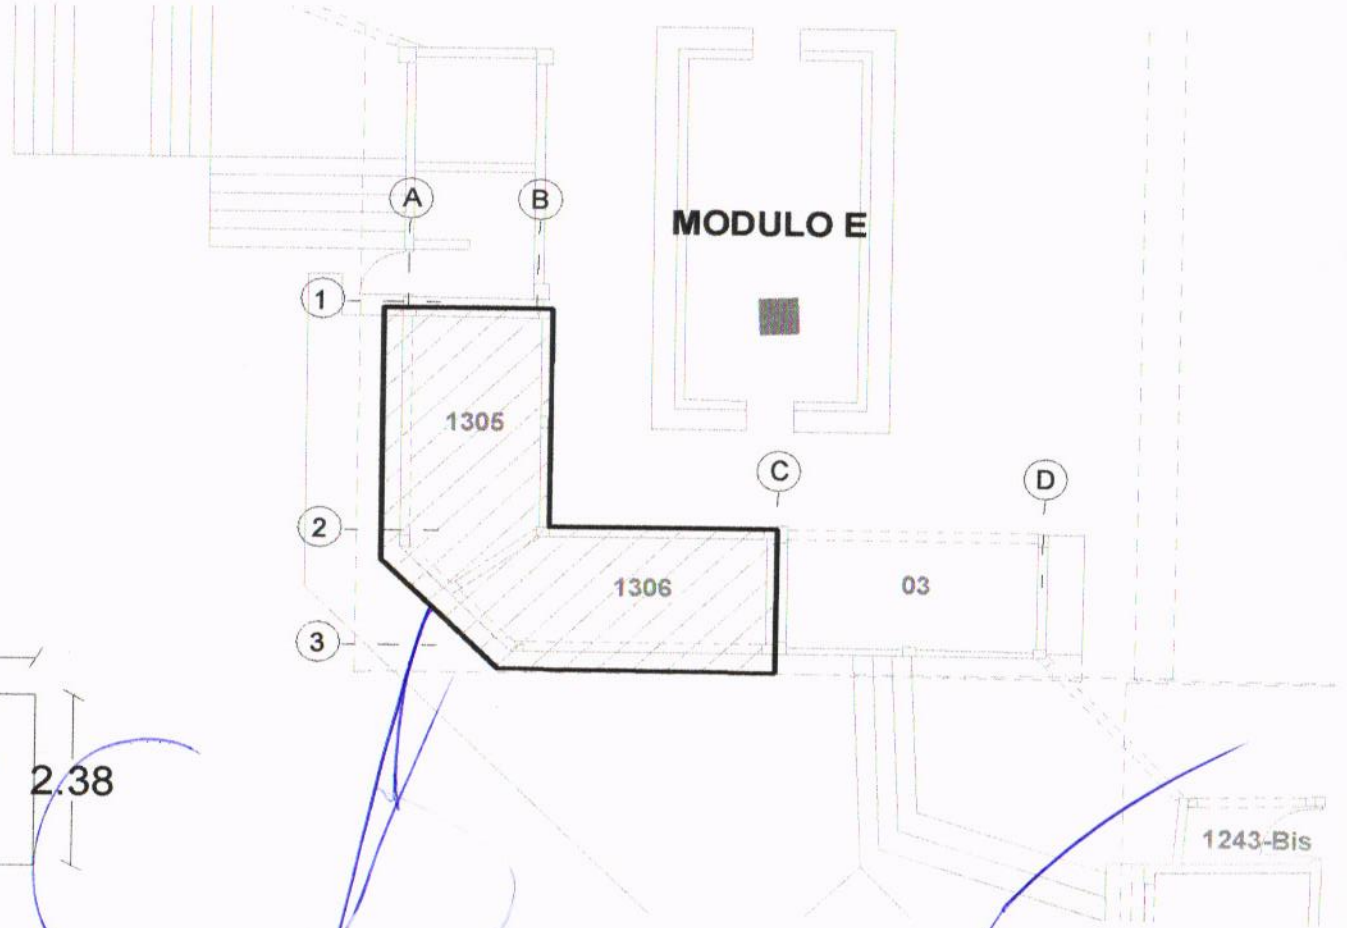

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS


ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

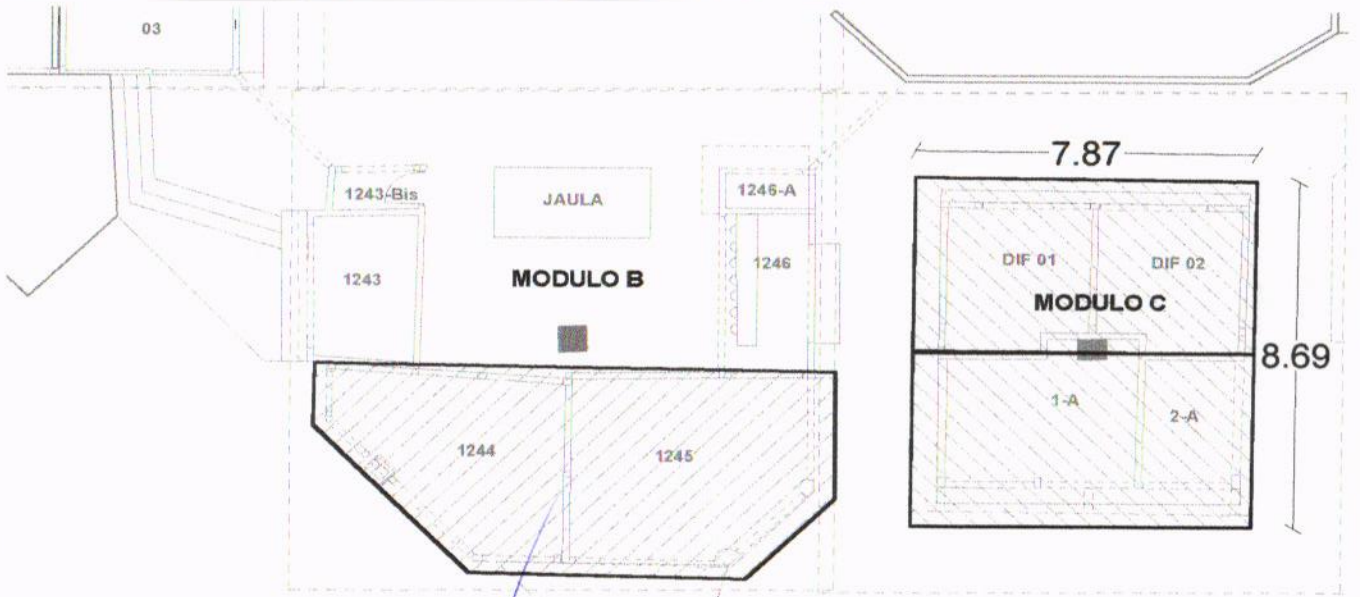

MODULO B

AREA 1: 1.53 X 1.78 = 2.72
AREA 2: (1.78 X 1.82) /2 = 1.62
AREA 3: 10.26 X 3.20 = 32.83
AREA 4: (1.82 X 1.86) /2 = 1.69
AREA 5: 6.39 X 1.86 = 11.89
AREA 6: (2.05 X 1.86) /2 = 1.91

AREA TOTAL: 52.66 M2

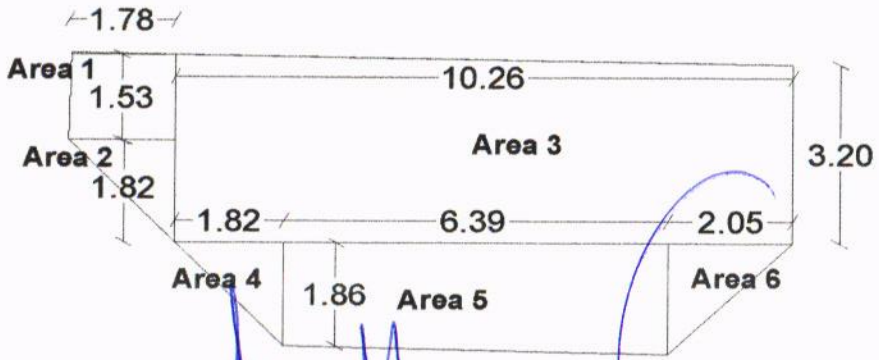

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

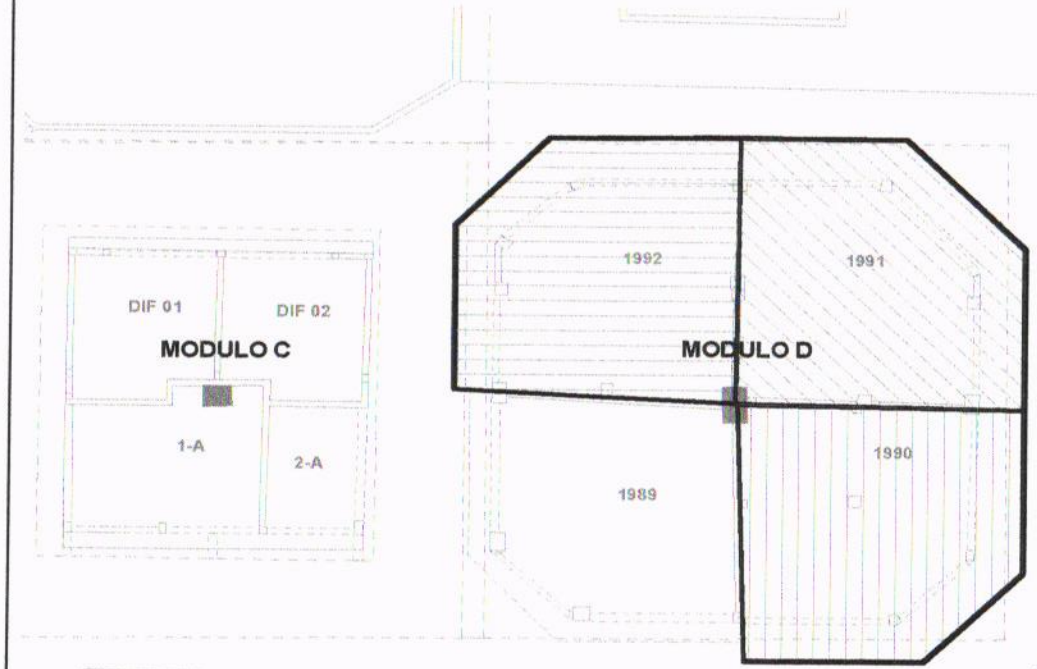


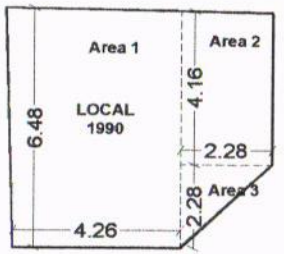

LOSA LOCAL 1990

AREA 1: 4.26 X 6.48 = 27.60
AREA 2: 2.28 X 4.16 = 9.48
AREA 3: (2.28 X 2.28) /2 = 2.60


AREA TOTAL LOSA 1990 39.68 M2

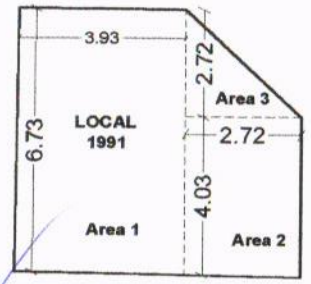

LOSA LOCAL 1991

AREA 1: 3.93 X 6.73 = 26.45
AREA 2: 2.72 X 4.03 = 10.96
AREA 3: (2.72 X 2.72) /2 = 3.70

AREA TOTAL LOSA 1991 41.11 M2

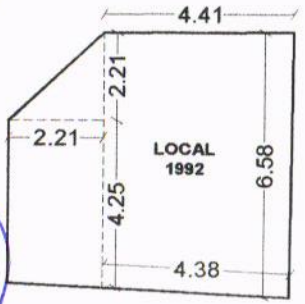

LOSA LOCAL 1992

AREA 1: 4.38 X 6.58 = 28.82
AREA 2: 2.21 X 4.25 = 9.39
AREA 3: (2.21 X 2.21) /2 = 2.44

AREA TOTAL LOSA 1992 40.65 M2

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

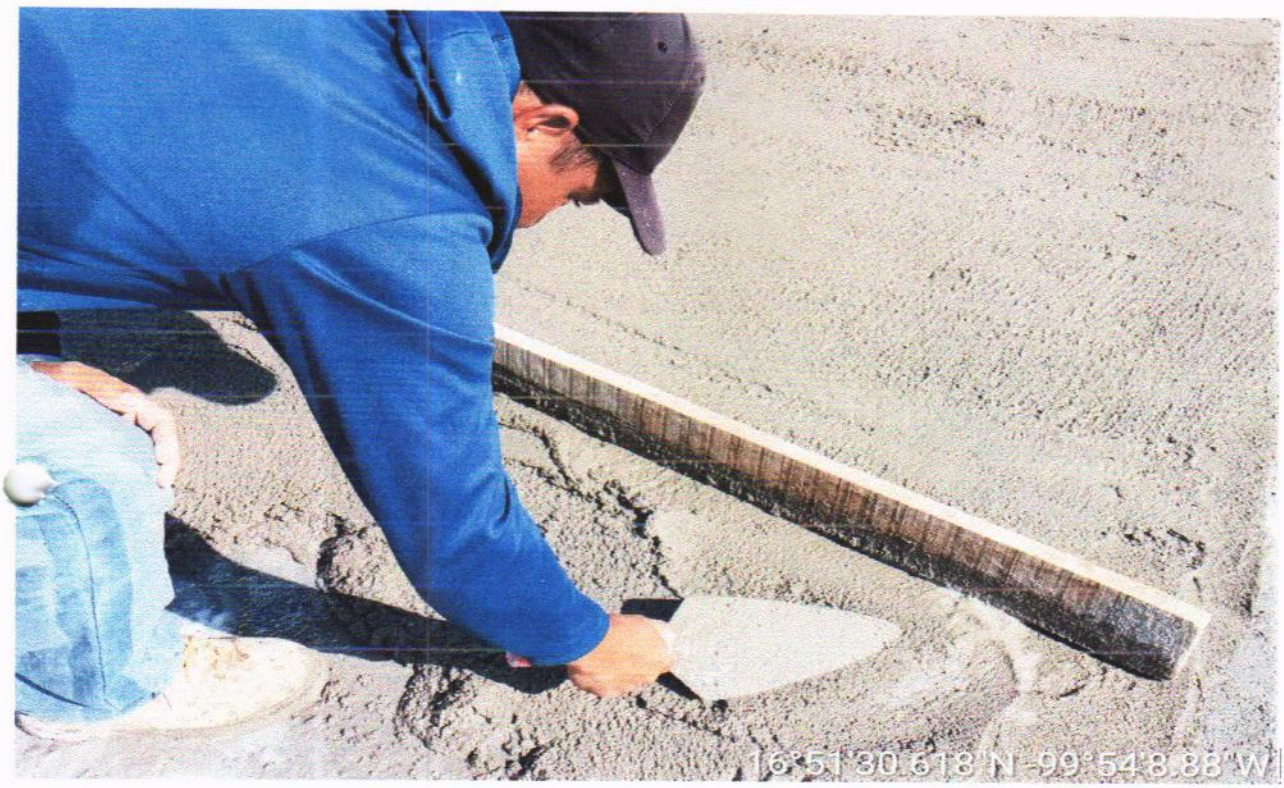

A04	**ALBAÑILERIAS**
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



A04	**ALBAÑILERIAS**
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	
ENTOR3*		ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

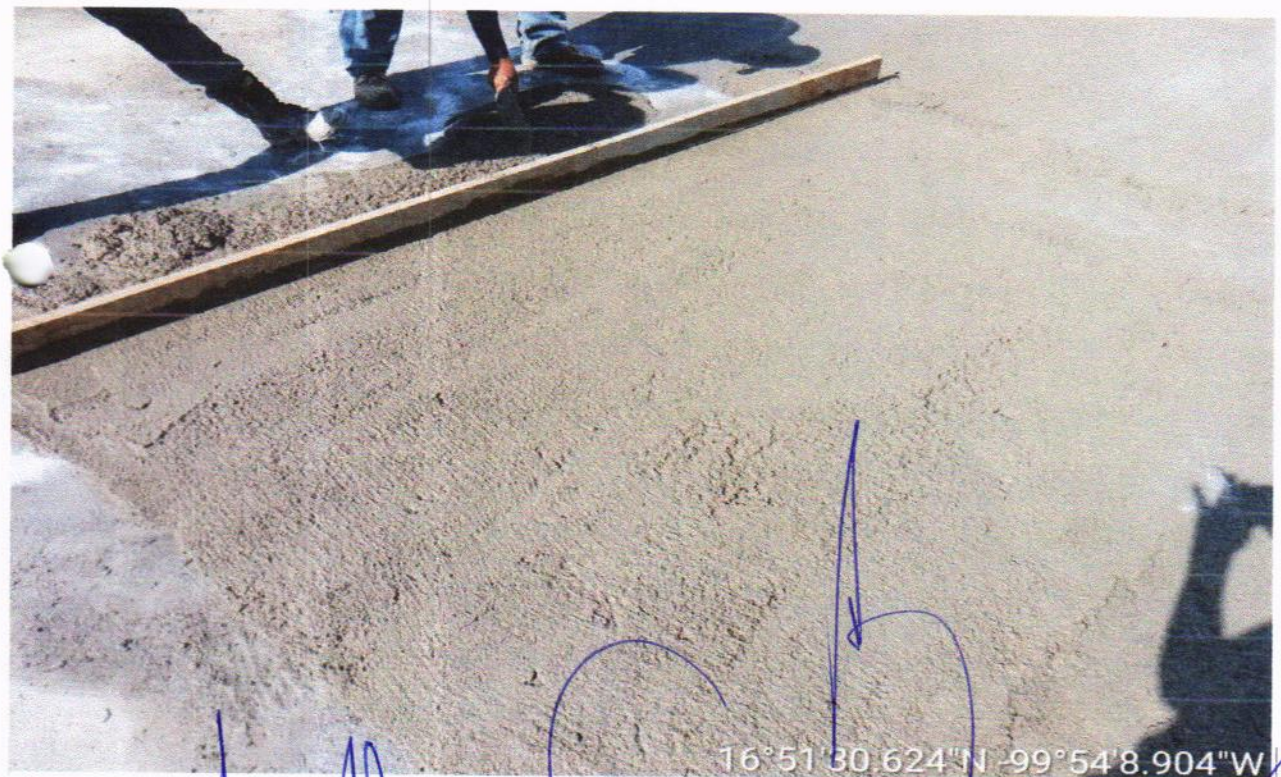

A04	**ALBAÑILERIAS**	
ENTOR3*		ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS									
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	1	A-B		1.87		2.40		4.49	
		2	B-C		3.29		3.40		11.19	
		B	1-2		3.28		3.40		11.15	
		C	2-3		1.76		2.40		4.22	
		A-B	2-3		1.52		2.40		3.65	
							TOTAL	M2	34.70	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.

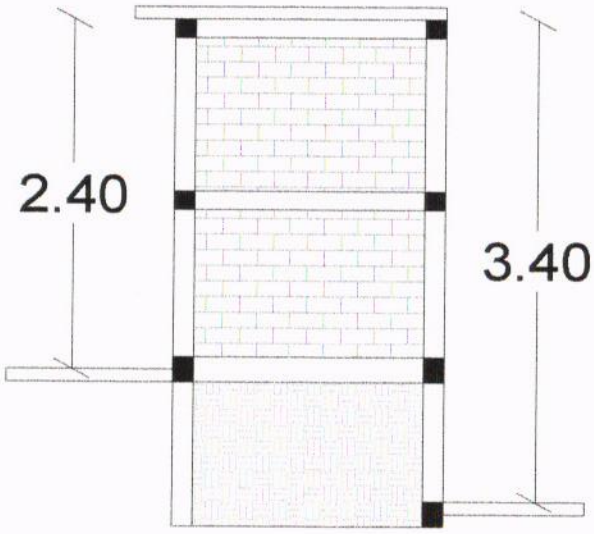

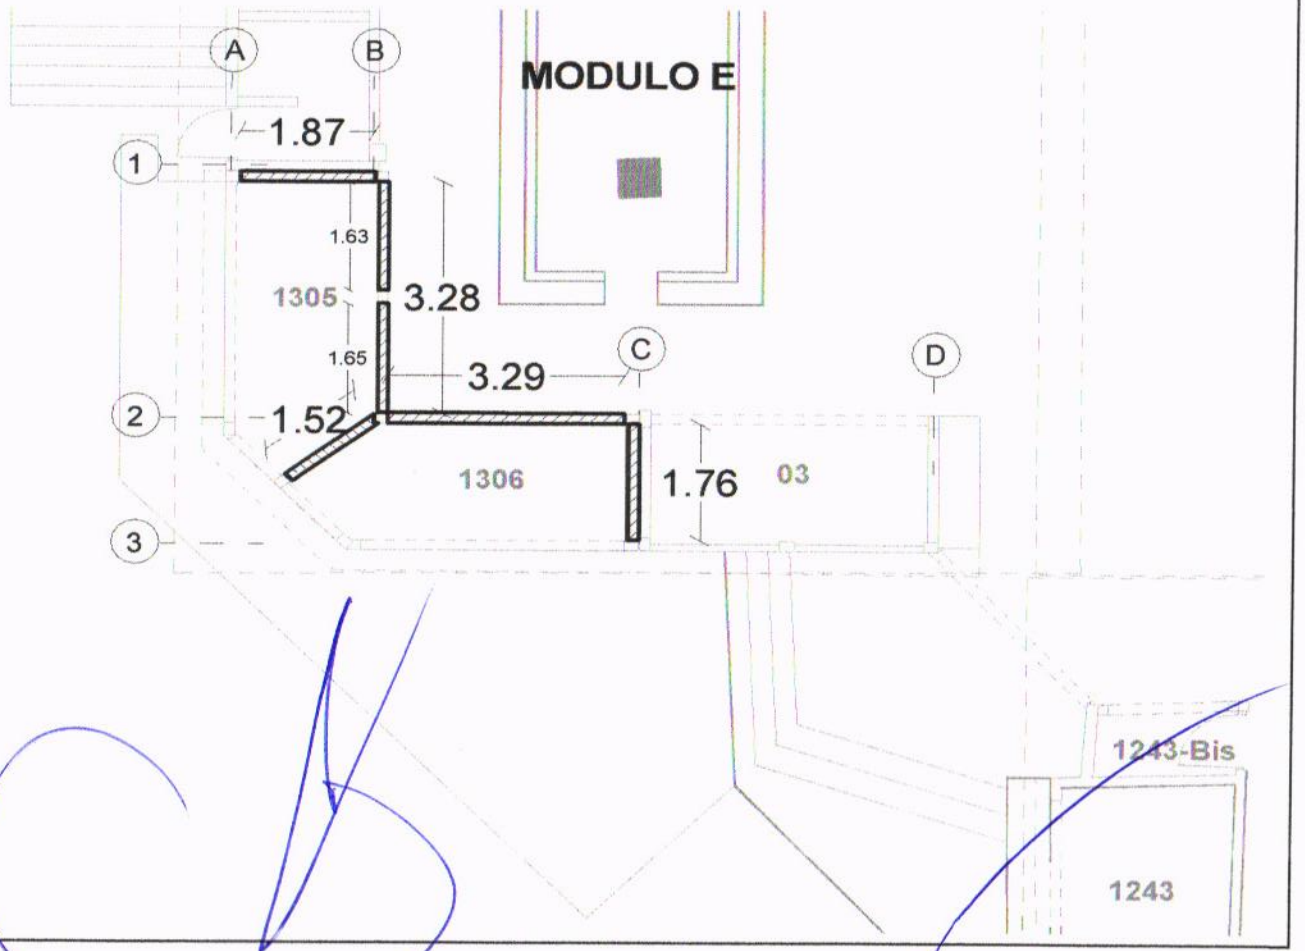

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

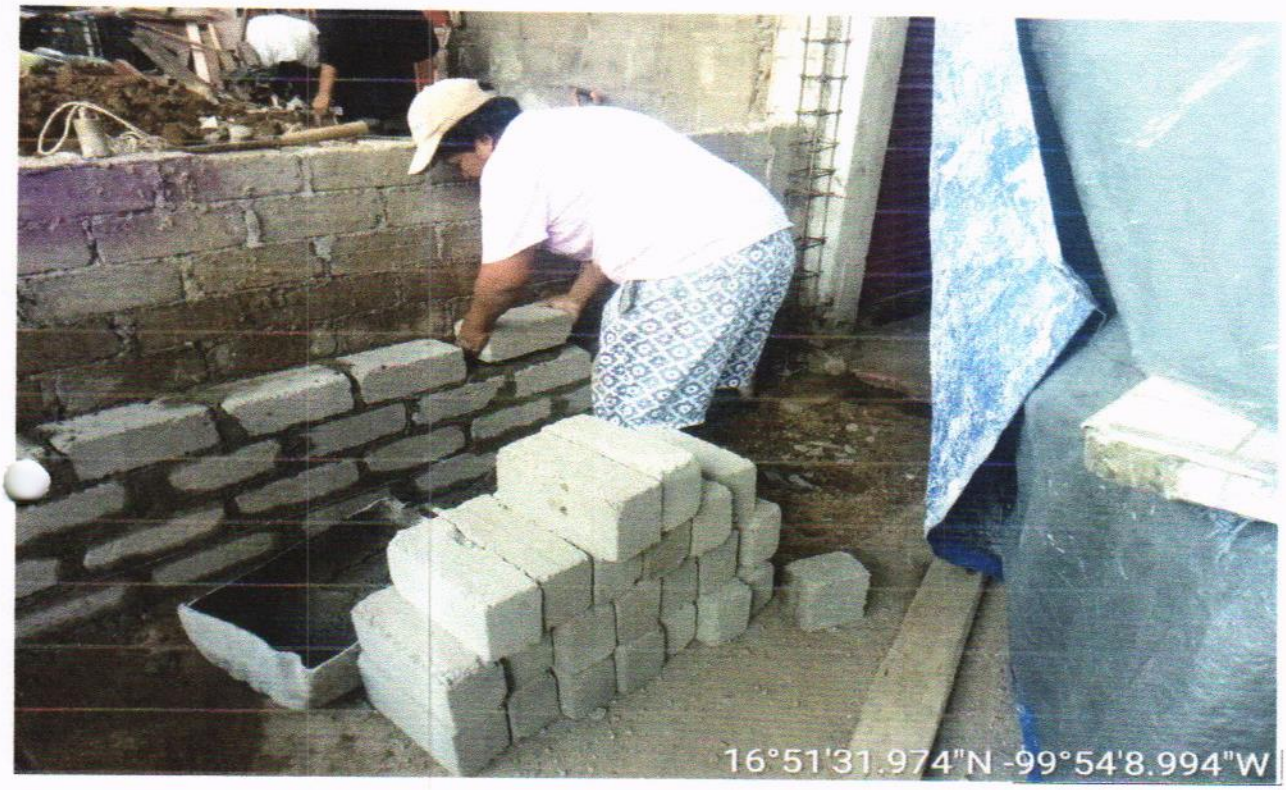

MURO14	A04	ALBAÑILERIAS
		MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



MURO14	A04	ALBAÑILERIAS
		MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	
MURO14		MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.



A04	**ALBAÑILERIAS**	
MURO14		MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS				Largo	Alto	Pza			
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	1	A-B	Int	2.12	2.70	1.00		5.72	
		2	B-C	Int	3.49	2.70	1.00		9.42	
		B	1-2	Int	3.63	2.70	1.00		9.80	
		C	2-3	Int	2.06	2.70	1.00		5.56	
		A-B	2-3	Int-Ext	1.78	2.70	2.00		9.61	
		2	B-C	Ext	3.49	3.95	1.00		13.79	
		B	1-2	Ext	3.63	3.95	1.00		14.34	
		C	2-3	Ext	2.06	1.25	1.00		2.58	
		Modulo E		Losa	22.08	1.00			22.08	
							TOTAL	M2	92.90	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

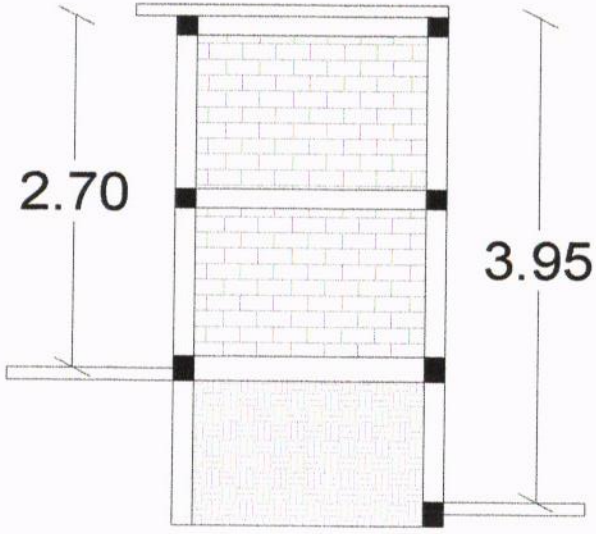

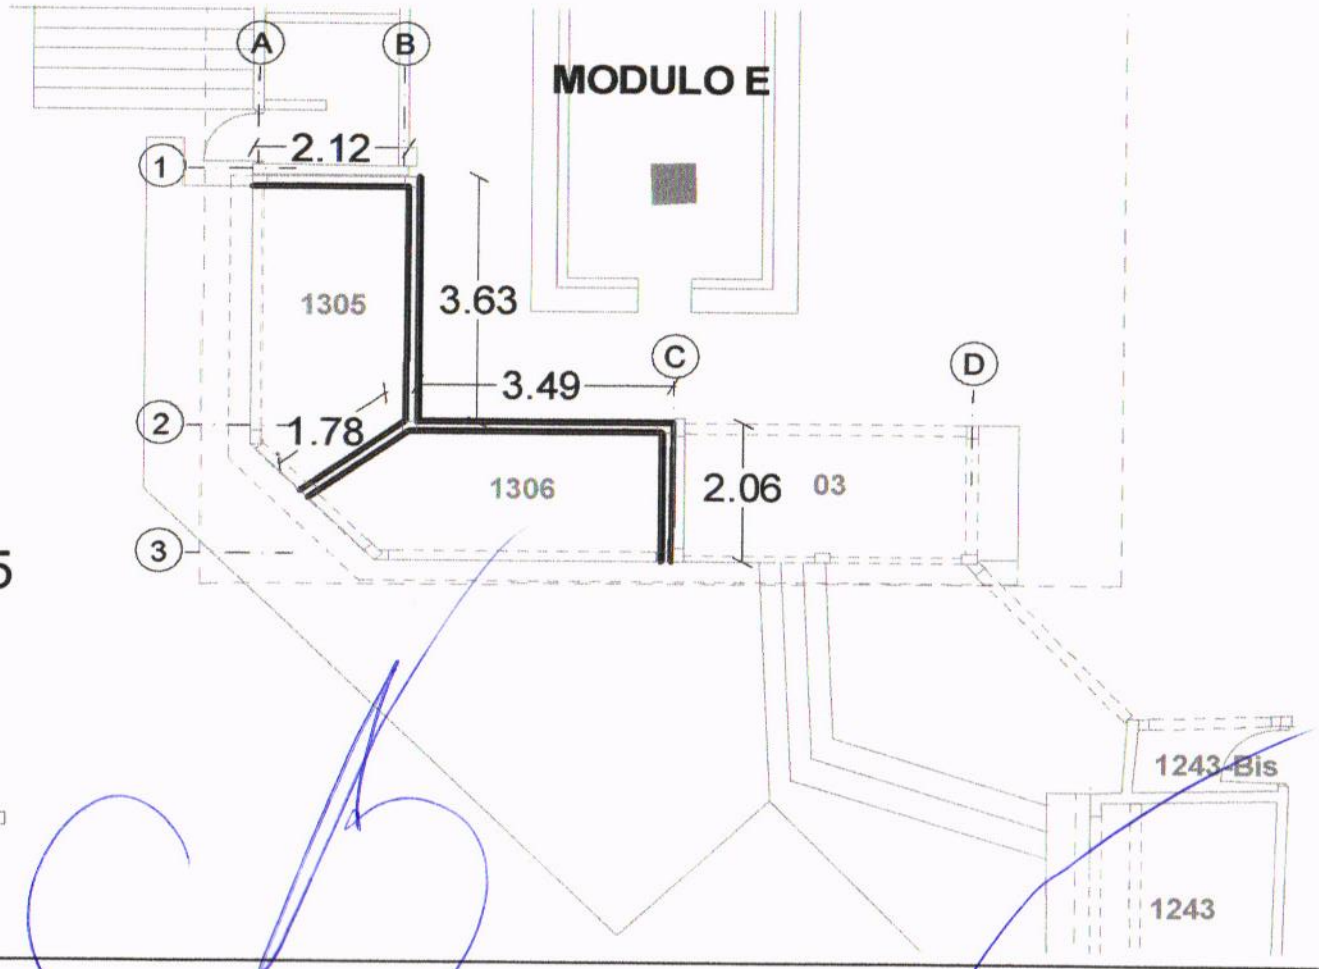

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS


11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

LOSA

AREA 1: 2.57 X 4.18 = 10.74
AREA 2: 3.49 X 2.38 = 8.31
AREA 3: 0.76 X 1.82 = 1.38
AREA 4: (1.81 X 1.82) /2 = 1.65

AREA TOTAL: 22.08 M2

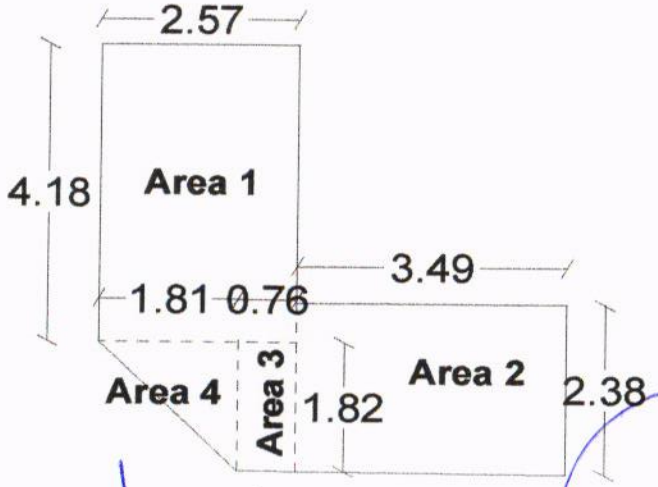

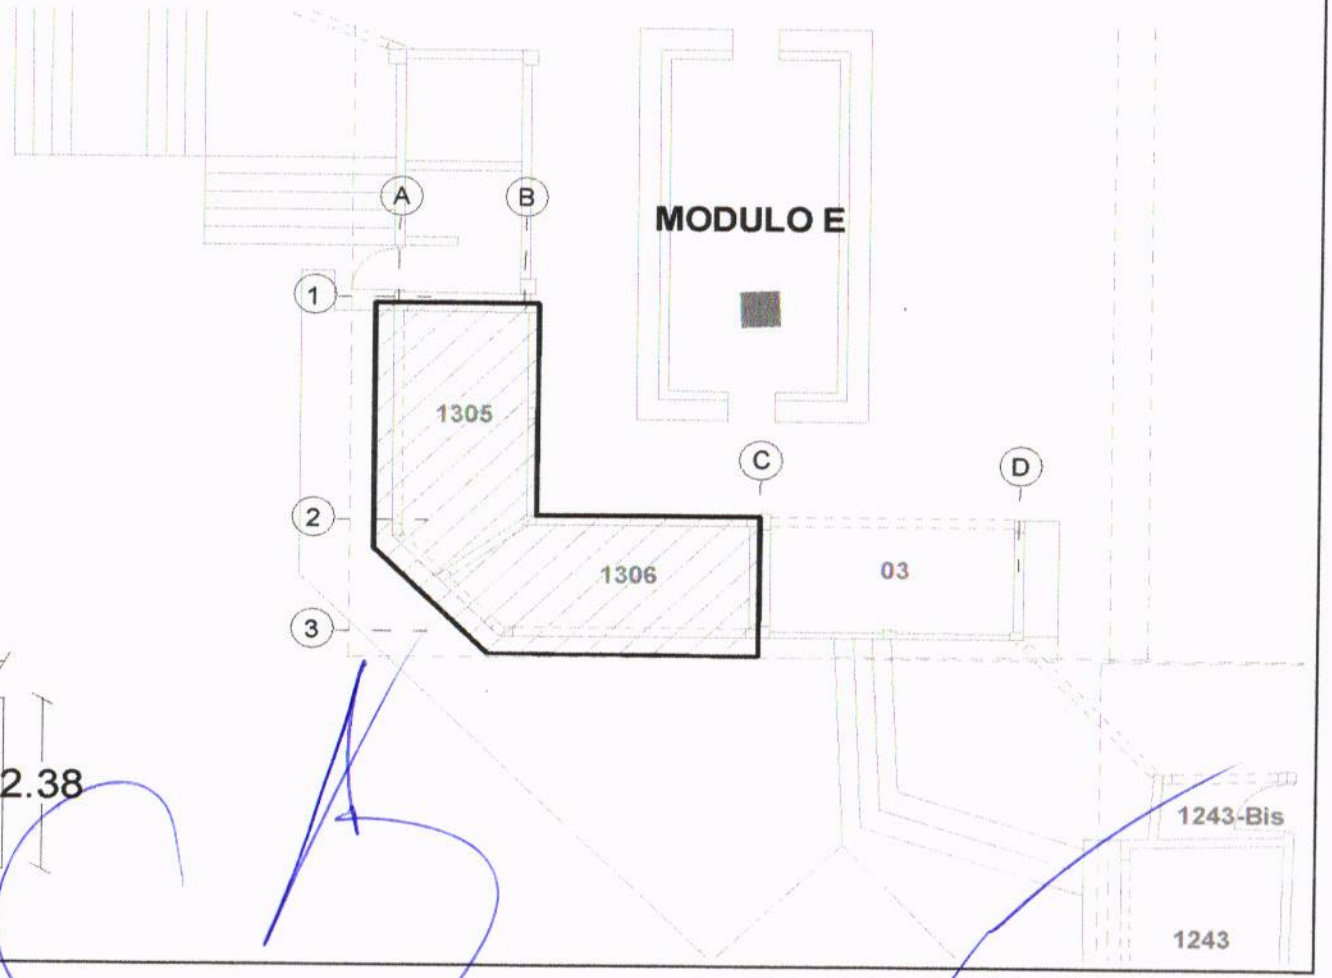

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

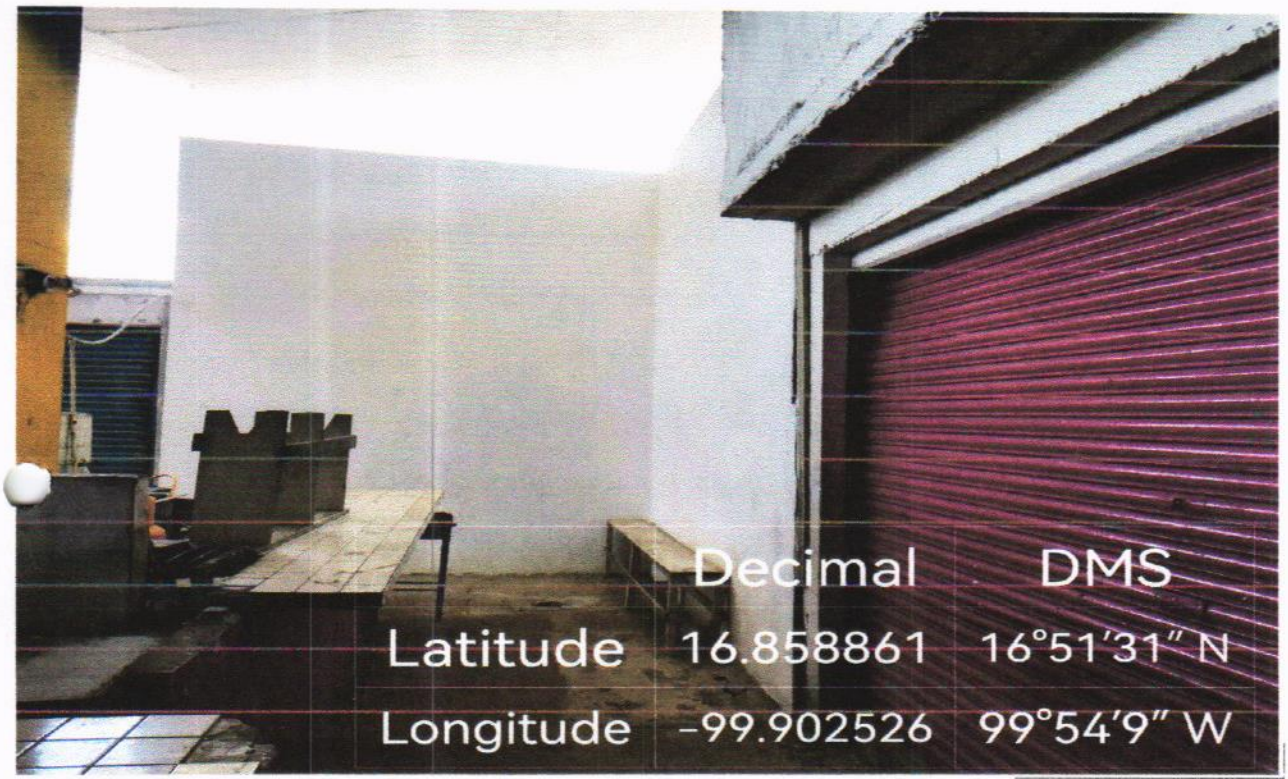

A04	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		

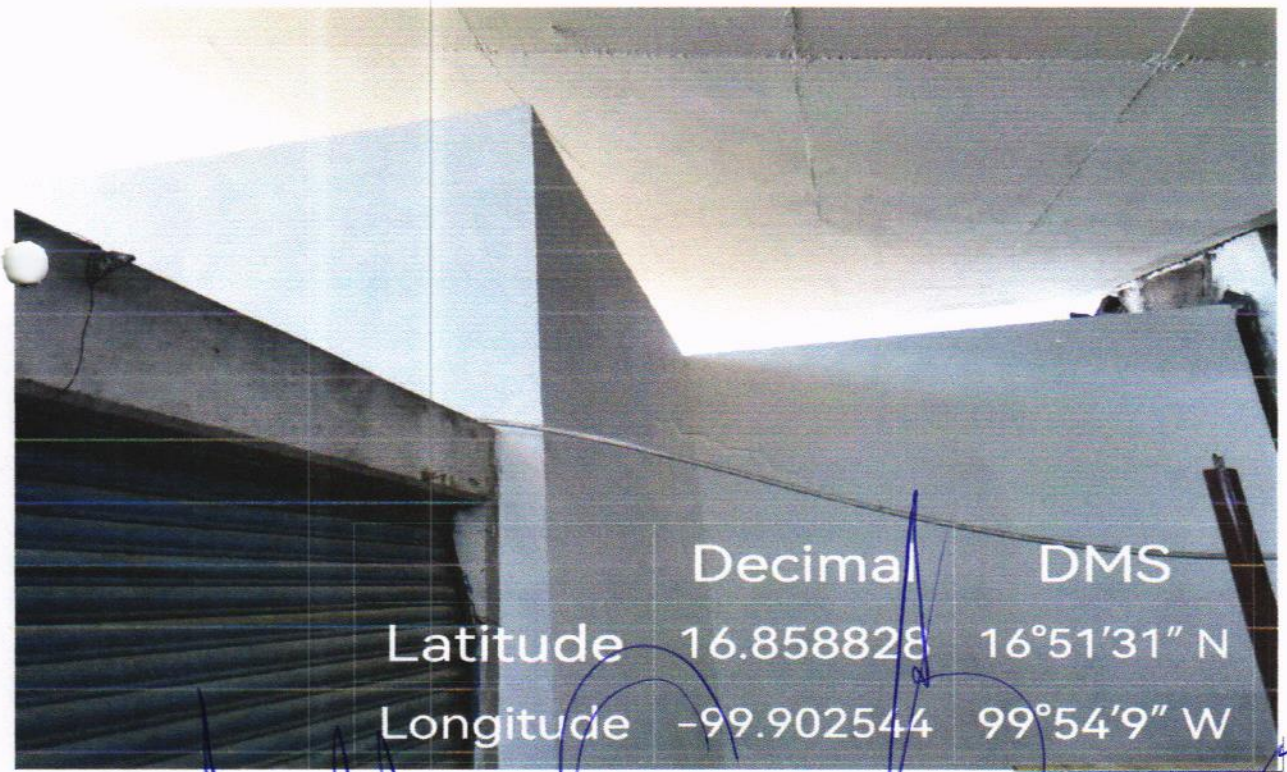


A04	**ALBAÑILERIAS**	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
11-0212		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

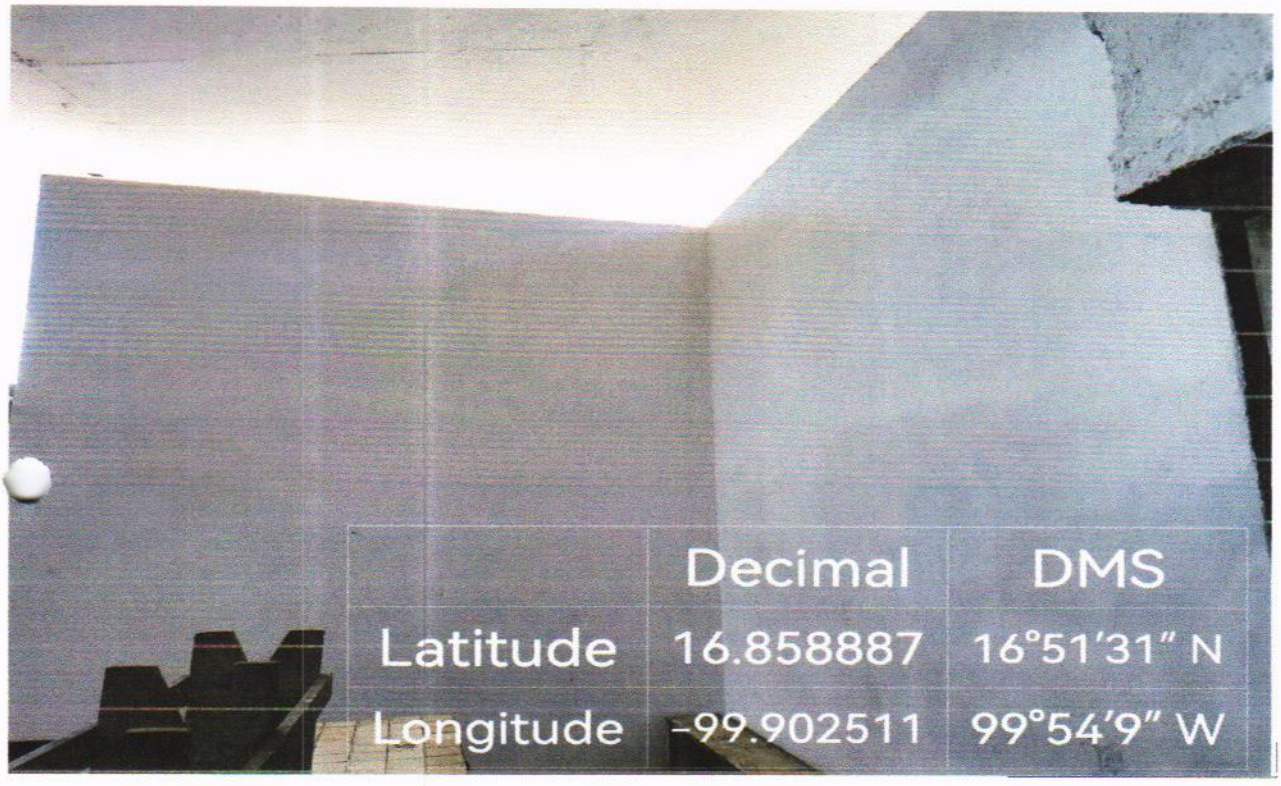

ALBAÑILERIAS		APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION
A04	11-0212	



ALBAÑILERIAS		APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.
A04	11-0212	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	ALBAÑILERIAS					Largo	Pza			
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	Modulo B		Sombrilla		52.00	6.00		312.00	
		Modulo E		Losa		11.59	1.00		11.59	
		Vanos		Cortinas		2.50	5.00		12.50	
		A	1-2	Cerramiento		3.63	3.00		10.89	
		3	B-C	Cerramiento		3.65	3.00		10.95	
		2-3	A-B	Cerramiento		1.10	3.00		3.30	
		2-3	A-B	Cerramiento		1.10	3.00		3.30	
		A	1-2	Desplante		3.98	1.00		3.98	
		2-3	A-B	Desplante		2.42	1.00		2.42	
		3	B-C	Desplante		4.05	1.00		4.05	
		1-3	A-C	Castillos		2.90	7.00		20.30	
							TOTAL	ML	395.28	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .

Cadena de desplante y Cortinas

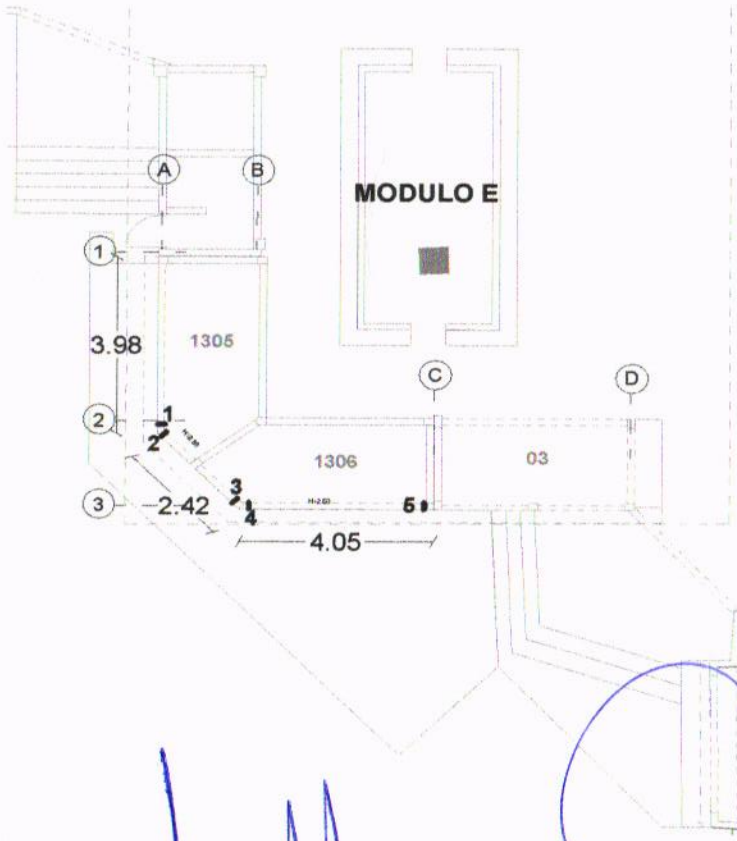

Cadenas de Cerramiento

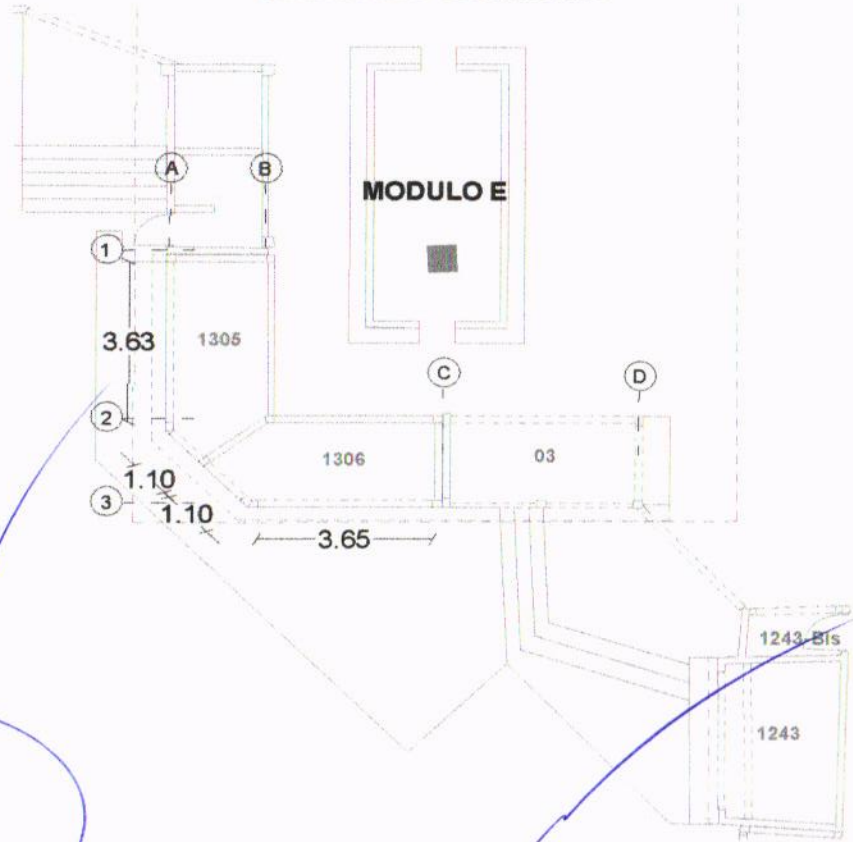

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .

Castillos

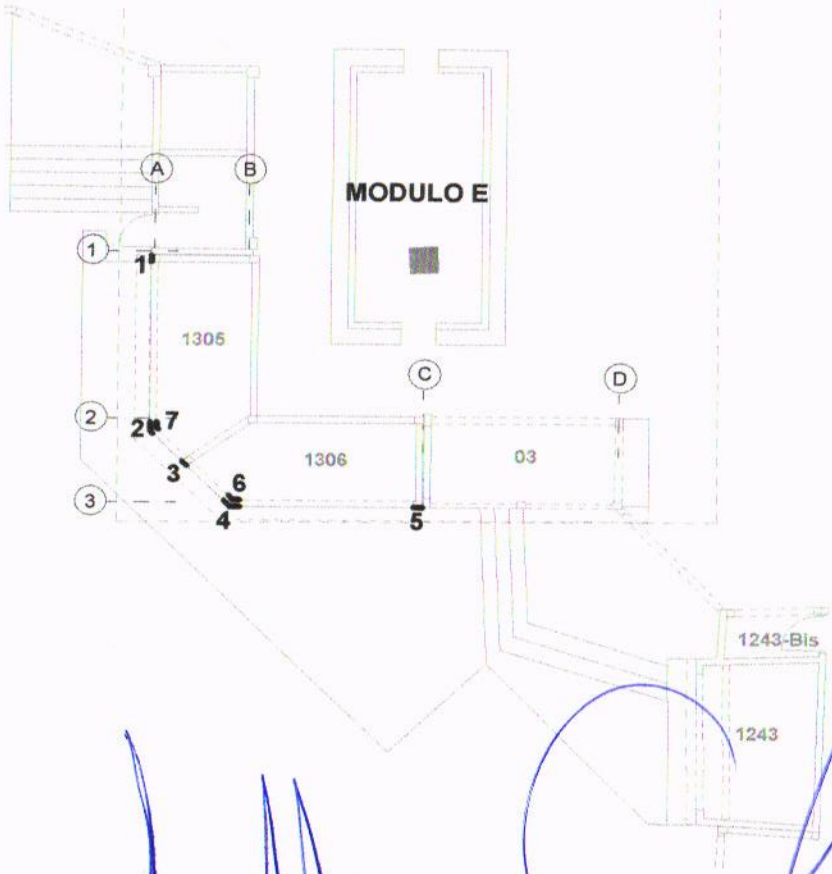

Losa

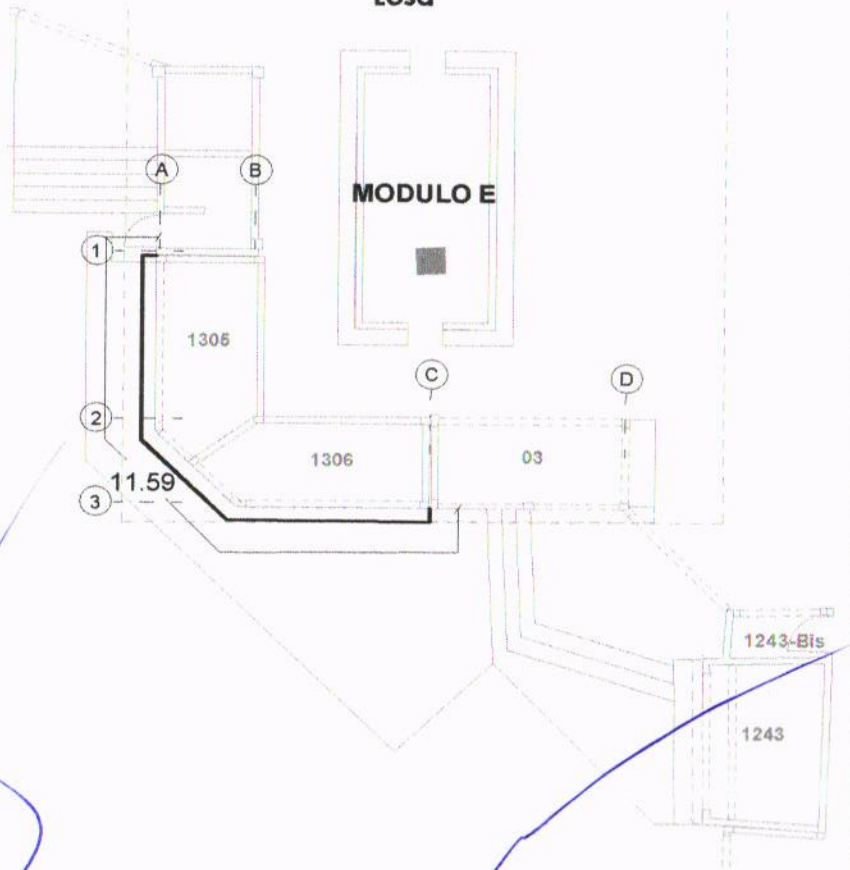

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .



A04	**ALBAÑILERIAS**
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .


SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
11-0218		

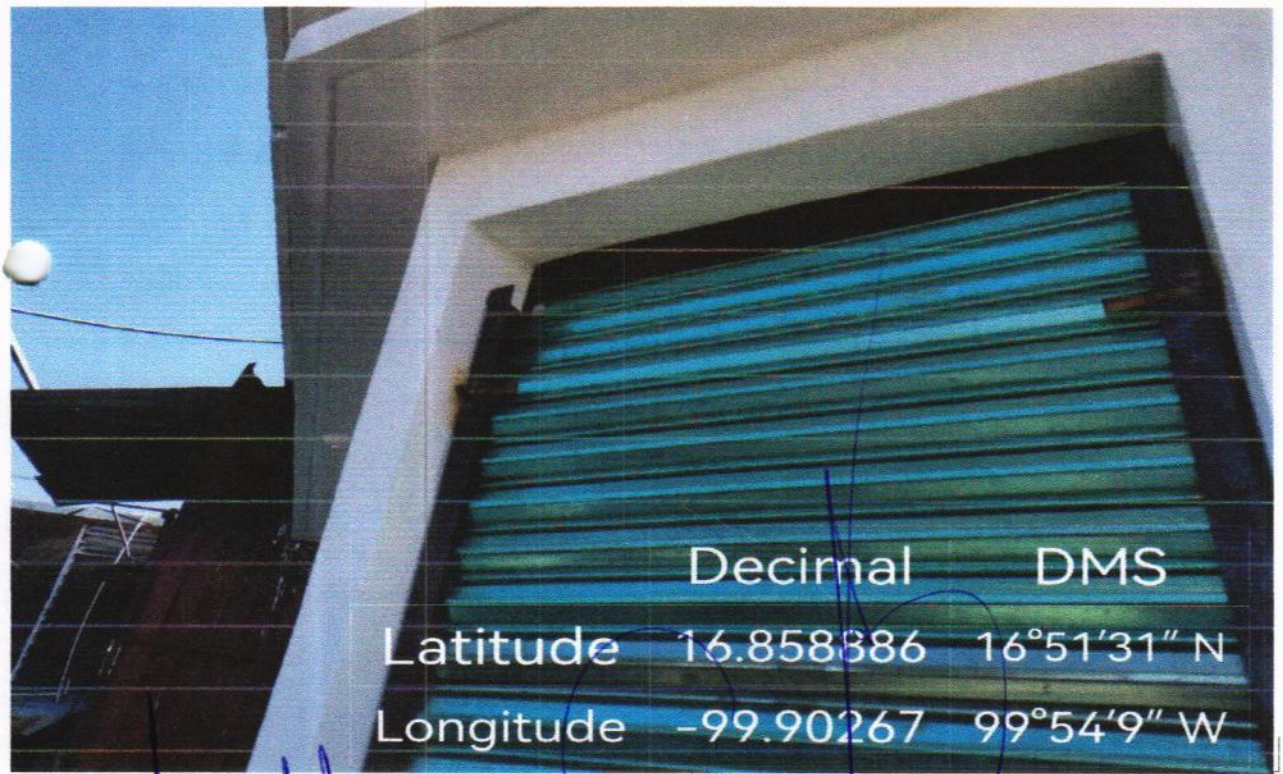

A04	**ALBAÑILERIAS**	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .
11-0218		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A04	**ALBAÑILERIAS**	Modulo E		Piso 1	8.42	1.00			8.42	
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	Modulo E		Piso 2	7.98	1.00			7.98	
		Modulo E		Piso 3	33.66	1.00			33.66	
		Modulo E		Piso 4	10.90	1.00			10.90	
		Modulo B		Piso 5	5.18	1.00			5.18	
		Modulo B		Piso 6	1.08	1.00			1.08	
		Modulo B		Piso 7	2.38	3.87			9.21	
		Modulo B		Piso 8	4.74	1.00			4.74	
		Modulo C		Piso 9	120.64	1.00			120.64	
		Modulo D		Piso 10	84.87	1.00			84.87	
							TOTAL	**M2**	**286.68**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023


C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS

12-0239 PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.




Piso 1
AREA 1= 2.12 X 3.48= 7.38
AREA 2= (1.18 X 1.77)/2= 1.04
AREA TOTAL: **8.42 M2**

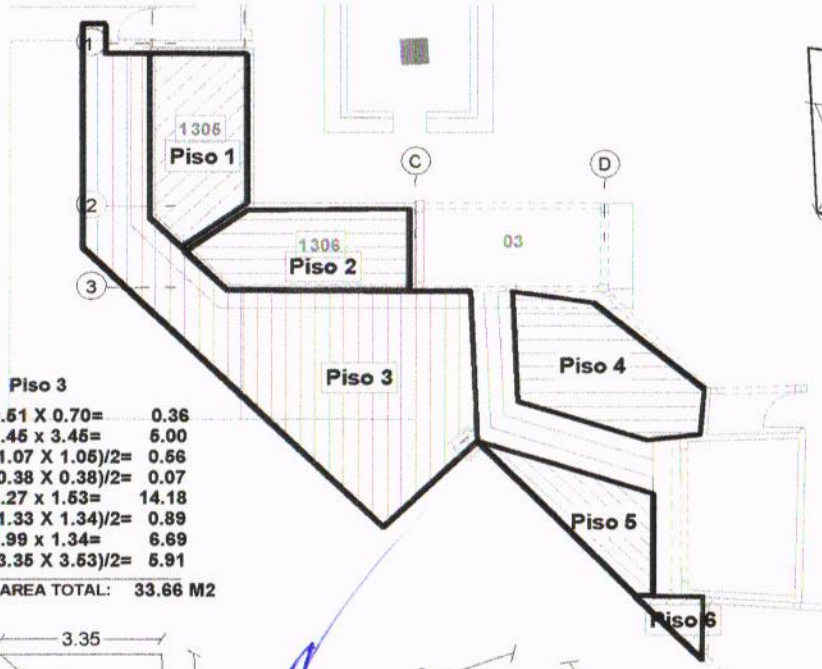


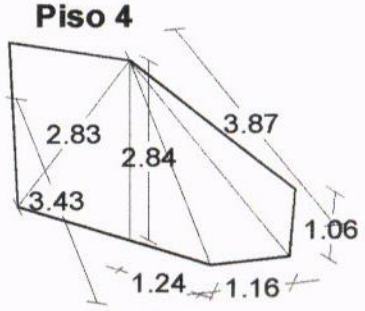


Piso 4
AREA 1= (2.83 X 3.43)/2= 4.85
AREA 2= (2.84 X 1.24)/2= 1.76
AREA 3= (3.87 X 1.16)/2= 2.24
AREA 4= (3.87 X 1.06)/2= 2.05
AREA TOTAL: **10.90 M2**



Piso 3
AREA 1= 0.51 X 0.70= 0.36
AREA 2= 1.45 x 3.45= 5.00
AREA 3= (1.07 X 1.05)/2= 0.56
AREA 4= (0.38 X 0.38)/2= 0.07
AREA 5= 9.27 x 1.53= 14.18
AREA 6= (1.33 X 1.34)/2= 0.89
AREA 7= 4.99 x 1.34= 6.69
AREA 8= (3.35 X 3.53)/2= 5.91
AREA TOTAL: **33.66 M2**




Piso 2
AREA 1= 3.46 X 1.91= 6.61
AREA 2= (1.67 X 1.64)/2= 1.37
AREA TOTAL: **7.98 M2**

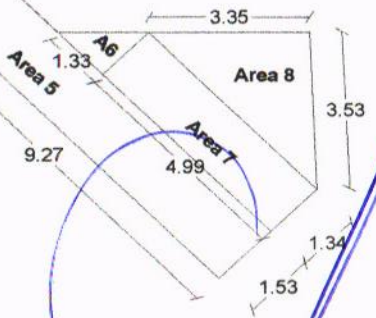



Piso 5
AREA 1= 2.40 X 0.36= 0.86
AREA 2= (2.40 X 3.60)/2= 4.32
AREA TOTAL: **5.18 M2**



Piso 6
AREA 1= (1.47 X 1.48)/2= 1.08
AREA TOTAL: **1.08 M2**

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023


C R O Q U I S


A04 ALBAÑILERIAS

12-0239 PISO DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

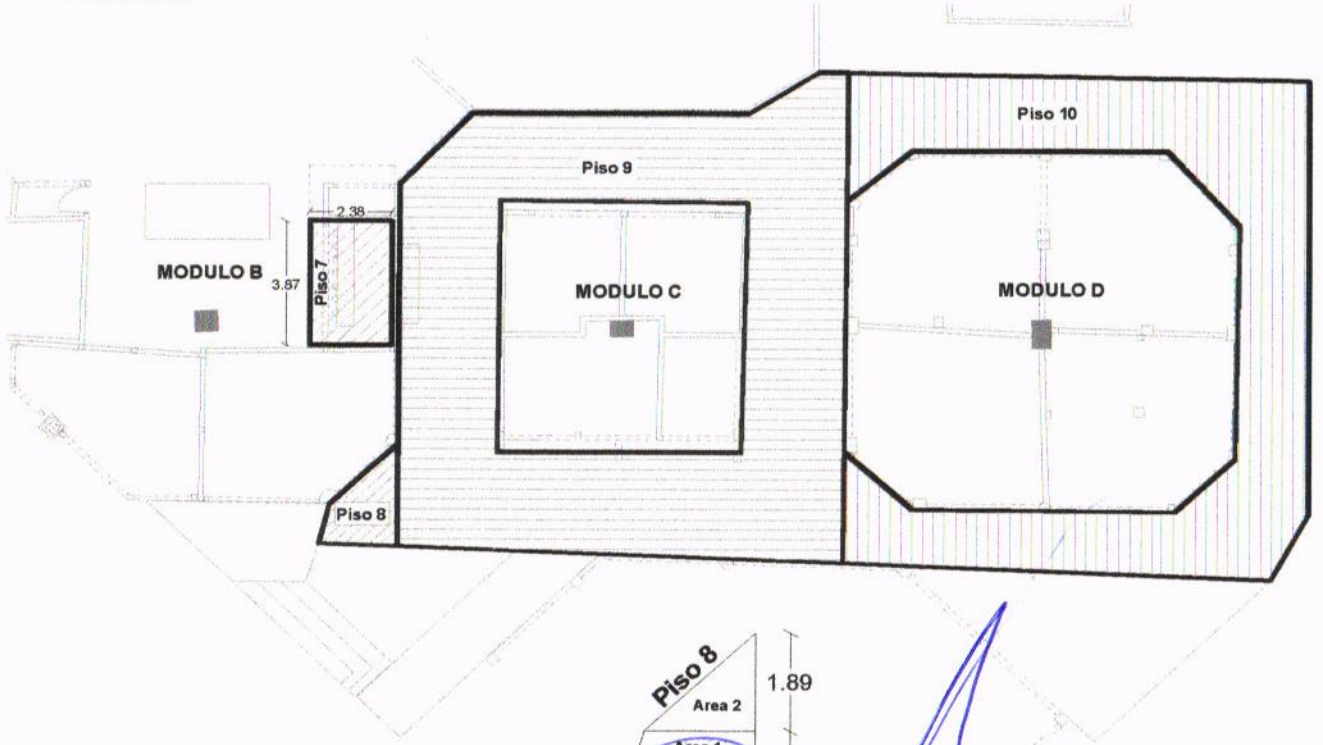

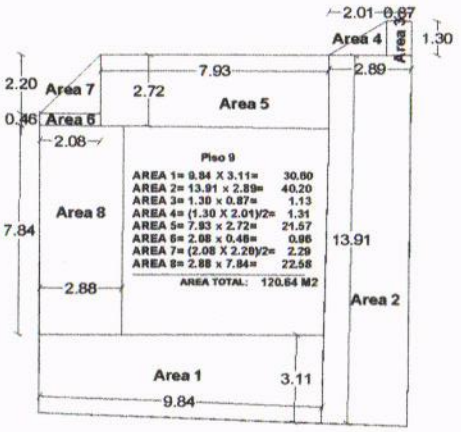

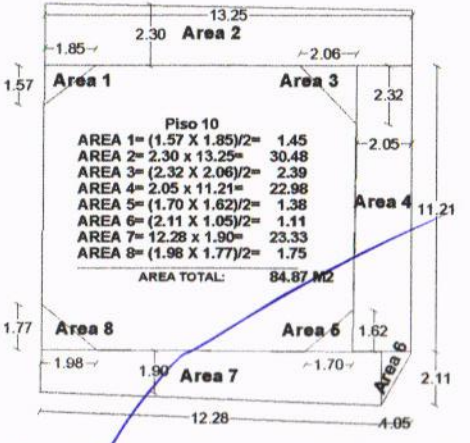



Piso 8

AREA 1= 2.13 X 1.28= 2.73

AREA 1= (2.13 X 1.89)/2= 2.01

AREA TOTAL: 4.74 M2

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M., JUNTAS FRIAS.



A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M., JUNTAS FRIAS.


SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

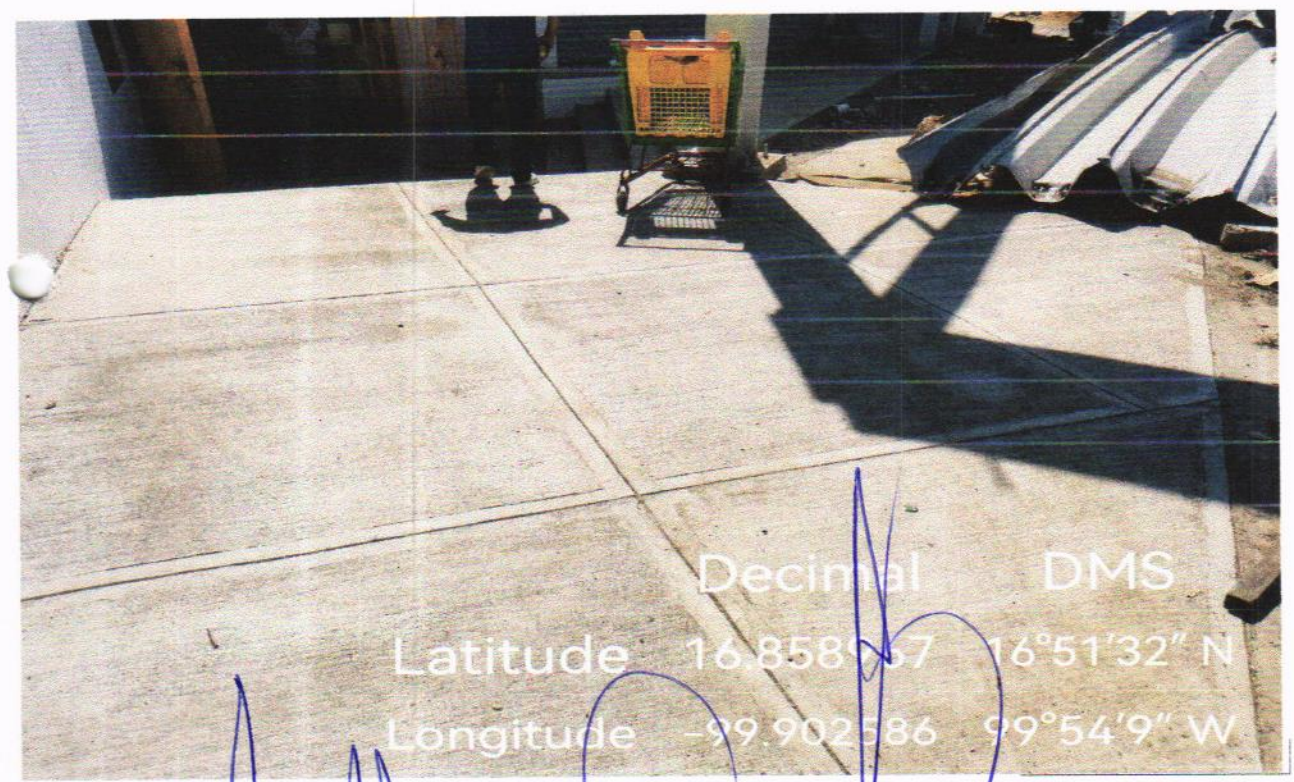

A04	**ALBAÑILERIAS**
12-0239	PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A04	**ALBAÑILERIAS**										
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.			**Escalon 01**		7.52				7.52	
				Escalon 02		6.91				6.91	
				Escalon 03		6.29				6.29	
							TOTAL	**ML**		**20.72**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A04 ALBAÑILERIAS

14-0264* FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.

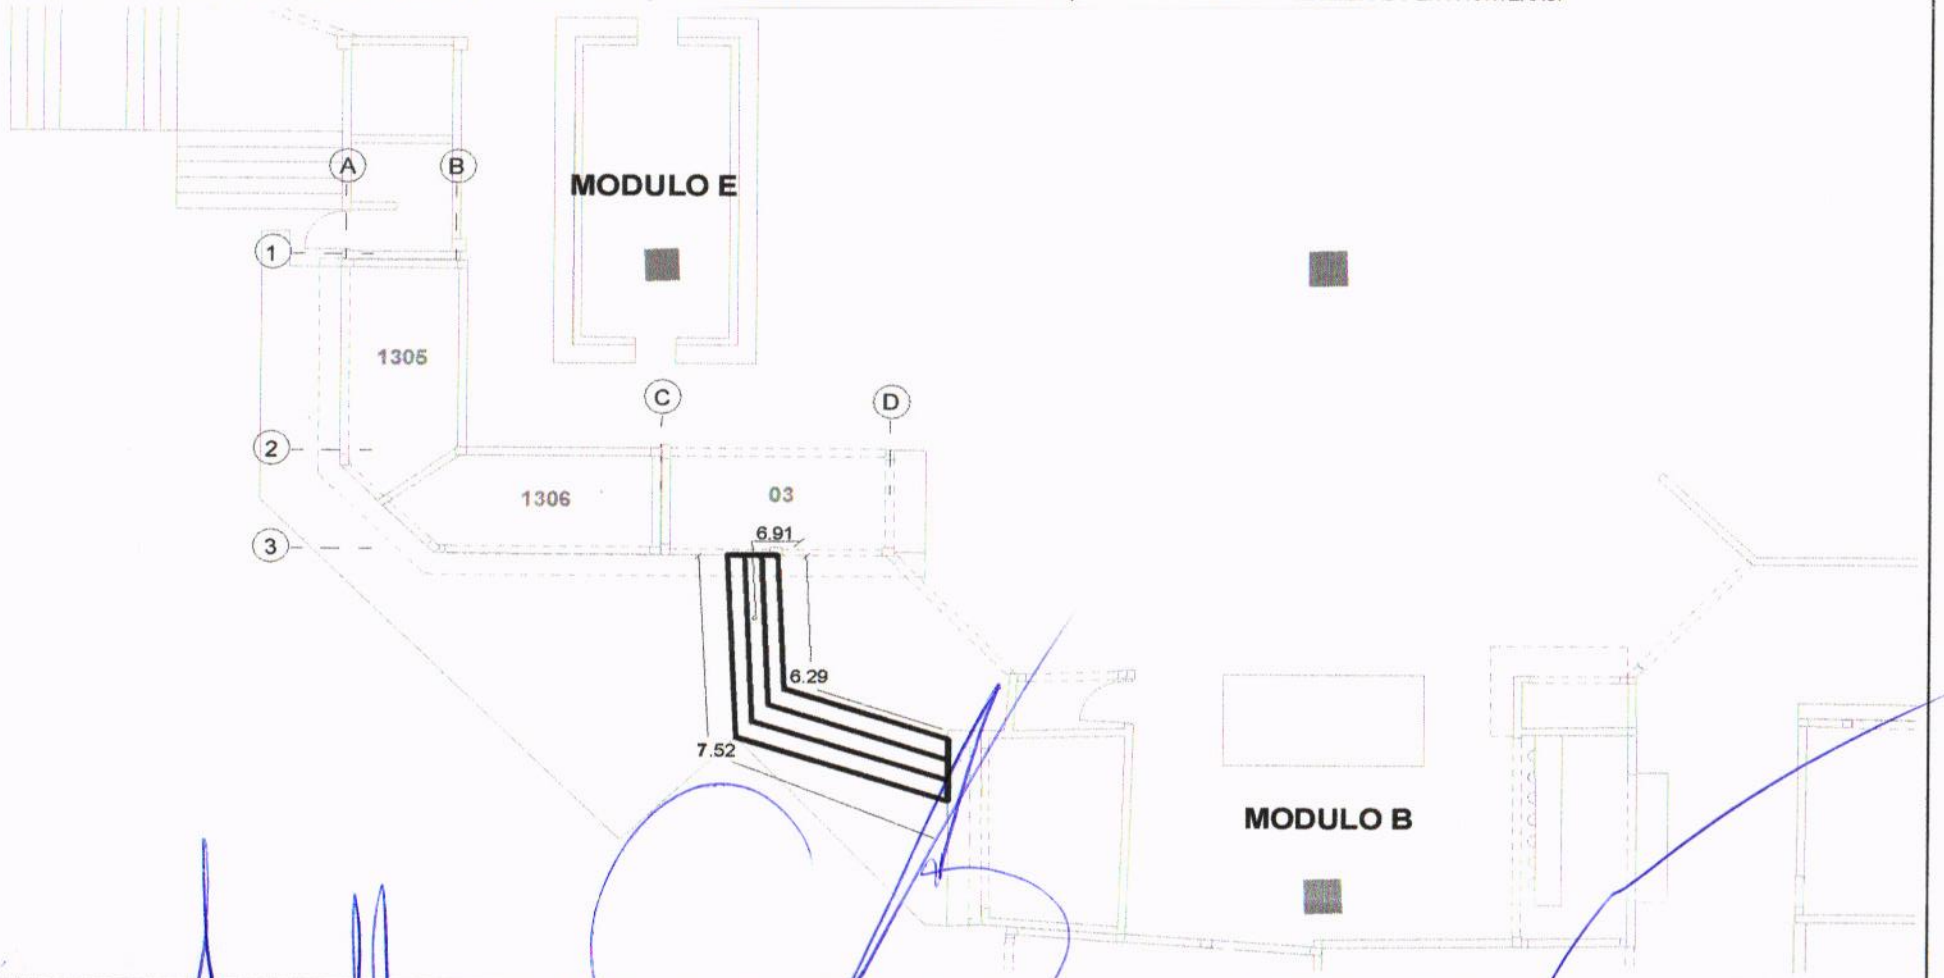

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

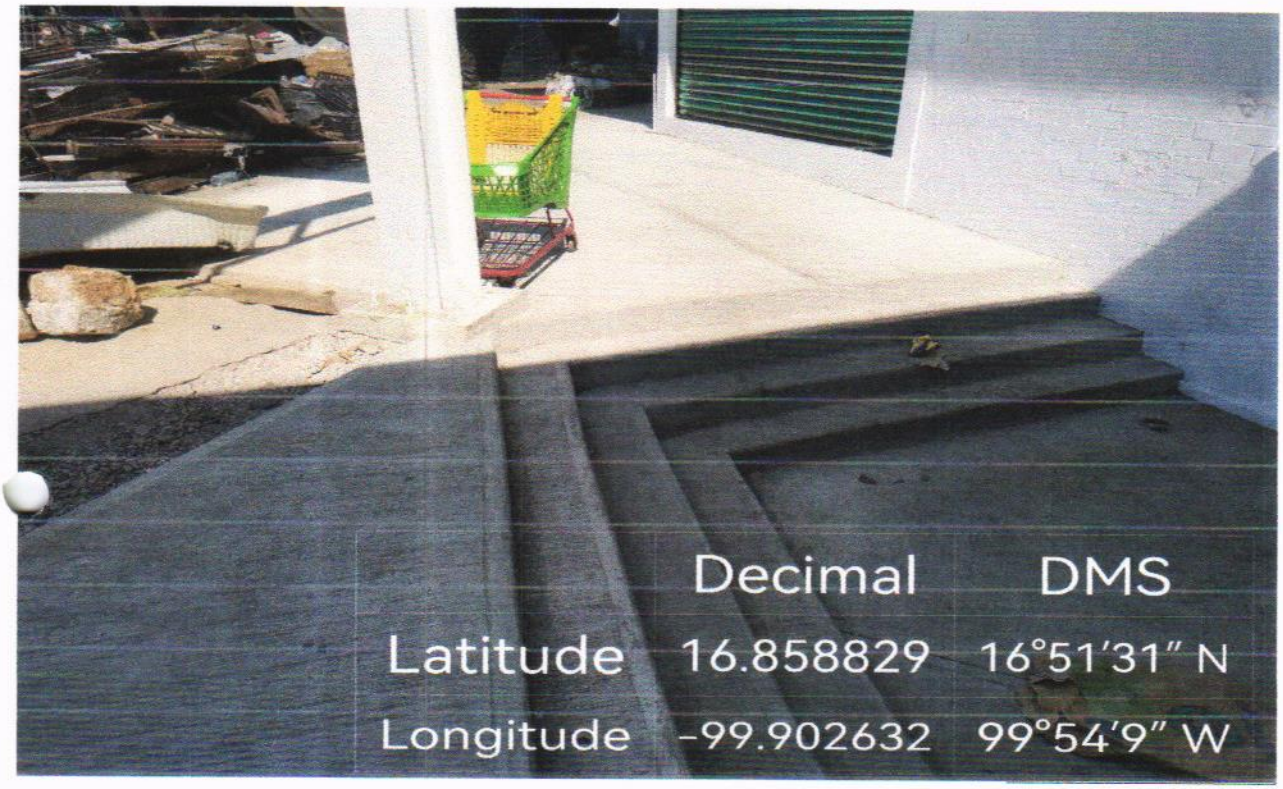

A04	ALBAÑILERIAS	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264*		




A04	ALBAÑILERIAS	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
14-0264*		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

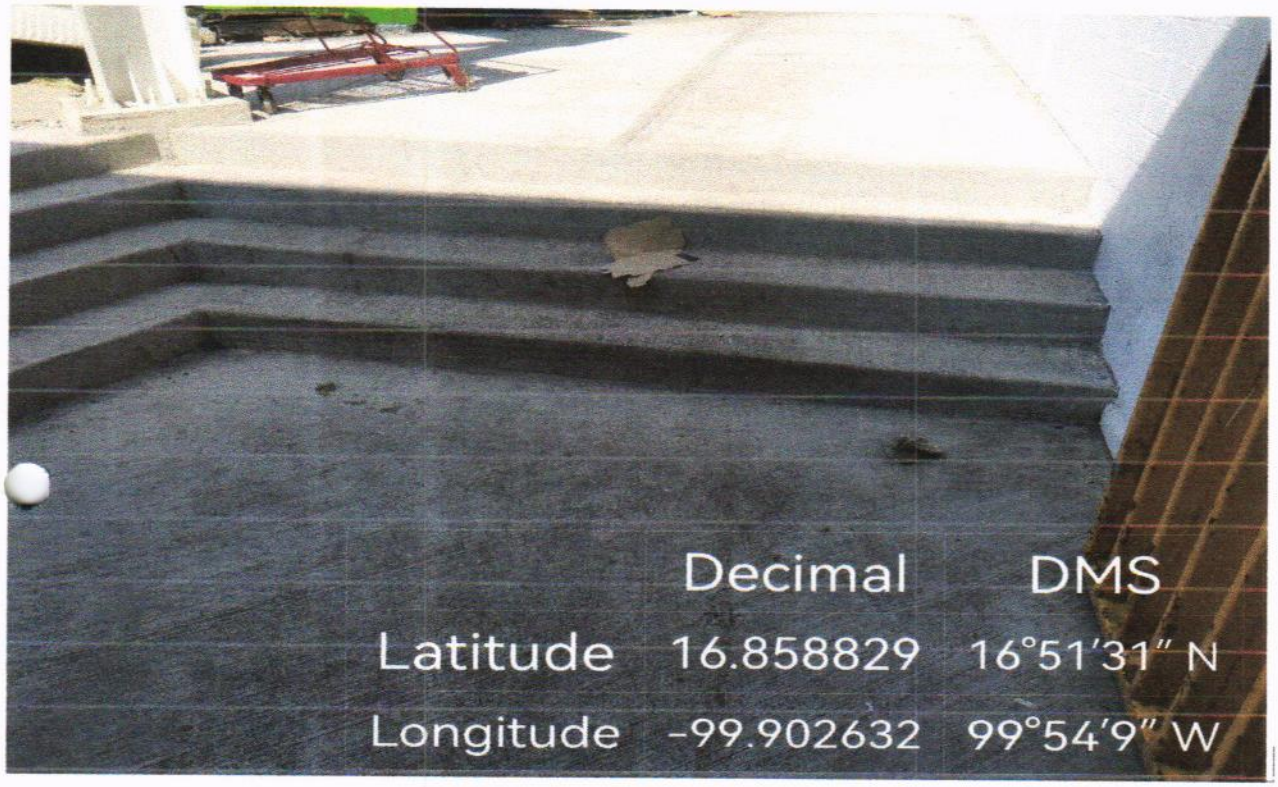

A04	ALBAÑILERIAS	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
	14-0264*	



A04	ALBAÑILERIAS	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.
	14-0264*	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS				Largo	Alto				
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	Modulo D	1989		3.25	1.85			6.01	
		Modulo D	1989		2.64	1.85			4.88	
		Modulo D	1989		3.31	1.85			6.12	
		Louvers en Sombrilla		Modulo B	33.14	1.05			34.80	
				Modulo F	24.00	1.05			25.20	
							TOTAL	M2	77.01	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

HERR-01-LOUV PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

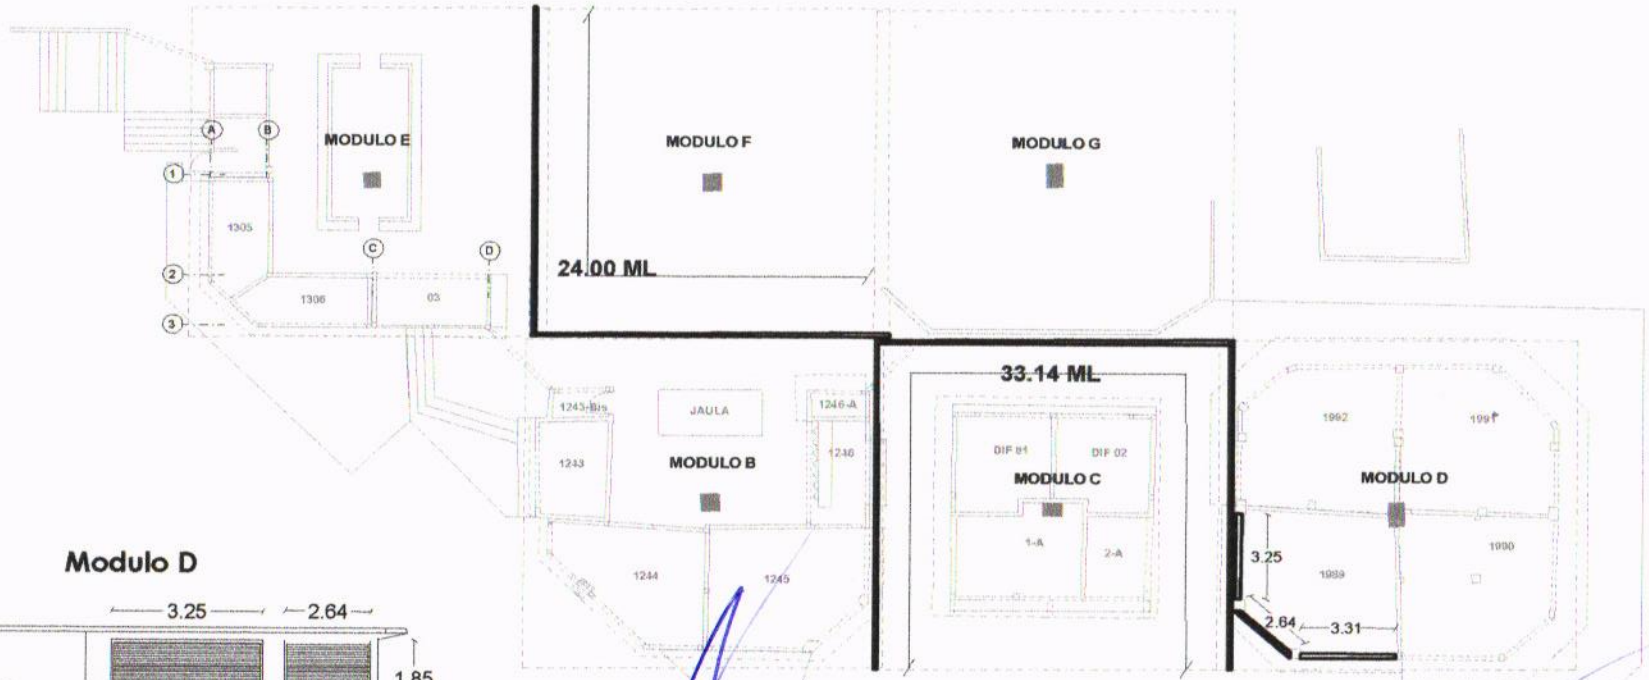

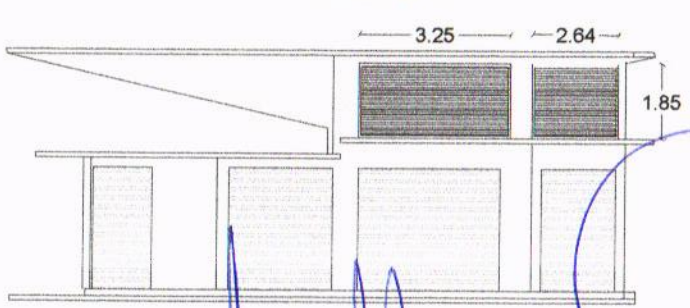

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

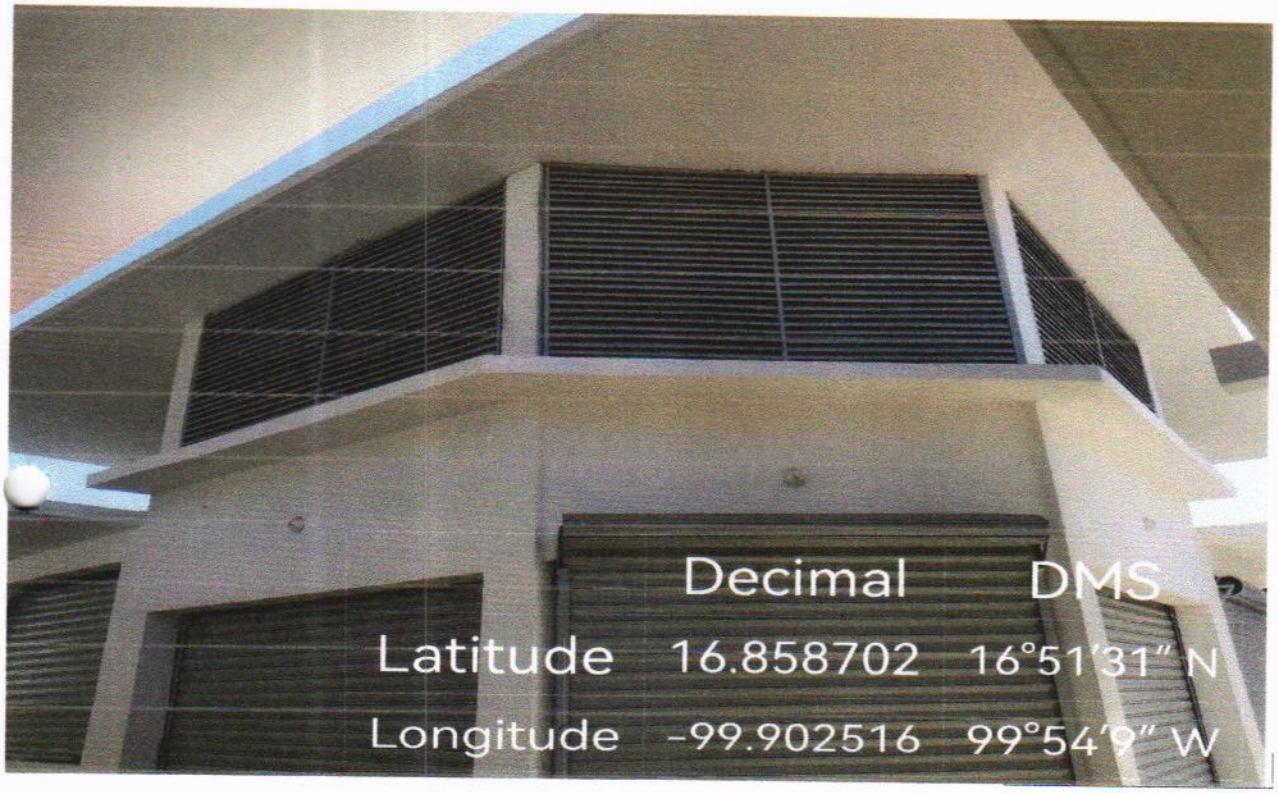

A05	**ACABADOS**	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
HERR-01-LOUV		

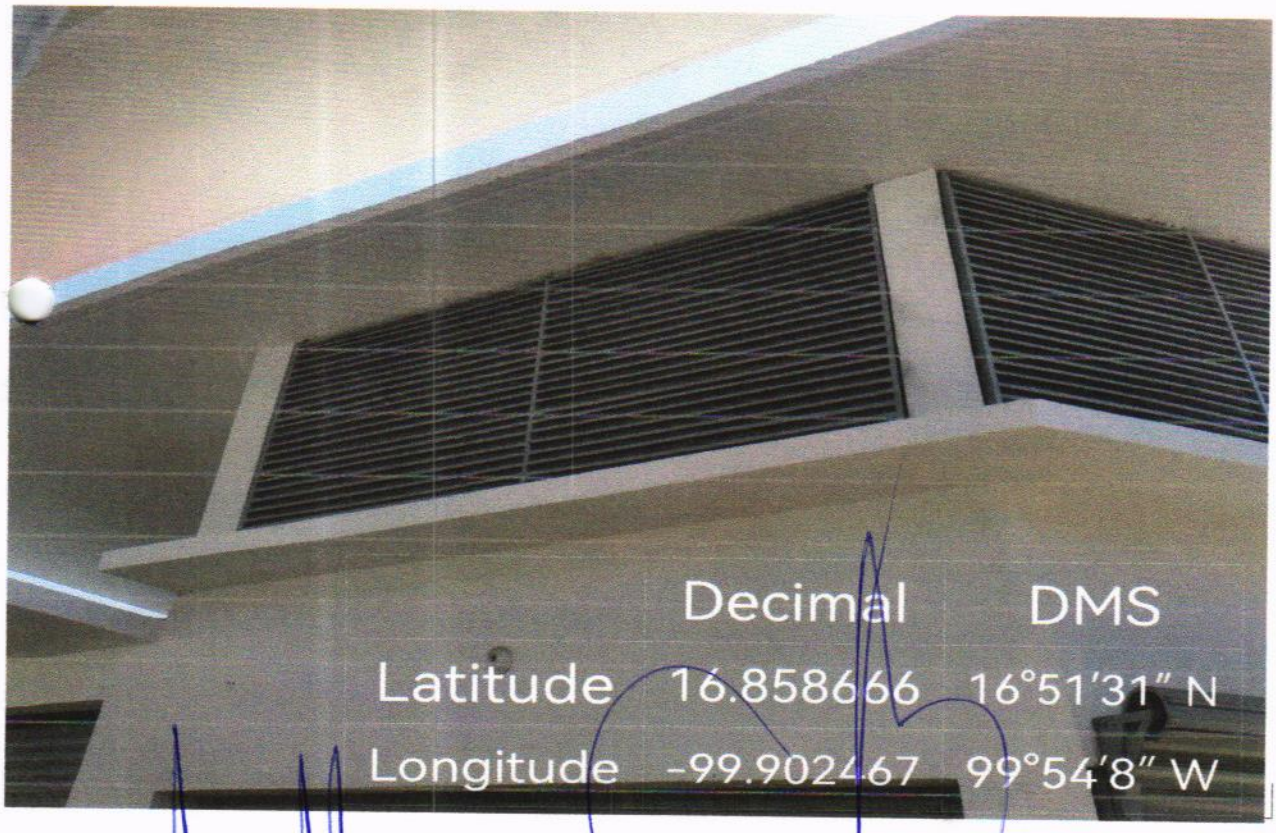

A05	**ACABADOS**	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
HERR-01-LOUV		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS									
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	Modulo E	Cortina 01		3.50		2.50		8.75	
		Modulo E	Cortina 02		1.10		2.50		2.75	
		Modulo E	Cortina 03		1.10		2.50		2.75	
		Modulo E	Cortina 04		3.50		2.50		8.75	
							TOTAL	M2	23.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

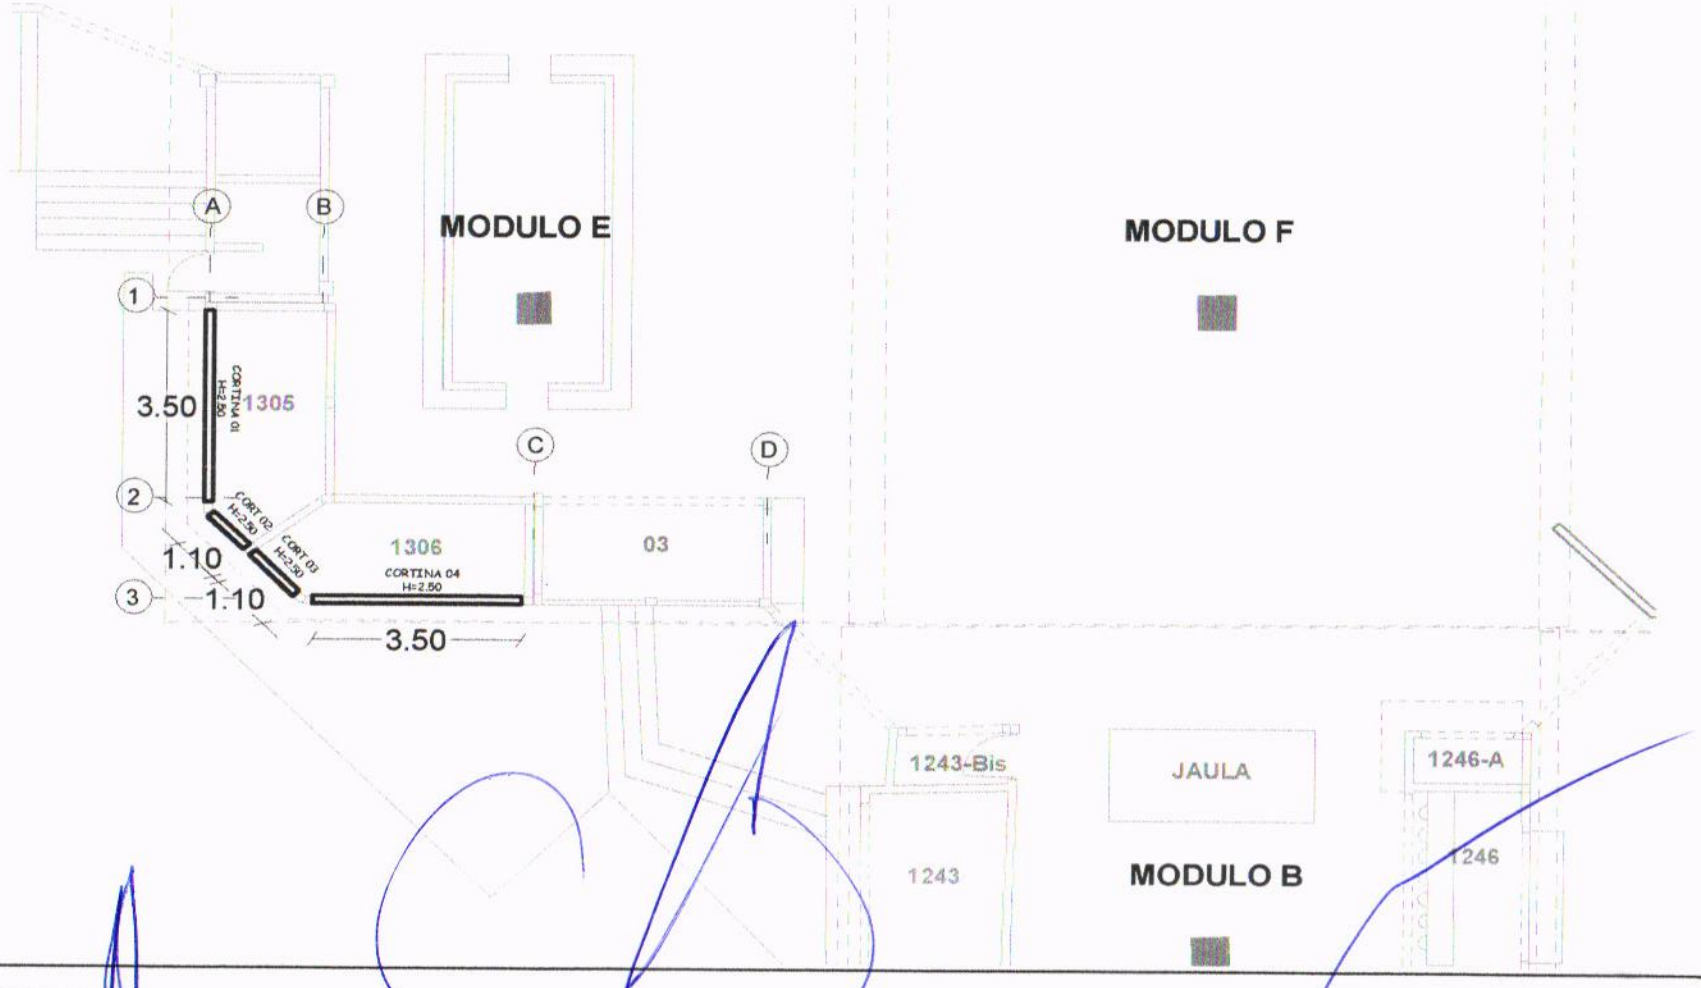

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

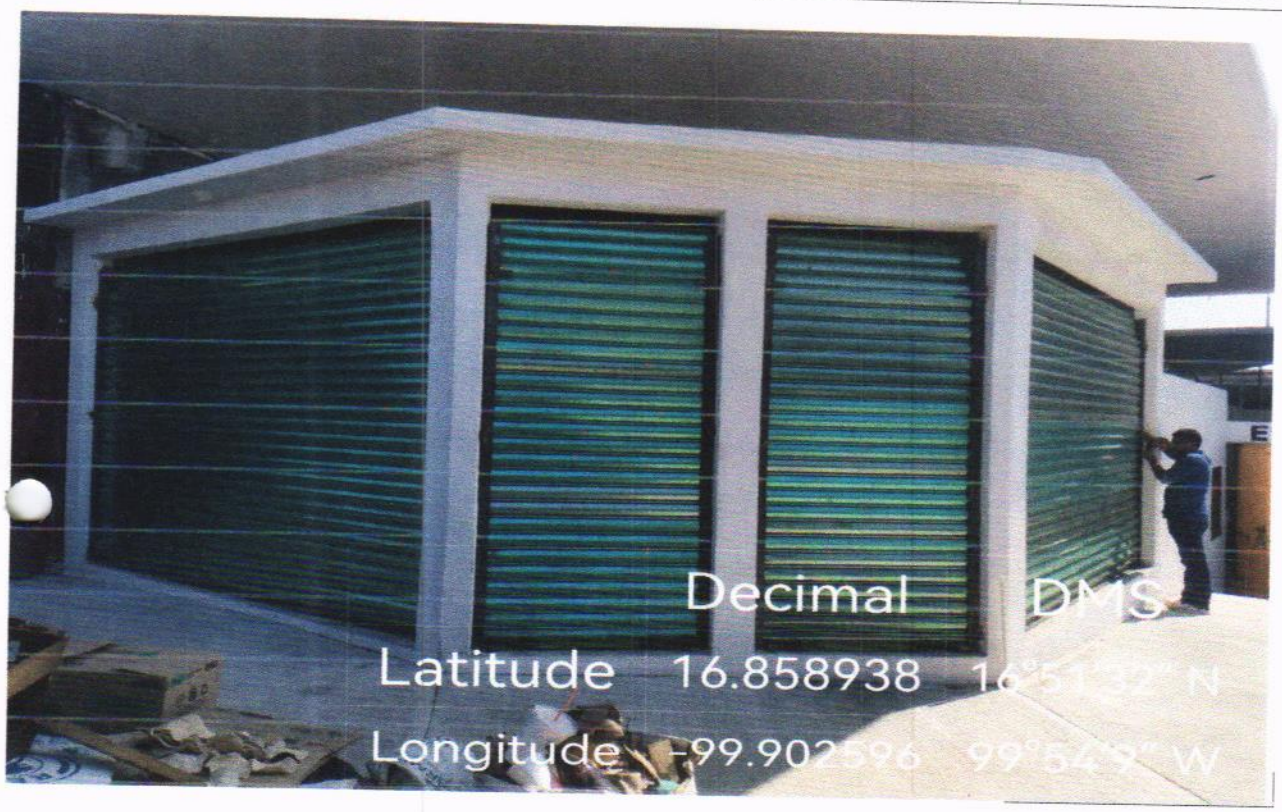

A05	**ACABADOS**
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

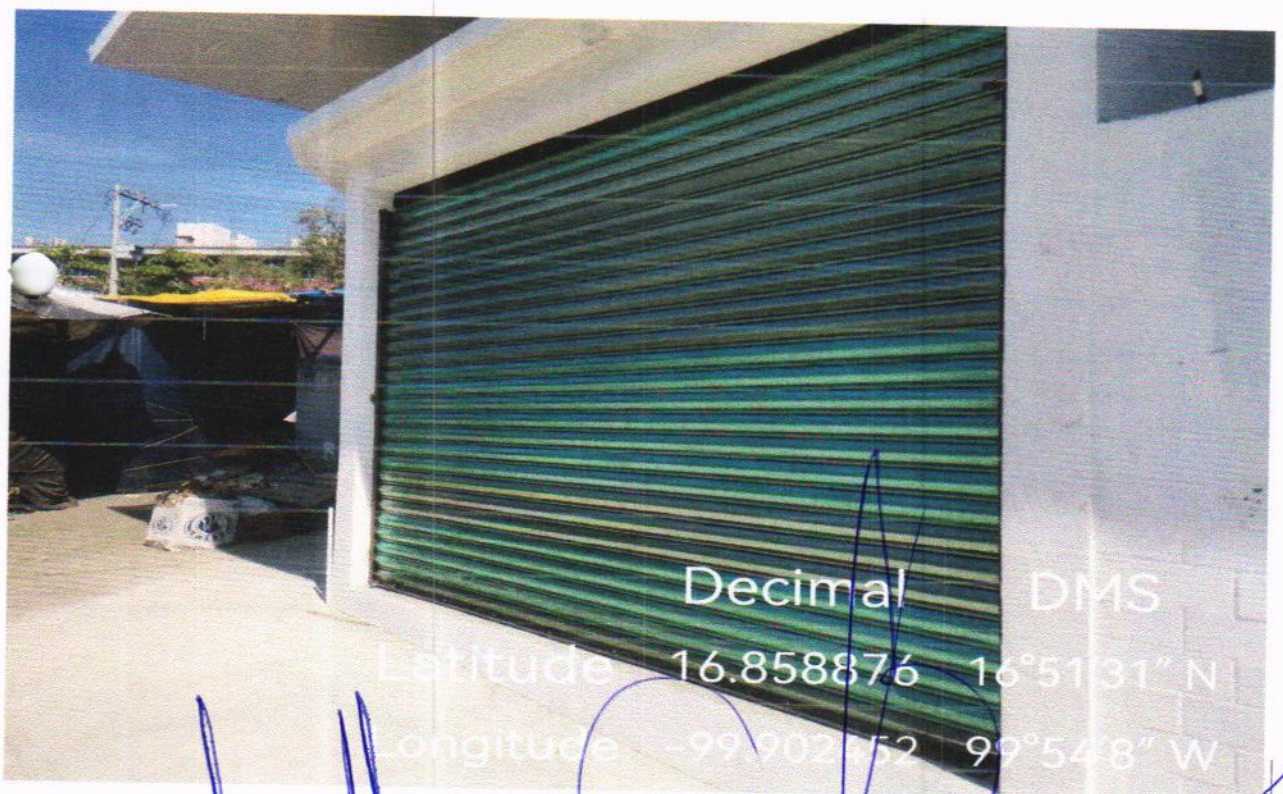

A05	**ACABADOS**
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A05	**ACABADOS**				**Largo**	**Ancho**	**Pza**			
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	Modulo E		Losa	22.08	1.00	1.00		22.08	
			Pintura en Boquilla de Losa		14.29	0.10	1.00		1.43	
		Sombrilla B, C, D, E, F, G			13.00	13.00	6.00		1014.00	
		Pintura en Boquillados			50.00	0.10	6.00		30.00	
		Columna E			3.80	2.40	1.00		9.12	
		Columna F			4.80	2.68	1.00		12.86	
		Columna G			3.80	3.00	1.00		11.40	
		Muro			**Largo**	**Alto**	**Pza**			
		1	A-B	Int	2.12	2.70	1.00		5.72	
		2	B-C	Int	3.49	2.70	1.00		9.42	
		B	1-2	Int	3.63	2.70	1.00		9.80	
		C	2-3	Int	2.06	2.70	1.00		5.56	
		A-B	2-3	Int-Ext	1.78	2.70	2.00		9.61	
		2	B-C	Ext	3.49	3.95	1.00		13.79	
		3	C-D	Ext	4.15	2.50	1.00		10.38	
		B	1-2	Ext	3.63	3.95	1.00		14.34	
		C	2-3	Ext	2.06	1.25	1.00		2.58	
							SUBTOTAL 01:	**M2**	**1,182.09**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS	Trabes			Largo	Alto	Pza			
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	Vanos		Cortinas	2.50	0.20	5.00		2.50	
		A	1-2	Cerramiento	3.63	0.20	3.00		2.18	
		3	B-C	Cerramiento	3.65	0.20	3.00		2.19	
		2-3	A-B	Cerramiento	1.10	0.20	3.00		0.66	
		2-3	A-B	Cerramiento	1.10	0.20	3.00		0.66	
		A	1-2	Desplante	3.98	0.20	1.00		0.80	
		2-3	A-B	Desplante	2.42	0.20	1.00		0.48	
		3	B-C	Desplante	4.05	0.20	1.00		0.81	
		1-3	A-C	Castillos	2.90	0.20	7.00		4.06	
							Subtotal 02:		14.34	
							TOTAL	M2	1,196.43	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

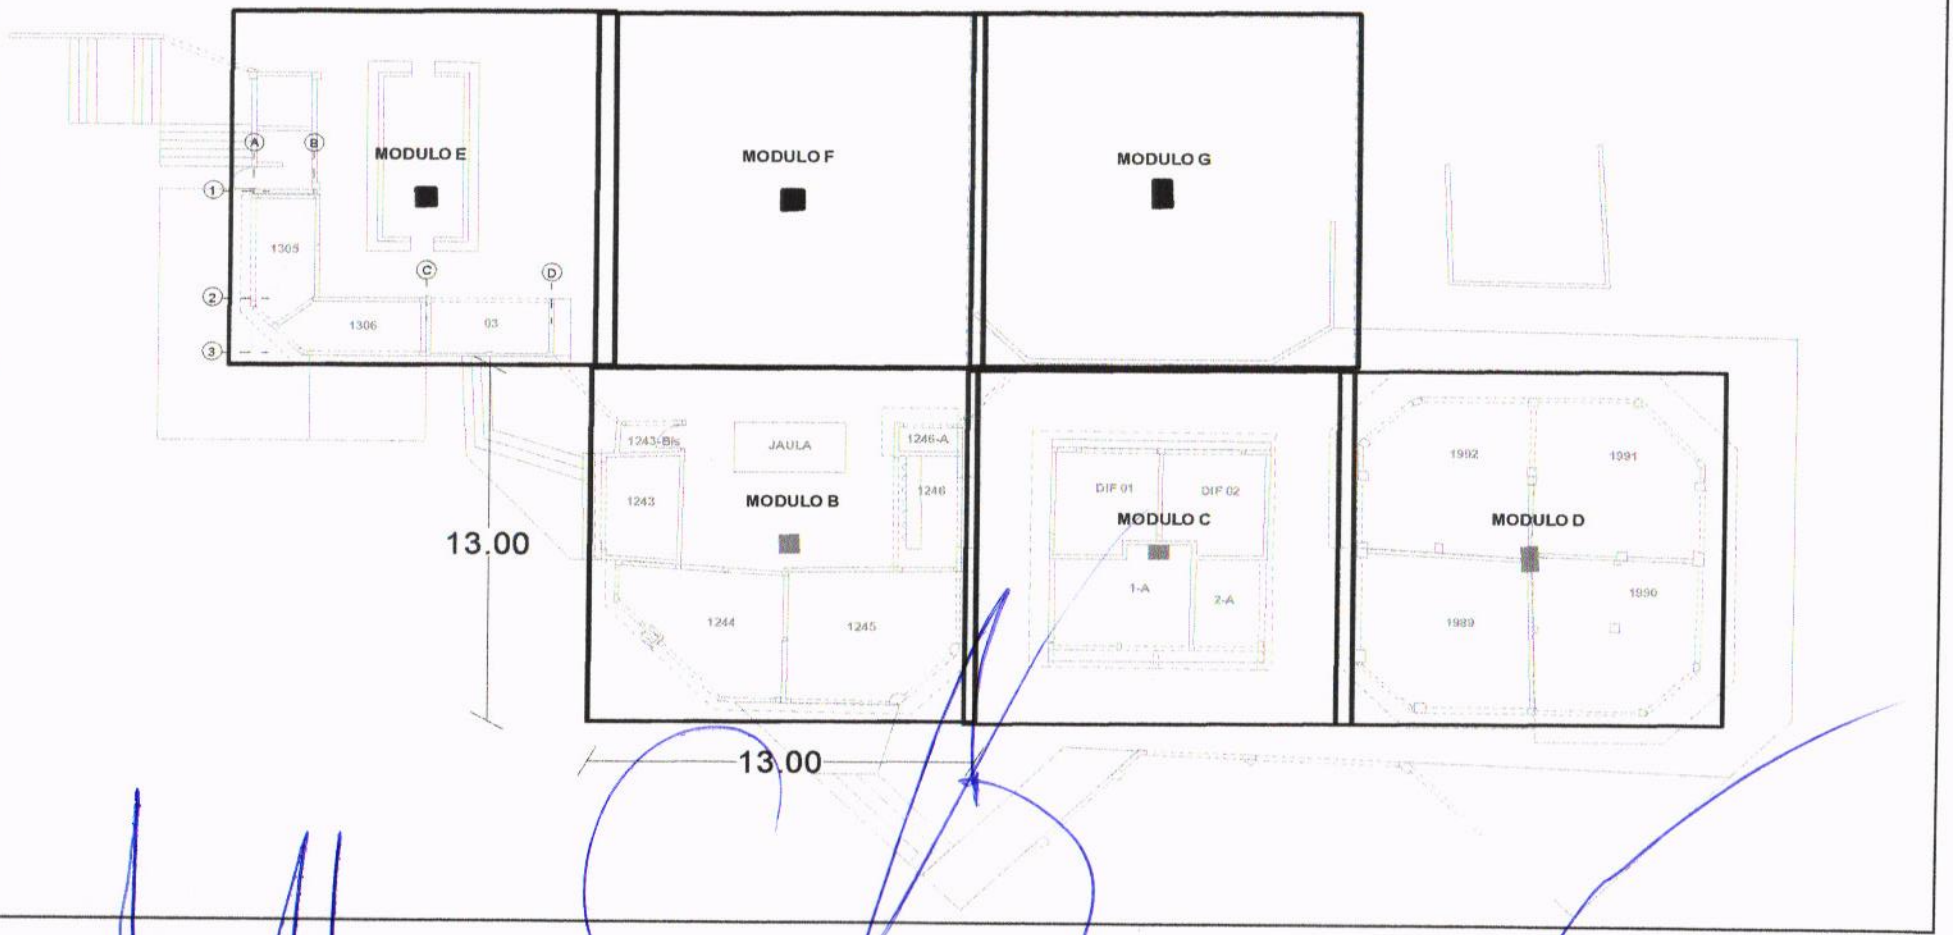

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

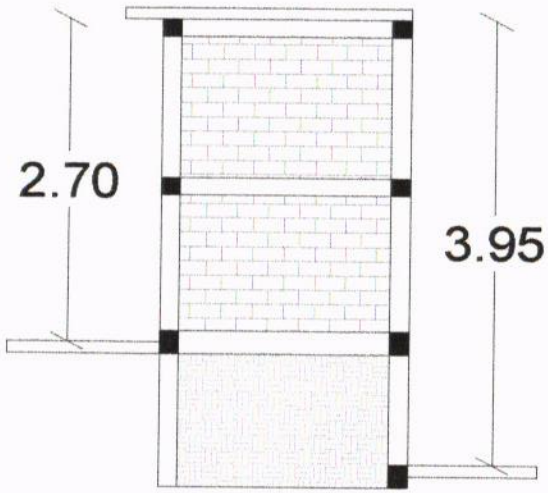

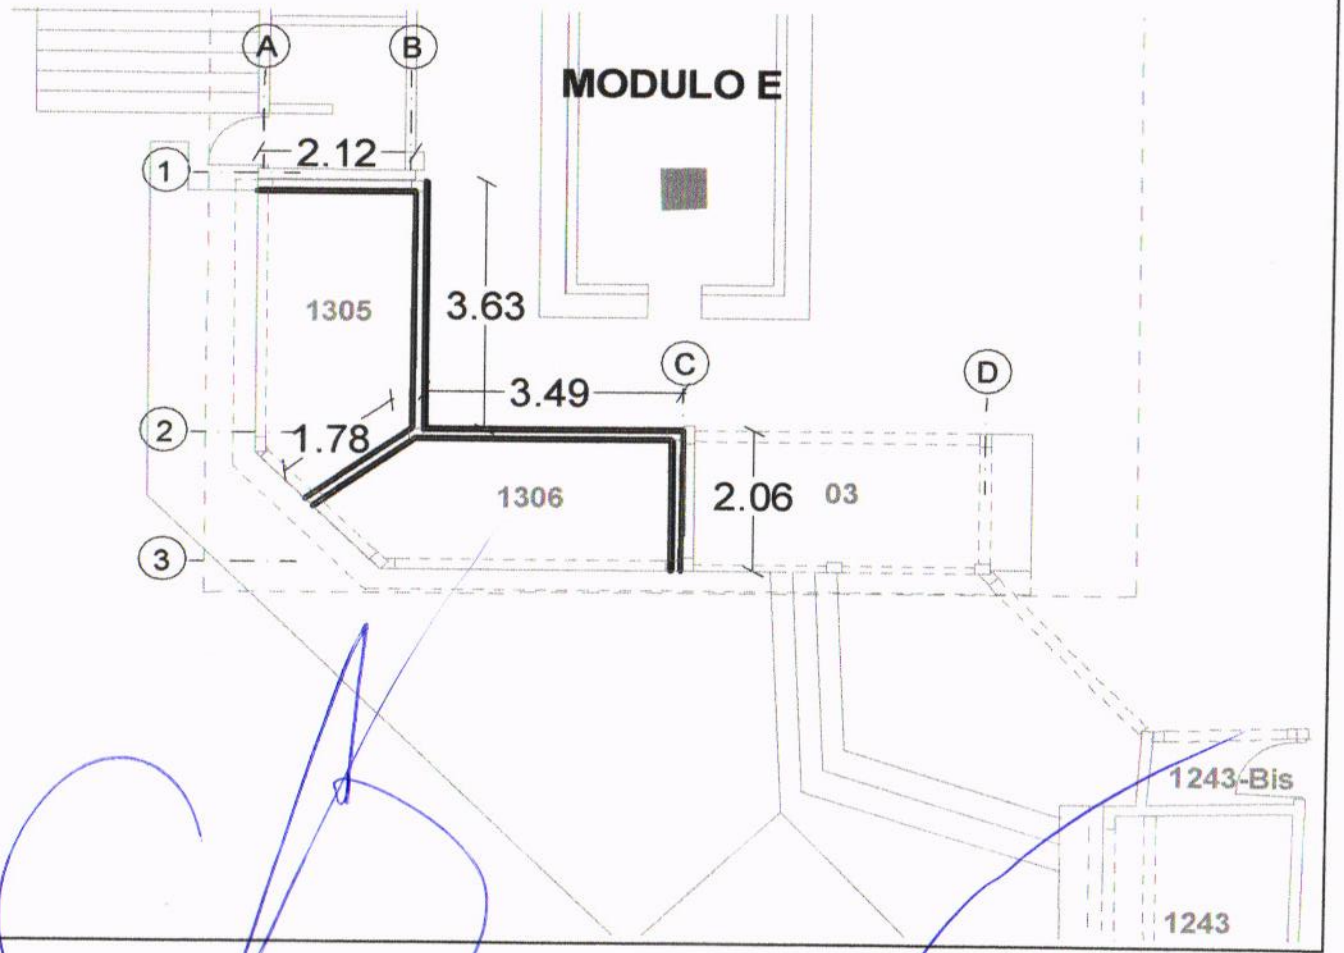

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

ACAPULCO SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS


22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

LOSA

AREA 1: 2.57 X 4.18 = 10.74
AREA 2: 3.49 X 2.38 = 8.31
AREA 3: 0.76 X 1.82 = 1.38
AREA 4: (1.81 X 1.82) /2 = 1.65

AREA TOTAL: 22.08 M2

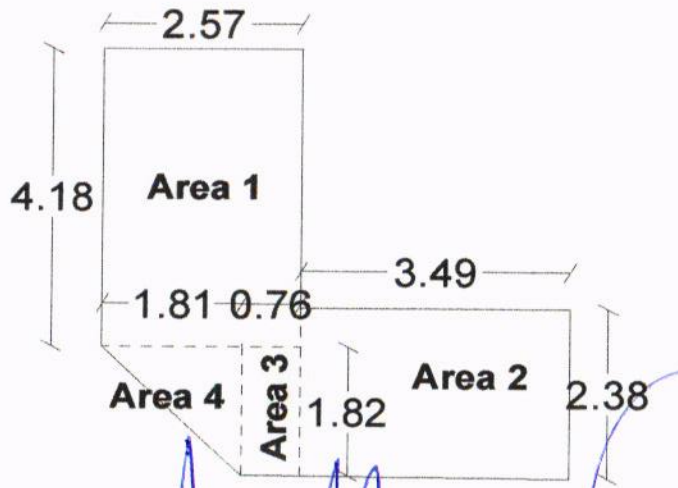

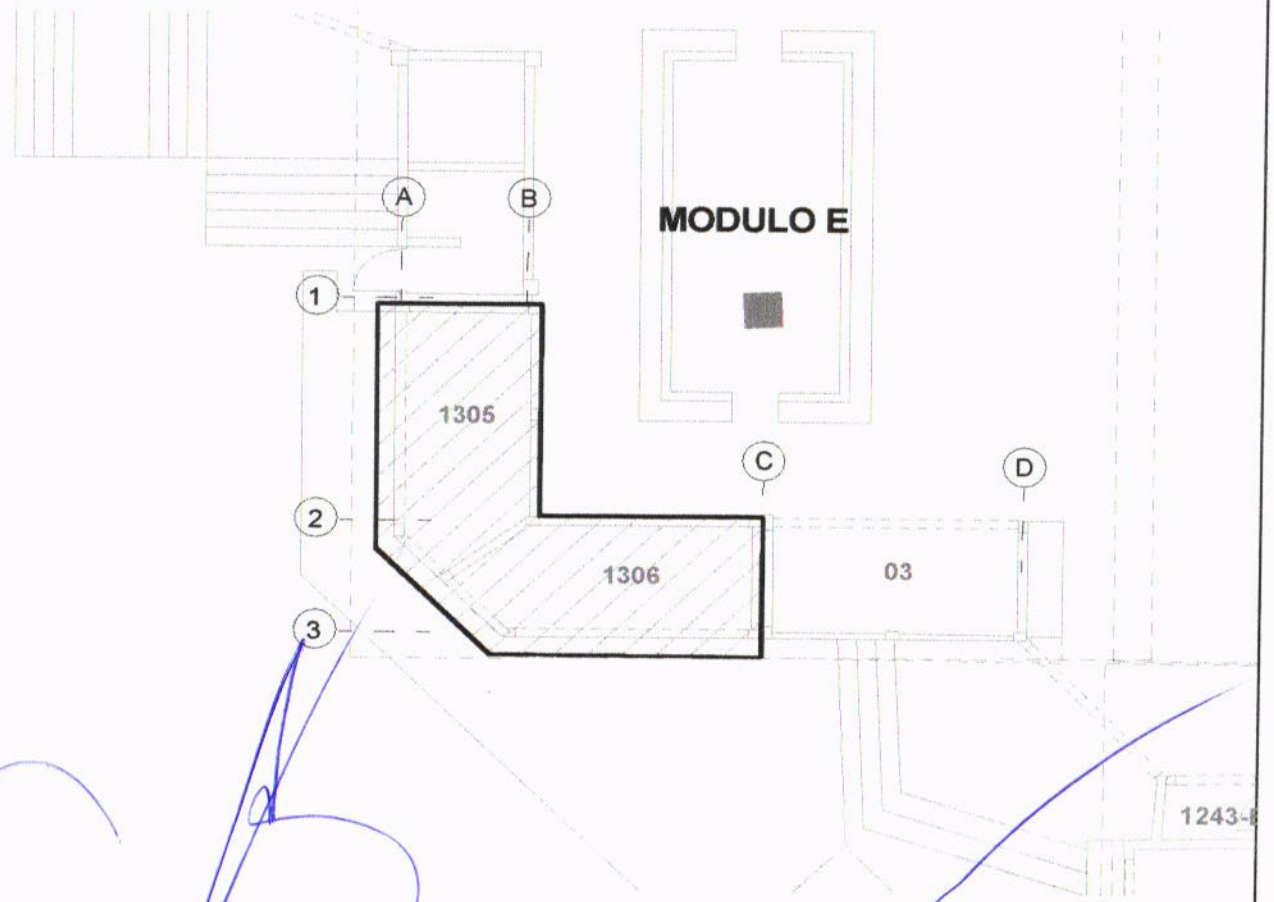

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

Cadena de desplante y Cortinas

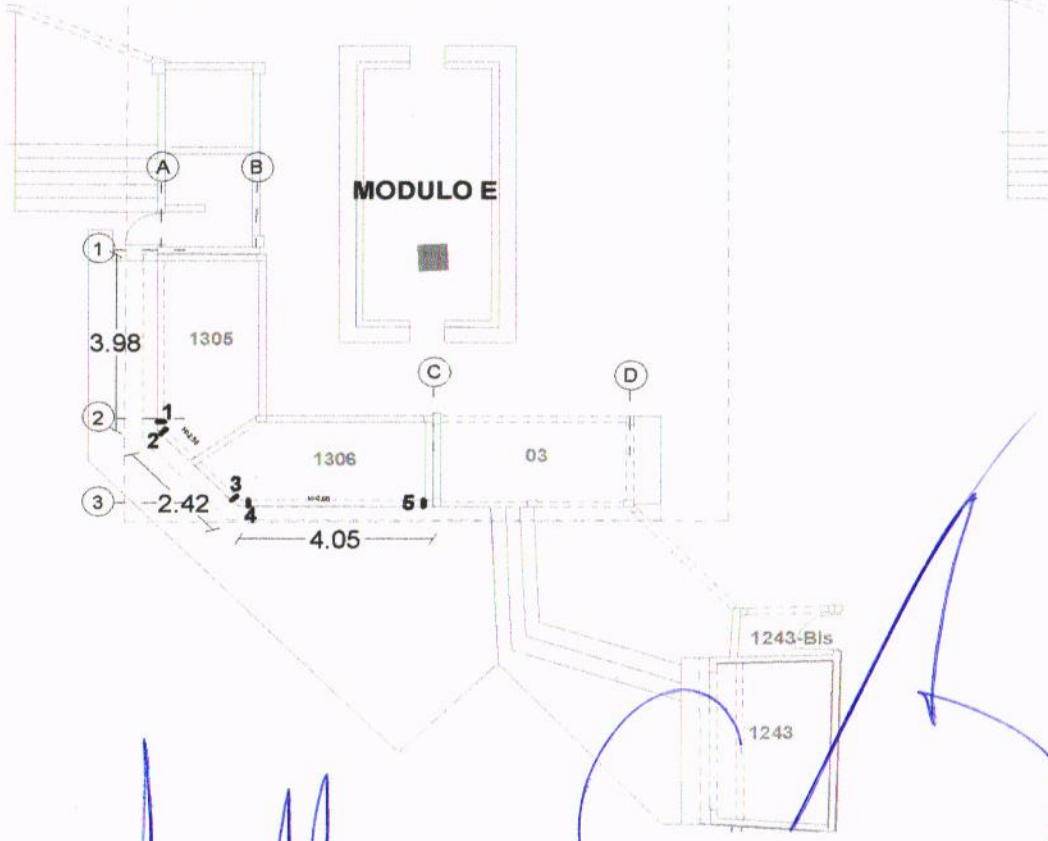

Cadenas de Cerramiento

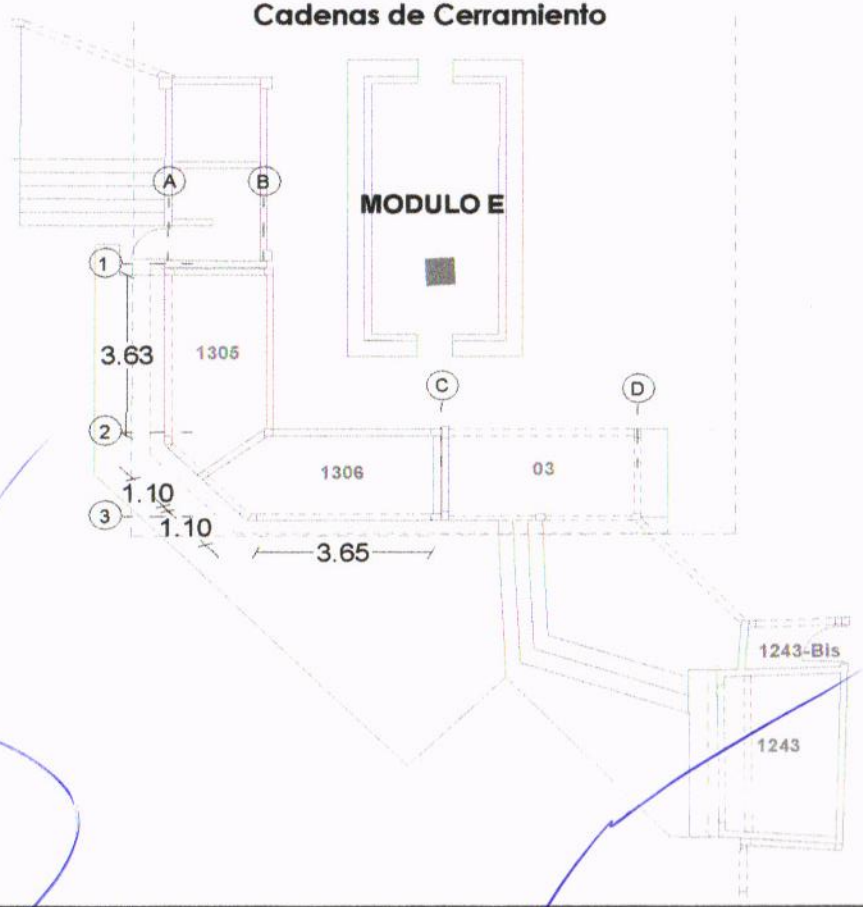

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

Castillos

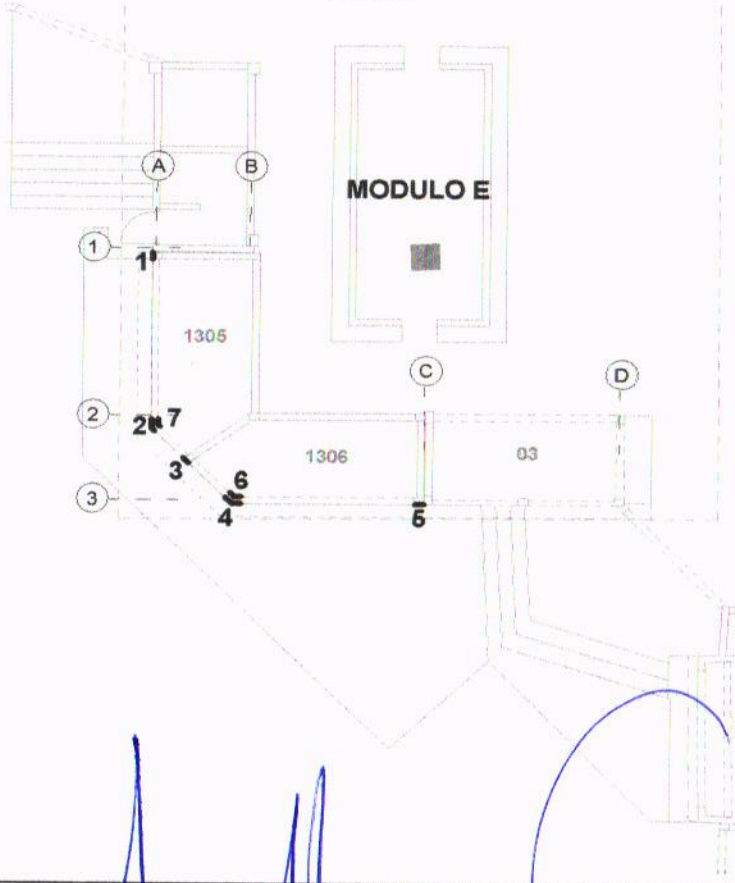

Losa

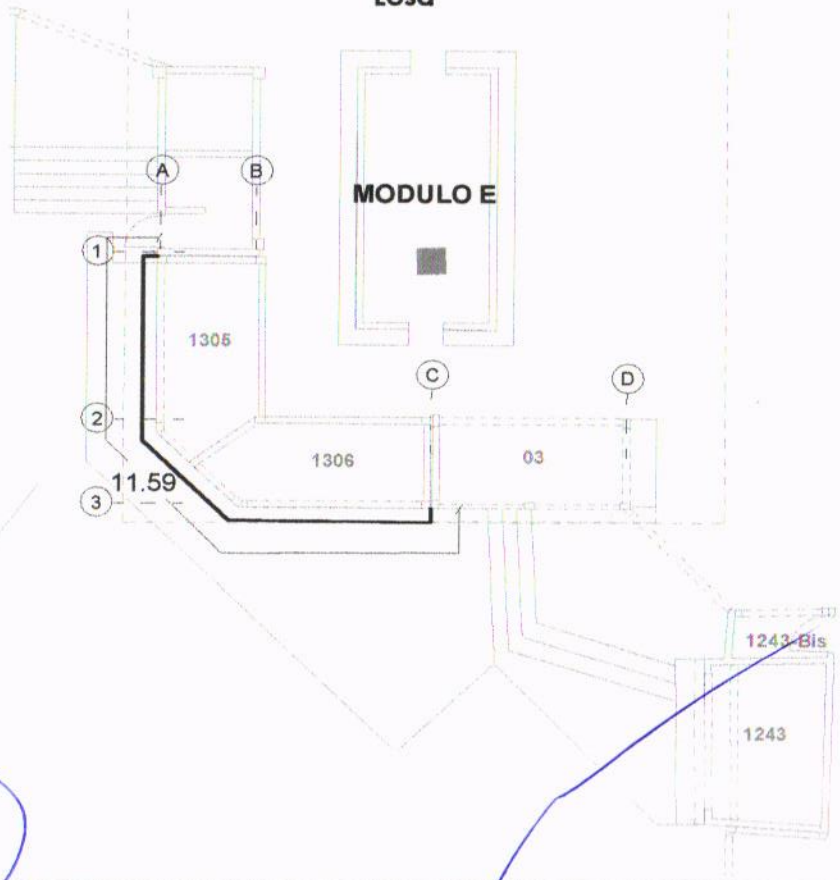

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A05	22-0327
ACABADOS	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

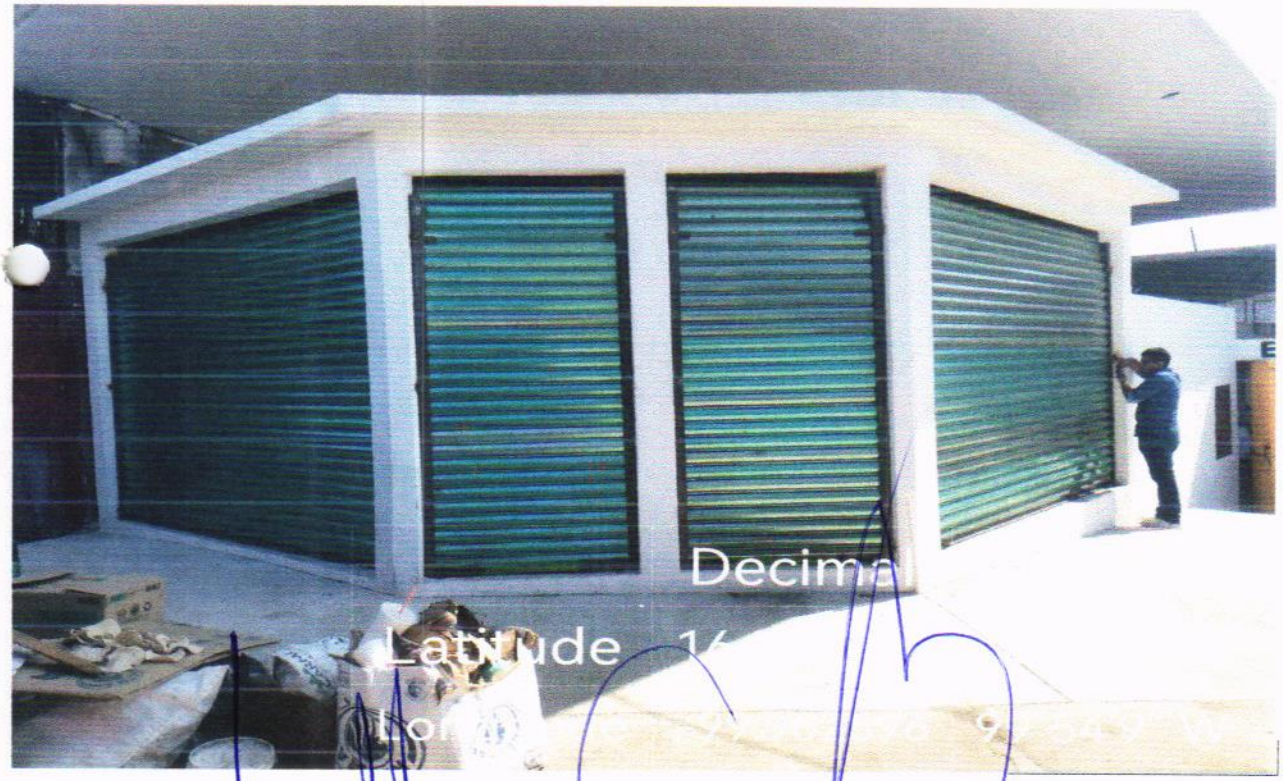

A05	22-0327
ACABADOS	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



ACABADOS	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
A05	22-0327



ACABADOS	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.
A05	22-0327

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A05	ACABADOS				Largo	Alto	Pza			
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	Modulo E	Cortina 01		3.50	2.50	2.00		17.50	
		Modulo E	Cortina 02		1.10	2.50	2.00		5.50	
		Modulo E	Cortina 03		1.10	2.50	2.00		5.50	
		Modulo E	Cortina 04		3.50	2.50	2.00		17.50	
		Louvers	1989		3.25	1.85	2.00		12.03	
		Louvers	1989		2.64	1.85	2.00		9.77	
		Louvers	1989		3.31	1.85	2.00		12.25	
		Louvers en Sombrilla		Modulo B	33.14	1.05	2.00		69.59	
				Modulo F	24.00	1.05	2.00		50.40	
							TOTAL	M2	200.04	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A05 ACABADOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

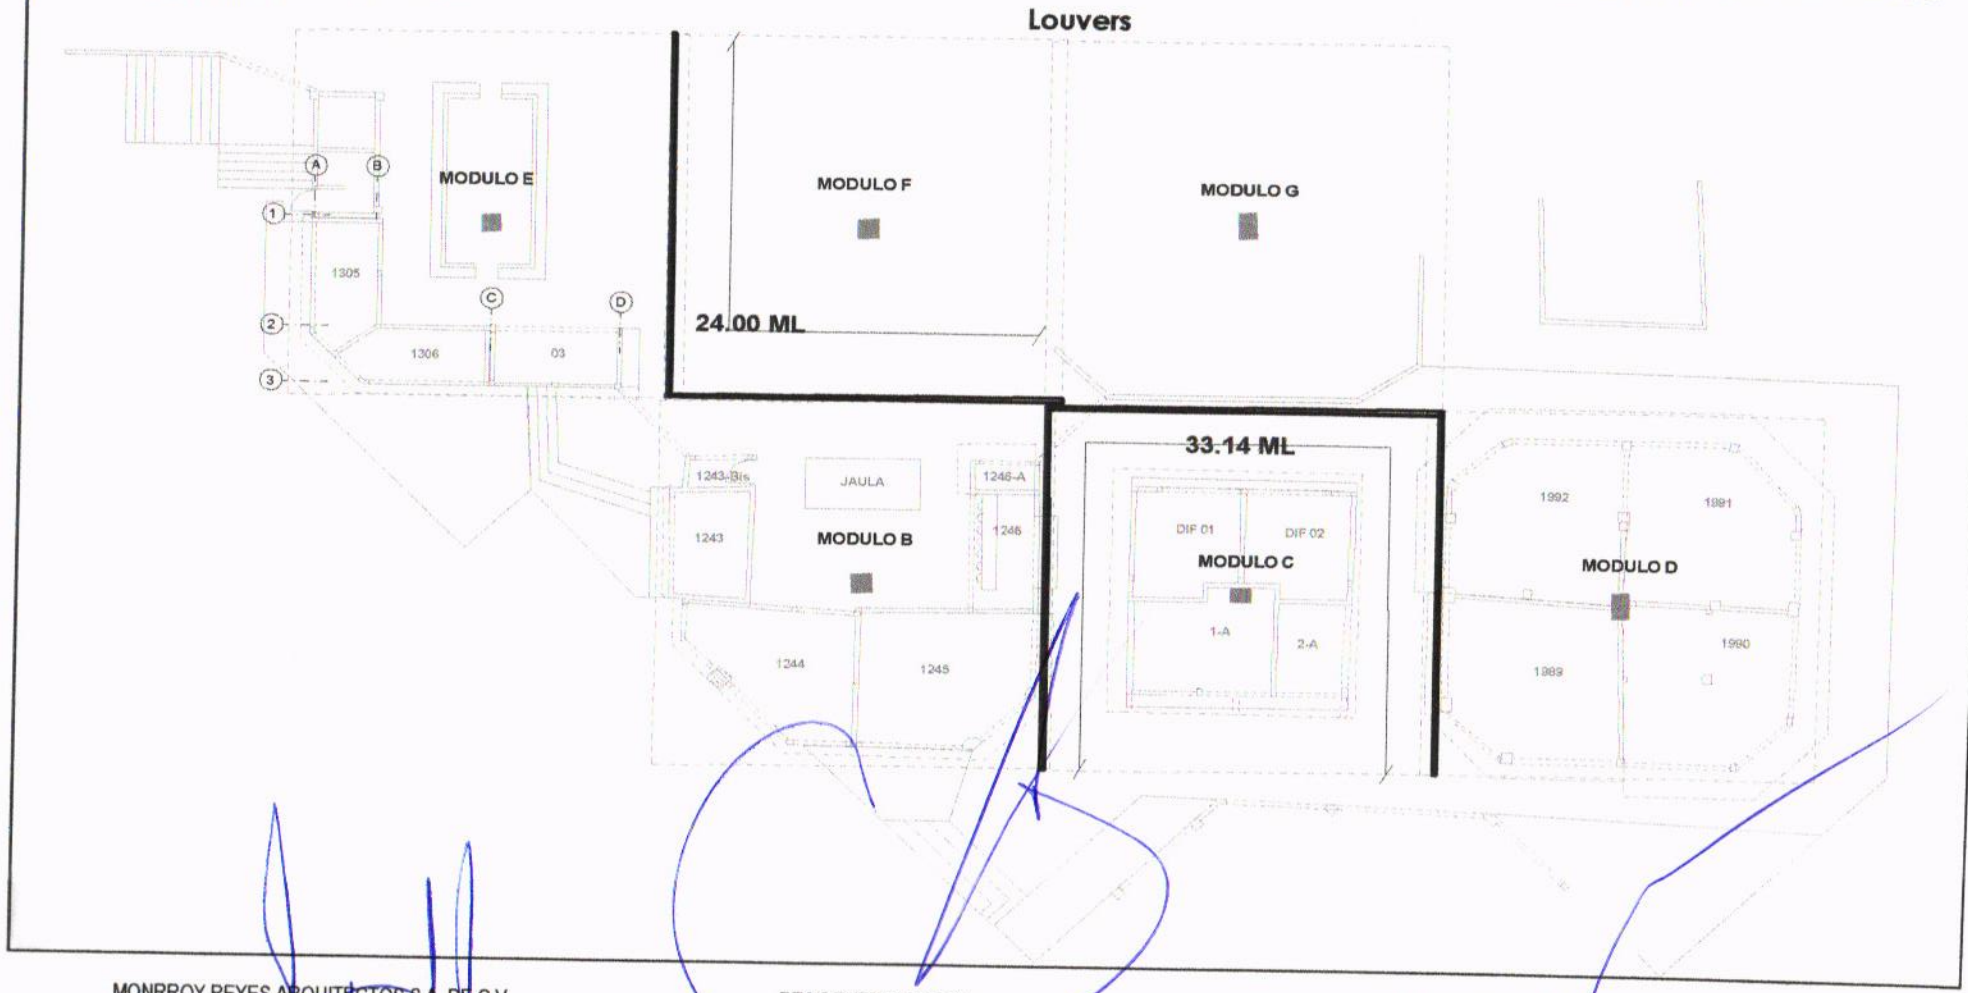

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S


A05 ACABADOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.


Cortinas

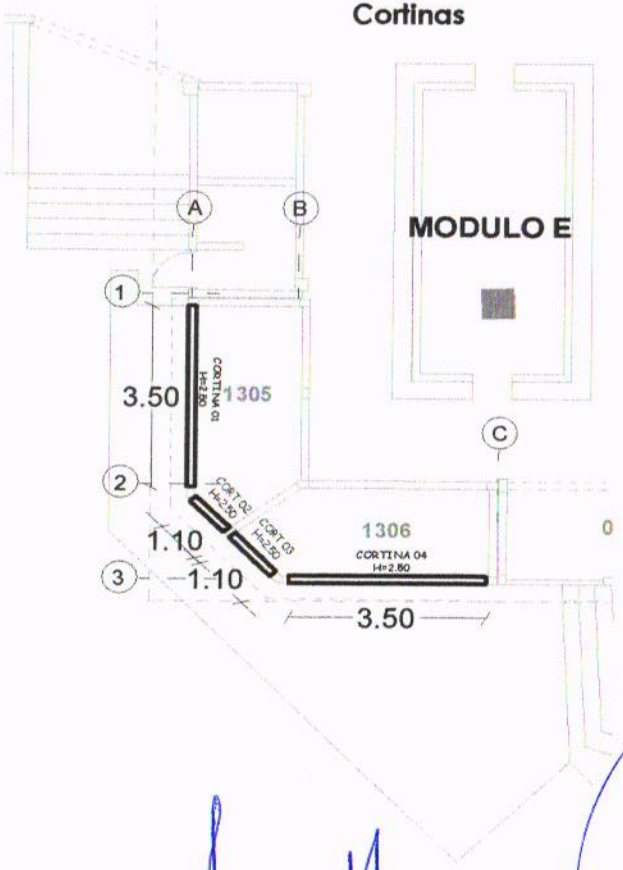


Cortinas



Louvers



Louvers

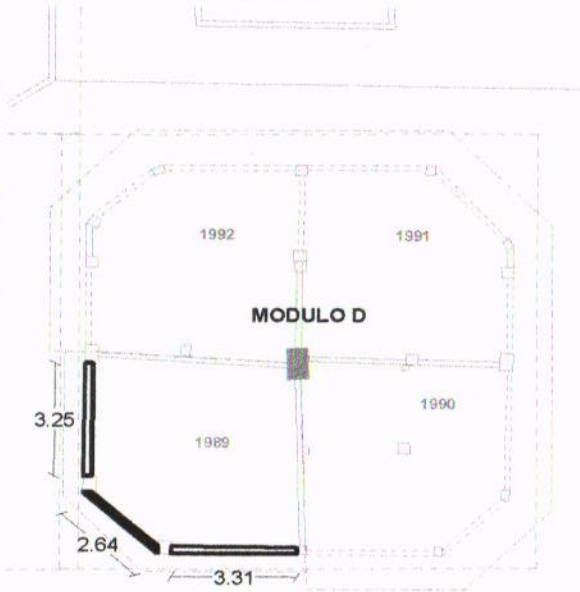

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

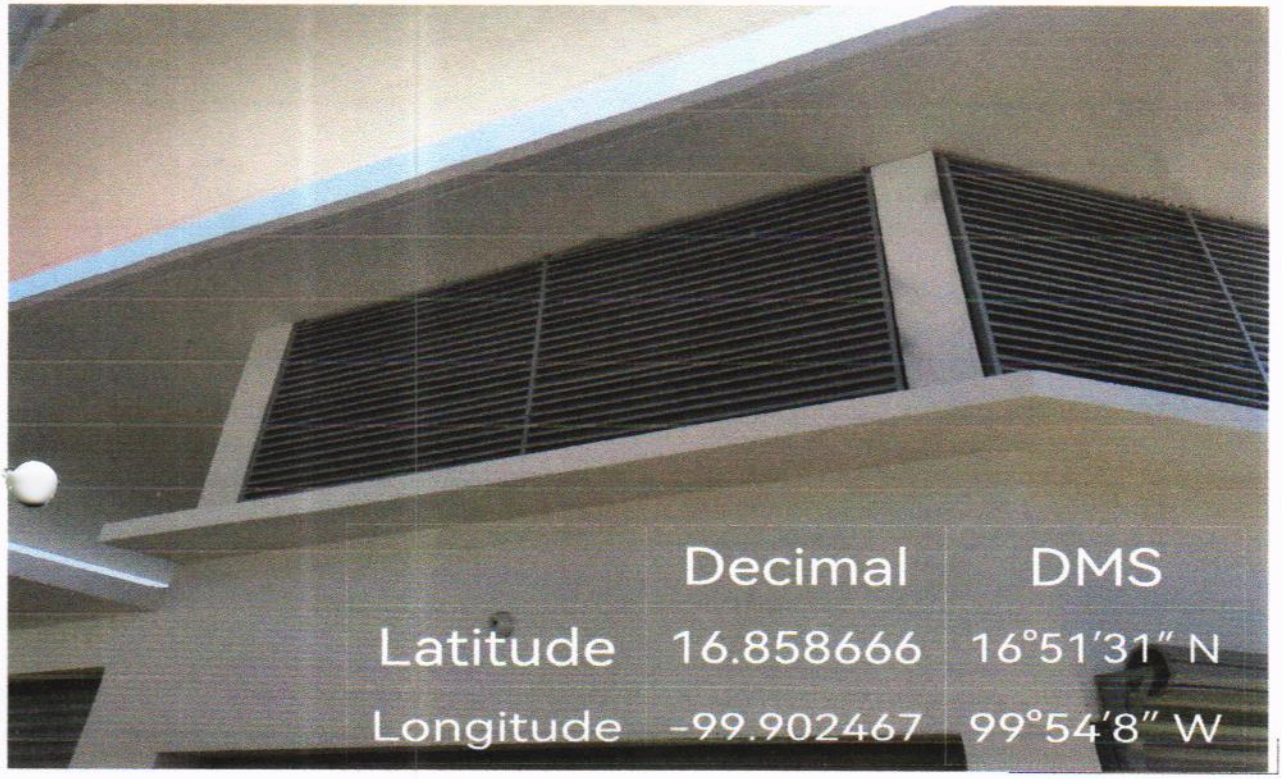

A05	**ACABADOS**
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

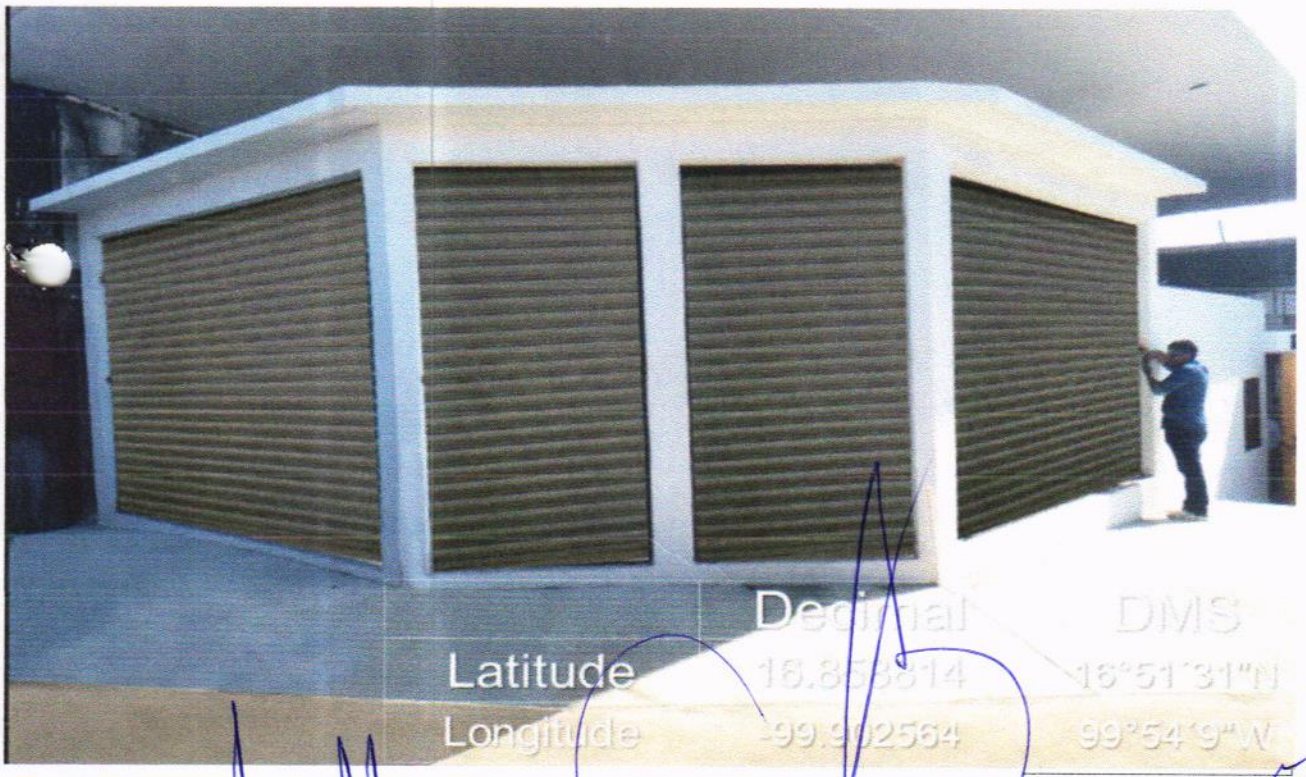

A05	**ACABADOS**
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**					ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**					DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**					AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**						
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.			1.00						1.00	
							TOTAL	**PZA**		1.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-001 ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.
	EL-BT-001	

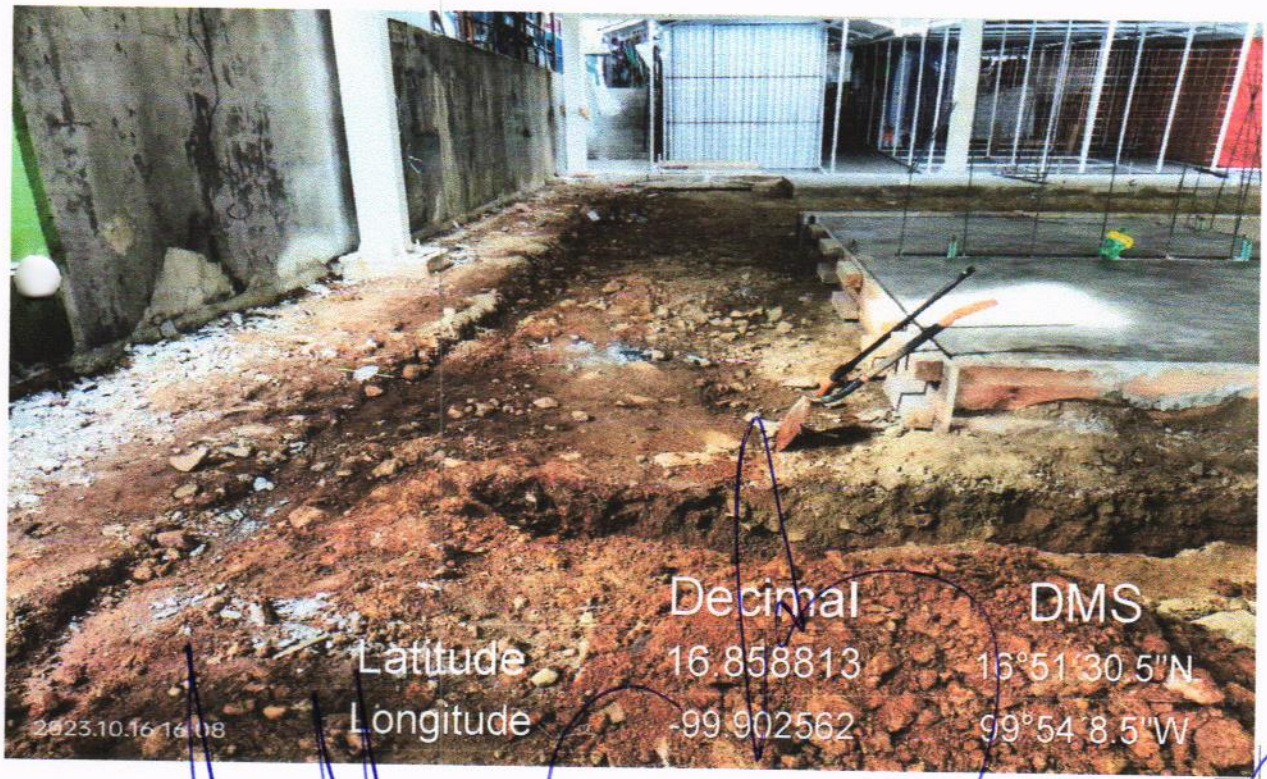

A07	**BAJA TENSION**	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.
	EL-BT-001	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.
	EL-BT-001	



A07	**BAJA TENSION**	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.
	EL-BT-001	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.			5.00						5.00	
							TOTAL	**JGO**		5.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-002 CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

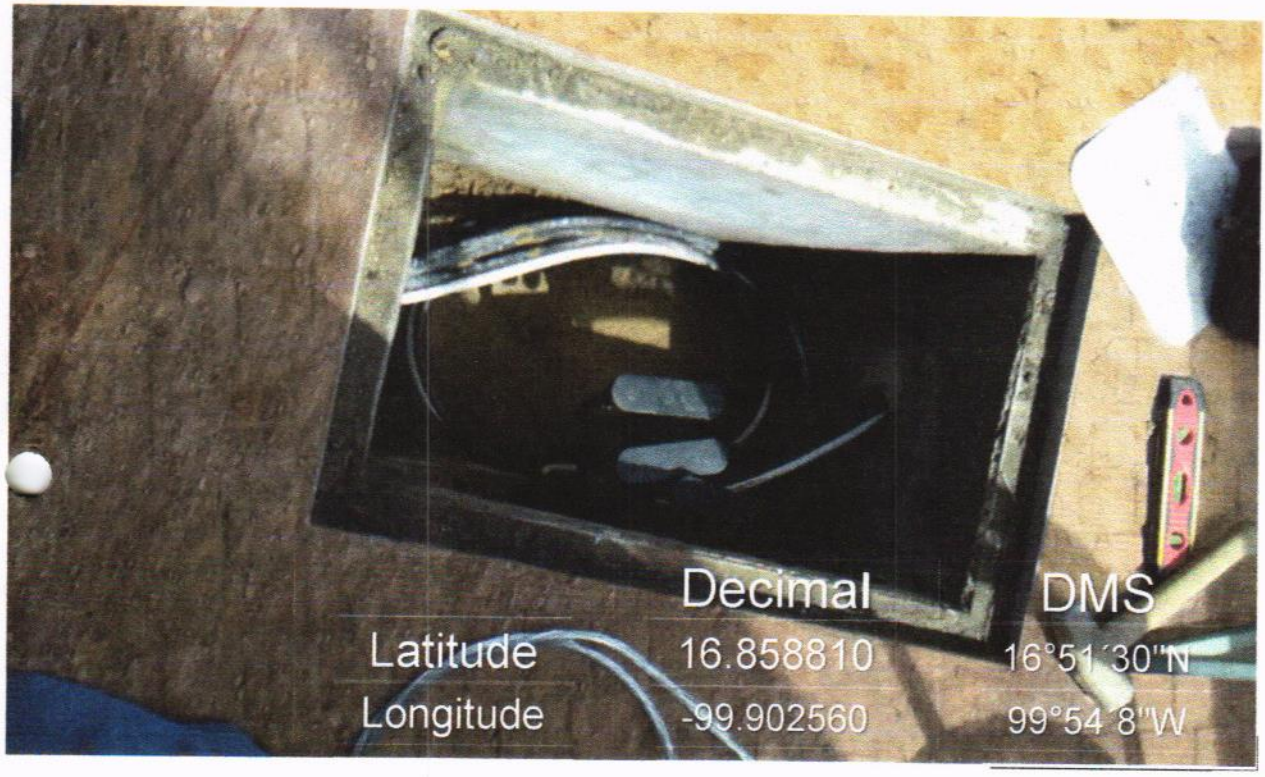

A07	**BAJA TENSION**	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.
	EL-BT-002	

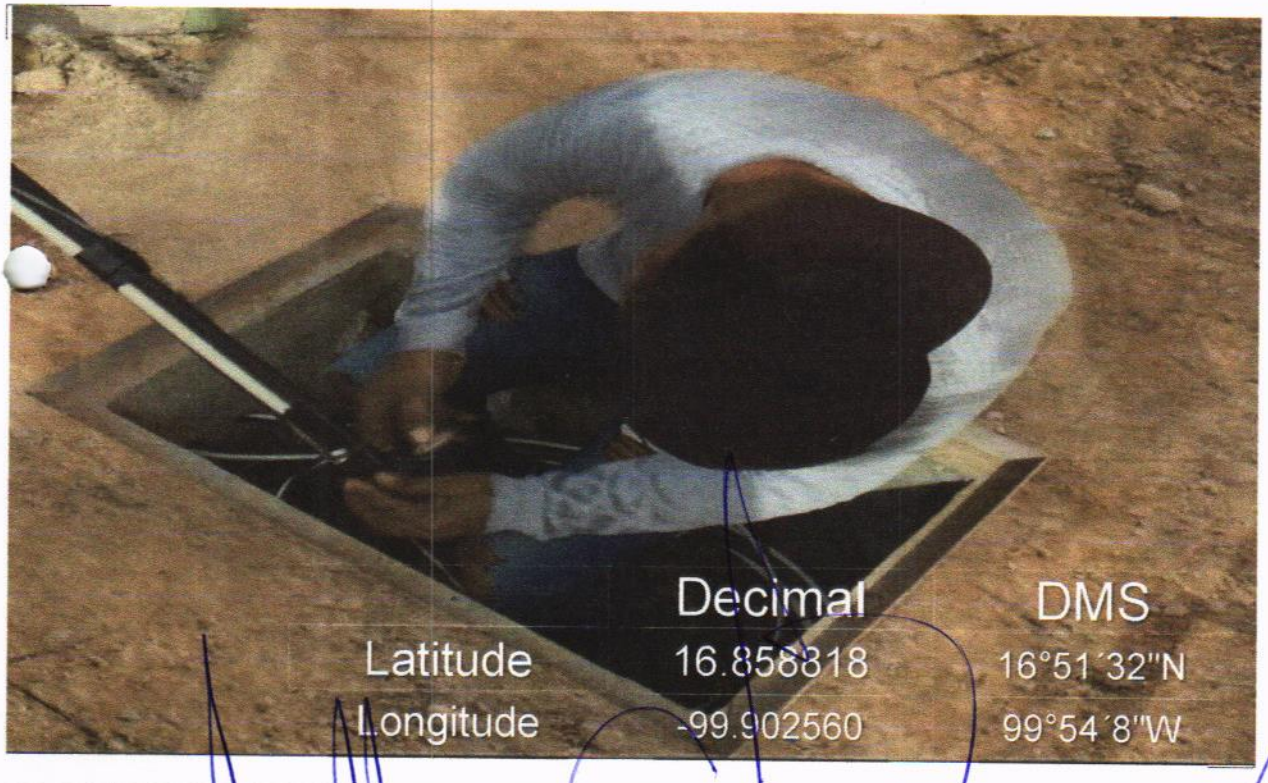

A07	**BAJA TENSION**	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.
	EL-BT-002	

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	**Transformador**		a R1	14.82				14.82		
			R1 a R2		35.97				35.97		
			R2 a R3		39.16				39.16		
			R3 a R4		14.10				14.10		
		R4 a Centro Modular			1.50				1.50		
							TOTAL	**ML**	**105.55**		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-003 INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.

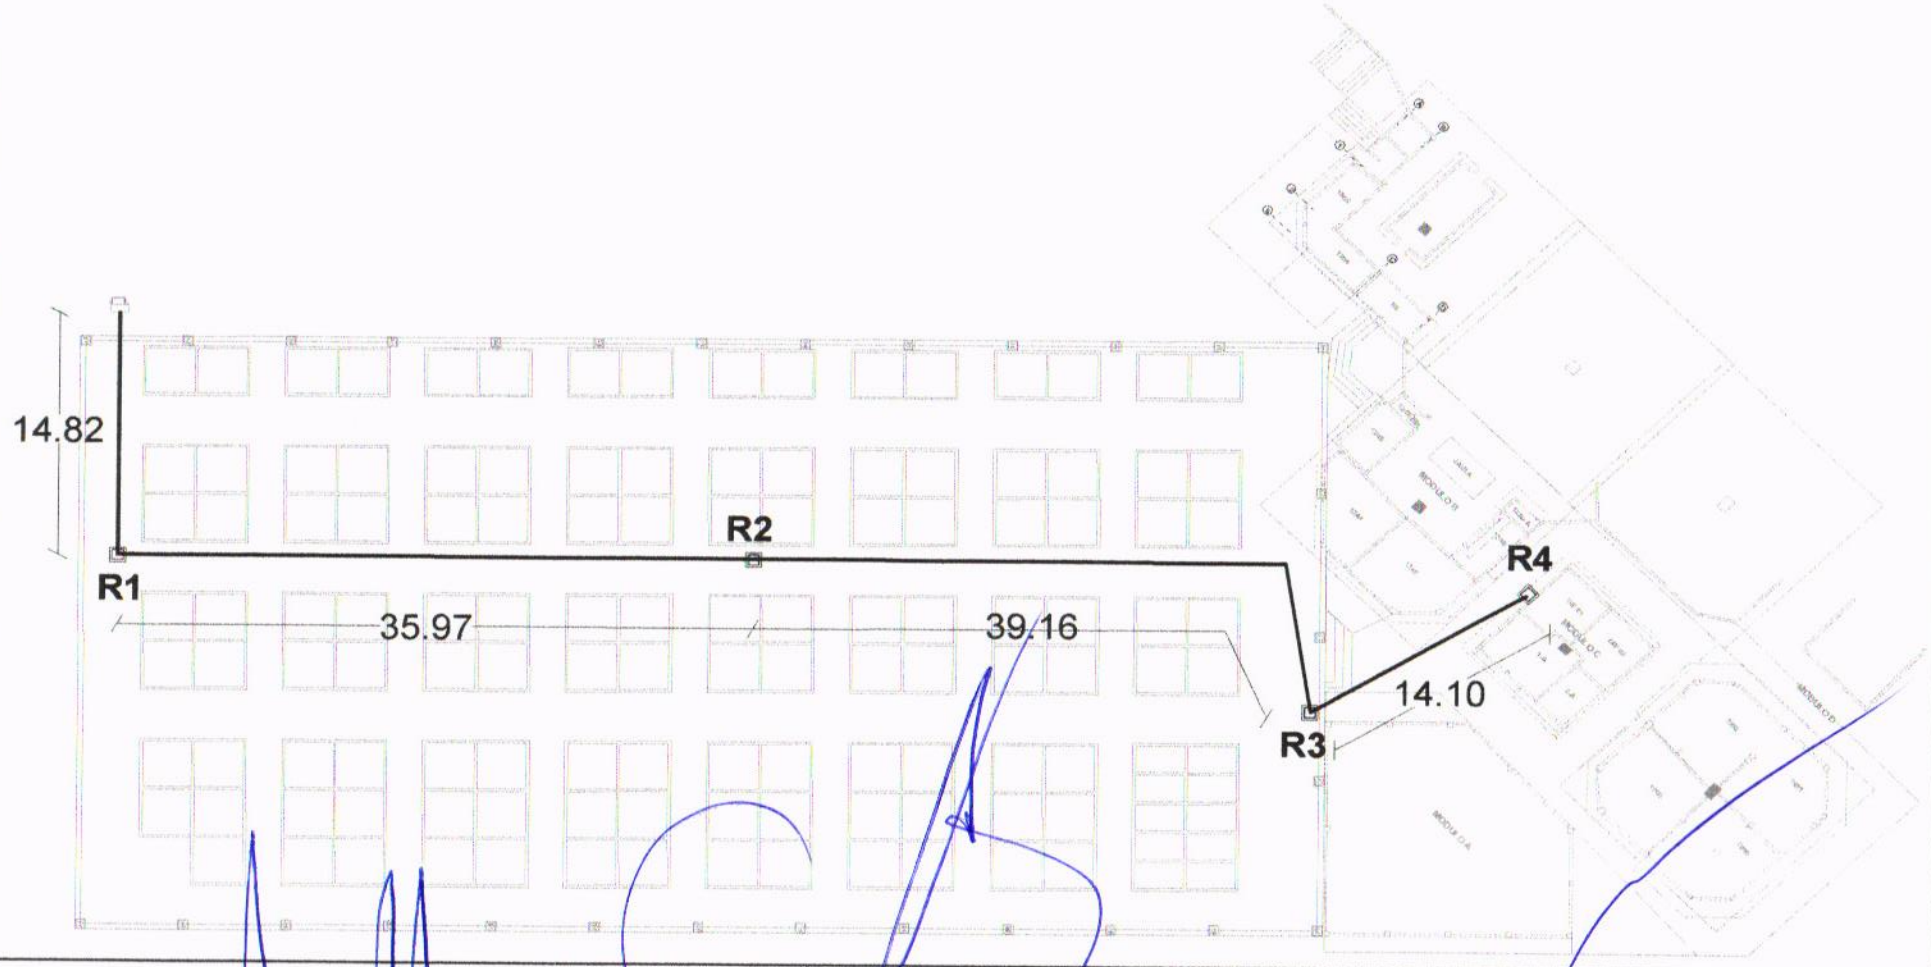

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
	EL-BT-003	



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
	EL-BT-003	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
EL-BT-003		



A07	BAJA TENSION	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
EL-BT-003		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	**Electrica**	L1 a R1		14.50				14.50		
			R1 a R2		7.85				7.85		
			R2 a R3		6.57				6.57		
			R3 a R4		7.48				7.48		
			R4 a R5		6.22				6.22		
			R3 a R6		8.49				8.49		
							TOTAL	**ML**	**51.11**		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-004 INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.

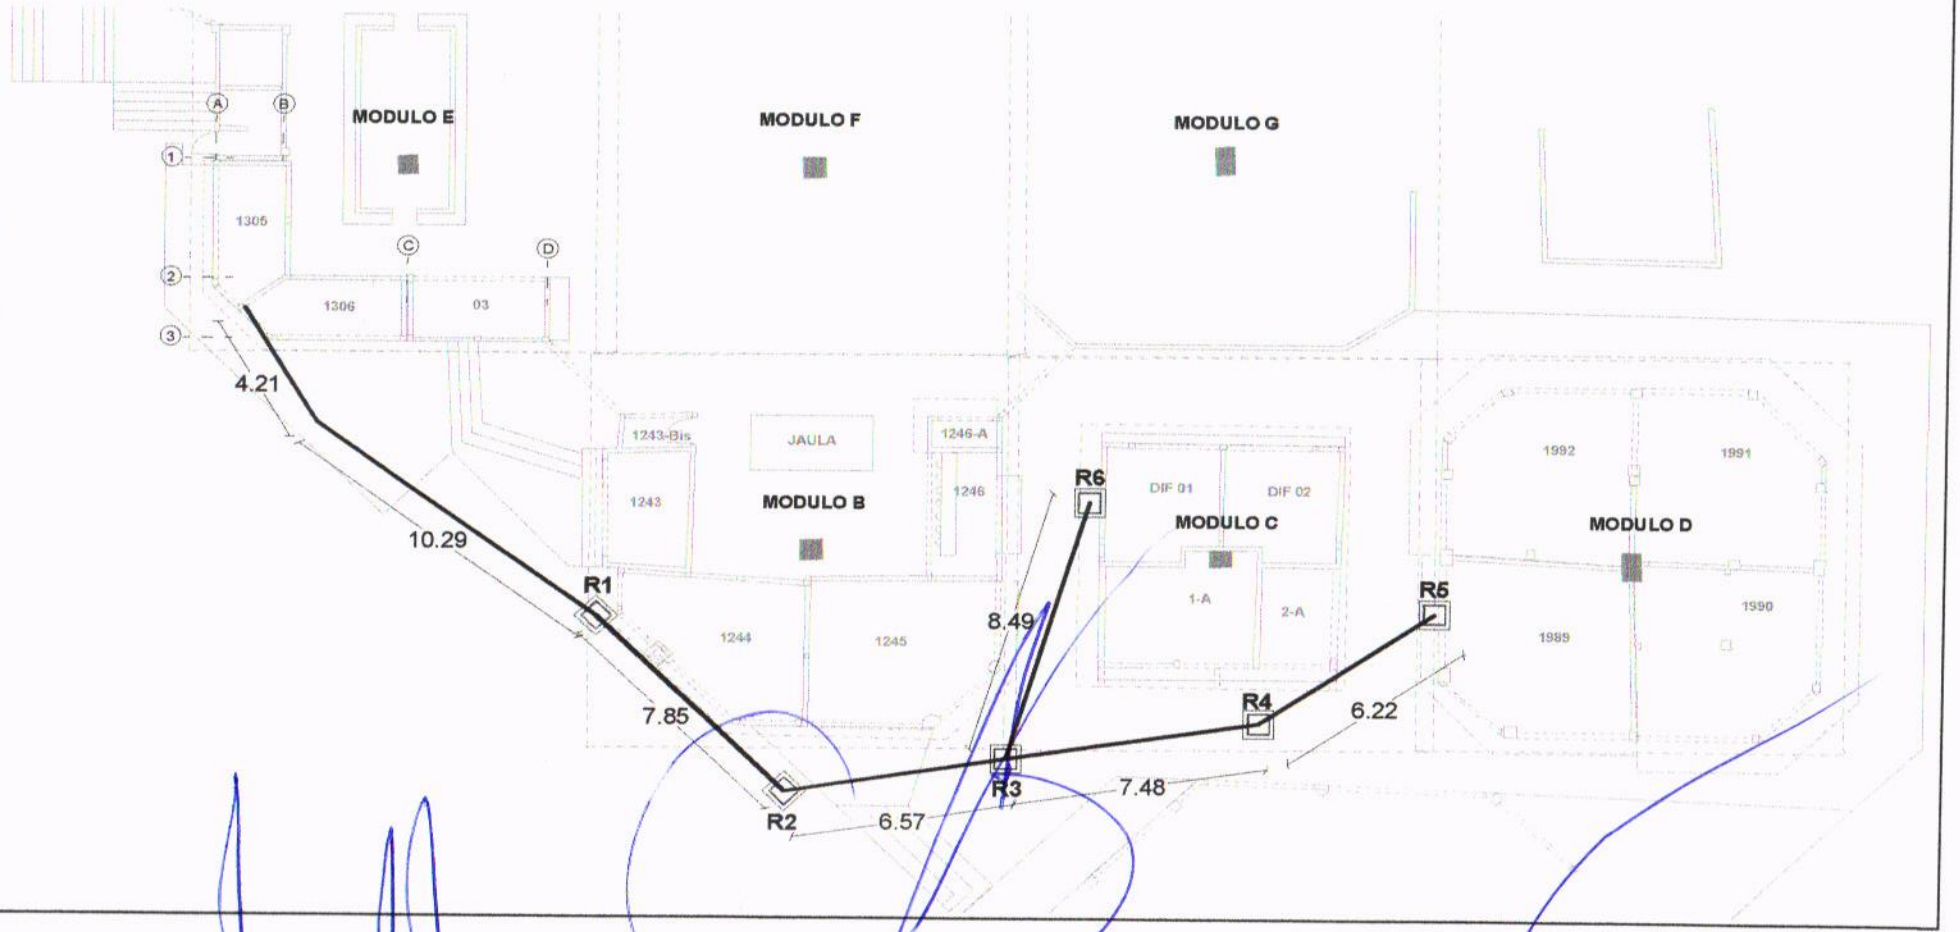

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

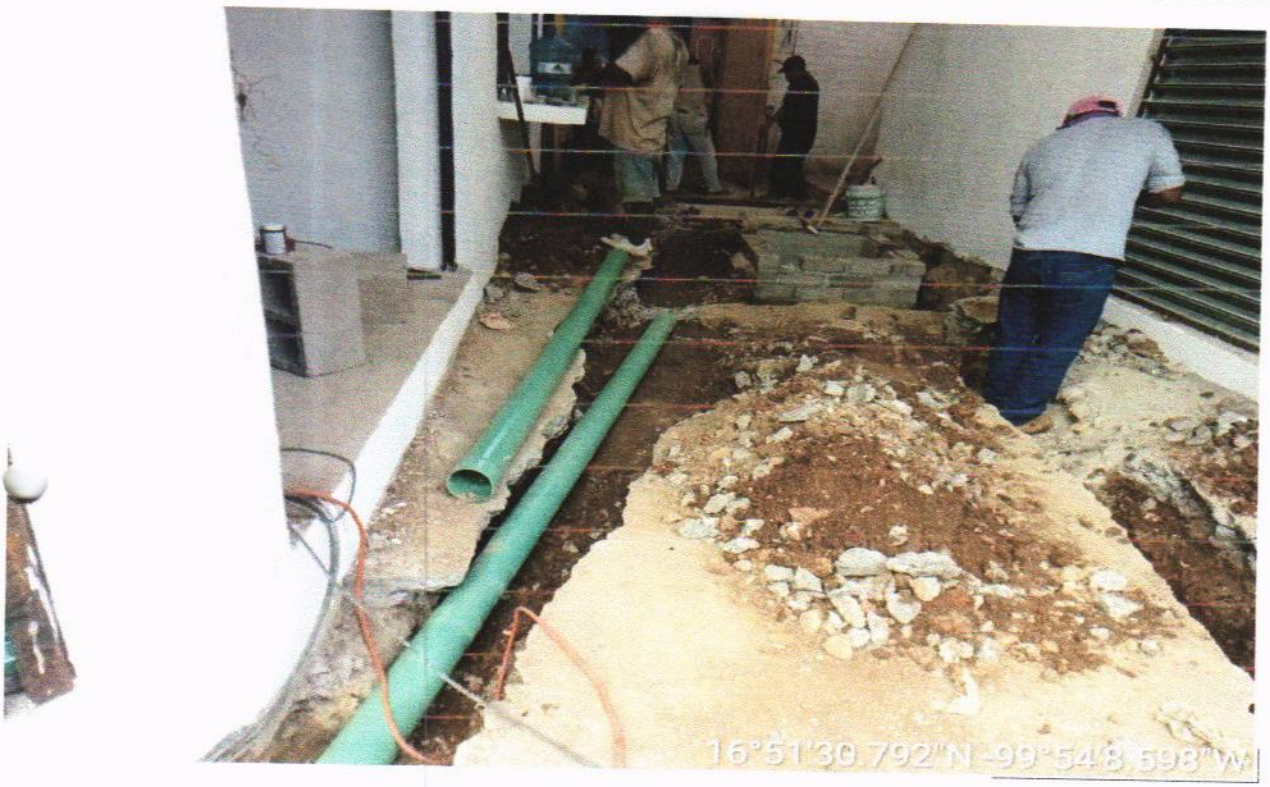

A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
EL-BT-004		



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
EL-BT-004		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
	EL-BT-004	



A07	BAJA TENSION	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.
	EL-BT-004	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**									
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	Transformador		a R1	14.82				14.82	
			R1 a R2		35.97				35.97	
			R2 a R3		39.16				39.16	
			R3 a R4		14.10				14.10	
			R4 a Centro Modular		1.50				1.50	
			Instalacion Provicional		100.00	1.00	1.00		100.00	
							TOTAL	ML	205.55	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-005 INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

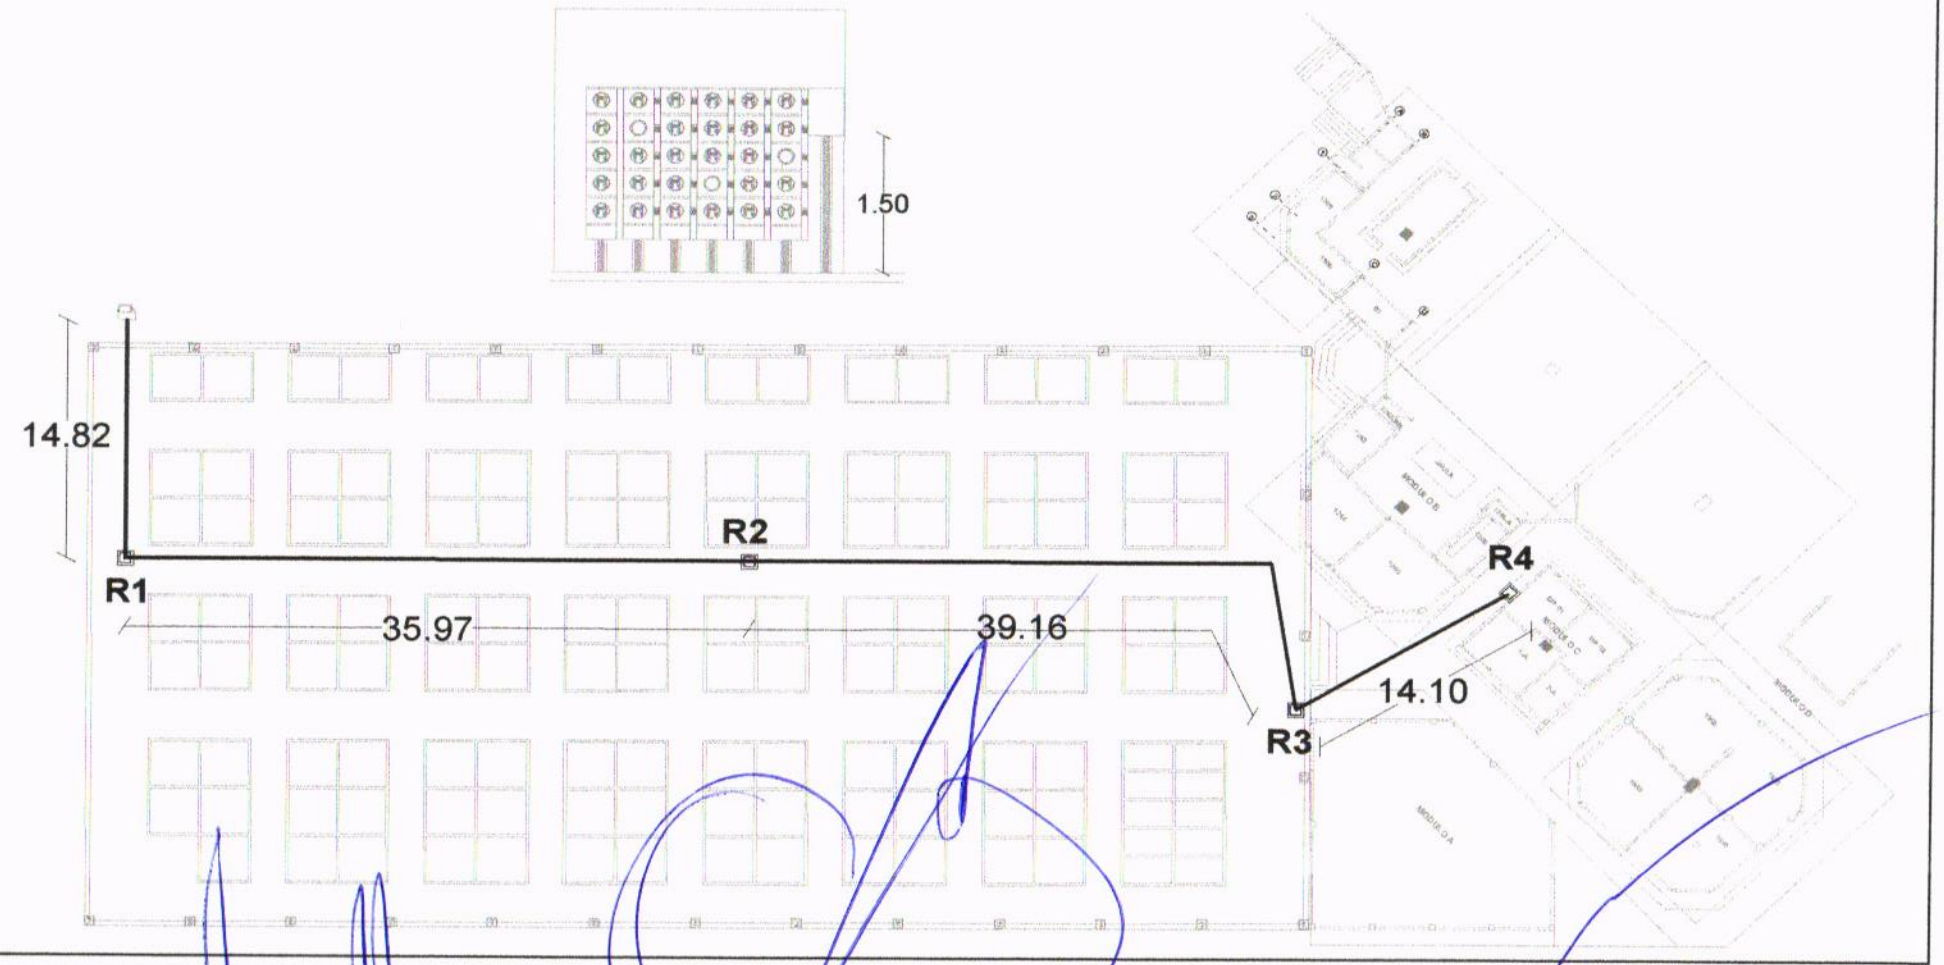

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

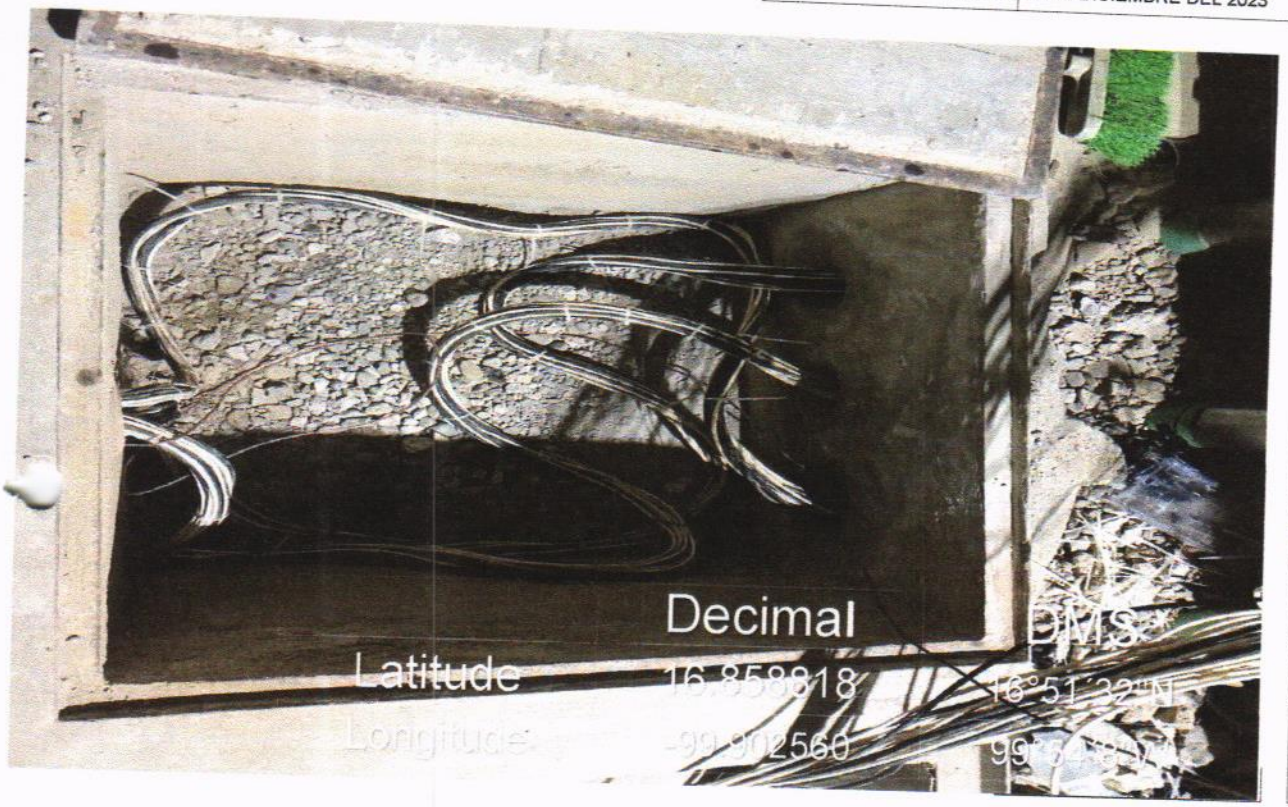

A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
EL-BT-005		



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA
EL-BT-005		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	Transformador		a R1	14.82					14.82	
			R1 a R2		35.97					35.97	
			R2 a R3		39.16					39.16	
			R3 a R4		14.10					14.10	
			R4 a Centro Modular		1.50					1.50	
							TOTAL	**ML**		**105.69**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-006 INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

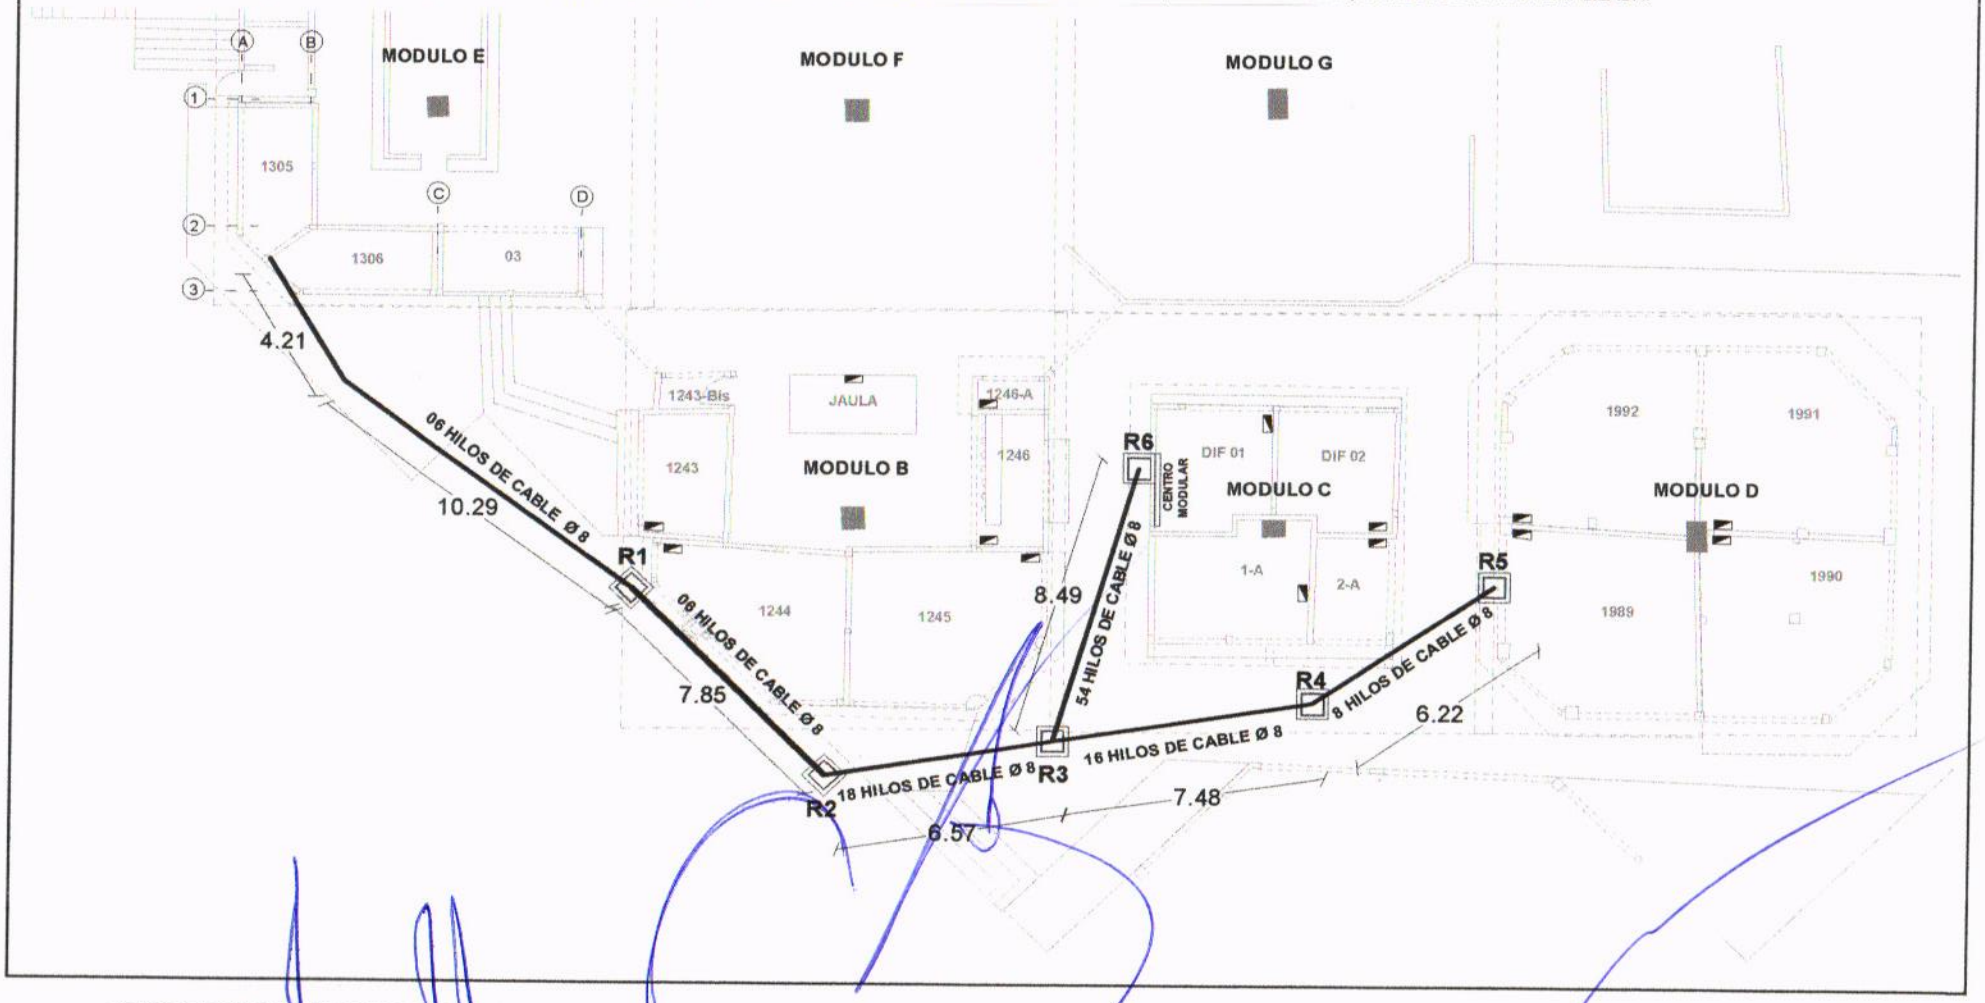

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

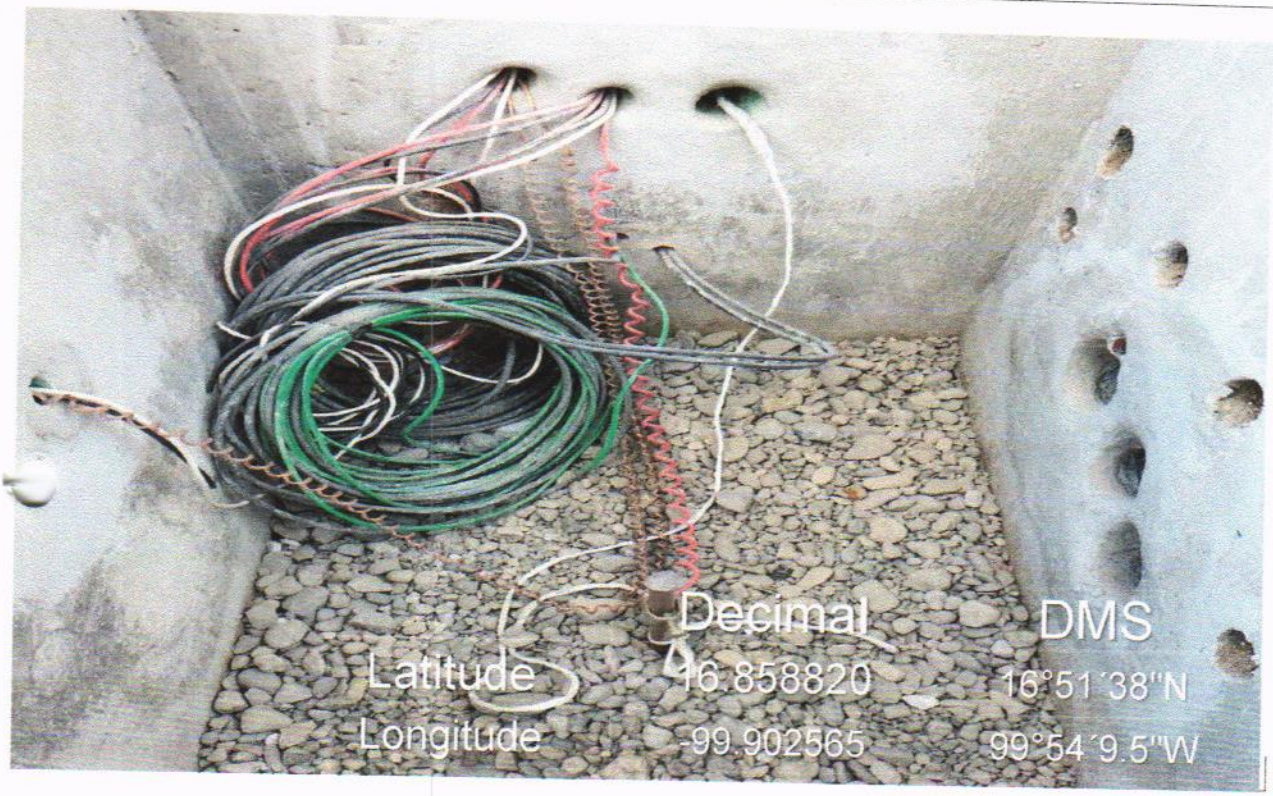

A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA
EL-BT-006		PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

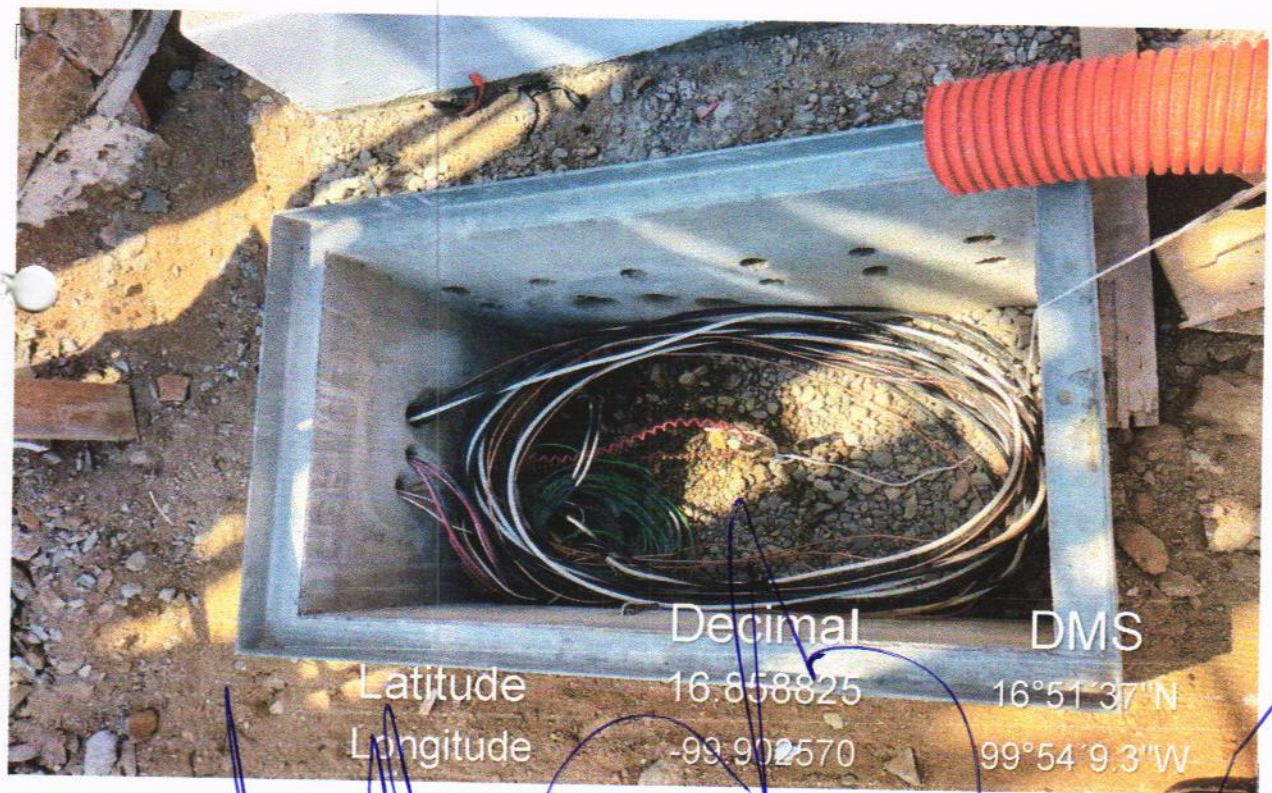

A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA
EL-BT-006		PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**				Largo	Servicios	Hilos			
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.	Centro Modular a R6			1.40	27.00	2.00		75.60	
			R6 a R3		8.49	27.00	2.00		458.46	
			R3 a R4		7.48	8.00	2.00		119.68	
			R4 a R5		6.22	4.00	2.00		49.76	
			R3 a R2		6.57	8.00	2.00		105.12	
			R2 a R1		7.85	4.00	2.00		62.80	
			R1 a L1		14.50	2.00	2.00		58.00	
							TOTAL	ML	929.42	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-007 SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.

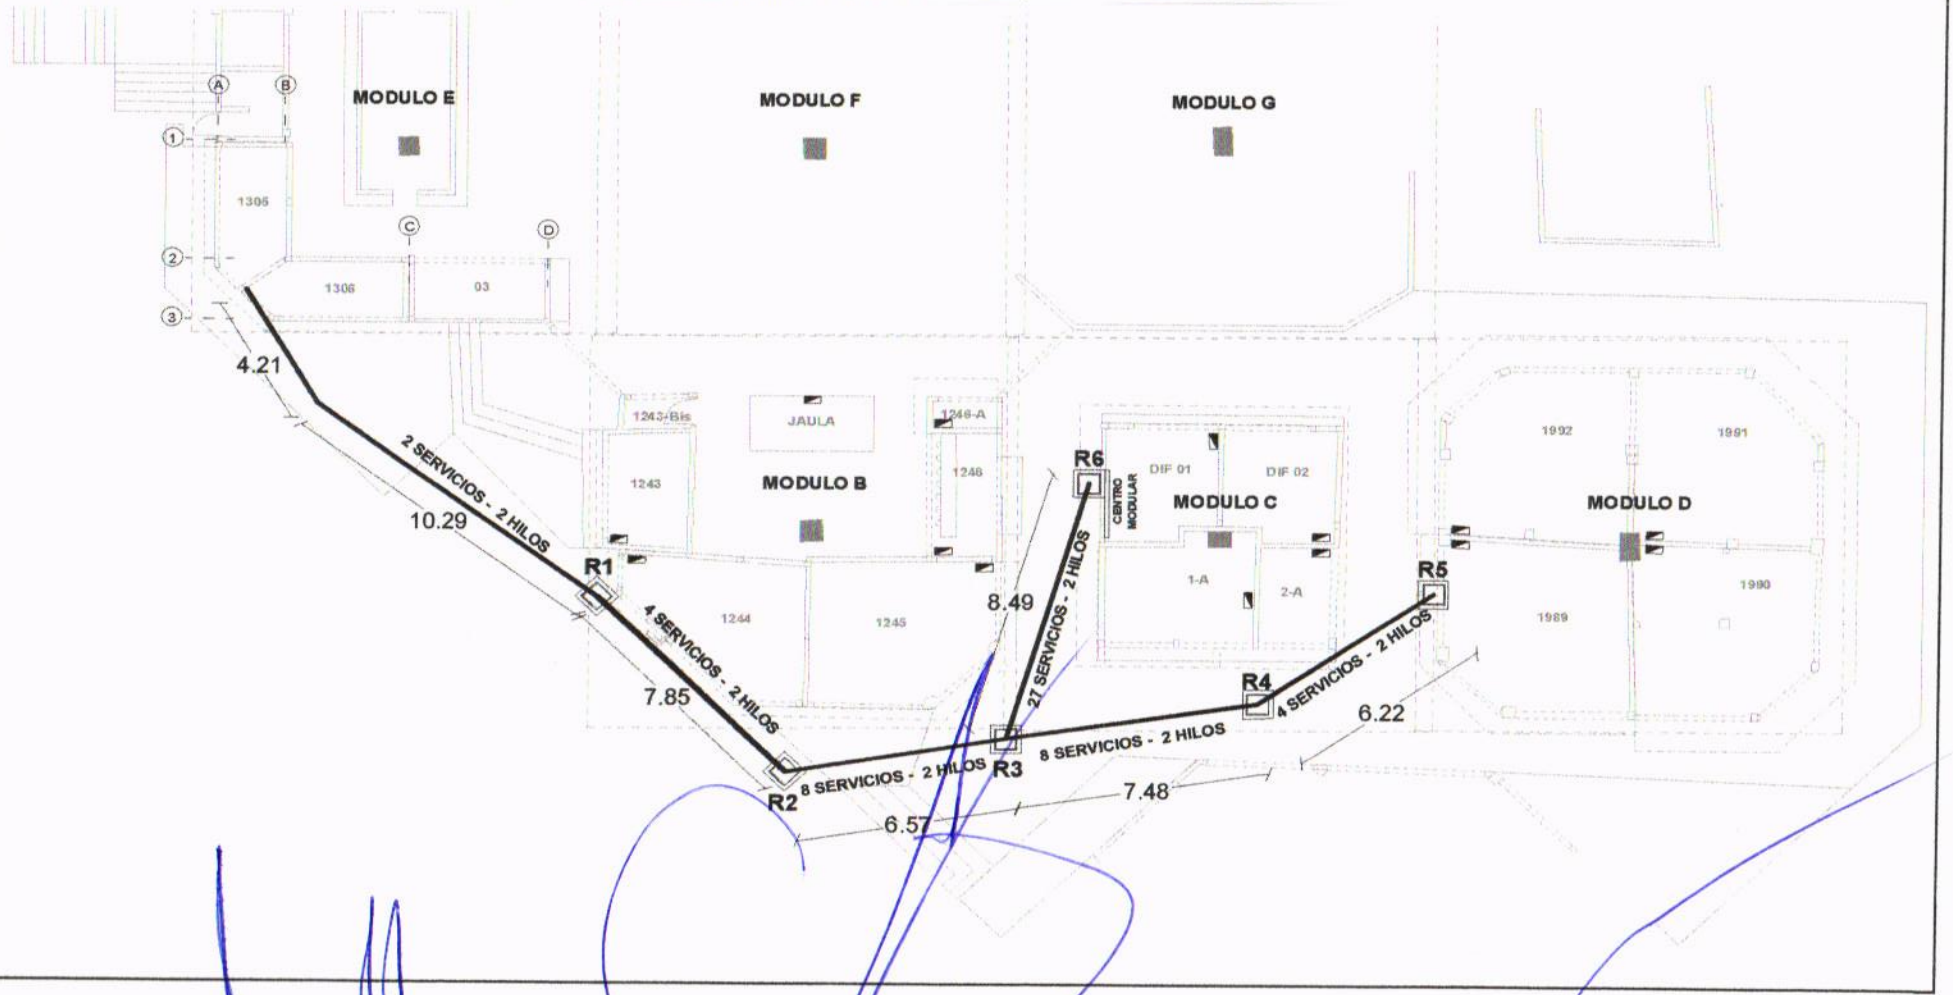

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.
	EL-BT-007	



A07	**BAJA TENSION**	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.
	EL-BT-007	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A07	**BAJA TENSION**				**Largo**	**Registro**					
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	Centro Modular a R6			1.40	1.50			2.90		
			R6 a R3		8.49	1.50			9.99		
			R3 a R4		7.48	1.50			8.98		
			R4 a R5		6.22	1.50			7.72		
			R3 a R2		6.57	1.50			8.07		
			R2 a R1		7.85	1.50			9.35		
			R1 a L1		14.50	1.50			16.00		
							TOTAL	**ML**	**63.01**		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-008 INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

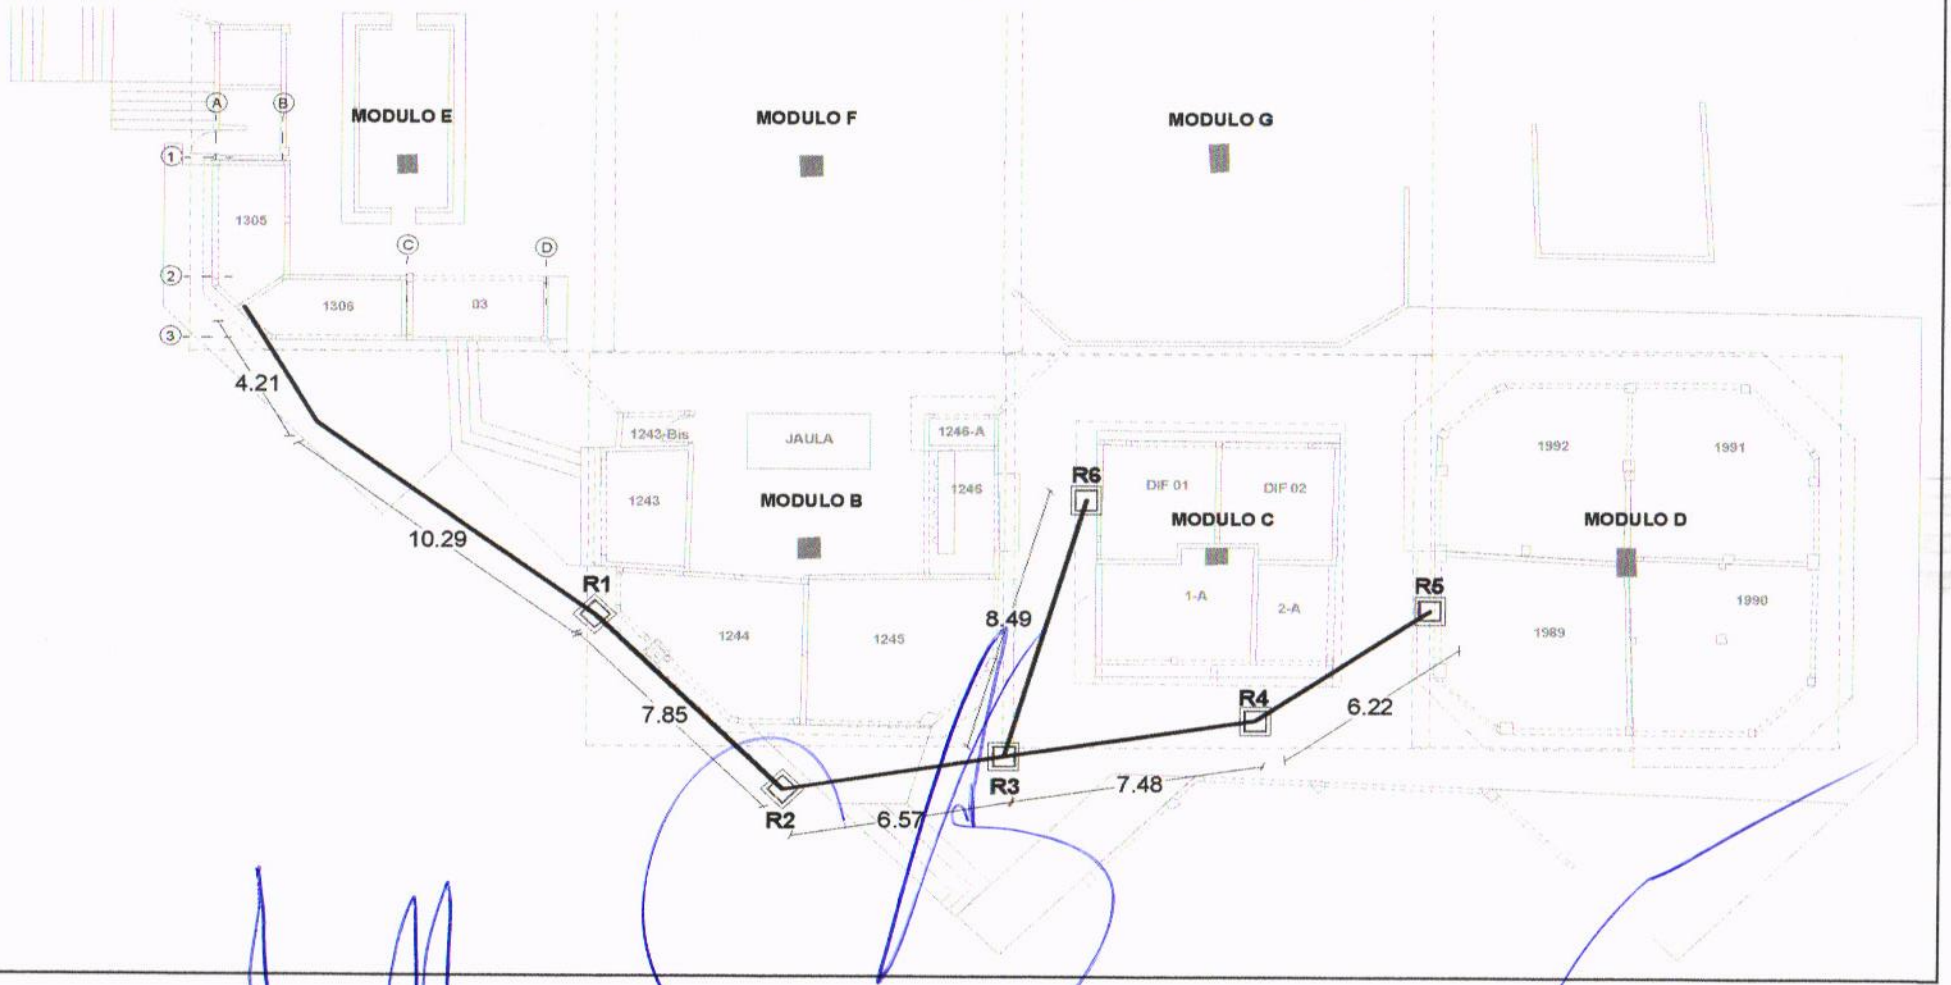

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

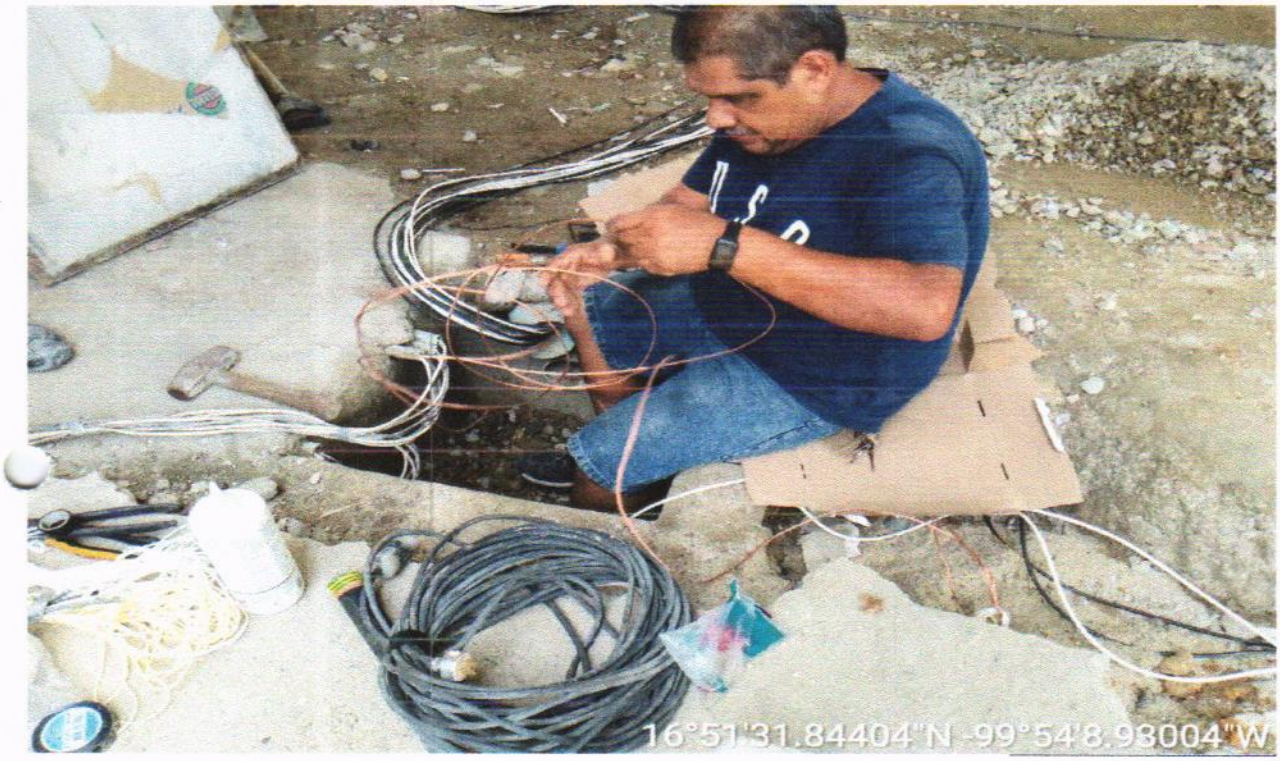

A07	**BAJA TENSION**
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.



A07	**BAJA TENSION**
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**		Registo	Local	Largo	Q0-04				
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	Modulo D	R5 A	1989	2.25	1.40			3.65	
		Modulo D	R5 A	1990	8.30	1.40			9.70	
		Modulo D	R5 A	1991	8.10	1.40			9.50	
		Modulo D	R5 A	1992	2.00	1.40			3.40	
		Modulo C	R4 A	Dif 01	9.20	1.40			10.60	
		Modulo C	R4 A	Dif 02	6.50	1.40			7.90	
		Modulo C	R4 A	1-A	3.10	1.40			4.50	
		Modulo C	R4 A	2-A	6.00	1.40			7.40	
		Modulo B	R3 A	Jaula	16.70	1.40			18.10	
		Modulo B	R3 A	1246-A	12.00	1.40			13.40	
		Modulo B	R3 A	1246	7.70	1.40			9.10	
		Modulo B	R3 A	1245	5.75	1.40			7.15	
		Modulo B	R1 A	1244	1.70	1.40			3.10	
		Modulo B	R1 A	1243	1.70	1.40			3.10	
		Modulo E	L1 A	1306	14.20	1.40			15.60	
		Modulo E	L1 A	1305	13.35	1.40			14.75	
							TOTAL	ML	140.95	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			
NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	No. DE OBRA: **MAJ/574**		ESTADO: GUERRERO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	FECHA:	21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-009 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.

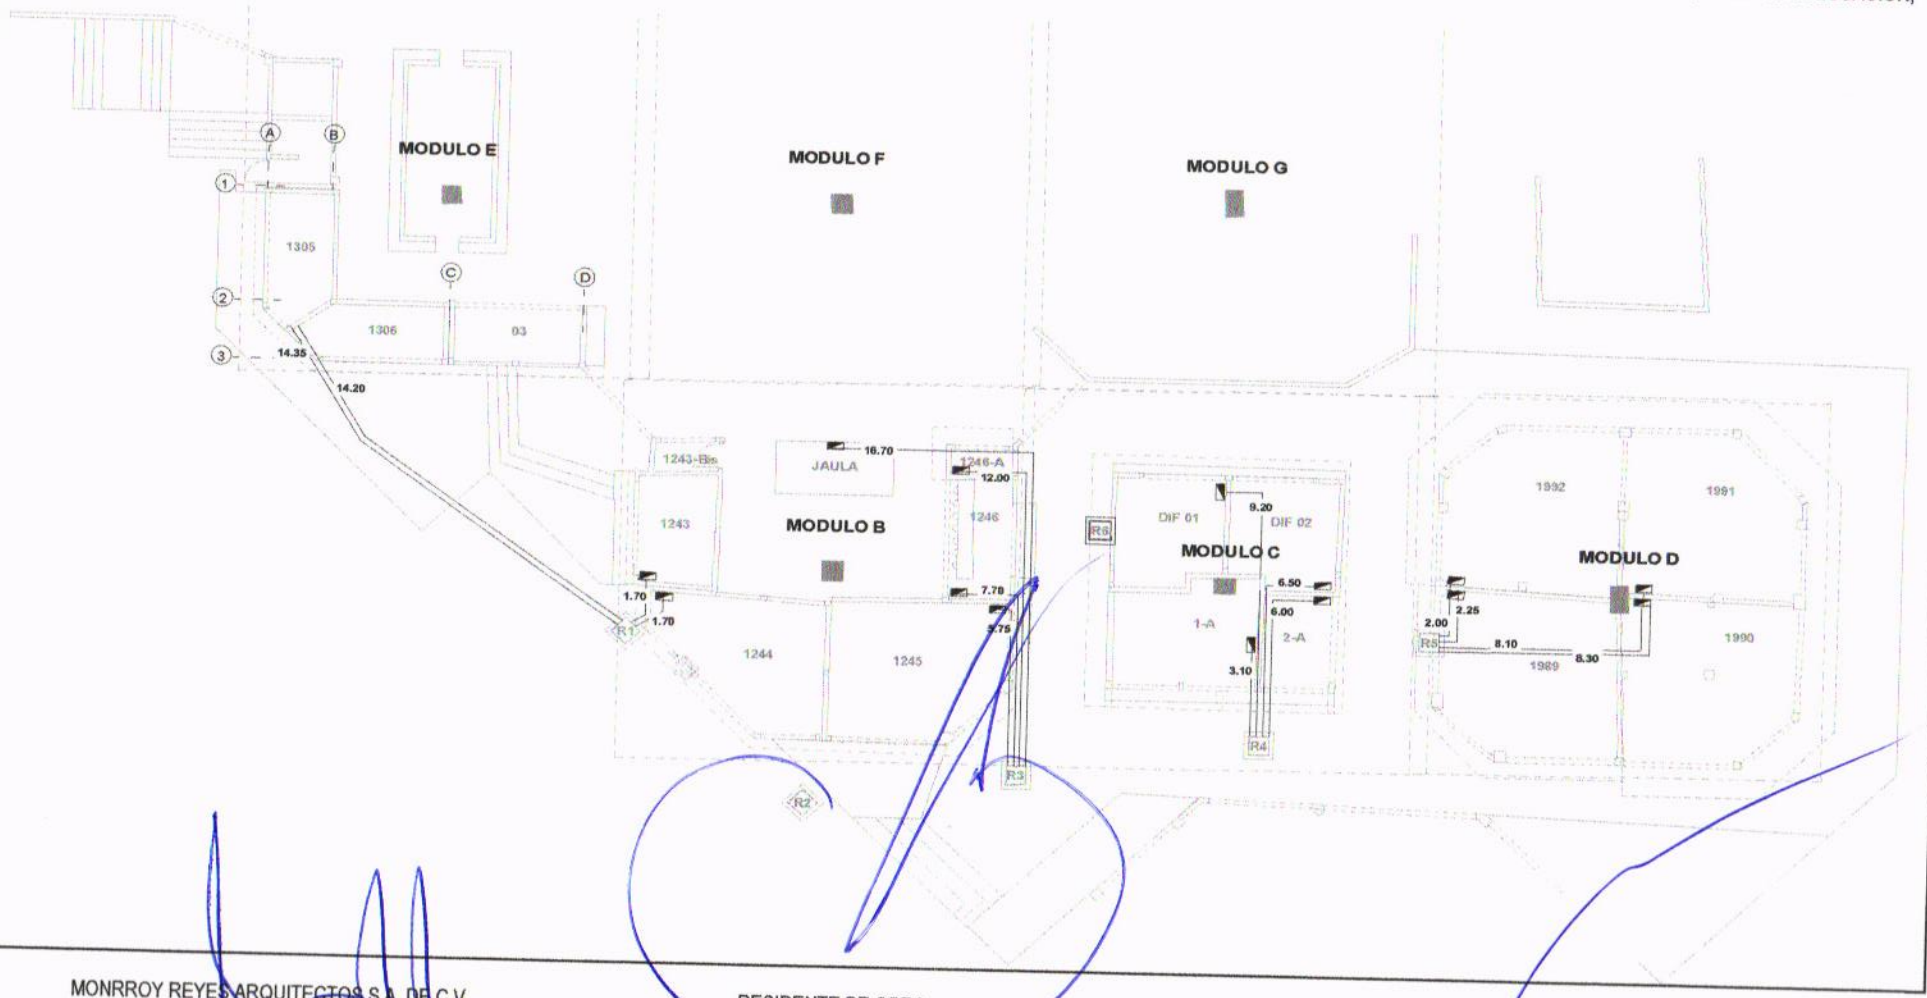

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.
	EL-BT-009	



A07	**BAJA TENSION**	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.
	EL-BT-008	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.
EL-BT-009		



A07	BAJA TENSION	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.
EL-BT-009		

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**									
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN	Ganinete		1.00					1.00	
							TOTAL	PZA	1.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-010 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN

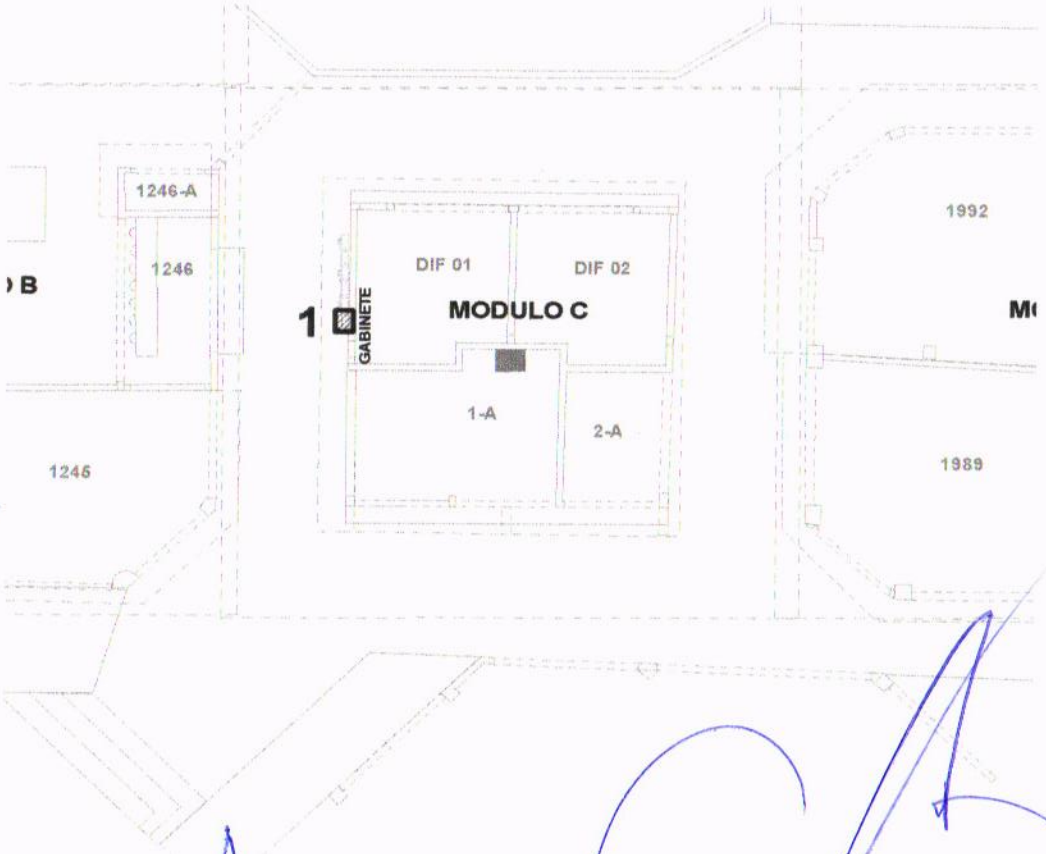

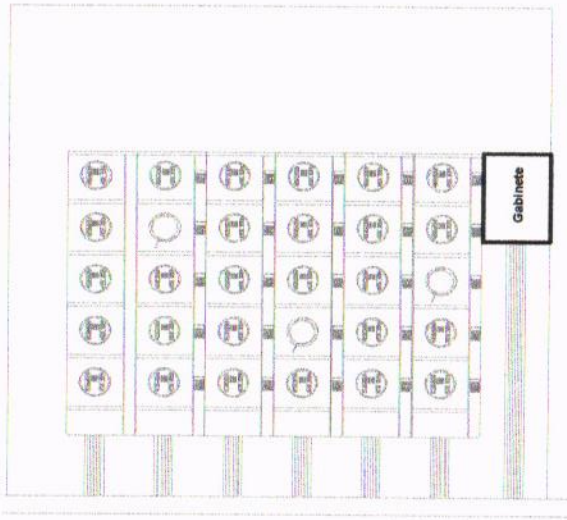

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN



A07	BAJA TENSION
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	BAJA TENSION									
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	Centro Modular		6.00					6.00	
							TOTAL	PZA	6.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-011 CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

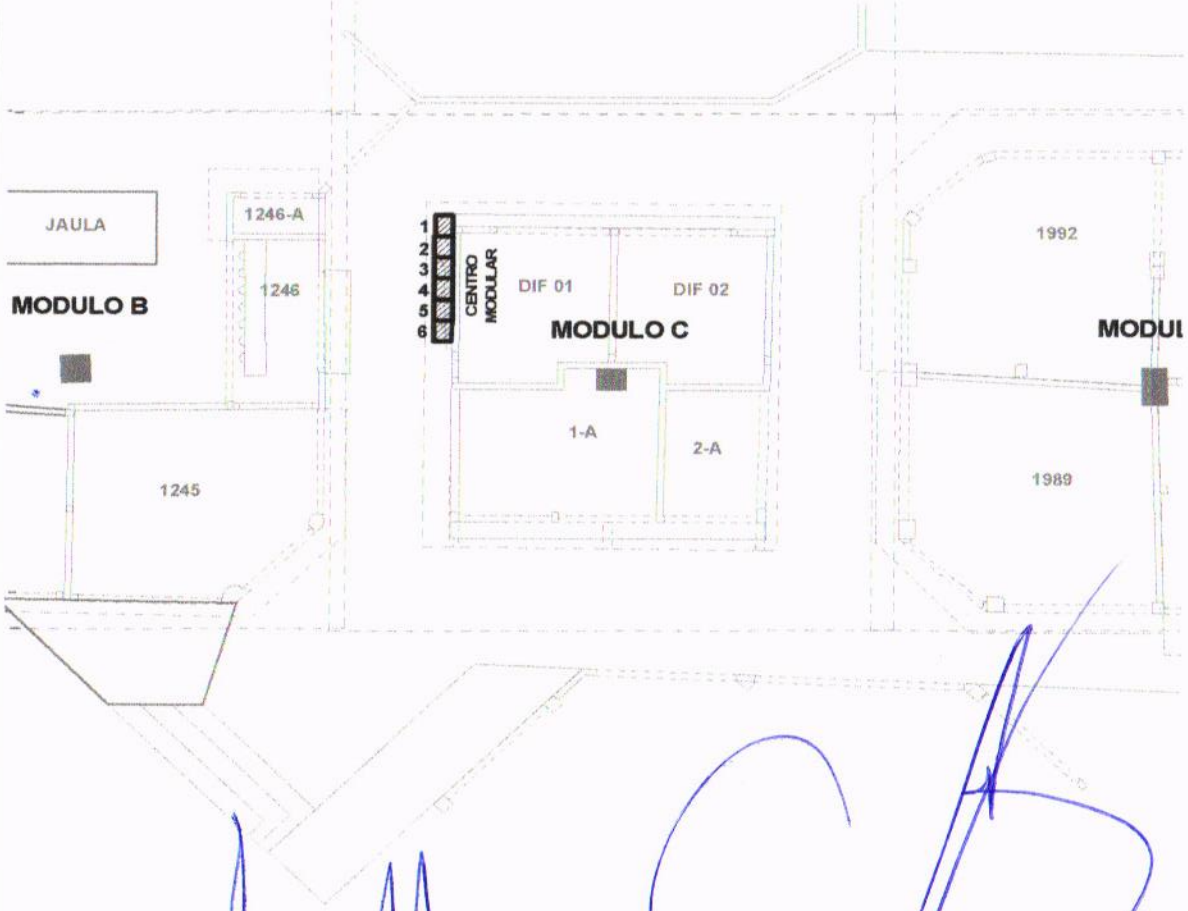

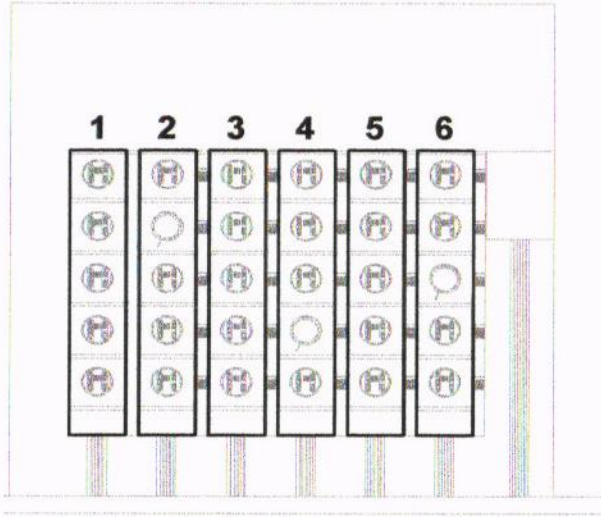

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

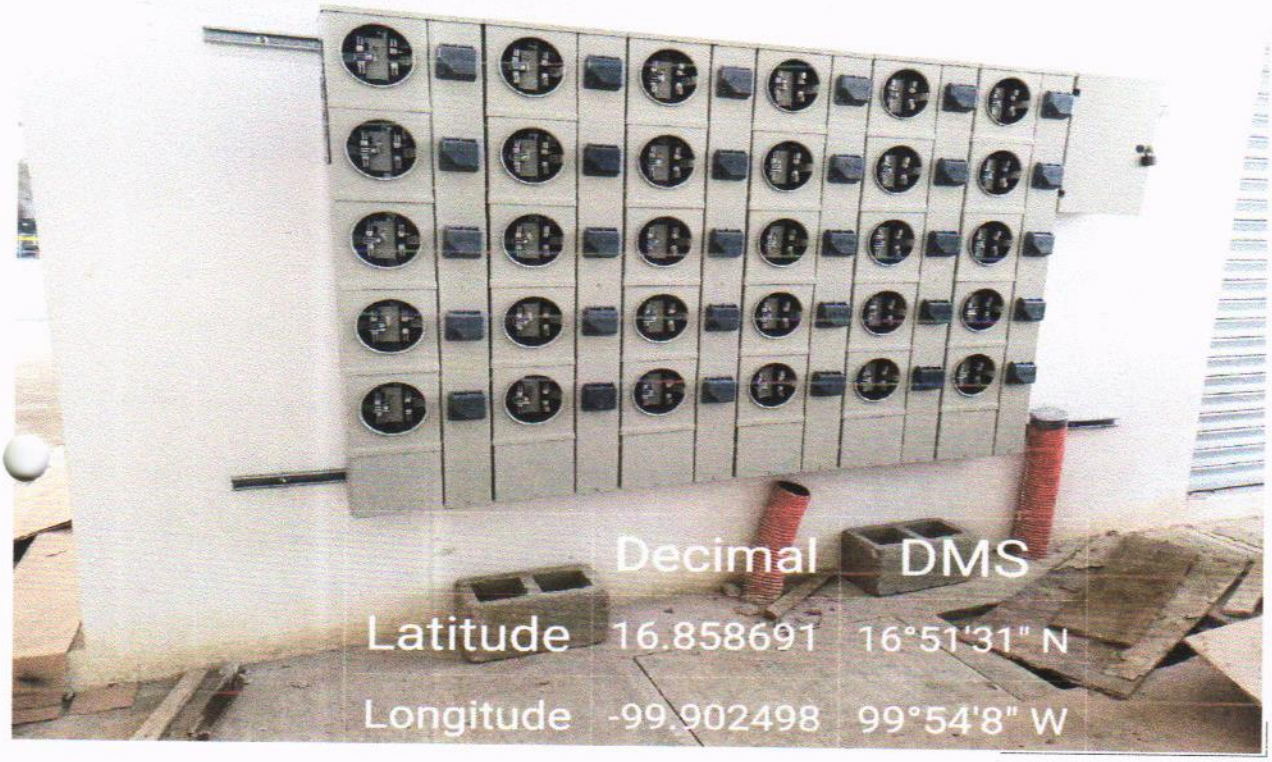

A07	**BAJA TENSION**	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	EL-BT-011	

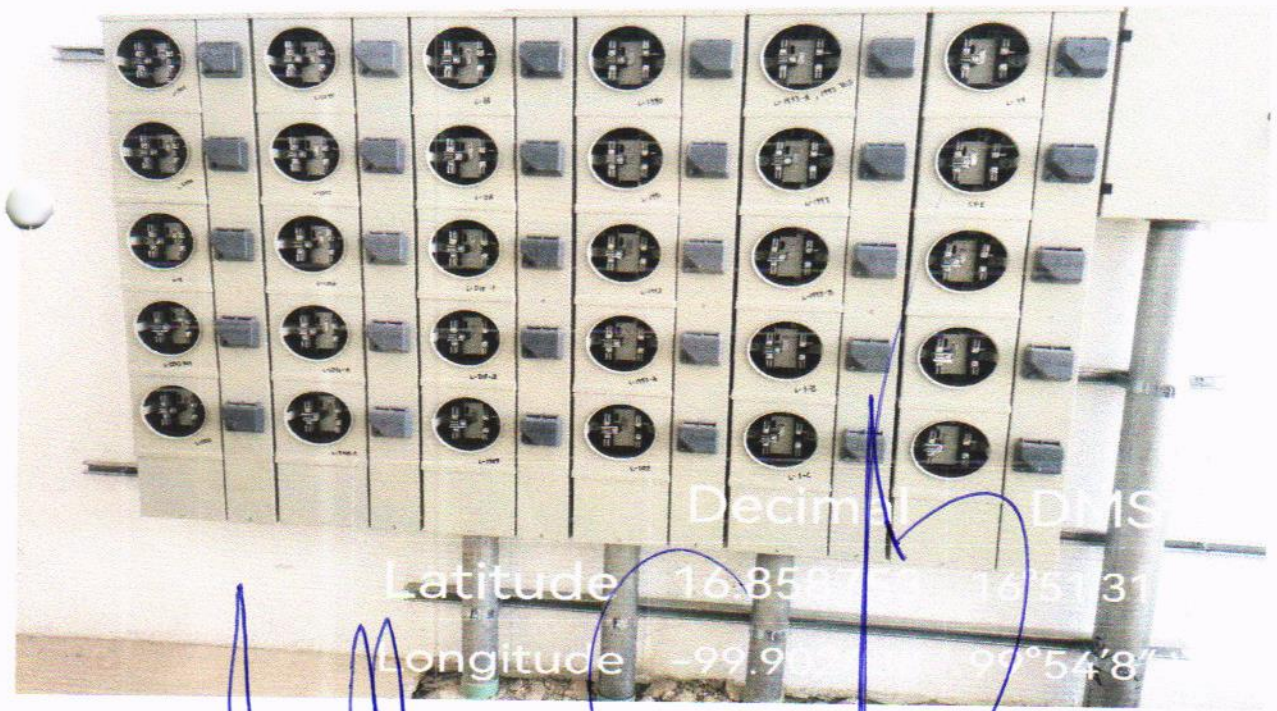


A07	**EAJA TENSION**	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	EL-BT-011	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION	
EL-BT-011		CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

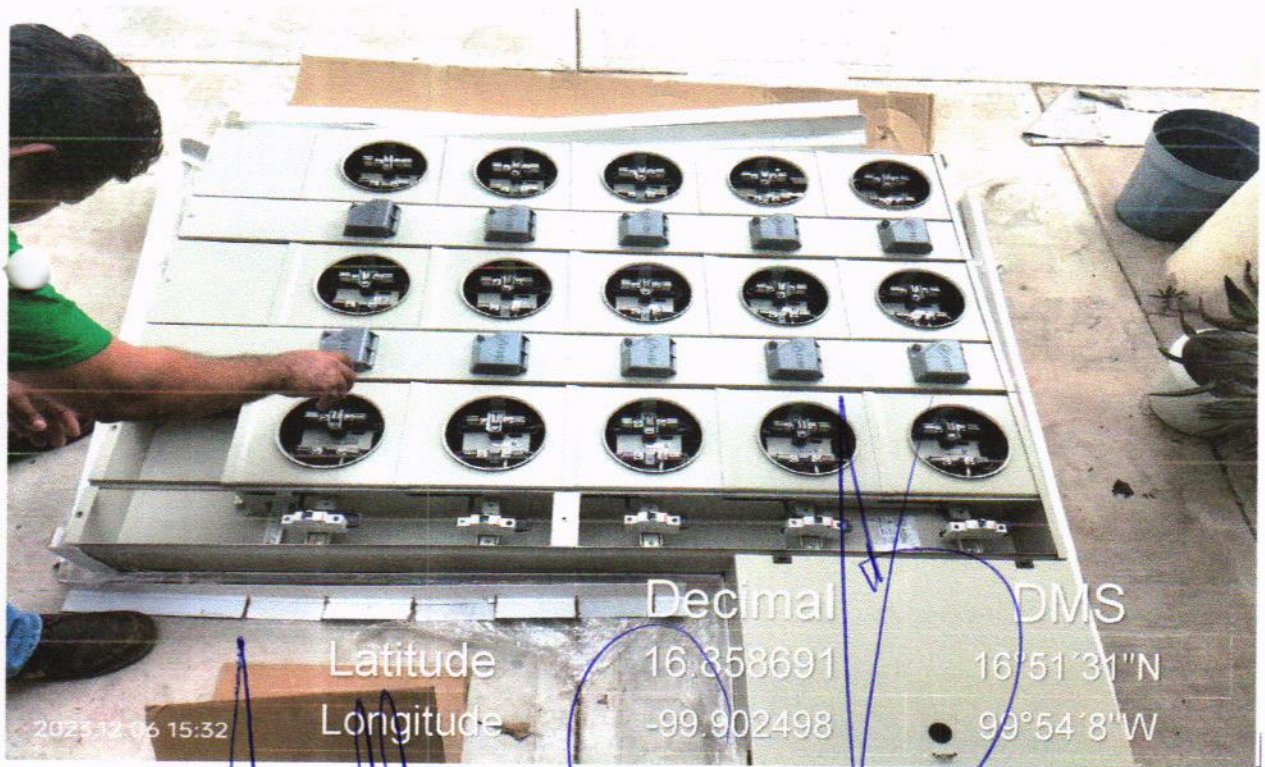

A07	BAJA TENSION	
EL-BT-011		CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES		ESTADO: GUERRERO
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**	

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**									
EL-BT-012	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	Registro		4.00					4.00	
							TOTAL	PZA	4.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-012 INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE

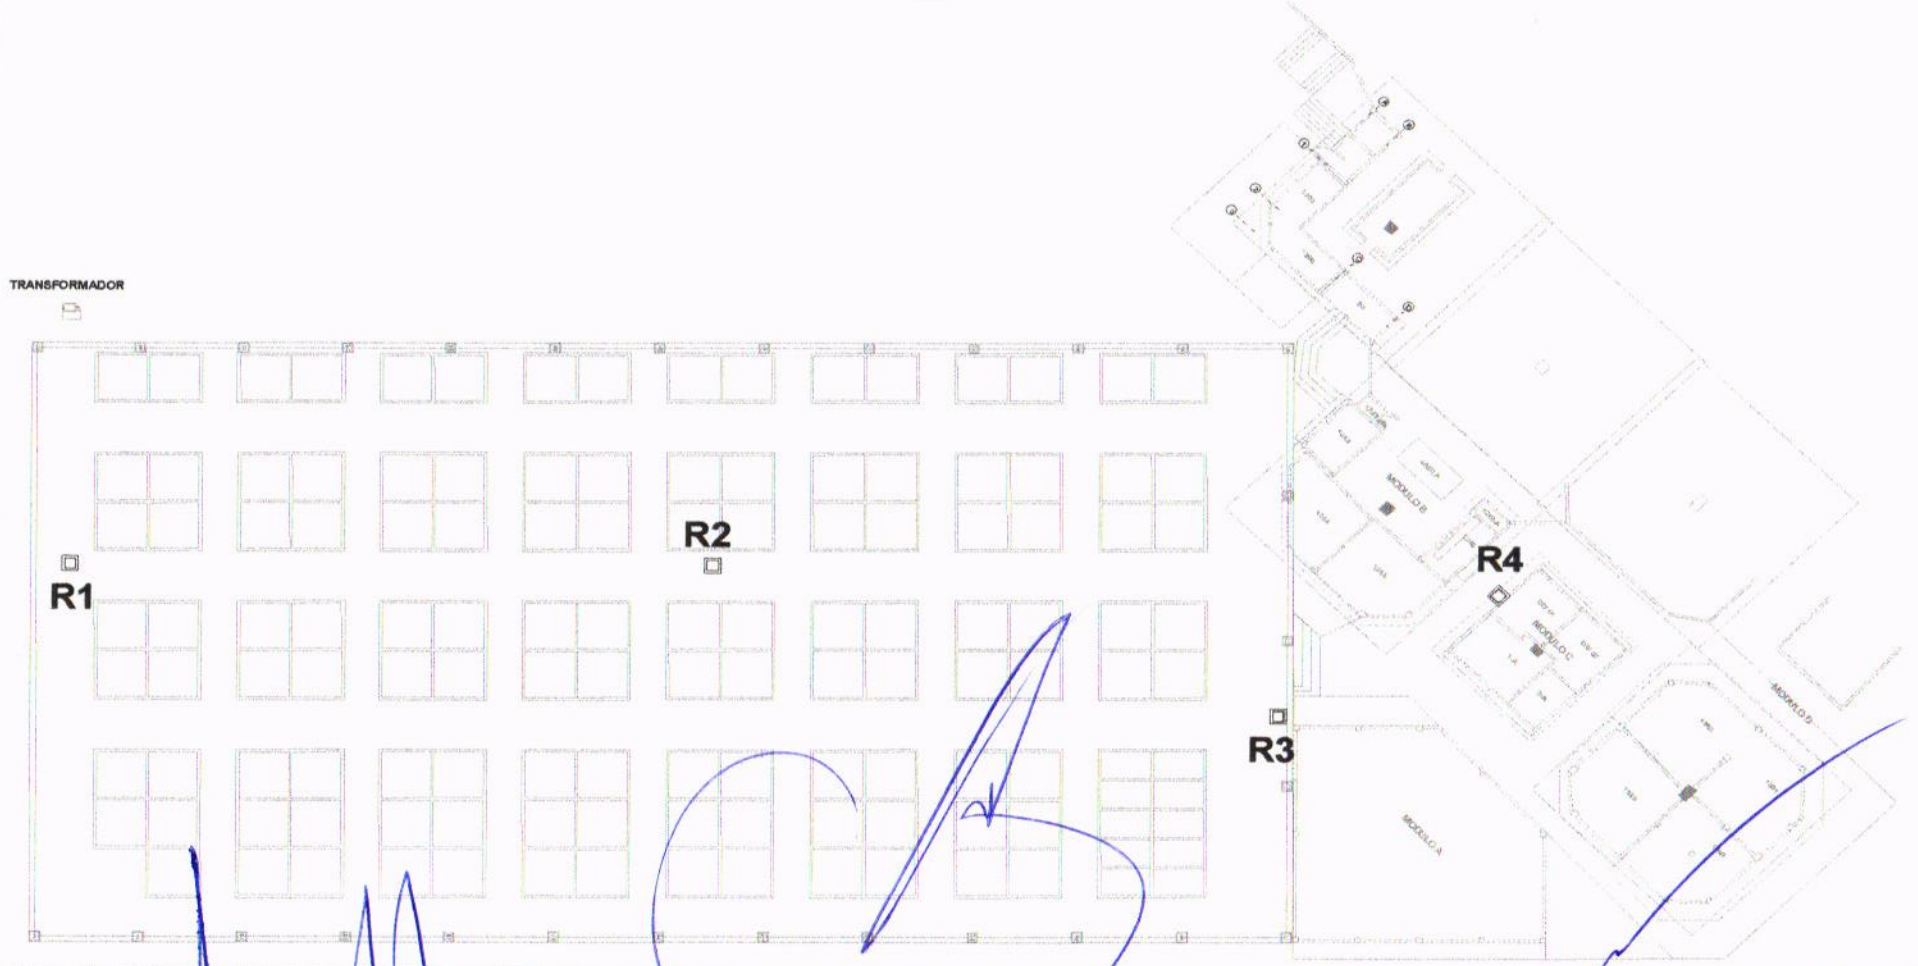

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE
	EL-BT-012	



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE
	EL-BT-012	

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES								ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA: **MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A07	**BAJA TENSION**									
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	Registro		5.00					5.00	
							TOTAL	PZA	5.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-013 REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

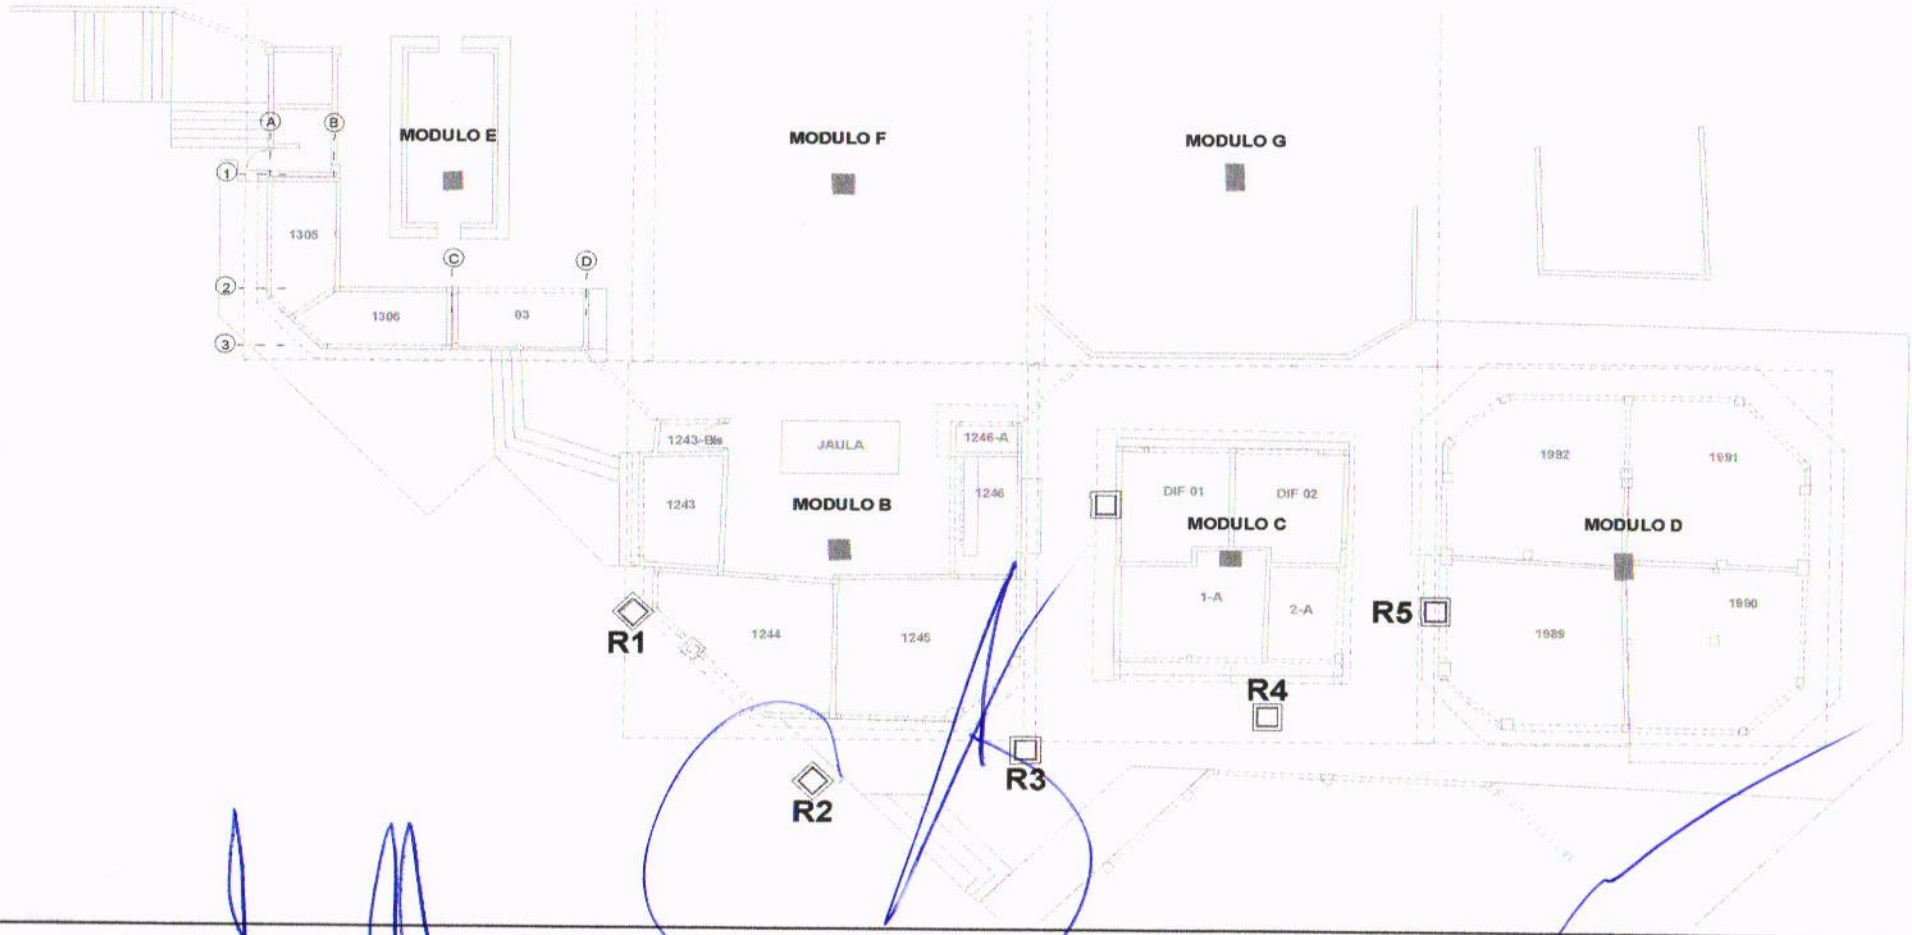

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	BAJA TENSION	
EL-BT-013		REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

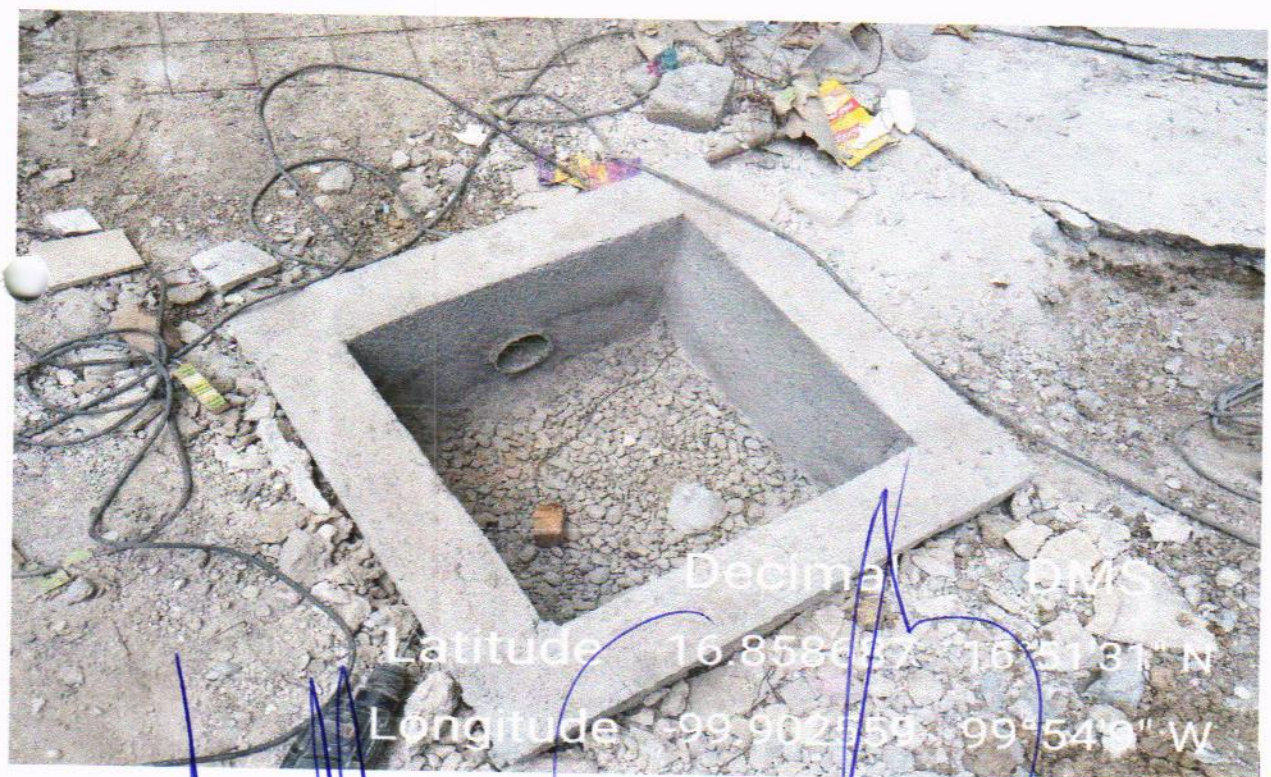

A07	BAJA TENSION	
EL-BT-013		REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA: **MAJ/574**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A07	**BAJA TENSION**									
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	Registro		1.00					1.00	
							TOTAL	PZA	1.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-014 REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

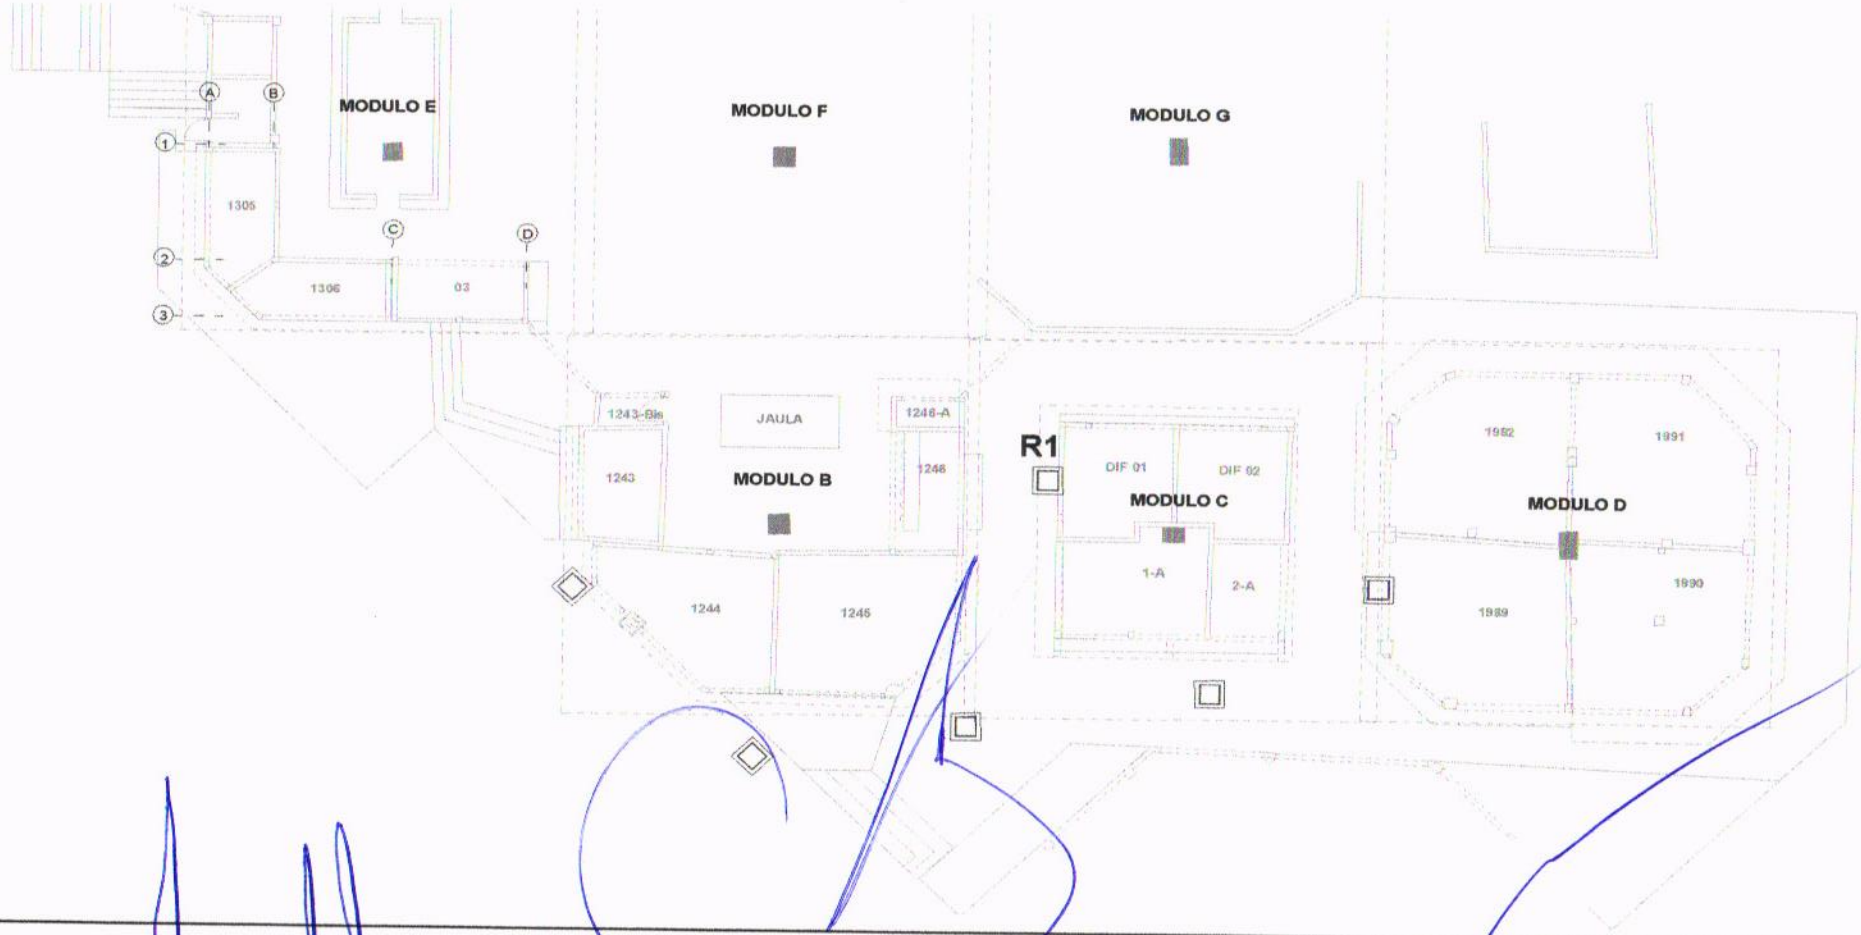

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:


ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

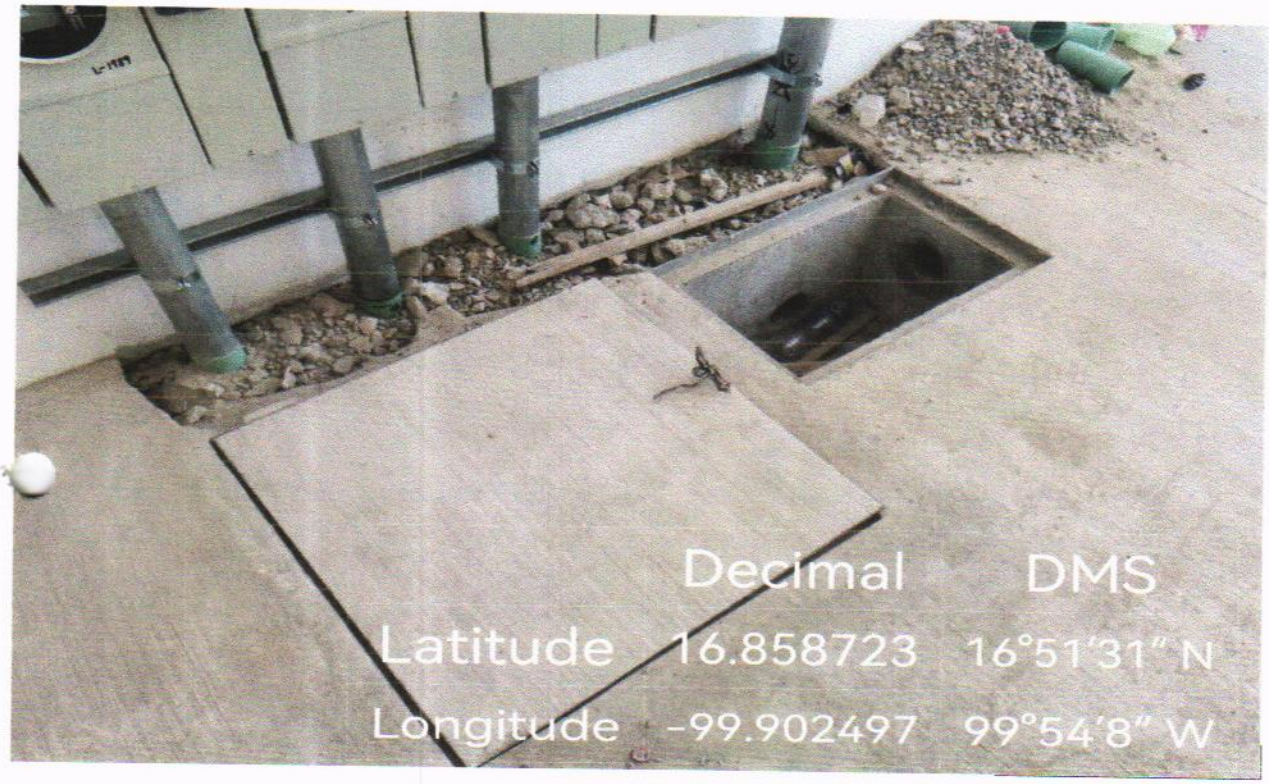

A07	BAJA TENSION	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"
	EL-BT-014	

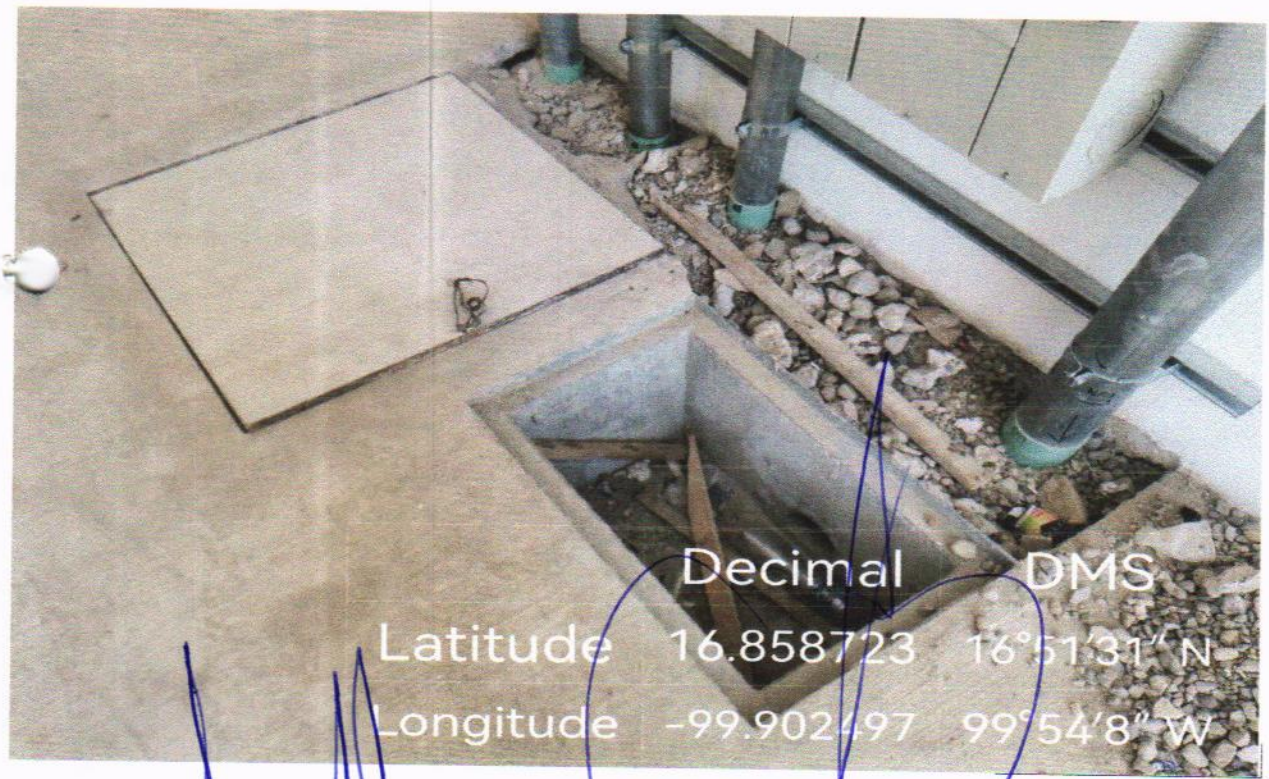

A07	BAJA TENSION	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"
	EL-BT-014	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	Registros		10.00					10.00		
							TOTAL	**PZA**	**10.00**		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**		FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-015 INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.

TRANSFORMADOR

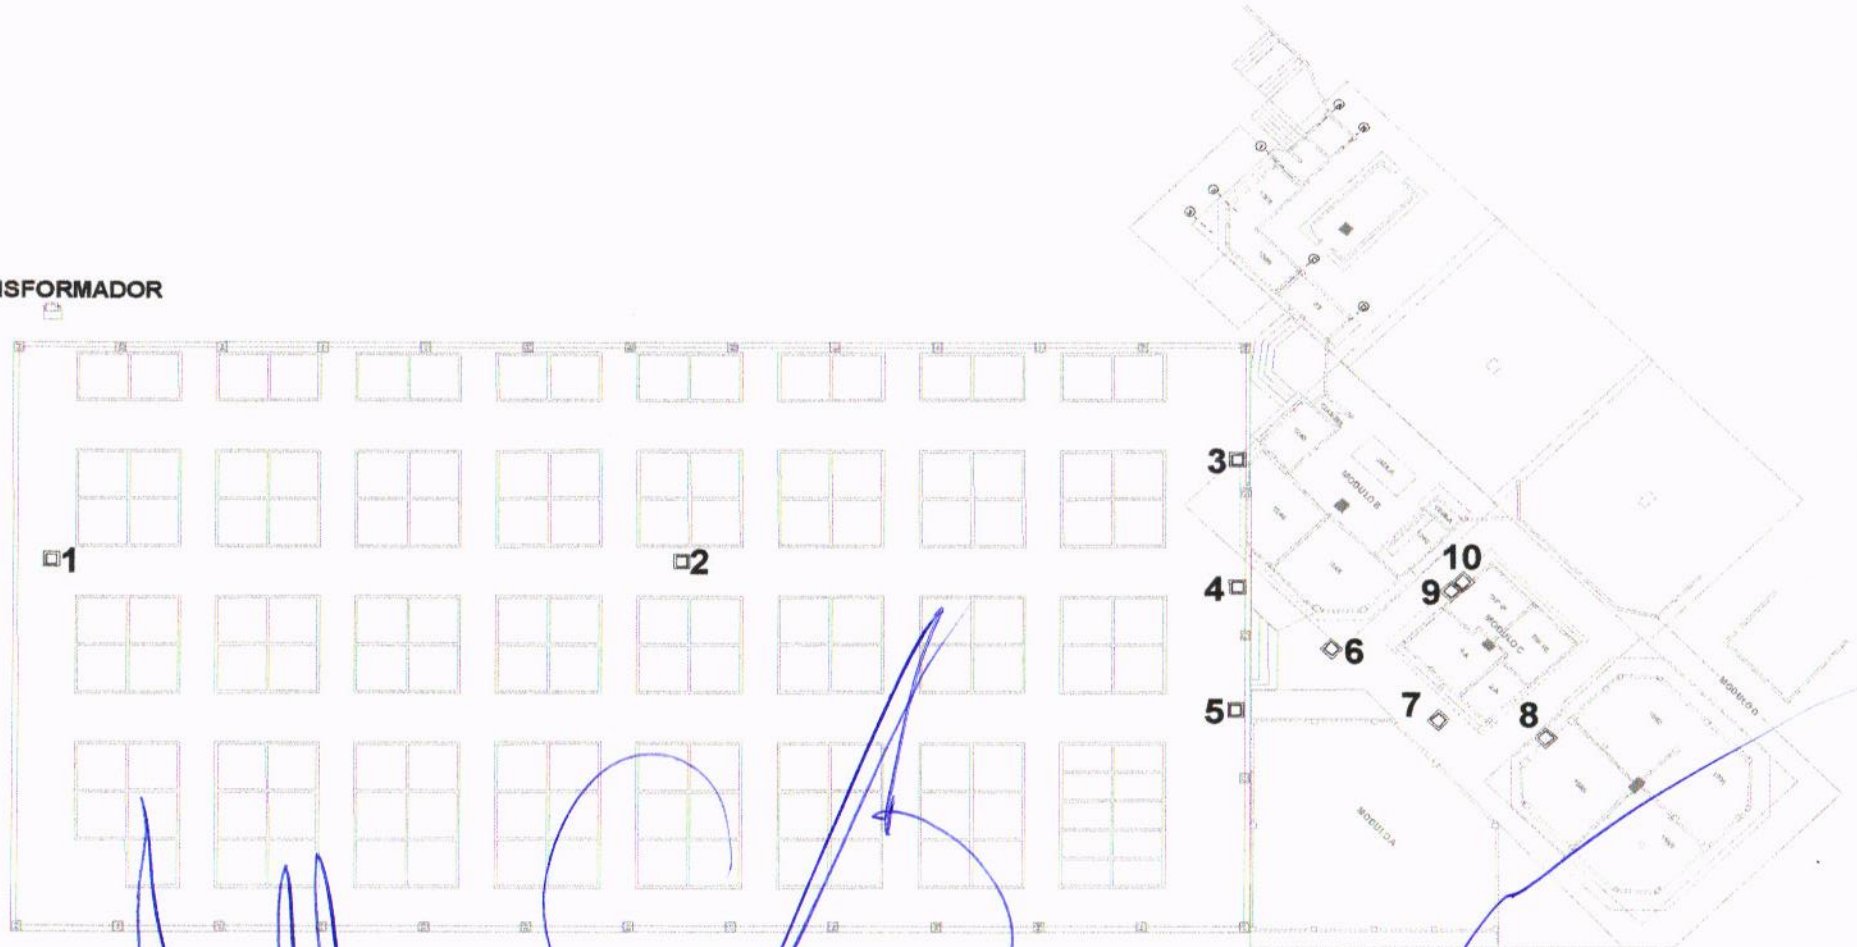

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.
EL-BT-015		



A07	**BAJA TENSION**	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.
EL-BT-015		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**			TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**			FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**			No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.			1.00						1.00	
							TOTAL	**PZA**		1.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A07 BAJA TENSION

EL-BT-016 DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.

TRANSFORMADOR



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, fracciones IV-A y XVII, 68, 70, 70-C, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 97, 98 y 99 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica; 112 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica y demás disposiciones legales aplicables, en mi carácter de Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, aprobada con registro número: ***UVSEIE 619-A***, con acreditación vigente de fecha: *miércoles, 29 de agosto de 2018* otorgada por una entidad de acreditación autorizada, y aprobación vigente de la Secretaría de Energía otorgada en oficio No. ***314.DGDCEEVS.1663.2018*** de fecha *lunes, 8 de octubre de 2018*, y habiéndose aplicado el procedimiento para la evaluación de la conformidad correspondiente a las instalaciones para el uso de energía eléctrica que se describen a continuación:

Dictamen de Verificación Folio No.: **Sin folio** — Fecha: **04/12/2023**

Nombre, denominación o razón social: ***MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ***

Registro Federal de Contribuyentes: **MAJ010101NA3** — Nombre Comercial: *NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO*

Actividad de la instalación conforme al SCIAN: ***COMERCIO AL POR MENOR***

Tensión eléctrica de suministro: (entre conductores)

Hasta 1000 volts (x) Mayor a 1000 volts ( )

Capacidad de la Subestación

Tipo de Concentración Pública: Mercados

Carga instalada 25 kW

Alcance de la verificación 25 kW

* Lugar de concentración pública **X**

* Áreas peligrosas (clasificadas)

* Industria

Instalación Nueva x

Ampliación de una instalación existente

Modificación de una instalación existente

Verificación periódica de instalación con áreas peligrosas

Subestación para cambio de tensión para la alimentación de la instalación.

Instalación existente construida antes de la entrada en vigor de la NOM-001-SEDE-2012

Fecha de la próxima verificación para áreas peligrosas (clasificadas): **No Aplica**

~~NOTAS: Se inspecciona 1er etapa de acuerdo al cuadro de cargas y diagrama unifilar~~

Datos del visitado

Calle: AV. DIEGO HURTADO DE MENDOZA — No. Exterior: s/n — No. Interior:

Colonia o Población: COMERCIAL ACAPULCO — Municipio o Alcaldía: Acapulco De Juárez

Ciudad y Estado: Acapulco De Juárez, Guerrero — Código Postal: 39672

Teléfono: 7443543588 — Celular: 7443543588 — Correo Electrónico: leonardogm10@hotmail.com

Solicitante del servicio

Nombre: LEONARDO VALENTE GARCIA MERAZA — CURP: Sin dato

Teléfono: 7443543588 — Celular: 7443543588 — Correo Electrónico: leonardogm10@hotmail.com

CERTIFICO, en los términos establecidos en los artículos 33, fracción V, y 40 de la Ley de la Industria Eléctrica, que las instalaciones en cuestión cumplen con las disposiciones aplicables de la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en el presente Dictamen de Verificación son verdaderos y acepto la responsabilidad que pudiera derivarse de la veracidad de los mismos, haciéndome acreedor a las sanciones que, en su caso, procedan.

EL TITULAR (O GERENTE) DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN

César Muñoz Ibarra

UVSEIE 619-A

Domicilio: Laurel, No. 506, Int. 2-A, Col. El Roble, C.P. 39640, Acapulco de Juárez, Acapulco de Juárez, Guerrero

Teléfono: 7441693098 Correo electrónico: acaproyecto.cmi@gmail.com

NOTA – En caso de realizar modificaciones en la instalación eléctrica después de la emisión del presente dictamen, se requerirá que dicha instalación sea verificada para evaluar el cumplimiento con la **Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).**

SEDIVER *v2.0* **|| SERVER GUID:**

A07	BAJA TENSION	EL-BT-016 DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A08	DRENAJES										
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	Pluvial	P1 a P2		8.50				8.50		
			P2 a P3		8.93				8.93		
			P3 a P5		9.88				9.88		
			P5 a P6		3.13				3.13		
			P6 a P7		15.90				15.90		
			P3 a P4		11.75				11.75		
							TOTAL	ML	58.09		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A08 **DRENAJES**

SUM-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.

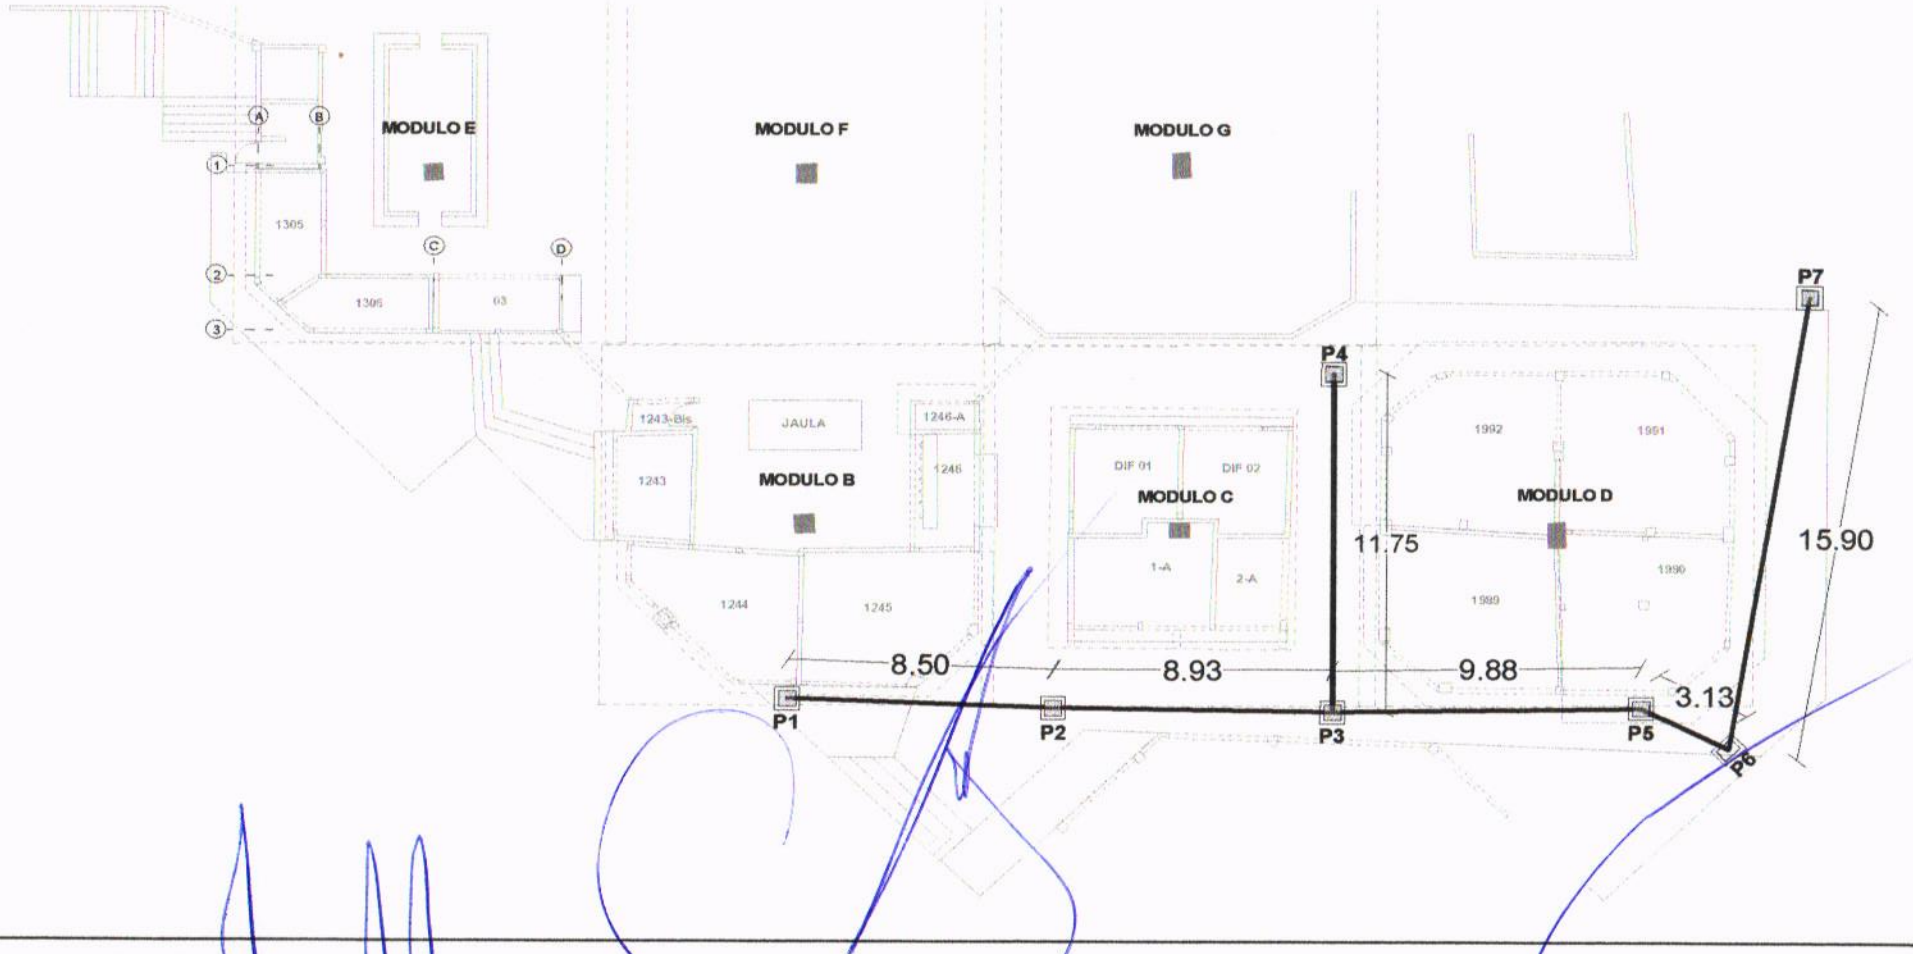

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A08	**DRENAJES**
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.



A08	**DRENAJES**
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.

SUPERINTENDENTE	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A08	DRENAJES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.
SUM-04		



A08	DRENAJES	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.
SUM-04		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A08	DRENAJES									
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	Registro		7.00					7.00	
							TOTAL	PZA	7.00	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A08 DRENAJES

REG-PLUV REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A08	**DRENAJES**
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2. ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.



A08	**DRENAJES**
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2. ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ — No. DE OBRA: **MAJ/574** — ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** — TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** — DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** — FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** — AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** — No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA									
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.				Largo	Ancho	Pza			
		Sombrilla B, C, D, E, F, G			13.00	13.00	6.00		1014.00	
		Columna E			3.80	2.40	1.00		9.12	
		Columna F			4.80	2.68	1.00		12.86	
		Columna G			3.80	3.00	1.00		11.40	
						POR AJUSTE DE ESTIMACION:			-48.981	
							TOTAL	M2	998.399	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A09 ACARREOS Y LIMPIEZA

REMESC-02 LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.



A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.
	REMESC-02	



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.
	REMESC-02	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ | No. DE OBRA: **MAJ/574** | ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** | TIPO DE OBRA: **URBANIZACION** | DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** | FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023** | AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.** | No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA					M3	ABUND.			
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	REMOCION DE ESCOMBROS				13.14	1.30		17.08	
		DEMOLICION DE MUROS				15.47	1.40		21.66	
		VOL. EXCAVACION - RELLENO				90.58	1.30		117.75	
							SUBTOTAL DEMOLICIONES:		156.49	
				LARGO	ANCHO	ALTO	PZAS	DESP.		
		ZAPATA		1.00	1.00	0.15	7.00	1.05	1.10	
		CONTRATRABE		21.40	0.15	0.25	1.00	1.05	0.84	
		CASTILLO .15 X .20		0.15	0.20	26.10	1.00	1.05	0.82	
		CADENA		11.92	0.15	0.15	1.00	1.05	0.28	
		TRABE		21.40	0.15	0.30	1.00	1.05	1.01	
		LOSA		22.08	1.00	0.10	1.00	1.05	2.32	
					M2	ESP	ABUND.			
		ENTORTADO			264.57	0.06	1.05		16.67	
		MURO			34.70	0.15	1.05		5.47	
		APLANADO			92.90	0.02	1.05		1.95	
		PISO			286.68	0.10	1.05		30.10	
							SUBTOTAL MATERIALES:		60.56	
							TOTAL	M3	217.05	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II

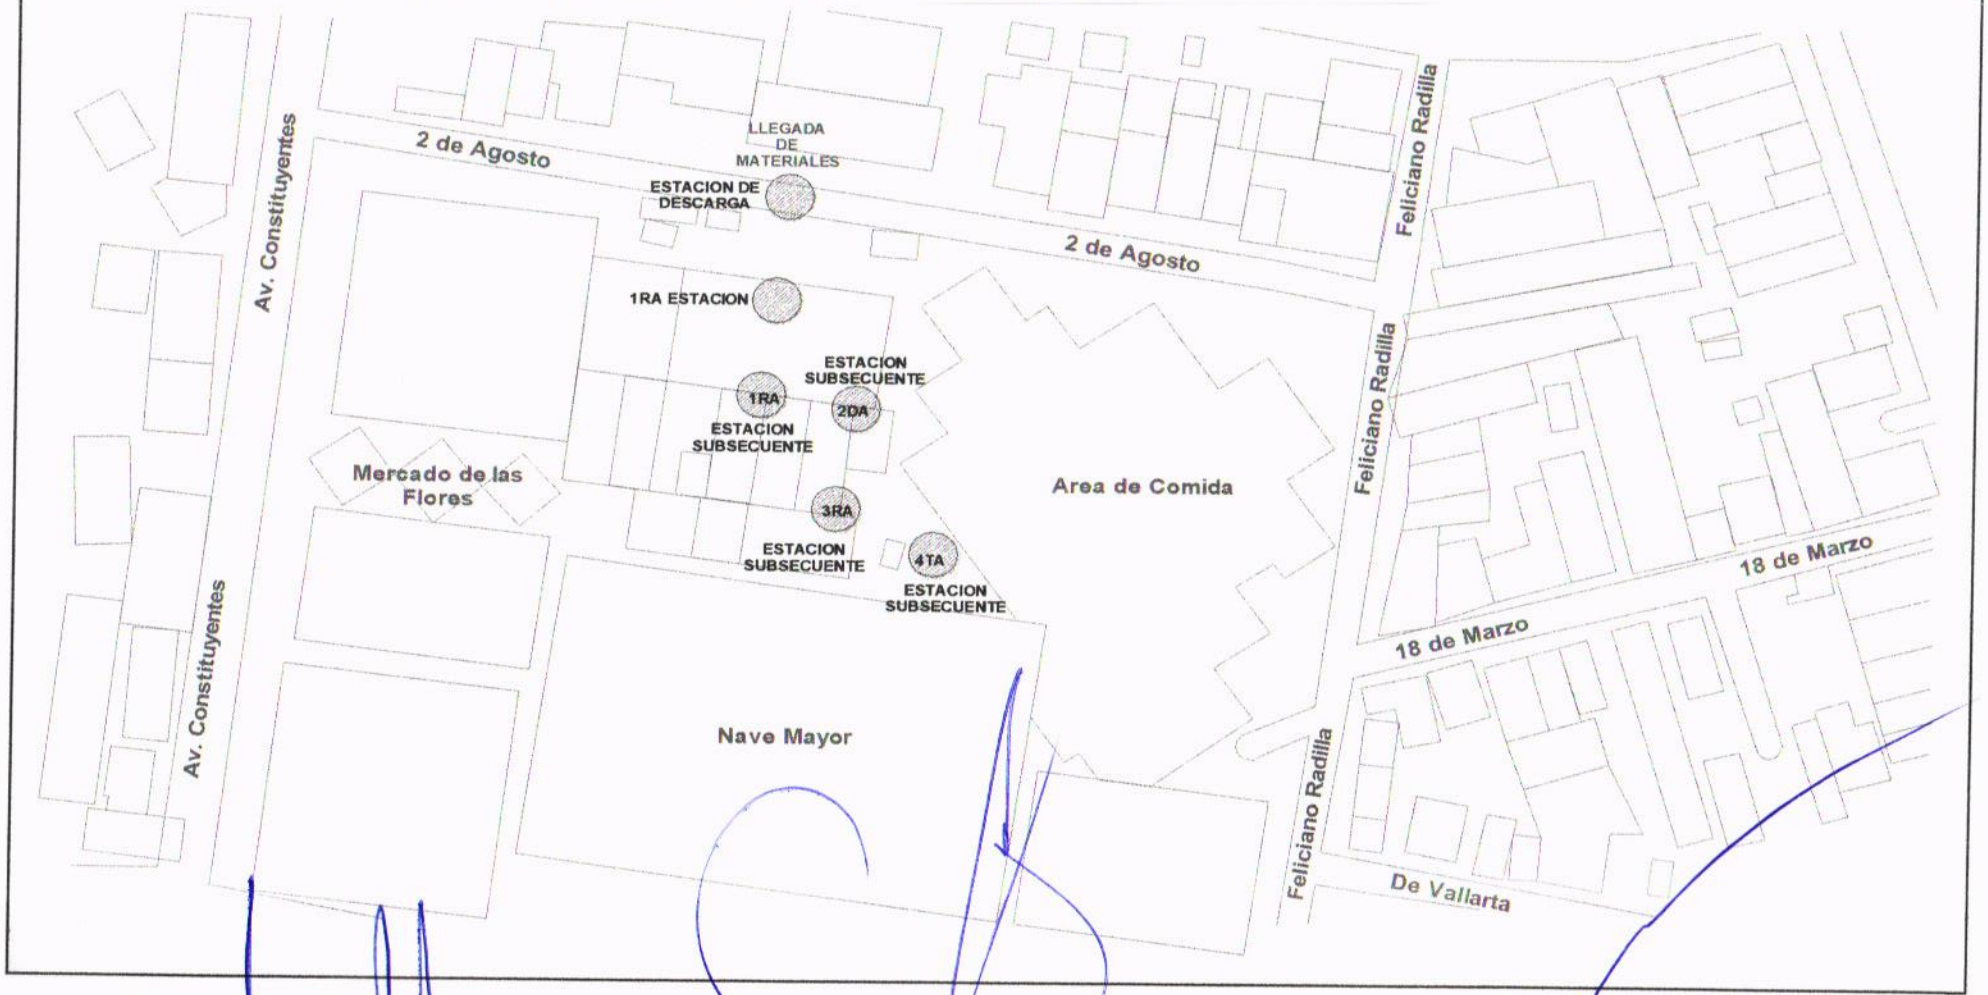

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		

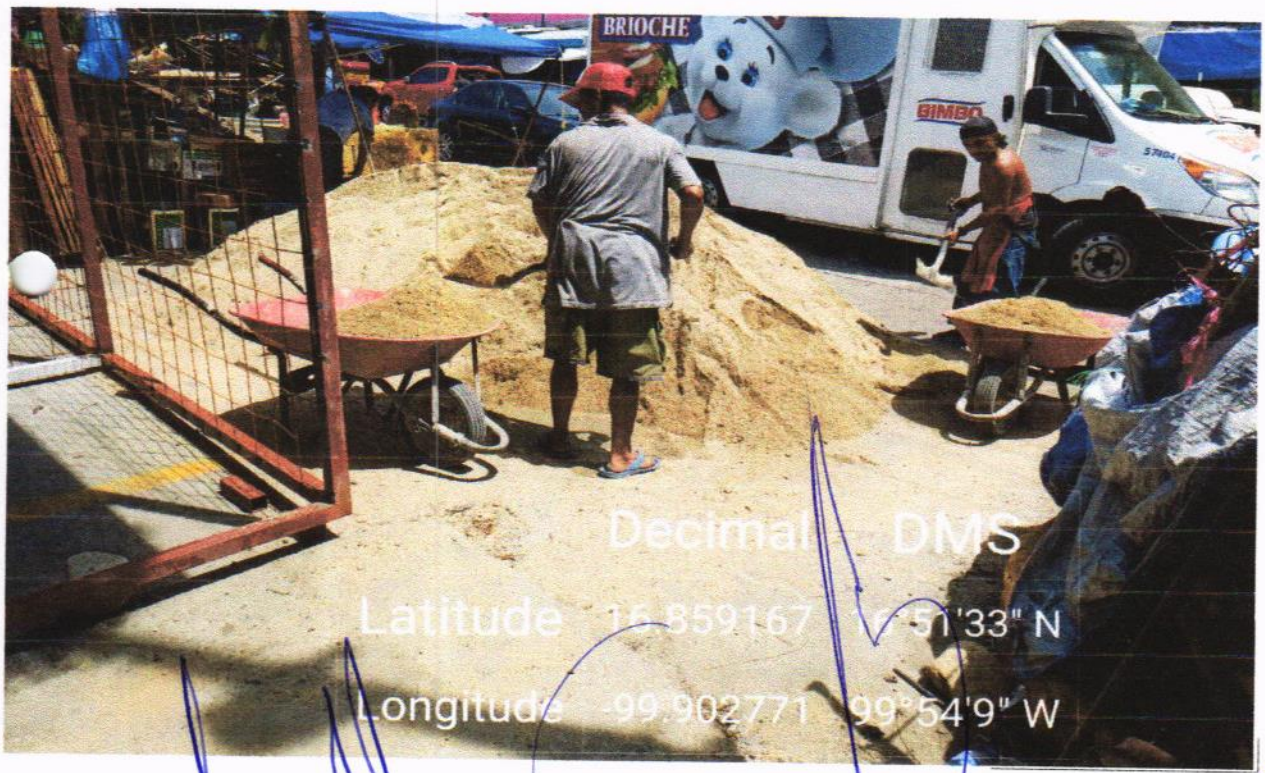

A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II
33-0496		

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMÉNEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

NÚMEROS GENERADORES

ESTADO: GUERRERO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

No. DE OBRA: **MAJ/574**

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

TIPO DE OBRA: **URBANIZACION**

DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

FECHA: **21 DE DICIEMBRE DEL 2023**

AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**

No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA									
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	GENERADOR DE ACARREO DE MAT.				217.05	No. Est.	4.00	868.20	
							TOTAL	M3	868.20	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A09 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.

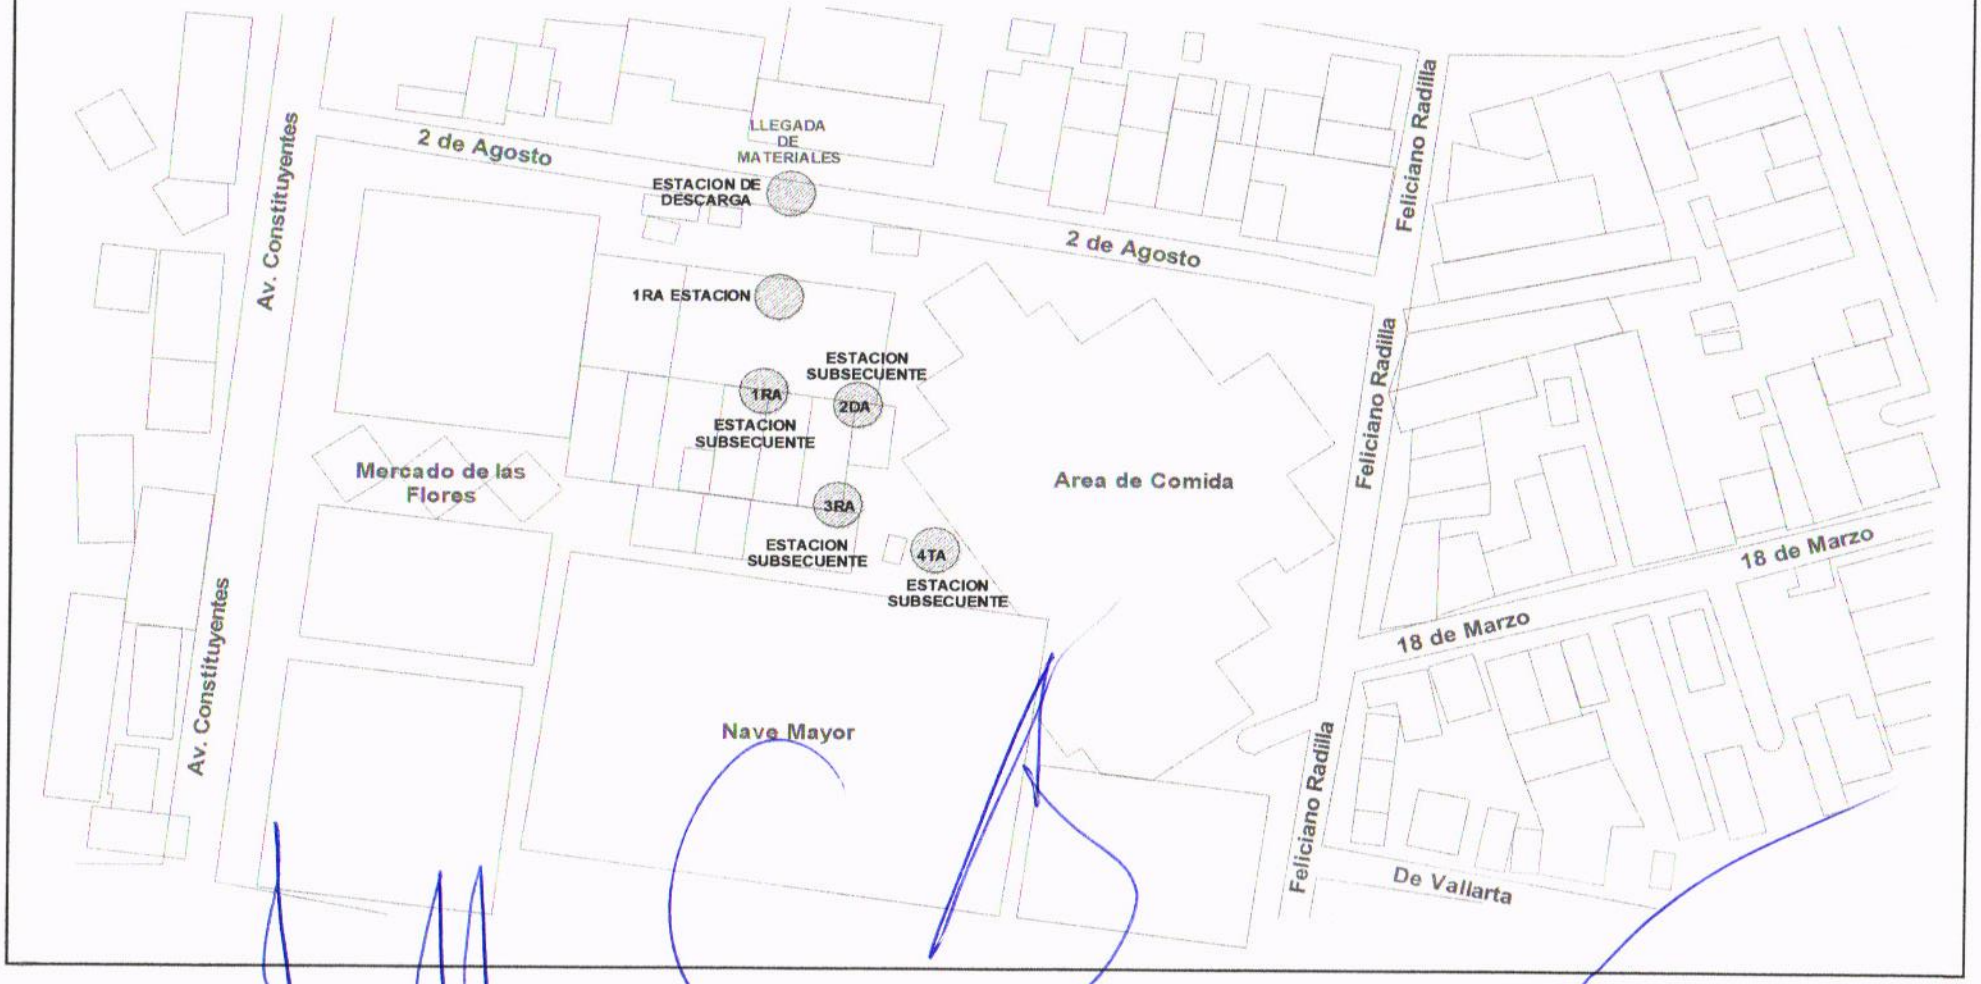

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
	33-0497	



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.
	33-0497	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**		**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					**M3**	**ABUND.**				
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	REMOCION DE ESCOMBROS				13.14	1.30			17.08	
		DEMOLICION DE MUROS				15.47	1.40			21.66	
		VOL. EXCAVACION - RELLENO				90.58	1.30			117.75	
							POR AJUSTE DE ESTIMACION:			-46.450	
							TOTAL	**M3**		**110.040**	

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)



MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)




A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)

SUPERINTENDENTE :	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023



A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)
	33-0521	

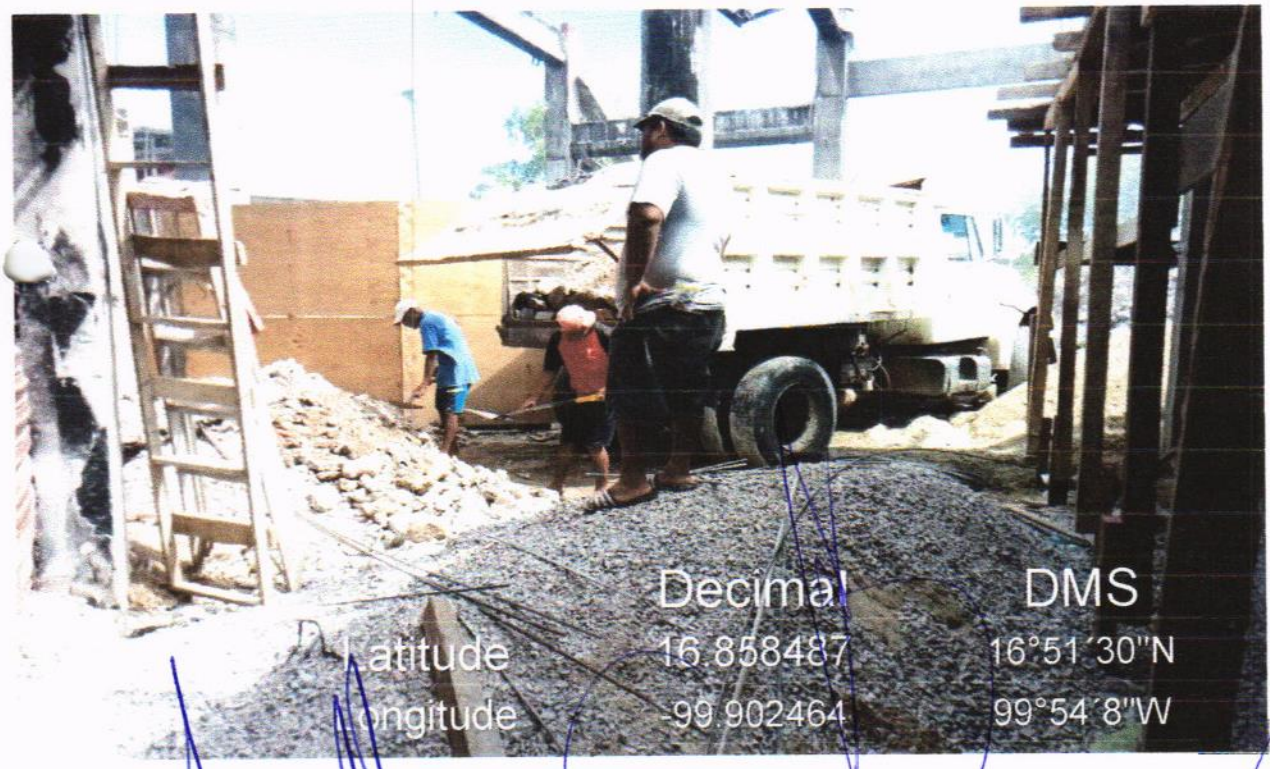

A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)
	33-0521	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AY..TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAR..

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	NÚMEROS GENERADORES									ESTADO: GUERRERO	
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ				No. DE OBRA:	**MAJ/574**				ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO	
	NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				TIPO DE OBRA:	**URBANIZACION**				DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023	
	UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**				FECHA:	**21 DE DICIEMBRE DEL 2023**				AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	
	CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**				No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**					
CLAVE	**CONCEPTO**	**EJE**	**TRAMO**	**PIEZAS**	**LARGO**	**ANCHO**	**ALTO**	**U**	**SUBTOTAL**	**REFERENCIA**	
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	Modulo E			51.75	25.82			1,336.19		
							TOTAL	**M2**	1,336.19		

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/574**	ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA:	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACIÓN No. 1 (UNO) Y FINIQUITO
UBICACIÓN:	**COL. COMERCIAL ACAPULCO**	FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023	DEL: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
CONTRATISTA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD	AL: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

C R O Q U I S

A09 ACARREOS Y LIMPIEZA

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

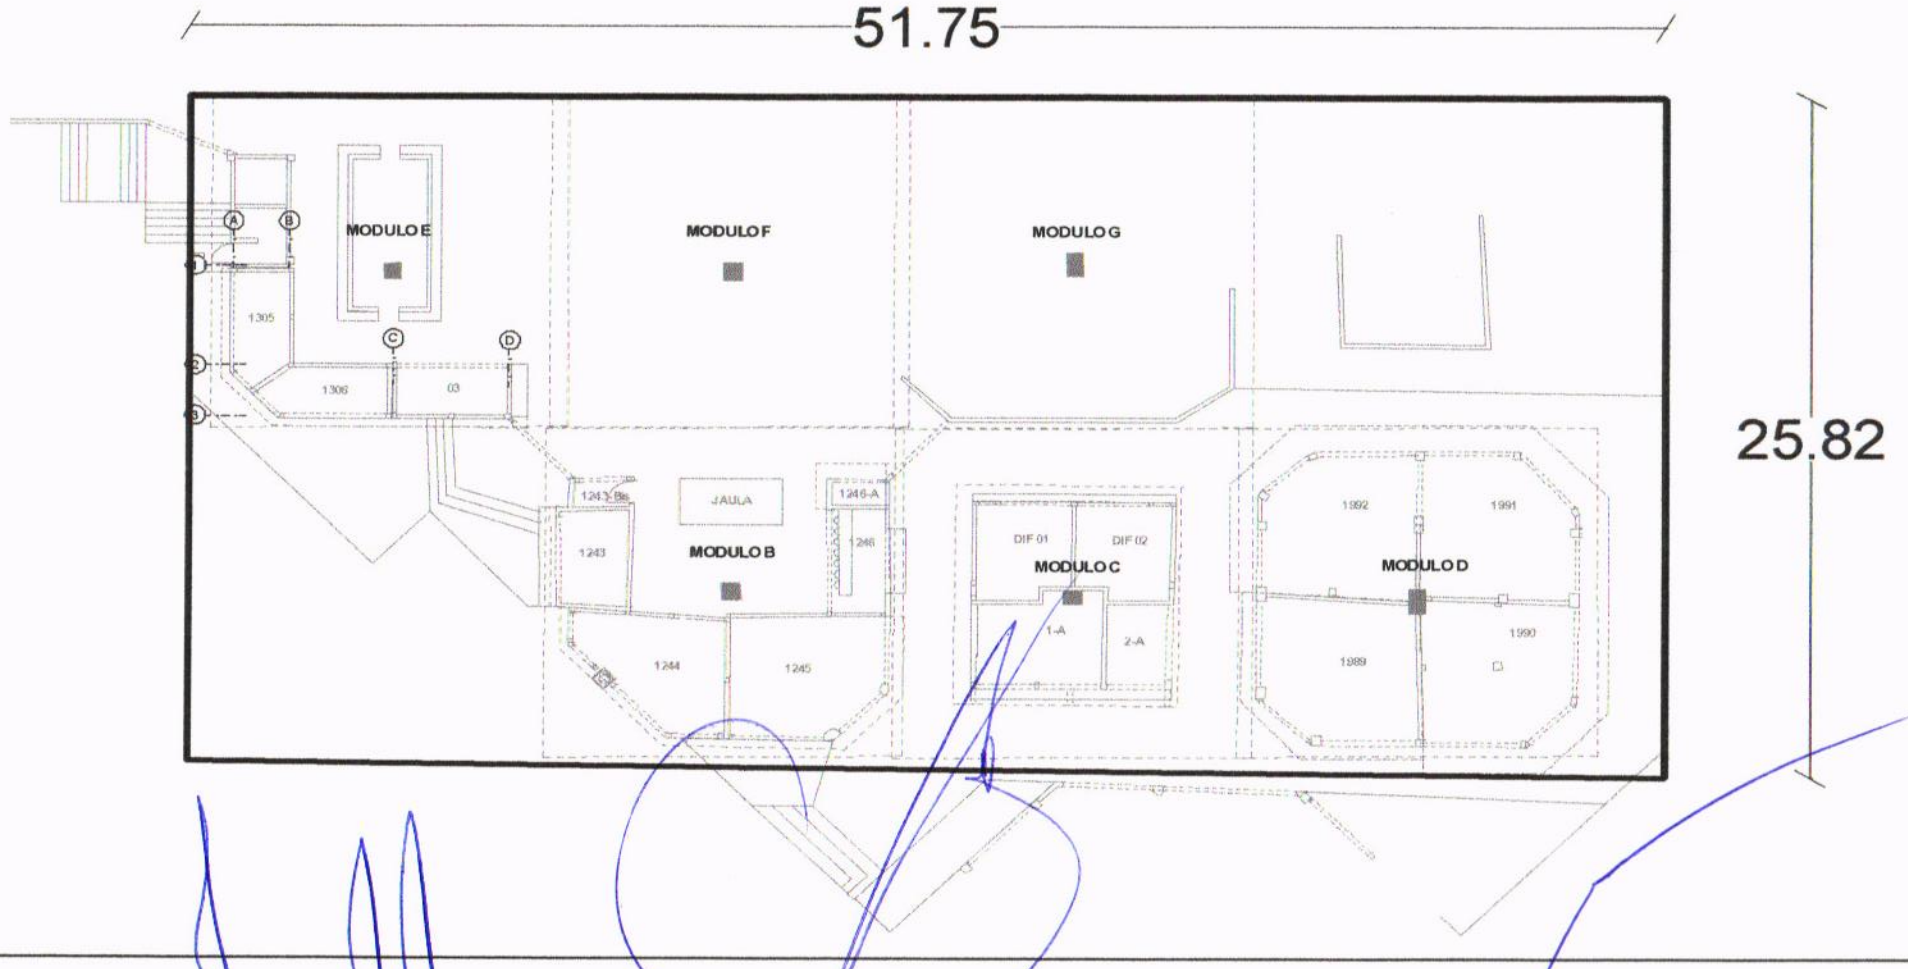

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

RESIDENTE DE OBRA:

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
UBICACIÓN	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023




A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
	33-0528	

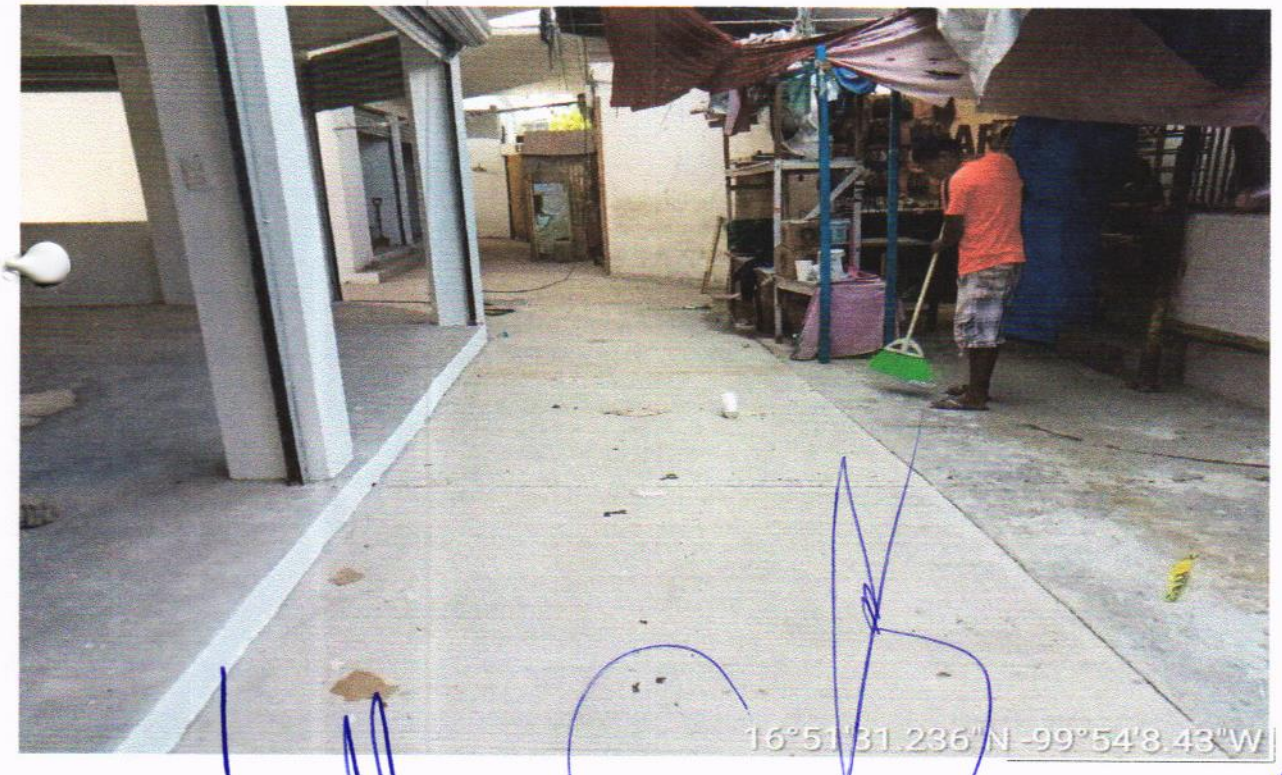

A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.
	33-0528	

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

	REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
	COL. COMERCIAL ACAPULCO	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	1 (UNO) Y FINIQUITO
		FECHA	21 DE DICIEMBRE DEL 2023

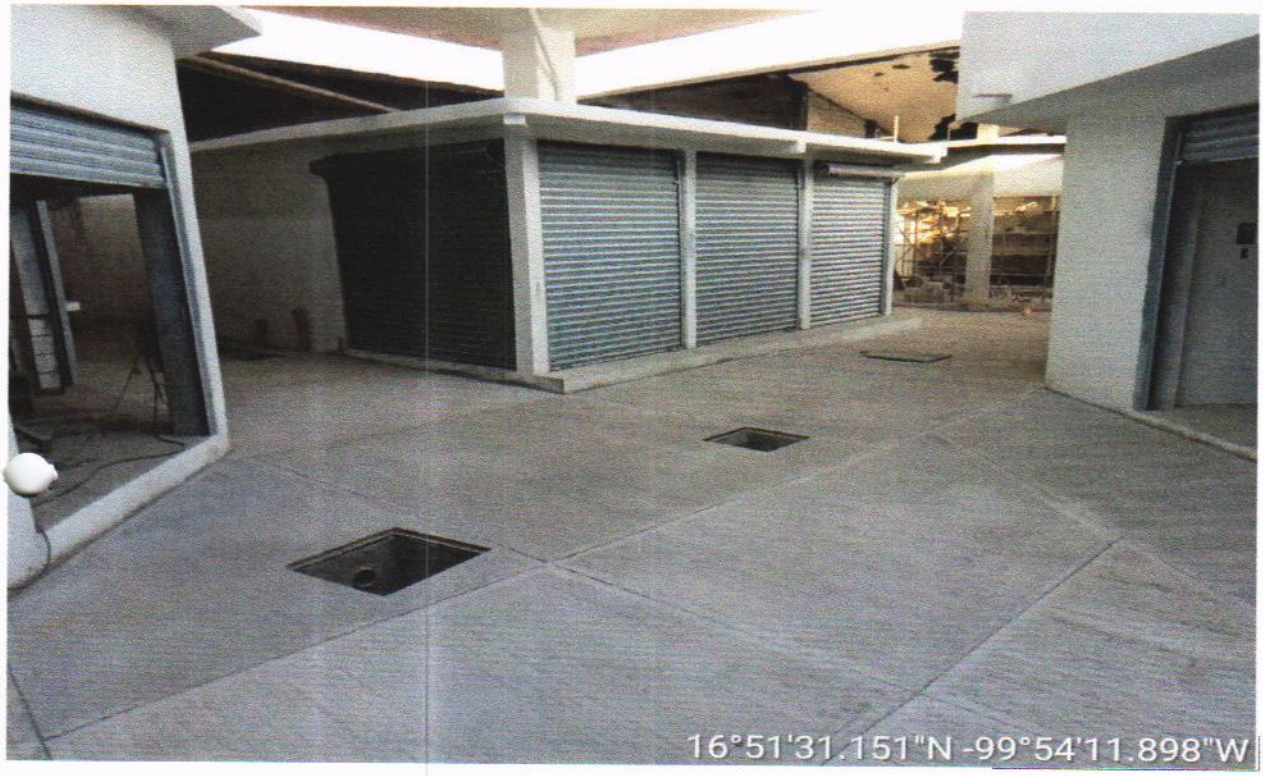

33-0528	A09	ACARREOS Y LIMPIEZA
		LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.



33-0528	A09	ACARREOS Y LIMPIEZA
		LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

SUPERINTENDENTE:	RESIDENTE DE OBRA:	JEFE DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA:
MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.		
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS	ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ	ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE



ARQ RICARDO REYES CEBALLOS

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO



ARQ. URIEL M SALMERON JIMENEZ

FOLIO Nº 297871

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FON-DAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 1:

Con esta fecha y número de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista MONROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

La cual se encuentra ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO.

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-PAISMUN/571-2023/AD
- Nombre y Teléfono del o la Contratista MONROY REYES ARQUITECTOS S.A DE C.V. TELÉFONO: 7441805619
- Nombre del Representante legal ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS TELEFONO: 7441805619

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023
- Fecha de inicio. 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023
- Monto del contrato. $2,196,516.92 (CON IVA INCLUIDO)
- Fecha del anticipo. 15 DE DICIEMBRE DEL 2023
- Monto del anticipo. $658,955.08 (CON IVA INCLUIDO)

ARQ. ABEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
SUPERINTENDENTE

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. FOLIO Nº 297872

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

NOTA 2:

En cumplimiento a los artiulos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266 Y los artpiculos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

El Supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberám formular con una anticipacion no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las entimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los corquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de cpnjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.
2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.
3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.
4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.
5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.
SUPERINTENDENTE

REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FON- FOLIO Nº 297873

OBRA: DAS CABEZAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 COL. COMERCIAL ACAPULCO.

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligacion en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, **sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos.** En caso necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceotos asi como sus esoecificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse asi se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. **Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido** de la nota en cuestión, perdiendo el dereco de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y numero de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra asi como el avance fisico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son respondabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ARQ. VALENTE MARCELO SANTIAGO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.
SUPERINTENDENTE

FOLIO Nº 297874

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 4

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS (SUPERVISIÓN) QUE LA CONTRATISTA INICIA CON RECURSOS PROPIOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO. ATENDIENDO LA SITUACIÓN EMERGENTE DE LOS LOCALES EN SUS ÁREAS GENERALES, AFECTADOS DURANTE EL SINIESTRO OCURRIDO EN EL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EL DÍA 06 DE JUNIO DEL 2023, LOS CUALES SUFRIERON DAÑOS EN INSTALACIONES, ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS EN SUS ÁREAS GENERALES, POR LO CUAL SE DEBERÁN REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS GENERALES.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 5

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA, SE DA POR ENTERADA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN LA REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO Y AUTORIZA LA REMOCIÓN DE LOS ESCOMBROS PARA ELIMINACIÓN DE FOCO DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DEL SINIESTRO.

RESIDENTE DE OBRA — ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE — ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297875

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE COMIDAS (CÁRCAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 6

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE HAN COLOCADO PROTECCIONES DE TRIPLAY EN LA OBRA, PARA EVITAR QUE PERSONAS A LA OBRA OBSTRUYAN LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN MANUAL DE ESCOMBROS, LA DEMOLICIÓN A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERÍA, DE TABLAROCA Y BLOCK LA DEMOLICIÓN DE LOS FIRMES DE CONCRETO Y EL DESMANTELAMIENTO DE CAMINOS GALVANIZADOS, TODA LA DEPENDA DE METALES SE HACE EN BOLSAS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y RETIRO REALIZADAS POR LAS EMPRESAS AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO.

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE COMIDAS (CÁRCAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 7

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE ANTE LA DIFICULTAD DE SUMINISTROS DE MATERIALES, DEBIDO A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LOCALES PROVISIONALES, UBICADOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL MERCADO Y POR LA DEMOLICIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA NAVE PRINCIPAL, NO HAY ACCESOS PARA EL SUMINISTROS DE MATERIALES SOLAMENTE SE PUEDEN SUMINISTRAR POR LA CALLE 27 DE AGOSTO, EN LA PARTE POSTERIOR DEL MERCADO. POR ESTO, SE TIENEN QUE REALIZAR ACARREOS A HOMBRO Y CARRETILLA DE MATERIALES COMO VARILLA, ALFÉN, GRAVA, TABICÓN A UNA DISTANCIA DE 100 MTS EQUIVALENTE A UNA ESTACIÓN Y 4 ESTACIONES SUBSECUENTES.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ		ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297876

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FOLDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 8

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA, LA RESIDENCIA DE OBRA SE DÁ POR ENTERADA, REALIZA UNA VISITA A LA OBRA, EN LA QUE SE PUEDE OBSERVAR QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO EN EL TRAZO, EXCAVACIONES, Y HABILITADOS DE ACEROS PARA LOS NUEVOS LOCALES POR LO CUAL VERIFICA QUE LOS ARMADOS Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES SEAN LOS MARCADOS Y QUE CORRESPONDAN AL PRESUPUESTO DE OBRA, SE VERIFICA TAMBIEN LAS SECCIONES Y VOLÚMENES DE OBRA, SE DÁ VISTO BUENO DE LOS MARCADOS, PARA QUE SE PROCEDA AL COLADO DEL DESPLANTE.

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. OLIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ

SUPERINTENDENTE.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FOLDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 9.

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLADO DE ZAPATAS Y CADENAS DE DESPLANTE, PREVIO A QUE SE COLÓ UNA PLANTILLA DE 5 CMS PARA AISLAR EL COLADO DEL SUELO NATURAL, POR LO CUAL SE REALIZAN TRABAJOS DE PEGADO DE MUROS DE TABLÓN DE CEMENTO DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADOS CON MORTERO CEM-ARENA PROP. 1:3 CONFINADOS CON CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO DE 15X20 CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y VARILLAS DE ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CMS Y CADENAS INTERMEDIAS DE 15X15, ARMADAS CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 15 CMS. LA TRABE SERÁ DE CONCRETO ARMADO DE 15X30 CMS ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 10 Y 15 CMS DE SEPARACIÓN.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. OLIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ		ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297877

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA 10

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE DEBIDO A QUE POR CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL MERCADO CENTRAL, SER ALTAMENTE COMERCIAL, Y A PETICIÓN DE LOS LOCATARIOS, PARA NO AFECTAR SU SUSTENTO DIARIO, SE ESTÁ TRABAJANDO EN JORNADAS NOCTURNAS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS ACABADOS, SE EMPIEZA CON LA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINÍLICA Y/O ESMALTE PARA APLICACIÓN DE NUEVA PINTURA ASÍ COMO LA PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, ASÍ MISMO SE INFORMA QUE LA ALTURA A LA CUAL SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS EXCEDEN LOS 3 METROS DE ALTURA Y SE DEBEN REALIZAR SOBRE ANDAMIOS, LO QUE REPRESENTA QUE EL TIEMPO DE APLICACIÓN SEA MÁS TARDADO.

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. ORIEL MADRIGAL SALMERÓN JIMÉNEZ.

SUPERINTENDENTE.-
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 11.

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE YA ESTA LISTA LA LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS, DOBLE EMPARRILLADO, PARA INICIAR EL COLADO CON CONCRETO. SE PROGRAMAN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO PARA VERIFICAR EL FRAGUADO CORRECTO Y SE TOMAN LAS MUESTRAS PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DEL CONCRETO SOLICITADO f'c = 250 KG/CM².

RESIDENTE DE OBRA — ARQ. ORIEL MADRIGAL SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE — ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297878

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE PUESTOS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 12

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA SUPERVISIÓN VERIFICA EL COLADO DE LA LOSA DE CONCRETO, EN DONDE SE SUPERVISA QUE LOS ARMADOS, SECCIONES Y NIVELES ESTÉN DE ACUERDO AL PROYECTO, QUE SE REALICE EL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA EL COLADO Y LOS ACABADOS EN LOS LOCALES NUEVOS, ASÍ MISMO AUTORIZA LOS TRABAJOS EN JORNADAS NOCTURNAS, PARA NO AFECTAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE LOS LOCATARIOS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE PUESTOS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.
FECHA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 13

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN) QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACIONES, INSTALACIÓN DE REGISTROS EN BAJA TENSIÓN TIPO "1" (CFE-RBT01) TENDIDO DE TUBERÍAS CONDUCTO PADC DE 4" PARA LÍNEA PRINCIPAL Y CONDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA ALIMENTACIÓN SECUNDARIA, ASÍ COMO LAS ALIMENTACIONES DE CADA LOCAL) RELLENANDO TODA LA TUBERÍA CON ARENA DESPUÉS UNA CAPA DE MATERIAL DE BANCO Y COMPACTANDOLA. TAMBIÉN SE INFORMA QUE SE MANDO A PEDIR AL PROVEEDOR LOS EQUIPOS DE CENTROS MODULARES DE 5 SERVICIOS Y DE GAVINETE PARA ACOMETIDA DERECHA.

ASÍ MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACIONES, TENDIDO DE TUBERÍAS PARA DRENAJES SANITARIOS Y PLUVIALES DE 6" Y LA ELABORACIÓN DE REGISTROS PLUVIALES, SANITARIOS Y ELÉCTRICOS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297879

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 14

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE INICIA EL DESCIMBRADO DE LA LOSA DE CONCRETO DEJANDO APUNTALADOS LOS CENTROS DE LOS LOCALES, PARA DAR INICIO A LOS APLANADOS EN MUROS Y LOSAS A BASE DE MORTERO CEM-ARENA 1:3 Y EL EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS DE ANCHO.

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. URIEL MAURICIO SANTERÓN JIMENEZ

SUPERINTENDENTE.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 15.

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE REALIZAN TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACIÓN DE SUELO PARA EL COLADO DE PISOS DE CONCRETO EN LAS ÁREAS GENERALES DE LOS LOCALES COMERCIALES, A BASE DE CONCRETO $f'c=200$ KG/CM² CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 COMO REFUERZO.

DE IGUAL MANERA, TAMBIEN SE REALIZA LA DEMOLICIÓN DE LAS ESCALERAS DE CONCRETO EN LOS ACCESOS EXTERIORES PARA HACER LA REPOSICIÓN DE FORJANDO LOS ESCALONES CON CONCRETO NUEVO $f'c=200$ KG/CM² DE 40 CMS DE HUELLA Y 18 CMS DE PERALTE.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SANTERÓN JIMENEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297880

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 04 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO 16

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA, EN COMPAÑIA DE LA CONTRATISTA, DETERMINARON LA UBICACIÓN DE LOS CENTROS MODULARES DE MEDICIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, QUE SERÁN EN EL MURO QUE OCUPA EL LOCAL DIF-1, SE VERIFICA QUE LA OBCTERIA ESTÉ DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y CORRESPONDAN AL PRESUPUESTO DE OBRA AUTORIZADO Y QUE TODOS LOS TRABAJOS PRELIMINARES ESTEN CONCLUIDOS, POR LO CUAL SE DA EL VISTO BUENO PARA EL TENDIDO DE LA LINEA ELECTRICA PRINCIPAL, SECUNDARIA Y LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS.

ASÍ MISMO SE LE PIDE A LA CONTRATISTA EL SUMINISTRO PROVISIONAL PARA LOS LOCALES, DEBIDO A QUE TODAVIA NO SE CUENTA CON FECHA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA DEL TRASFORMADOR PROGRAMADO.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 17

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA LA LINEA PRINCIPAL CON CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3x350+1 4/0 AWG Y SU LÍNEA DE TIERRA CON CABLE DESNUDO CAL 2, ASÍ MISMO LA LÍNEA SECUNDARIA CON CABLEADO THW CAL 8 Y SU TIERRA FISICA CON CABLE DESNUDO DEL MISMO CALIBRE, SE REALIZA EL CABLEADO PARA LA LÍNEA PROVISIONAL PARA ALIMENTAR LOS LOCALES CON CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3x350+1x4/0 AWG. SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS EN REGISTROS DE BAJA TENSIÓN CON ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8 x3 MTS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. ORIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297881

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.

FECHA: COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 18

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE PROTECCIÓN DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2"x1" ROLGADAS Y EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, ASÍ MISMO SE PINTARÁN ESTOS ELEMENTOS METÁLICOS CON PINTURA DE ESMALTE COMEX.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE.
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. COL COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 11 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 19

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZARÁN TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 30X35X15-300 A, CON KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 300 AMPERES, Y LA INSTALACIÓN DE CENTRO MODULAR DE MEDICIÓN DE 5 SERVICIOS MONOFÁSICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA, TAMBIEN SE REALIZARÁN LAS ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297882

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 20

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE HEMOS RECIBIDO EL ANTICIPO DE OBRA CORRESPONDIENTE EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023, ES POR ESTO QUE SE INCREMENTARÁ LA FUERZA DE TRABAJO PARA TERMINAR EN TIEMPO Y FORMA CON EL CONTRATO PROGRAMADO.

RESIDENCIA DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALVERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 21

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE DERIVADO DEL AJUSTE DE LAS METAS PROYECTADA POR LA CONTRATISTA, SE OBTUVIERON VOLUMENES EXCEDENTES EN ALGUNOS CONCEPTOS QUE NO ESTABAN PREVISTOS Y QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTAN PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN.

VOLUMENES EXCEDENTES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. ORIG.	CANT POR EST. INITR	EXCEDENTE
DEMESC-01	DEMOLICIÓN DE ESCOMBROS PARA ELIMINACIÓN DE FOCO DE INFECCIÓN DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACIÓN DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISIÓN, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	11.08	13.14	2.06
DEM-LOC	DEMOLICIÓN A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.14	15.47	4.33

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALVERÓN JIMÉNEZ

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297883

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO DEL. COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 18 DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 21 <CONTINUACIÓN>

EXCEDENTES

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANT. DEST.	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
1-0016*	DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS DE ESPESOR, INCLUYE ACARREOS EN 1ra ESTACIÓN	M2	269.81	363.44	93.63
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LÁMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA	M2	118.60	135.37	16.77
EXC-II-A	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE AFINE DE FONDO Y TALUD.	M3	42.55	90.58	98.03
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (COMPACTADORA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO	M3	8.05	128.42	120.37
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, INCLUYE ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.94	23.48	14.54
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.00	264.57	229.57
11-0218	REHOGUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS DE ALTO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:5 PERFILANDO UNA BRUSTA HASTA 3.00 MTS PLANEADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CMS DE ESP. INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL A 1ra ESTACIÓN.	ML	359.00	395.28	36.28
12-0239	PISO DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10 PLANEADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. JUNTAS FRIAS.	M2	267.81	286.68	18.87
22-0335	PINTURA ESMALTE COMÚN EN ELEMENTOS METÁLICOS, TRABAJO TERMINADO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MEDIO GALVINITE COMEX, ALTURA MÁXIMA 3.00 MTS, INCLUYE ACARREO EN 1ra ESTACIÓN	M2	32.00	200.04	168.04

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. OREL MANZICIO SANTAMARÍA JIMÉNEZ.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297884

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FLORES (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 21 <CONTINUACIÓN>

EXCEDENTES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD ORIGINAL	CANTIDAD REAL ESTIMADA	EXCEDENTE
EL-BT-003	INSTALACIÓN DE DUCTO PVC DE 4" PARA LÍNEA PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON AVISO DE PROPIEDAD CFE	ML	105.00	105.55	0.55
EL-BT-004	INSTALACIÓN DE POLIDUCTO PVC PESADO DE 1" PARA LÍNEA SECUNDARIA DE ALIMENTACIÓN INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, CON AVISO DE PROPIEDAD C.F.E	ML	46.50	51.11	4.61
EL-BT-005	INSTALACIÓN DE CABLE CONDUPLEX DES 3x3/0+1x4/0 AWG, PARA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICIÓN INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	115.00	205.55	90.55
EL-BT-008	INSTALACIÓN DE CABLE CU DESNUDO CAL. 8 PARA TIERRA FÍSICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERMEDIOS, INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	48.00	63.01	15.01
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, SEGUNDARIOS, CONEXIÓN Y M.O.	ML	91.72	58.09	16.37
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50 CON 0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PINO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, PISO DE 10 CMS DE CONCRETO SIMPLE F'c=150KG/CM², ACABADO EN MEDIA CAÑA, INCLUYE: BRIDA TIPO IRVING PARA TRÁFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y COMPLEMENTOS.	PZA	5.00	7.00	2.00
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 MTS A 20 MTS EN 1ra ESTACIÓN INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL 1H11	M³	95.68	217.05	121.37
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 MTS EN ESTACIONES SUBSECUENTES INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES 1H11	M³	287.04	868.20	581.16

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MARCELO SALMERÓN SAMANIEGO

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297885

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 18 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 21 <CONTINUACIÓN>

EXCEDENTES

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD POR ESTIMAR	EXCEDENTE
33-0521	CARGA MANUAL Y A MANO LIBRE EN CAMIÓN DE VOLTEO (6 M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN (DR KM)	M³	46.16	110.04	63.88
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	1300.00	1336.19	36.19

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL COMERCIAL ACAPULCO.

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2023.

NOTA NO. 22

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA, SE DA POR ENTERADA DE LA SOLICITUD DE EXCEDENTE DE OBRA RESULTADO DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, POR LO TANTO, SE DA EL VISTO BUENO PARA PRESENTAR LOS VOLÚMENES EXCEDENTES EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO Y DENTRO DEL PRESUPUESTO CONTRATADO.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ		ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS.

FOLIO Nº 297886

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 20 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 23

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZAN LOS TRABAJOS FINALES DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO EN LA COL. COMERCIAL ACAPULCO, CON LA LIMPIEZA DE OBRA CORRESPONDIENTE Y SE LE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA, LOS GENERADORES DE OBRA PARA LA VISITA FINAL DE OBRA CORRESPONDIENTE PARA LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO

RESIDENTE DE OBRA.
ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ

SUPERINTENDENTE
ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (ÁREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA NO. 24

——-CIERRE DE BITÁCORA.——

CON ESTA FECHA Y NÚMERO DE NOTA LA RESIDENCIA DE OBRA (SUPERVISIÓN EN CONJUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DE OBRA, REALIZAMOS EL RECORRIDO DE LA OBRA ANTERIORMENTE CITADA, CON CROQUIS Y GENERADORES DE OBRA A LA MANO, PARA VERIFICAR LOS VOLÚMENES TERMINADOS DE OBRA HASTA EL DIA DE HOY. ASÍ COMO EVALUAR LA CALIDAD DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168 AL 172 DEL R.L.O.P.S.R.M SE REALIZO LA CONCILIACIÓN DE LOS VOLÚMENES EJECUTADOS, REVISANDO A SU VEZ QUE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO ESTEN TERMINADOS AL 100%, CON LA CALIDAD Y LOS MATERIALES ESTIPULADOS EN LOS CONCEPTOS DEL PRESUPUESTO Y/O PROYECTO AUTORIZADO

(CONTINUA SIG. PÁGINA)

RESIDENTE DE OBRA — SUPERVISOR — SUPERINTENDENTE

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERÓN JIMÉNEZ — ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

FOLIO Nº 297887

OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FOLDOS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL COMERCIAL ACAPULCO

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.

NOTA NO. 24 <CONTINUACIÓN>

YA VISTO ESTO Y TENIENDO LOS VOLUMENES FINALES CORRESPONDIENTE A LA OBRA SE OTORGA EL VISTO BUENO A LA EMPRESA CONTRATISTA PARA QUE PRESENTE LA ESTIMACIÓN 1 (UNO) Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTRATO, TODA VEZ QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA EMPRESA ES COHERENTE CON LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA, REFERENTE A LA CALIDAD, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA OBRA SOLVENTANDO EN PAPEL LAS CORRECCIONES OBSERVADAS POR LA RESIDENCIA, ANEXANDO AL FINIQUITO EL ACTA DE RECEPCIÓN FISICA DE LOS TRABAJOS.

ASÍ MISMO, SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO, QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO CON EL CONTRATO, CON ESTA FECHA SE REALIZA TAMBIEN EL CIERRE DE LA BITÁCORA, YA QUE SE DAN POR TERMINADAS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, NO SIN ANTES INFORMAR QUE EL H. AYUNTAMIENTO NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUEDA DERIVARSE DURANTE EL PERIODO DE CONTRATO Y/O FIANZA.


RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. DANIEL MAURICIO SALMERÓN JIMENEZ.		ARQ. RICARDO REYES LEBRILLAS

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297888

OBRA:

FECHA:

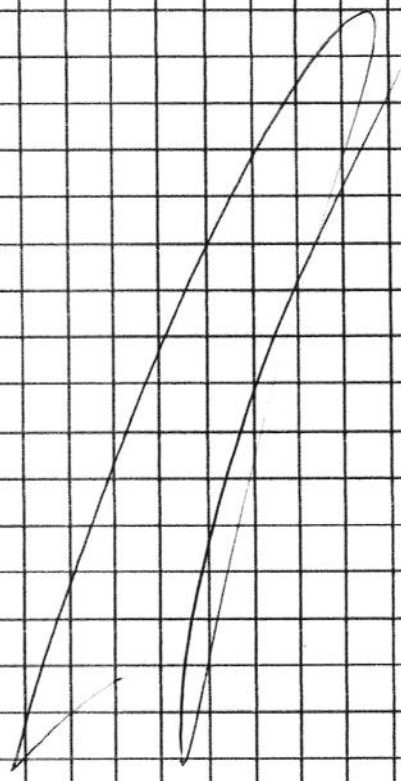

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297889

OBRA:

FECHA:

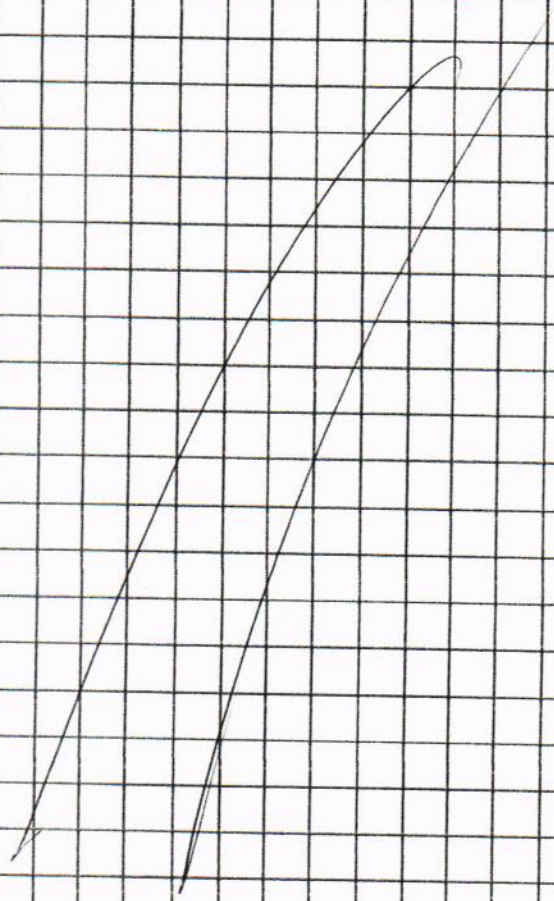

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR


SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 297890

OBRA:

FECHA:

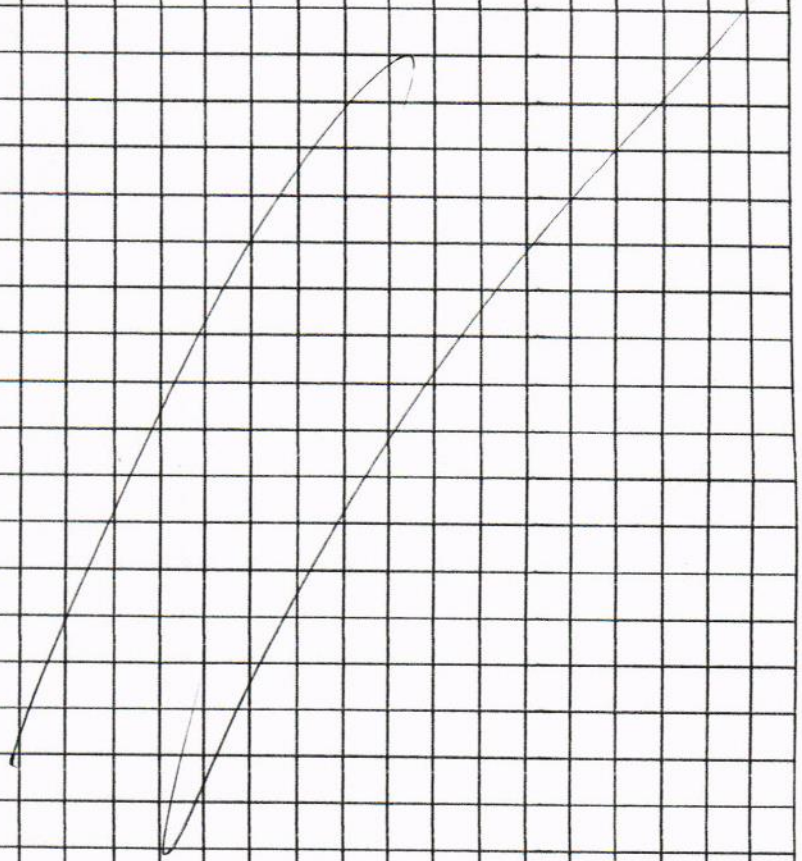

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO).**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO.**

CONTRATISTA: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 4179**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0001**

NUMERO DE (AGEB) : **12001 0001 4179**

ORIGINAL.

SPER-06
R-3

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

ACAPULCO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. COMERCIAL ACAPULCO	REHABILITACION DEL MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO	2,196,516.92	658,955.08	658,955.08	1,537,561.84

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO.**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	20-dic.-23	MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V. FACT. C068B	658,955.08	-	658,955.08
		SUBTOTAL $	658,955.08	-	658,955.08
		TOTAL $	658,955.08	-	658,955.08

miércoles 20 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 806

Paguese vía transferencia a: 27 DE DICIEMBRE DE 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. La cantidad de: 658,955.08

(** SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
	Cuenta	27/12/2023 806	658,955.08

Concepto

PAGO FACTURA NO. 34D7DDFC068B 30% ANTICIPO REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO, CON CARGO AL RAMO 33

Facturas: 34D7DDFC068B

Cuenta	NUP	Descripción	Debe	Haber
11340-00000-01004-00125		MONRROY REYES ARQUITECTOS SA D	658,955.08	
11120-00000-02005-00005		MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A		658,955.08
			658,955.08	658,955.08

Solicitud de pago 1501 - 1141

Póliza 11 12 138

OPERADO FISM 2023

Elaboró JCM

Revisó EMO

Autorizó CAMR

Santander

806

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 4I578

Referencia numérica del Emisor:

Referencias del Movimiento: 3627670

OPERADO
FAISMUN - 2023

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta CLABE: 014260655096093956

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 072261011890909892 - MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Importe: $ 658,955.08 MXN

Concepto: R33FIII F068B 30XANT REHAB MERCADO NAVE

Fecha y hora de Alta: 27/12/2023 15:34:46

Fecha y hora de Liquidación: 27/12/2023 15:34:48

Clave de Rastreo: 20231227400140BET0000436276700

RFC Beneficiario:

RFC Ordenante: MAJ010101NA3

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Banco Destino: BANORTE

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 SuperLínea Empresarial ó **55 5169 4303** SuperLínea PyME

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

RFC EMISOR: MRA2107282J2
DOMICILIO: AV. CUAUHTEMOC NO. 18-A, COL. CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39300

RECEPTOR: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
RFC: MAJ010101NA3
DOMICILIO: AV. CUAUHTEMOC S/N, INT. PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. MEXICO CP. 39350

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**
NUMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
PERIODO DEL CONTRATO: **DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.**
IPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$ 2,196,516.92**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$ 658,955.08**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **1,300 M2**
No. DE OBRA: **MAJ/574**
GEOREFERENCIAS: **LATITUD: 16°51'40.030"N - LONGITUD: 99°54'9.571"O**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FÍSICA POSITIVA

POBLACIÓN BENEFICIADA: **2,917 HABITANTES**

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVÉS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III) 2023 QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, LA CANTIDAD DE $ 658,955.08 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) POR CONCEPTO DE PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; 10% PARA EL INICIO DE LA OBRA Y EL 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD.

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A DE C.V.

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

LIC. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2021 2024

OPERADO
FAISMUN - 2023

Subtotal	$ 568,064.72
Impuestos Trasladados	
IVA 16.00%	$ 90,890.36
TOTAL	$ 658,955.08

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.)

RFC emisor:	MRA2107282J2	**Folio fiscal:**	D70E8204-D2FE-4F4E-9F7A-34D7DDFC068B
Nombre emisor:	MONRROY REYES ARQUITECTOS	**No. de serie del CSD:**	00001000000514302175
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	39300 2023-12-20 12:11:04
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Construcciones.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93141500		1.00	E48	Unidad de servicio	568,064.72	568,064.72		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD FECHA DE CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	568,064.72	Tasa	16.00%	90,890.36

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 568,064.72
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 90,890.36
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 658,955.08**

Sello digital del CFDI:

bSo8n5R3+abKjbskQiyAQhPylfCLuuA56Td7ae/DgSsvCh0U3hWZouF/E8L/rerwkWlVy5TzEMUG915MCoMn714Edr0gBcVXRWgpaaWrW+DoS1avlxRBXhs8FNfCNMdZkB3B62LTkmORm
y+22l2thO2159gWV1oCBxYX7mbWmER3SP7E9n77fXROuyzDdUAjrlLJZnb4nVEZQJUVnw9JAP7k1Y5hoZFq7XYHf+q19OXxpW2h5BsJa0GiuOzP1M8j76lrTSNv6+I9xCHbZ72meKbdPJs
ZaxvevlywC+dzl+9mGyZgYpRYLsFePRguOO730xuzzHgwMlUeYtSZx5jWcg==

Sello digital del SAT:

LZ5htFeaJLq1k4u0NgVUvUclXjTVL793r5Ct77uoUBQj3f7xToMZ+6m0GrEpVuX5oVBIZLy7CbXo1t/t5cqNp/NTJdArX80sfh3MWcV5ptskMjxNTg5RCT5rRoMhPYeyoV89QPzizlWLRb2NwoK
f1/QMMNpR8geKeqSHiRUhBxCW7Jbj7DMDJ5ecJL0nxCUE9RbNgZea0SaYGkzvhi6WOP5M1JX3lGnd/jgxm4FyWUeShZZA9lLvvglxMnDg35gA+FwKK4+uJoW2/oivABX7y+MdrlDoKZh/B
g18kECR1l7ar1xzHCkvMRalkZlMYbRMQl5eENrQuURSww3e64XWDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D70E8204-D2FE-4F4E-9F7A-34D7DDFC068B|2023-12-20T12:12:24|SAT970701NN3|bSo8n5R3+abKjbskQiyAQhPylfCLuuA56Td7ae/DgSsvCh0U3
hWZouF/E8L/rerwkWlVy5TzEMUG915MCoMn714Edr0gBcVXRWgpaaWrW+DoS1avlxRBXhs8FNfCNMdZkB3B62LTkmORmy+22l2thO2159gWV1oCBx
YX7mbWmER3SP7E9n77fXROuyzDdUAjrlLJZnb4nVEZQJUVnw9JAP7k1Y5hoZFq7XYHf+q19OXxpW2h5BsJa0GiuOzP1M8j76lrTSNv6+I9xCHbZ72meK
bdPJsZaxvevlywC+dzl+9mGyZgYpRYLsFePRguOO730xuzzHgwMlUeYtSZx5jWcg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2023-12-20 12:12:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMIREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Este documento es una representación impresa de un CFDI

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Fecha="2023-12-20T12:11:04"
Sello="bSo8n5R3+abKjbskQiyAQhPylfCLuuA56Td7ae/DgSsvCh0U3hWZouF/E8L/rerwkWIVy5TzEMUG915MCoMn714Edr0gBcVXRWgpaaWrW+DoS1avlxRBXhs8FNfCNMdZkB3B62LTkmORmy+221
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000514302175"
Certificado="MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTQzMDIxNzUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="568064.72" Moneda="MXN" Total="658955.08" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39300">
  <cfdi:Emisor Rfc="MRA2107282J2" Nombre="MONRROY REYES ARQUITECTOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="93141500" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="ANTICIPO NOMBRE DE LA OBRA:
    REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO COL. COMERCIAL ACAPULCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII
    EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD FECHA DE CONTRATO: 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: DEL 10 DE
    NOVIEMBRE DEL 2023 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2023." ValorUnitario="568064.72" Importe="568064.72" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="568064.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="90890.36"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="90890.36">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="568064.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="90890.36"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="D70E8204-D2FE-4F4E-9F7A-34D7DDFC068B"
    FechaTimbrado="2023-12-20T12:12:24" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="bSo8n5R3+abKjbskQiyAQhPylfCLuuA56Td7ae/DgSsvCh0U3hWZouF/E8L/rerwkWIVy5TzEMUG915MCoMn714Edr0gBcVXRWgpaaWrW+DoS1avlxRBXhs8FNfCNMdZkB3B62LTkmO
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="LZ5htFeaJLq1k4u0NgVUvUclXjTVL793r5Ct77uoUBQj3f7xToMZ+6m0GrEpVuX5oVBIZLy7CbXo1t/t5cqNp/NTJdArX80sfh3MWcV5ptskMjxNTg5RCT5rRoMhPYeyoV89QPzizlW
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MRA2107282J2	MONRROY REYES ARQUITECTOS	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
D70E8204-D2FE-4F4E-9F7A-34D7DDFC068B	2023-12-20T12:11:04	2023-12-20T12:12:24	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$658,955.08	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

F U N D A M E N T O J U R Í D I C O

VISTO PARA EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 29: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. POR CONTRATO; O

II. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ASÍ MISMO EL ARTÍCULO 39 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, NOS MENCIONA, QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. LICITACIÓN PÚBLICA;

II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

POR OTRO LADO, EN SU ARTÍCULO 54 FRACCION I, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y TRATÁNDOSE DE OBRAS PÚBLICAS, SIEMPRE QUE EL MONTO DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, NO EXCEDA DE **VEINTE MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**;

ASIMISMO, ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PUBLICARÁ **EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN** EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. CONCORDANTE CON LO ANTERIOR EL **10 DE ENERO DEL 2023**, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA DA A

CONOCER QUE EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ES DE: $103.74 PESOS MEXICANOS LOS CUALES ESTARAN VIGENTES APARTIR DEL 1ro. DE FEBRERO DEL AÑO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5, DE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, QUE SIRVE DE BASE PARA CALCULAR EL MONTO MÁXIMO PARA QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PUEDAN CONTRATAR BAJO SU RESPONSABILIDAD OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

R E S U L T A N D O S

PRIMERO.- QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO.- QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DICTAMEN TIENEN LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III Y V, INCISO G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTÍCULO 27 FRACCIONES XVI, XX, XIV, XXI, XXII, XXV, XIX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL RELACIONADOS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIOS DE FACULTADES DEL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

TERCERO.-QUE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

CUARTO.- PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA DE QUE SE TRATA, SE TOMO EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY EN COMENTO, SIENDO SELECCIONADA LA EMPRESA CONTRATISTA, **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C. RICARDO REYES CEBALLOS,** QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, EL EQUIPO MAYOR Y MENOR ES EL ADECUADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y EL PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO, YA QUE EN SU CURRICULUM CUENTA LA EXPERIENCIA EN CUANTO A OBRAS SIMILARES Y OBRAS DE MAYOR MAGNITUD.

QUINTO.-QUE LOS TRABAJOS DE**: REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO,** ASCIENDE A UN MONTO DE: **$1,893,549.07 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTO.- QUE EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 266, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O **DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION DE: $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.), RESULTANDO EL SIGUIENTE MONTO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN:

103.74*20,000= 2,074.800.00

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ES DE: **$103.74** QUE MULTIPLICADO POR VEINTE MIL, NOS DA COMO RESULTADO EL IMPORTE DE: **$2,074,800.00 (DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N.),** POR LO QUE DICHO IMPORTE ES TOMADO COMO BASE PARA CUMPLIR CON LO PRECEPTUADO EN EL REFERIDO ARTÍCULO, Y ASÍ OTORGAR LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO,** QUE ASCIENDE A UN MONTO DE: **$1,893,549.07 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NI EL CARGO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS PROPIO DEL AYUNTAMIENTO, CONCLUYENDO CON ESTO QUE EL COSTO DE LA OBRA NO REBASA EL MONTO SEÑALADO EN EL CITADO ARTÍCULO.

LA PRESENTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

A).- DE ECONOMIA: POR TRATARSE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTOS DE ACTUACIÓN, ESTA SE REALIZA CON LOS PRECIOS DE TABULADOR DETERMINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LO QUE REPRESENTA EL INDICADOR MÁS ADECUADO DE LA PROPORCIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE INVERSIÓN, COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL, Y EN ESTE MISMO SENTIDO LOS MEJORES PRECIOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

B).- DE EFICACIA: SE INVITO A LA EMPRESA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE RESPUESTA INMEDIATA NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO. CON EL HECHO DE RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE ATIENDE CON MAYOR RAPIDEZ LA DEMANDA DE LAS INSTALACIONES QUE REQUIERE UNA REHABILITACION DE MERCADO ADEMAS, AL ASEGURARNOS QUE LA EMPRESA SELECCIONADA PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS Y NOS FACILITA EL PROCESO DE CONTRATACION, EFICIENTANDO CON ELLO LA EJECUCION DE LA OBRA. CON ESTO SE CUMPLE CON EL PROPOSITO PERSEGUIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE ES EN ESTE CASO, EL ADJUDICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL OBJETO DE UN CONTRATO.

C).- DE EFICIENCIA:CON LA MODALIDAD ELEGIDA SE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL COSTO ACEPTABLE ASIGNANDO

EL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS EN LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO COMBATIR LOS ÍNDICES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO, POR LO QUE SON COBERTURA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, COINCIDIENDO CON ALGUNOS DE LOS SEÑALADOS EN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE.

D).- DE IMPARCIALIDAD: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE EXISTA UNA POBLACIÓN SIN ÍNDICES DE POBREZA, MARGINACIÓN, REZAGO Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, HABIÉNDOSE SELECCIONADO CON IMPARCIALIDAD A UNA EMPRESA CUYA CAPACIDAD NOS GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL COMPROMISO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON SU CURRICULUM COMO EMPRESA Y LA CURRICULA DE SU PERSONAL Y SIN MEDIAR OTRO TIPO DE RAZONES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA, SE REALIZO CON EL UNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, POR LO QUE SE REALIZO CON IMPARCIALIDAD QUE JUSTIFICA Y PERMITE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, DICHA IMPARCIALIDAD SE REFIERE A ECONOMIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, QUE GARANTIZAN Y SATISFACEN EN FORMA FEHACIENTE LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA IDONEA CONTRATACION QUE SE PRETENDE.

E).- DE HONRADEZ: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZA CON HONRADEZ, TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE PLANTEO SE LLEVO A CABO CON TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE JUSTIFICAN, REALIZÁNDOSE EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES QUE SE REQUIEREN OBTENIÉNDO ASÍ LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO. HABIÉNDOSE EVALUADO ADMINISTRATIVAMENTE A LA EMPRESA SELECCIONADA POR LO QUE NO SE ENCONTRÓ IMPEDIMENTO DE ESTE CARÁCTER PARA SU CONTRATACIÓN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y

C O N S I D E R A N D O

1.- QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN Y CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO, CUYO OBJETO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU REALIZACIÓN.

2.- QUE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES DE LEY, DETERMINO PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR RAZONES QUE DE ACUERDO A EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021 - 2024 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CONTEMPLA MEJORAR INTEGRALMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; SIENDO UNAS DE LAS DEMANDAS MÁS SOLICITADAS, LA DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ANDADORES, ESCALERAS Y PRINCIPALMENTE LA DE PAVIMENTAR CON CONCRETO

HIDRÁULICO SUS ACCESOS PRINCIPALES, OBTENIENDO CON ELLO SER INCLUIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CONTAR CON EL SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES, COMO SON: GAS, AGUA ENVASADA, ENTRE OTROS. ASÍ COMO PODER ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE DAN SOPORTE DE VIDA, SIENDO ESTOS: AGUA POTABLE, DRENAJE, SEGURIDAD PÚBLICA, SALUD Y ELECTRICIDAD, LOGRANDO CON ELLO INCREMENTAR LA COBERTURA DE CARÁCTER SOCIAL.

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SE RESUELVE

PRIMERO. – QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y EN COORDINACION CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y HABIÉNDOSE SATISFECHO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DETERMINA ADJUDICAR A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL AL C. RICARDO REYES CEBALLOS,** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO UBICADA EN COL. COMERCIAL ACAPULCO,** QUE CONSTA DE UN MONTO TOTAL DE: **$1,893,549.07 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.),** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE: **$302,967.85 (TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.),** DANDO UN TOTAL DE: **$2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.),** POR LO QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERÁ DEL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

SEGUNDO.-NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

ASÍ LO DICTAMINÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EL DÍA SEIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

A T E N T A M E N T E

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

LMMR/LAAT/FCHO/aaha.

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 4500
FOLIO ANUAL: 018

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO REYES CEBALLOS**
DOMICILIO:	AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
TELÉFONO:	744 688 4960, 744 180 5649
CORREO ELECTRÓNICO:	monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
RFC:	MRA2107282J2
IMSS:	B61 74079 10 7
INFONAVIT:	B61 74079 10 7
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS**
CÉDULA PROFESIONAL:	6952505
FECHA DE CÉDULA:	25 DE ABRIL DEL 2011
RFC:	RECR860821IJ3
TELÉFONO:	744 180 5649
CORREO ELECTRONICO:	ricre_aca21@yahoo.com.mx
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**23 DE MAYO DEL 2022**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	JORGE OCHOA JIMENEZ	
NOTARÍA:	TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES.	
CIUDAD:	ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.	
No. DE ACTA:	64095	FECHA: 28 DE JULIO DEL 2021
No. REG. PUB.:	N-2021076055	FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

VIGENCIA: 01 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	RICARDO REYES CEBALLOS REPRESENTANTE LEGAL	**ING. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
4500 Registro **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** Nombre o razón social **RICARDO REYES CEBALLOS** Representante legal **AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** Dirección social R.F.C. **MRA2107282J2** IMSS **B61 74079 10 7** TEL. **744 688 4960, 744 180 5649**	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** Nombre de la Obra **COL. COMERCIAL ACAPULCO** Ubicación **ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/574** Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)** Fecha: **08 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/574

$ 1,893,549.07

REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Nombre de la Obra

COL. COMERCIAL ACAPULCO
Ubicación

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 1,893,549.07
16% IVA	$ 302,967.85
TOTAL	**$ 2,196,516.92**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 10 de Noviembre del 2023	Fecha de terminación: 21 de Diciembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas

Acapulco, Gro., 06 de Noviembre del 2023

PCOR-01
REV. 02

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro , Acapulco , Gro., C.P. 39300
Tel (744)440 70 00 Ext. 4223 y 4227

CONTRATO N°. MAJ-FAISMUN/574-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE**, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**, REPRESENTADA POR EL C. **RICARDO REYES CEBALLOS, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 4500,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,**

GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **64095 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JORGE OCHOA JIMENEZ TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **N-2021076055 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.**

2.2.- EL C. **RICARDO REYES CEBALLOS,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **64095 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2021** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JORGE OCHOA JIMENEZ TITULAR EN EJERCICIO DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 3 DEL DISTRITO NOTARIAL DE TABARES., ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **N-2021076055** DE FECHA **21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **AV. CUAUHTEMOC NO 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **MRA2107282J2.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **4500.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **B61 74079 10 7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE

LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO,** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE, BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM SOBRE BASTIDOR DE POLINES, CADENA DE DESPLANTE F`C:250 KG/CM2 DE 15X25 CMS ARMADA CON 4 VARILLA No.4 ESTRIBOS No. 2A CADA 15CM, CASTILLO DE CONCRETO F`C:250 KG/CM2 DE 15X20 CMS ARAMDO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No.2 A CAD 25 CMS, PISO DE CONCRETO F`C: 200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECCTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULICO O RAYADO, PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2X1 PULG., PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, ELABORACION DE ROTULOS EN MUROS, CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA, REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0,50X,050X,060 MT. A BASE DE TABICON 10X14X28 CM INTERIOR ACABADO FINO, CARGA MANUA Y A TIRO LIBRE EN CAMON DE VOLTEO 6M3 DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$1,893,549.07 (UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$302,967.85 (TRESCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 85/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **42 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **10 DE NOVIEMBRE DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **21 DE DICIEMBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE ELLA, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"LA SECRETARIA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30 % (TREINTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$568,064.72 (QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA".**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL "**RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"**LA SECRETARÍA**" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE "**LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **6952505** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **25 DE ABRIL DEL 2011,** REGISTRADO COMO **"SUPERINTENDENTE",** EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA,

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "**LA SECRETARÍA**", QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE "**LA SECRETARÍA**" PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "**LA SECRETARÍA**", O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "**LA SECRETARÍA**".

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "**LA SECRETARÍA**" **(CATALOGO DE CONCEPTOS)** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "**LA SECRETARÍA**" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "**LA SECRETARÍA**", SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR **"LA SECRETARÍA"** NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, "**LA SECRETARÍA**" PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A "**LA SECRETARÍA**", QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ

COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A "**EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR,

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, "**LA SECRETARÍA**" LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE "**LA SECRETARÍA**" NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI "**LA SECRETARÍA**" OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A "**LA SECRETARÍA**" SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "**LA SECRETARÍA**" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A** "**LA SECRETARÍA**" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A** "**LA SECRETARÍA**" HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A** "**LA SECRETARÍA**".

"**LA SECRETARÍA**" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS POR **" LA SECRETARIA"** EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON "**LA SECRETARÍA**" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**,

ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

RICARDO REYES CEBALLOS
MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
658,955.08	PESOS	2249556	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 658,955.08 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

'TE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, LA CORRECTA INVERSION, EXACTA AMORTIZACION Y EN SU CASO, DEVOLUCION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $658,955.08 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA ASEGURADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;

B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA 'TOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y TORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS;

E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: jSVhqmDT5h/DrUWKjWjPQXdt0YQpc3KDSTOvd8eEelrkR895wrafufr7zWXmzf4+vV9eaDZzwK9TheiSZKuhxfZnF6SXmh+7Y2KlQmw6DiEr0qs2hiJUksse6C9JDu9vvLURmMLAMCnsrB9l6BwNte8Ry6HScq1YNkKwl1S/Q88DFDNS5TfttppP/43w1/WVCnnaXMP2Li+d9R9e6eoWhcOAJMZeLGMUPsnzOYR9hXTnA1za+jCFnvlfRKg0KjKpOSx0dlS9gD1T2a7gma7oTNFl4dRxW83zIjKmnU6h5PaJUdSV/78KZskXvc7dkdoxrsDqE0tGBw==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 4F1D 09

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
658,955.08	PESOS	2249556	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 658,955.08 SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

F) LA COMPAÑÍA ASEGURADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA ASEGURADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO;
G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
jSVlvqmDT5hDrUWKjWyPQXdt0YQpc3KDSTDvd8eEe/tkR885wvatufi7z1WXmzf4+vV9eaDZ2wK9ThejSZKuhxfZnF65Xmh+7Y2Kl/qmw6DiEr0qs2hjUlose6C9JDu9vvLURmMLAMCnsiB9l6BwNte8Ry6HScq1YNkKw1S/Q88DFDNS5TfttppP/43wVVVCnnaXMP2Li+c9Rh9o5ecMhcOAJWZeL6MUPsnzQYR9hXTnATza+jiCF+vlvRKgqDKjKpSDd0SSgD1T2a7gma7oTNf/4tbRvXVB3zjlKmnU6h5PaJUdSV/78KZskXvc7dkdoxrsDlqEtfGBw==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 4F1D 09

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09274F1D09 Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene linea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso:
2249556/0

Producto:
3312 - OBRA - ANTICIPO DE OBRA

Fecha de Expedición:
06/11/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante:
MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Beneficiario/ Asegurado:
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$658,955.08

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$658,955.08

Moneda:
PESOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 0976643509866

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
06/11/2023	0000	EXPEDICION	$658,955.08	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
219,651.69	PESOS	2249557	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 219,651.69 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

'TE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y R.F.C. MRA2107282J2, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO, UBICADA EN: COL. COMERCIAL ACAPULCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $2,196,516.92 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO, LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA ASEGURADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUBSTITUIRA EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA 'UTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y TORIZADAS EXTEMPORANEAMENTE;

E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ;

F) ESTA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICION Y DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRA ACORTARSE EN RAZON DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CORRECCION DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: UHoTiMjhbcTGG16iuMvTykgZE5+kYY11PcLEYyv58lo+fgTy+aUlCaZoyYfJEOYzsYKs36NTnED7nbH1+s7JpjM8Xi+BCEGi1XY4nWjLz0DlHZzpyTGR+NnG90bk8RodsC+VXbFEMkTAnes2E8G2fx93p7sHi9lkc9PbM
FBHnwqD2i9fDx908jzHpBqCOyH8YURnD2q9B9qvg3kK5C+7P1NgxhAVpPiw7/hwjB0DE1TKg78cvWGWK3nPj9RaF7eU39XKg7K2XmamF2EEPmHtbIhY7qDh6w5QihYizyjOxpKRZL0P47I79OQWjaM+6dNd1nUFIPVHEHg==

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA

EXPEDICION
06-11-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
219,651.69	PESOS	2249557	0	0000

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 219,651.69 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 69/100 M.N.

Por: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Dirección: AV. CUAUHTEMOC NO. 18 A, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Dirección: AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS;
LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERA LA CANCELACION DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ESTA CONTINUARA VIGENTE;
I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA COMFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE;
K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA ASEGURADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;
L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
M) LA INSTITUCION ASEGURADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA ASEGURADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; PUEBLA, PUEBLA

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
UHoThMjhbcTGG16iUMvTylgZE5+kYY11PpLEtYyx58o+fgTy+aUlCeZoYYuEOYrzjyYKs36NTfnEDTnhH1+s7JpM8XH+BCEGf1XY4nWjLz0DiHZznjTGR+NnG90bk8RodsC+VKfbFEMkTAnes2E8G2fx83p7sHi9kc8PbM
FBHnwq0z20fDx908zHpBqCOyH8YURhD2qe8Bqvg3kK5C+7P1NgxHvPpPw7/hvjBODE1TKgY8ovWGWK3nPjRaF7eU39Xkg7K2XmamF2EEPmHb/hY7qQh6w5OuNYzryjOxpKRZLbP4T79OQWjaM+6dNd1nUFIPVHEHg==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 4F1D 6D

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza. misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09274F1D6D Validar fianza/certificado Limpiar

Si su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Si cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso:
2249557/0

Producto:
3313 - OBRA - CUMPLIMIENTO DE OBRA

Fecha de Expedición:
06/11/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante:
MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.

Beneficiario/ Asegurado:
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$219,651.69

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$219,651.69

Moneda:
PESOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 0976643509867

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
06/11/2023	0000	EXPEDICION	$219,651.69	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/574-2023/AD
ASUNTO: ADJUDICACION DE OBRA
ACAPULCO, GRO. A 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
Nombre O Razón Social
RICARDO REYES CEBALLOS
Representante legal

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BASE A LOS ARTÍCULOS 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIENDO VERIFICADO LOS DATOS QUE CONSTAN EN NUESTRO ARCHIVO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, TIENE A BIEN SELECCIONAR A LA EMPRESA **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.** PARA ADJUDICARLE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** UBICADA EN **COL. COMERCIAL ACAPULCO, ACAPULCO GRO.**, SE AUTORIZO LA INVERSION MEDIANTE EL FONDO **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

EN CASO DE ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN REMITIDA, DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN **CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 DE ACAPULCO, GRO.** (ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL) EN IDIOMA ESPAÑOL, EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA SER OBJETO DE SU REVISIÓN Y CONTRATACIÓN.

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

MONRROY REYES

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente le agradezco se me haya asignado la obra: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** de este municipio, la cual acepto respetando los Reglamentos Internos de esta Dirección de Obras Públicas y la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero no. 266.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

CARTA DE PROTESTA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de este conducto y bajo protesta de decir la verdad manifiesto a usted que no me encuentro en los supuestos del Art. 62 de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266, para la obra: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** en el Municipio de Acapulco, Gro.

Firmo haciéndome responsable de cualquier aclaración que pudiera faltar a la verdad y afirmo que soy el Representante Legal de la Empresa denominada: **MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.**

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

CARTA DE SOLVENCIA ECONÓMICA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Como representante o apoderado de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., manifiesto y protesto lo necesario que mi representada tiene solvencia económica para responder a los compromisos contraídos, en relación a la obra pública asignada con el nombre de la obra y ubicación: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO** con no. de contrato: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** en el Municipio de Acapulco, Gro., por la confianza reiterada quiero recalcar que somos una empresa con amplia solvencia moral y económica, como se muestra en los estados financieros presentados y en base a los saldos que reporta nuestra cuenta, que nos da capacidad suficiente.

Sin más por el momento, reciba mis saludos.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

CARTA DE VISITA DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V., hago constar que se visitó la obra: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez ya su vez se realizó el levantamiento del cual se deriva el presupuesto de obra que contiene todos los conceptos para la correcta ejecución de dicha obra.

Sin más por el momento quedo de usted para cualquier aclaración.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

CARTA DE INICIO DE OBRA

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

Por medio de la presente y en mi calidad de Representante Legal de la empresa: MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. informo que con fecha: 10 de noviembre de 2023 la empresa que represento, dará inicio a los trabajos relacionados con la obra denominada: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** ubicada en: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, del Municipio de Acapulco de Juárez, Gro. con No. de contrato: **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD**, respetando los reglamentos internos de esta Dirección de Obras Públicas y la Ley de Obras Publicas y sus Servicios del Estado de Guerrero No. 266.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Arq. Ricardo Reyes Ceballos
Representante Legal

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**					
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**					
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	11.08	$580.00	$6,426.40	0.34%
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.14	$1,063.37	$11,845.94	0.63%
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	267.81	$34.63	$9,274.26	0.49%
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	26.08	$120.00	$3,129.60	0.17%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	118.60	$79.73	$9,455.98	0.50%
		TOTAL DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS			**$40,132.18**	**2.12%**
A02	**PRELIMINARES**					
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	67.20	$631.75	$42,453.60	2.24%
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	1,086.00	$28.85	$31,331.10	1.65%
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	42.55	$255.00	$10,850.25	0.57%
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	30.12	$152.50	$4,593.30	0.24%
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	8.05	$438.90	$3,533.15	0.19%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.94	$468.57	$4,189.02	0.22%
			TOTAL PRELIMINARES		**$96,950.42**	**5.12%**
A03	**LOCALES DE CONCRETO**					
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	7.00	$2,265.00	$15,855.00	0.84%
11-0167*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	34.82	$657.22	$22,884.40	1.21%
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	32.40	$624.00	$20,217.60	1.07%
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	20.20	490.41	$9,906.28	0.52%
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	34.82	1,350.00	$47,007.00	2.48%
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *	M2	35.00	1,500.00	$52,500.00	2.77%
			TOTAL LOCALES DE CONCRETO		**$168,370.28**	**8.89%**
A04	**ALBAÑILERIAS**					
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.00	336.46	$11,776.10	0.62%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	36.00	502.65	$18,095.40	0.96%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	161.98	274.81	$44,513.72	2.35%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	359.00	118.00	$42,362.00	2.24%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	267.81	$610.80	$163,578.35	8.64%
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	21.00	481.07	$10,102.47	0.53%
			TOTAL ALBAÑILERIAS		**$290,428.04**	**15.34%**
A05	**ACABADOS**					
29-0431	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.	M2	10.00	1,454.49	$14,544.90	0.77%
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	81.90	3,702.15	$303,206.09	16.01%
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	37.51	2,961.72	$111,094.12	5.87%
LAM-01*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	18.00	1,119.60	$20,152.80	1.06%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021 2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1,319.78	122.00	$161,013.16	8.50%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	32.00	138.66	$4,437.12	0.23%
			TOTAL ACABADOS		**$614,448.19**	**32.45%**
A06	**ROTULACION**					
ROT-01	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	2,500.00	$2,500.00	0.13%
ROT-02	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	$2,000.00	0.11%
ROT-03	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	$2,000.00	0.11%
ROT-04	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.	PZA	1.00	4,000.00	$4,000.00	0.21%
ROT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)	PZA	3.00	1,800.00	$5,400.00	0.29%
ROT-06	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.40	652.08	$1,564.99	0.08%
ROT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)	PZA	12.00	352.68	$4,232.16	0.22%
			TOTAL ROTULACION		**$21,697.15**	**1.15%**
A07	**BAJA TENSION**					
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.	PZA	1.00	4,191.43	$4,191.43	0.22%

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.	JGO	5.00	657.36	$3,286.80	0.17%
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	105.00	111.40	$11,697.00	0.62%
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	46.50	196.00	$9,114.00	0.48%
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	115.00	651.00	$74,865.00	3.95%
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	115.00	159.60	$18,354.00	0.97%
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.	ML	997.00	50.00	$49,850.00	2.63%
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	48.00	49.01	$2,352.48	0.12%
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	498.50	150.47	$75,009.30	3.96%
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN	PZA	1.00	10,050.59	$10,050.59	0.53%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	31,099.39	$186,596.34	9.85%
EL-BT-012	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	PZA	4.00	7,000.00	$28,000.00	1.48%
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	6.00	2,600.00	$15,600.00	0.82%
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	4,940.00	$4,940.00	0.26%
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	PZA	11.00	1,361.08	$14,971.88	0.79%
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.	PZA	1.00	24,440.00	$24,440.00	1.29%
		TOTAL BAJA TENSION			**$533,318.82**	**28.17%**
A08	**DRENAJES**					
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	41.72	379.53	$15,833.99	0.84%
37-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.	ML	37.00	233.88	$8,653.56	0.46%

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	5.00	$6,000.00	$30,000.00	1.58%
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	$6,000.00	$6,000.00	0.32%
		TOTAL DRENAJES			**$60,487.55**	**3.19%**
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,086.00	10.55	$11,457.30	0.61%
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	95.68	101.73	$9,733.53	0.51%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	287.04	30.93	$8,878.15	0.47%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	46.16	336.00	$15,509.76	0.82%
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS, PISOS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,014.00	10.55	$10,697.70	0.56%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	1,300.00	8.80	$11,440.00	0.60%
		TOTAL ACARREOS Y LIMPIEZA			**$67,716.44**	**3.58%**
A	**TOTAL REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**				**$1,893,549.07**	**100.00%**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,893,549.07**
IVA 16.00% **$302,967.85**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$2,196,516.92**
(* DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Partida	Concepto	Importe
A	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	
A01	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS	$40,132.18
A02	PRELIMINARES	$96,950.42
A03	LOCALES DE CONCRETO	$168,370.28
A04	ALBAÑILERIAS	$290,428.04
A05	ACABADOS	$614,448.19
A06	ROTULACION	$21,697.15
A07	BAJA TENSION	$533,318.82
A08	DRENAJES	$60,487.55
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA	$67,716.44
A	**TOTAL REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**	**$1,893,549.07**

Total del presupuesto mostrado sin IVA: **$1,893,549.07**
IVA 16.00% **$302,967.85**
Total del presupuesto mostrado: **$2,196,516.92**

(* DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

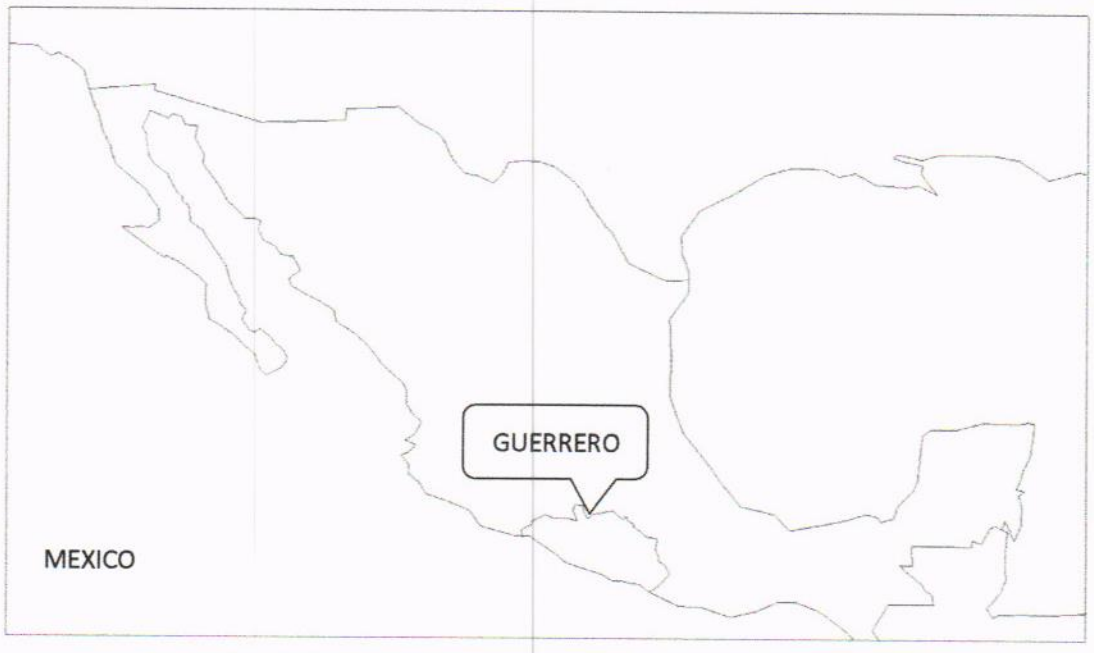

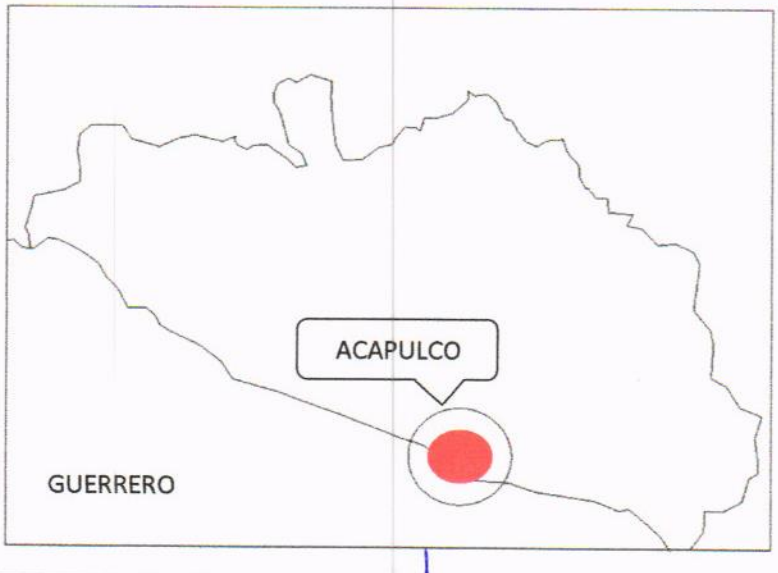

LATITUD: 16°51'40.030"N

LONGITUD: 99°54'9.571"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR MUNICIPIO:

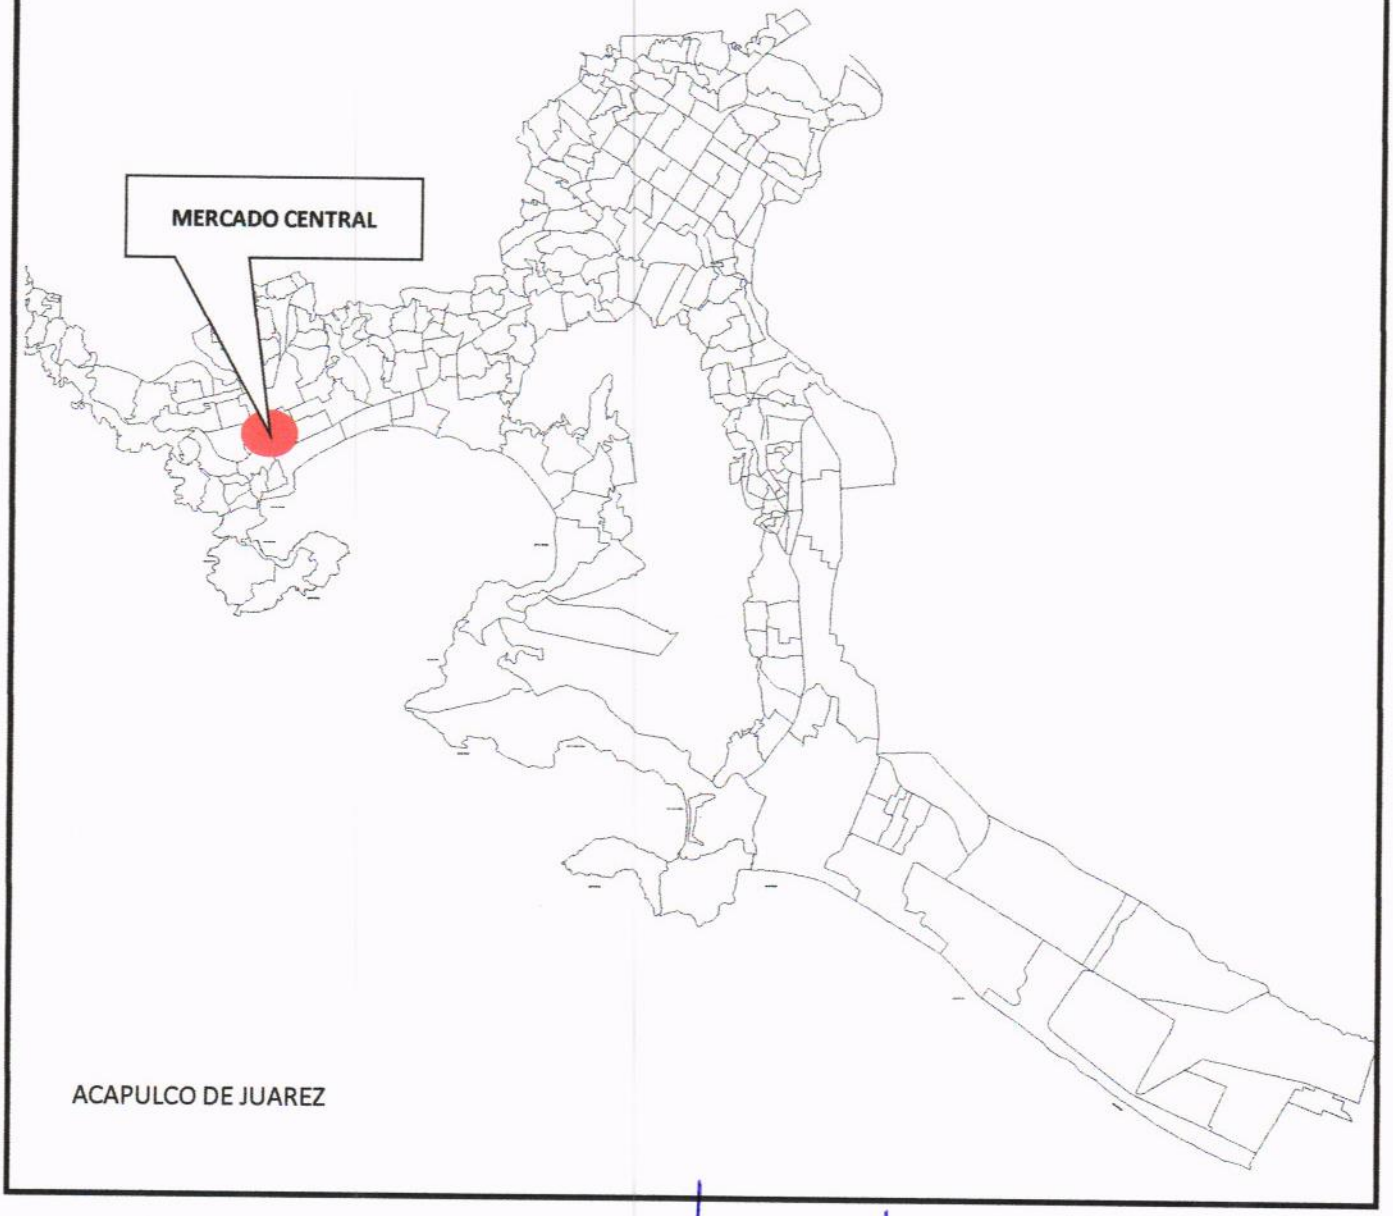

ACAPULCO DE JUAREZ

LATITUD: 16°51'40.030"N

LONGITUD: 99°54'9.571"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:

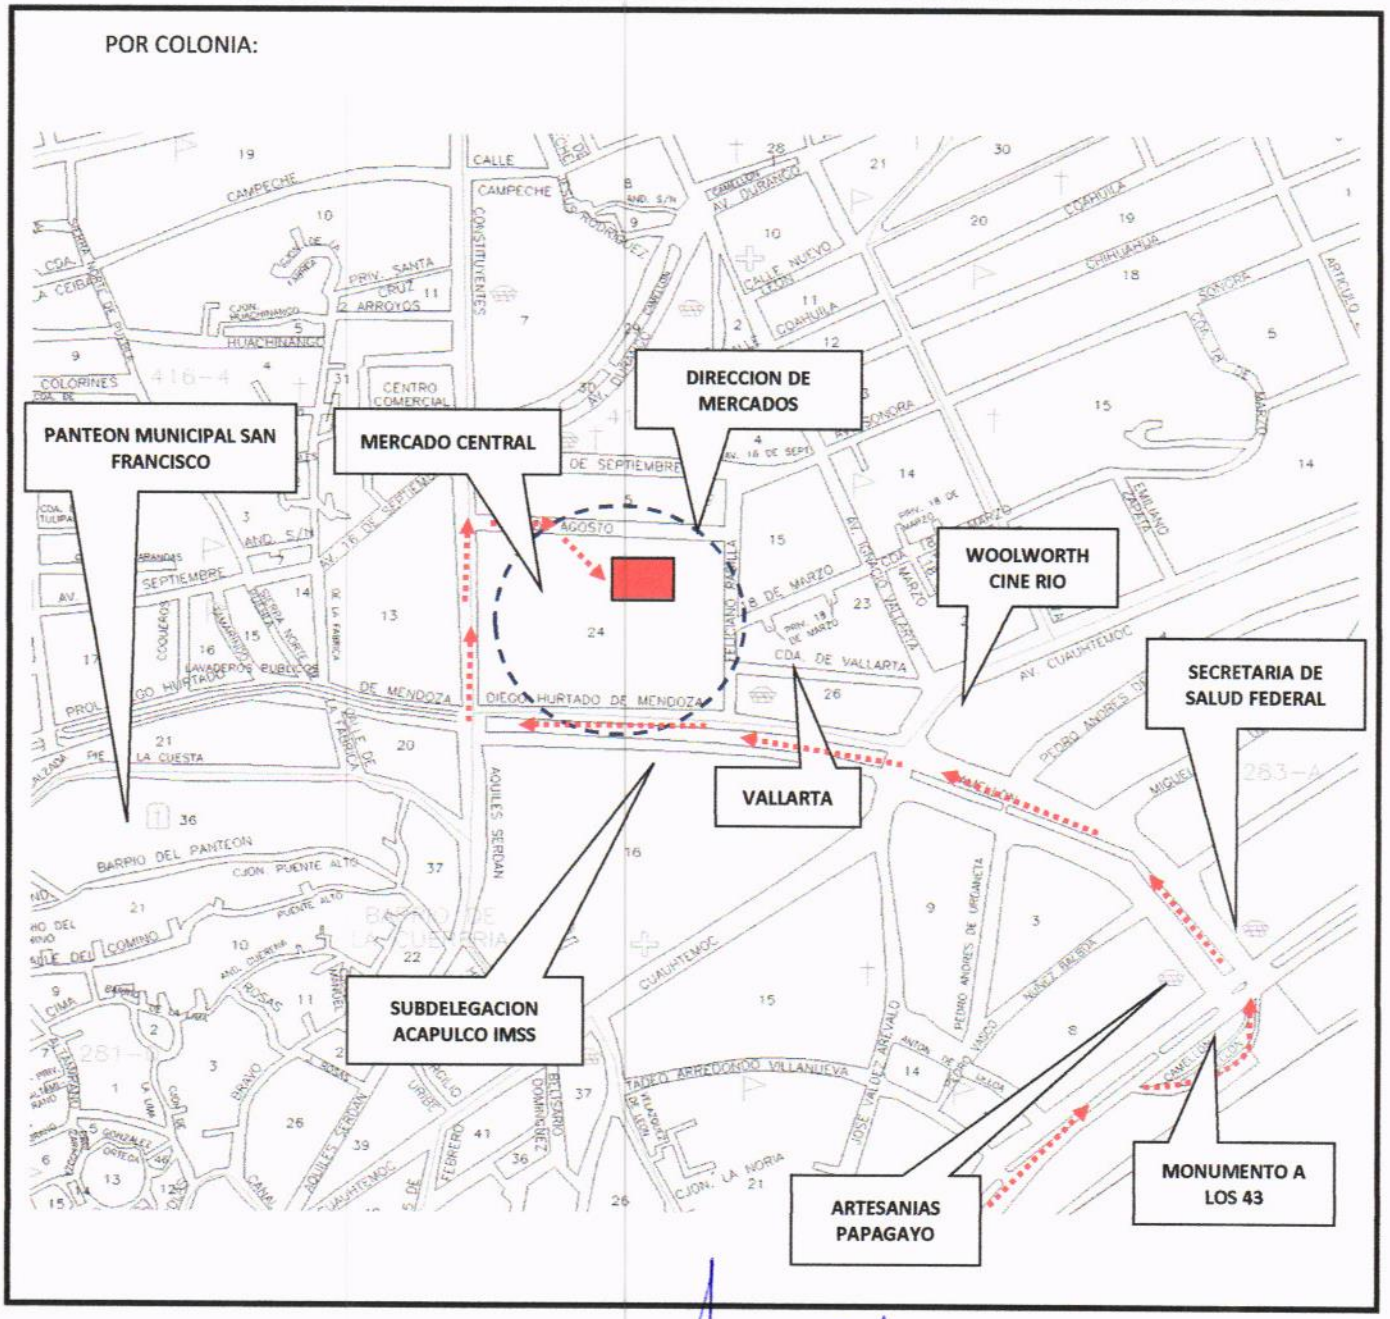

LATITUD: 16°51'40.030"N

LONGITUD: 99°54'9.571"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:

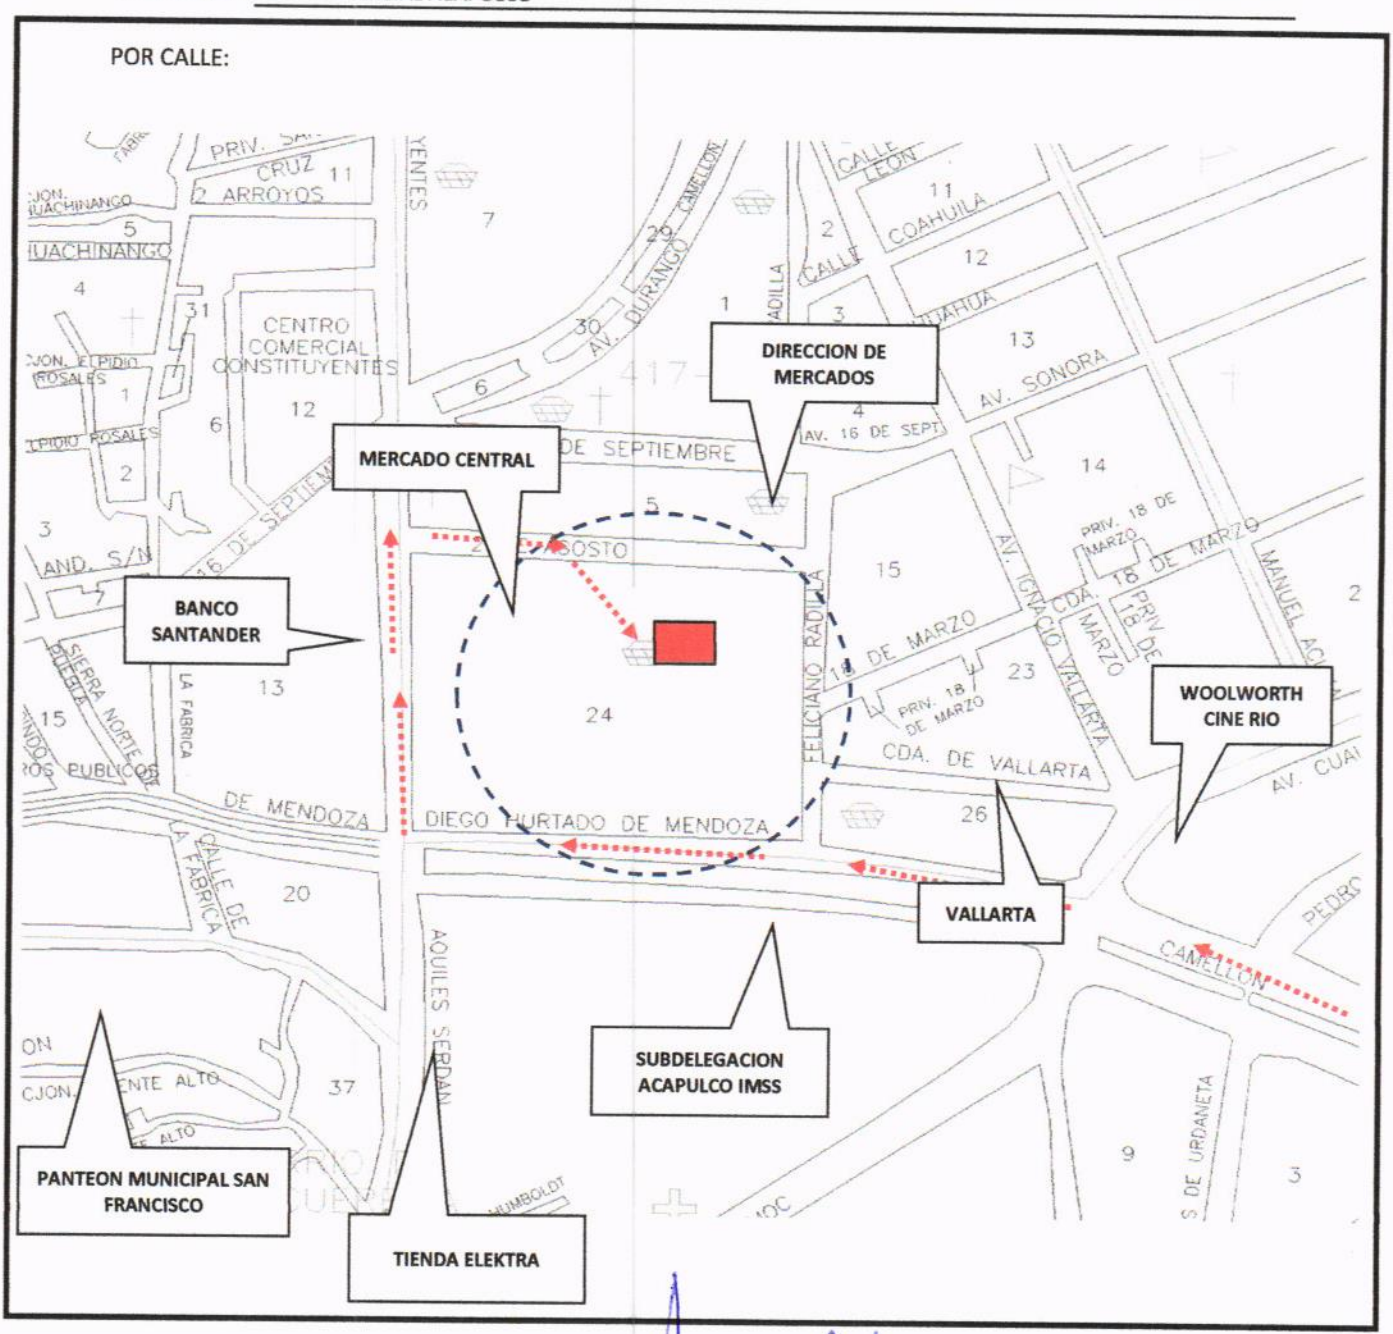

LATITUD: 16°51'40.030"N

LONGITUD: 99°54'9.571"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:

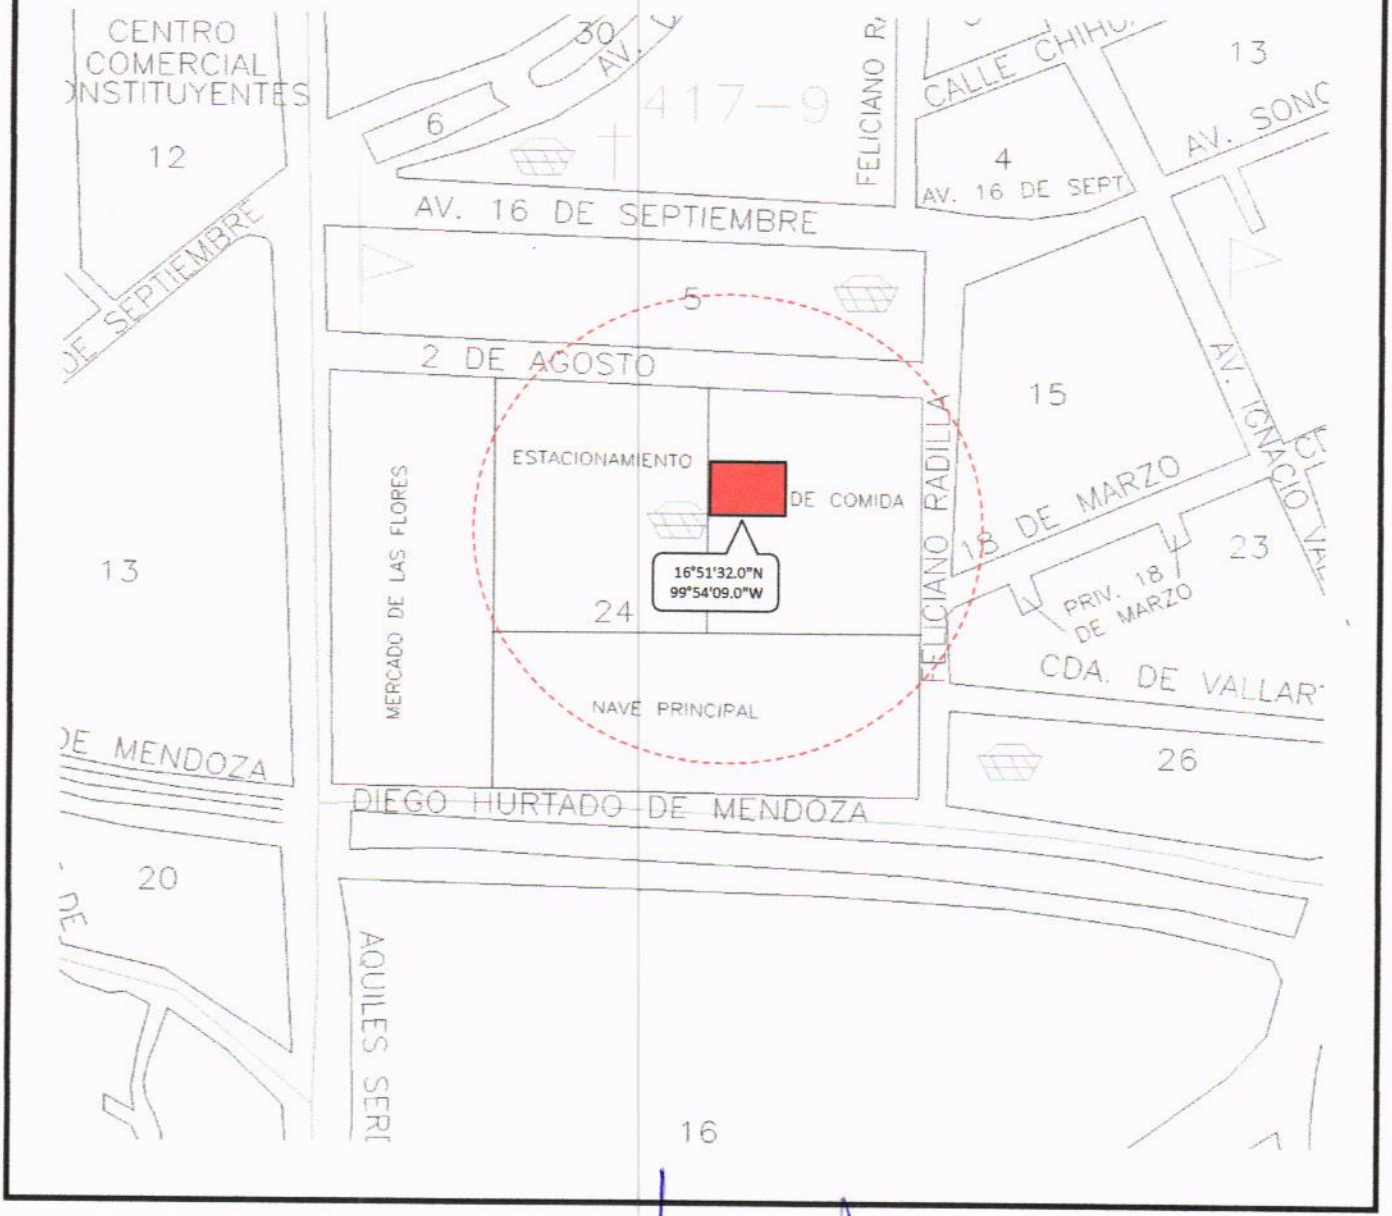

LATITUD: 16°51'40.030"N

LONGITUD: 99°54'9.571"O

REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NE0136436	MRA2107282J2

Nombre, Denominación o Razón social

MONRROY REYES ARQUITECTOS SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 09 de diciembre de 2023, a las 08:53 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||MRA2107282J2|23NE0136436|09-12-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

Wa5jXAPg+Ol0Tfj0US3H5VDOQnoLXXjW6R43SwpIQsZpYzZJ7qzF7VkFalhez+o7y0bCLtfXvLZPAYqcvdhkZ/91o
6n4FDwOCfVi0+34MsmENR2ciyeC+QeVxU15sVdELtXe2/yeEgOebpW3eGqp6mvfyRAfrtj+GUl5vRkYlPSZpHMcpr
goPu8gvkipwV0cuc3cpKbi1tSrMA22s7A/YNlVxvEvRvKbjCBQNC2LN5dwuuTSeF+2N+yjzjxLoeAMnFrot9sH433
mWg8qiLrov83Ho3lW/4qAz7L7pWEPSAutcXHGta86SVuHF+N7rfsGTeLzxuf/txZyYYhihaw==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

Acapulco, Gro. A 06 de Noviembre del 2023.

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
P R E S E N T E .

En relación al Contrato de Obras Publicas a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero **MAJ-FAISMUN/574-2023/AD** que comprende la obra: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**, ubicada en el **COL. COMERCIAL ACAPULCO**, por el monto de $ 2,196,516.92 (Dos Millones Ciento Noventa y Seis Mil Quinientos Dieciséis Pesos 92/100 M.N.) IVA Incluido, celebrado entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y la empresa que legalmente represento.

En particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se aplica de manera supletoria al de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Por este conducto le comunico que el Superintendente de Construcción por parte de la Empresa será el **ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS**, con los siguientes datos:

RFC:	**RECR860821IJ3**
Ced. Prof.:	**6952505**
Domicilio:	**Calle Hermanos Bravo No. 633-C, Col. La Mira, c.p. 39480**
Correo:	**ricre_aca21@yahoo.com.mx**
Teléfono:	**74 41 80 56 49**

Lo anterior le informo a usted a efecto de que me sirva dar el inicio correspondiente de la obra; así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de Obra"

A t e n t a m e n t e

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS
Superintendente de Obra

6 88 49 60
74 41 80 56 49
monrroy_reyes_arquitectos@outlook.com
Av. Cuauhtémoc No. 18-A.
Col. Centro, Cp. 39300, Acapulco, Gro.

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
6952505

Clave Única de Registro de Población
RECR860821HGRYBC08

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
6952	29	2	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

RICARDO	REYES	CEBALLOS
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN ARQUITECTURA	511303
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO	120027
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica

25/09/2020	17:26:51
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original

||6952505|6952|29|2|C1|25/04/2011 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|RECR860821HGRYBC08|RICARDO|REYES|CEBALLOS|2868|120027|INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO|809|511303|LICENCIATURA EN ARQUITECTURA||

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

QTT9xYRVsi0XKeNaJBv0O1MJlq7CfV0EBLm/1ICKUlgFA+2jsqh0j1suNulZ6fO/MBj7xbaM5lka3EKp274AdGCmCLyDHrSRmLJ3yo/BYGkBBGzp5kynzCSkBmm2cWl+zC54nlcABOtUtFoPDKiGc1w1Jwtz79SNKv8uV/5arfXlBoTBGmvxf7L6uKvrUWBlCXfLuBsxtJoFSE/8tZlsdzk86/PWAWhptHWbAFVV9bPjteLAl5SqFuOML5sBtyAl9xbJY99RAgN7n5vyDaZjMtEZ2cHkFwt1jDYbNLbnljJzc9YZ/AiUdc5uUhet3tO8aoZbCls+Pk674RAyJp8ySw==

DR. JUSTINO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

Sello digital de tiempo SEP

XVNe7URfjFDCXX9VKKs0jhA0x1CPg3i39HIT0Q7ZXytyGupLUxZn+NDlU7S/Mxg3mVbFZVWNOwjBlBtp9MYlcSTd3ivMFGSSiFS59FHn+kb4UXNZfl4vhex9sDZ6RUmFToUAdDxg5InTekfpGFGNHHqhvYdra0C8aD79rLu2isQxy3x41PUhlFbZJGLAqwE66FCvRbpVMOlxcH9EVO/NYNU1PuTB11Dc1gnRyzo3hA9ri+yxmL8zDE8C4/vATmAhc5YD0sYoAnlKrK5KJgIS3VFsZfM6LG+ulcN0lABJpxmuL0CJpEWlwSJFmBXUg/nJVojvuKZSDe1U6Oua8tS6w==

QR para validar la información


La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**


Identificador electrónico - cédula
6952505

MONRROY REYES ARQUITECTOS S.A. D E C.V.

REPRESENTANTE LEGAL
INE

RFC: RECR860821IJ3
CORREO: ricre_aca21@yahoo.com.mx
TELEFONO: 044-74-41-80-56-49

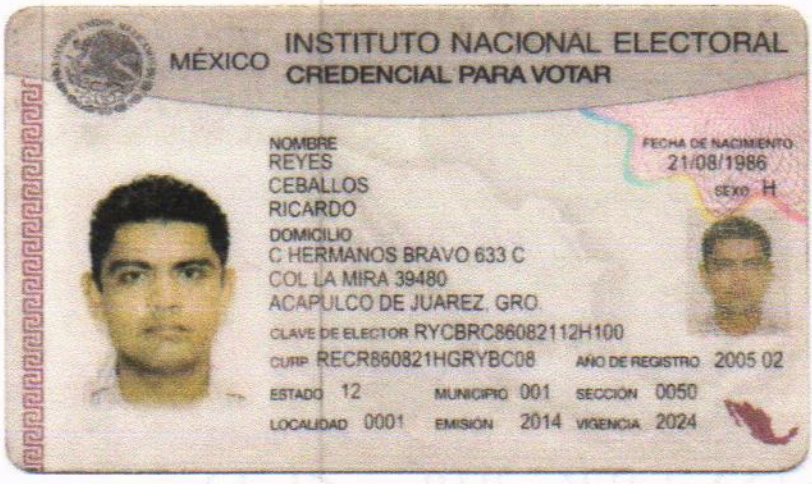

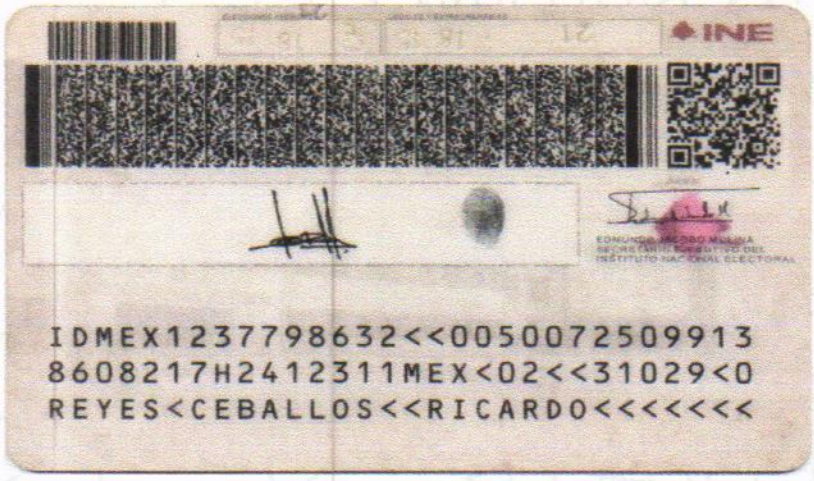

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
ACAPULCO DE JUÁREZ
2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/2318/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**
Acapulco, Gro., a 06 de noviembre del 2023

MONRROY REYES ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.
C. RICARDO REYES CEBALLOS
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que la Residencia asignada a la obra CONSTRUCCION DE MERCADO DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL ACAPULCO, ubicada en COL. COMERCIAL ACAPULCO, con número de contrato MAJ-FAISMUN/574-2023/AD, estará a cargo del ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ; así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico** (con su no. de cédula) y del **Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. URIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p. Archivo
VHA/CARR/*mgc

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: CONSTRUCCION

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	CANCHA
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	CONSTRUCCION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION DE CANCHA

ACAPULCO,GRO. 2023

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL EDO. DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD A TRAVES DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE BIENESTAR, SATISFACIENDO A LA POBLACION CON SERVICIO DE CALIDAD**, ES ASI COMO EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION**

LOCALIZACION: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

TIPO DE OBRA : REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

NUEVA (**X**) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

11.08 M3 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO INCLUYE: ACARREOS

67.20 M2 SUM. Y COL. TAPIAL TRIPLAY PINO 6MM, SOBRE BASTIDOR POLINES PINTADOS PINTURA VINILICA C/BLANCO INCLUYE: MATERIALES, M.O. Y HERRAMIENTA.

42.55 M3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

34.82 ML CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2 15x25 SCMS ARM. 4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 CADA 15 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN Y ACARREOS

32.40 ML CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 15X20 CMS, ARM. 4 VAR. No.4 Y ESTRIBOS No. 2 CADA 25 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN Y ACARREOS

35.00 M2 LOSA CONCRETO F'C=250 KG/CM2 10 CMS ESP. ARM. VAR. # 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL Y M.O.

267.81 M2 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2 10 CM. ESPESOR; REFORZADO MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO

81.90 M2 PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: CORTES, MATERIAL, M.O. Y HERRAMIENTA.

18.00 M2 SUM. Y COL. DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE18 ESPESOR 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES 2 x 1", MATERIALES PARA SU COLOCACION.

1319.78 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO SELLADOR, DOS MANOS PINTURA VINILICA Y PREPARACION

115.00 ML INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, M.O.

997.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO

498.50 ML ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT PVC. TIPO PESADO 25 MM. DIAM. Y 2 CABLES THW. CAL No. 8

6.00 PZAS. CENTRO MODULAR MEDICION 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, PRUEBAS, CONEXIONES

41.72 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.

37.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.

1300.00 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

OBJETIVO : **OTORGANDO A LA POBLACION SERVICIOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS QUE LES PERMITA SATISFACER SUS NECESIDADES, PROPORCIONANDO PRODUCTOS DE HIGIENE Y CALIDAD**

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION DE CANCHA

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION : **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO : **01.- ACAPULCO**

LOCALIDAD : **ACAPULCO** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : **$ 2,196,516.92**

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 2,196,516.92	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	**$ 2,196,516.92**

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
1,300.00	M2	**1,300.00**	M2	1,000	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO	noviembre , 2023	noviembre , 2023
PRELIMINARES	noviembre , 2023	noviembre , 2023
LOCALES DE CONCRETO	noviembre , 2023	diciembre , 2023
ALBAÑILERIAS	diciembre , 2023	diciembre , 2023
ACABADOS	diciembre , 2023	diciembre , 2023
ROTULACION	noviembre , 2023	diciembre , 2023
BAJA TENSION	noviembre , 2023	diciembre , 2023
DRENAJES	diciembre , 2023	diciembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	diciembre , 2023	diciembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : **CONTRATO**

FECHA DE INICIO : **noviembre-2023**

FECHA DE TERMINACION : **diciembre-2023**

JORNALES A GENERAR : 1,794

EETR-03
REV-02

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO
GOBIERNO PARA TRANSFORMAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		COL. COMERCIAL ACAPULCO
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

	CLAVE	NOMBRE
Nº DE OBRA		
PROGRAMA :	URBANIZACION	
SUBPROGRAMA :	CONSTRUCCION DE CANCHA	
MODALIDAD DEL PROYECTO :	CONSTRUCCION	

NOMBRE DE LA OBRA : **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
COL. COMERCIAL ACAPULCO

TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACION( )	REHABILITACION( )	PROCESO( )	EQUIPAMIENTO( )
MODALIDAD DE EJECUCION	C (X)	AM ( )	AD ( )	AC ( )	M ( ) EQ ( )

INSTANCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ - TOTAL	$ - FEDERAL	$ - ESTATAL	$ - MUNICIPAL	$ - BENEFICIARIOS	$ - CREDITO	$ - OTROS
CONCEPTO							
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	**$ 2,196,516.92**	0.00	**$ 2,196,516.92**	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO							
TERCERO	$ 2,196,516.92		$ 2,196,516.92				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1300.00	M2	1,000	HABITANTES	**1300.00**	M2	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 1,794

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	0	0
TERCERO	100	100

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	noviembre-2023	FECHA DE TERMINACION:	diciembre-2023	
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:	
NO INICIADA:		EN PROCESO:	SUSPENDIDA:

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONÓMICO

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO

FECHA: noviembre-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: noviembre-2023

La comunidad de: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** del Municipio de **ACAPULCO**

Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

11.08 M3 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO INCLUYE: ACARREOS
67.20 M2 SUM. Y COL. TAPIAL TRIPLAY PINO 6MM, SOBRE BASTIDOR POLINES PINTADOS PINTURA VINILICA C/BLANCO INCLUYE: MATERIALES, M.O. Y HERRAMIENTA.
42.55 M3 EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD
34.82 ML CADENA DE DESPLANTE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2 15x25 SCMS ARM. 4 VAR. No. 4 Y EST. No. 2 CADA 15 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN Y ACARREOS
32.40 ML CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2 15X20 CMS, ARM. 4 VAR. No.4 Y ESTRIBOS No. 2 CADA 25 CMS INCLUYE: CIMBRA COMUN Y ACARREOS
35.00 M2 LOSA CONCRETO F'C=250 KG/CM2 10 CMS ESP. ARM. VAR. # 3 @ 20 CMS AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, MATERIAL Y M.O.
267.81 M2 PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 10 CM. ESPESOR; REFORZADO MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO
81.90 M2 PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: CORTES, MATERIAL, M.O. Y HERRAMIENTA.
19.00 M2 SUM. Y COL. DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 19 ESPESOR 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES 2 x 1", MATERIALES PARA SU COLOCACION.
1319.78 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO SELLADOR, DOS MANOS PINTURA VINILICA Y PREPARACION
115.00 ML INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, M.O.
997.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO
498.50 ML ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT PVC. TIPO PESADO 25 MM. DIAM. Y 2 CABLES THW. CAL No. 8
6.00 PZAS. CENTRO MODULAR MEDICION 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, PRUEBAS, CONEXIONES
41.72 ML SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.
37.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.
1300.00 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS.

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un _____ % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problematica que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 año de Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 02 de Noviembre del 2023

LA COMUNIDAD DE: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO. EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS _____; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

Daniel Hernández Gómez
PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 02 del mes de Noviembre del año 2023, a las 11:40 horas en el domicilio COL. COMERCIAL ACAPULCO, localizado en el municipio **ACAPULCO DE JUAREZ**, de la entidad federativa **GUERRERO**, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 02 de Noviembre del 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO, COL. COMERCIAL ACAPULCO.		
Folio asignado en la MIDS: 403037		Monto total planeado: 2,196,516.92
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 10/Nov/2023	Fecha de conclusión: 21/Dic/2023
Entidad: **Guerrero**	Municipio: **Acapulco**	Localidad: Col. Comercial Acapulco
Si la obra tiene más de una su clasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación: Mercado Público		Monto: $ 2,101,182.67
Subclasificación: Drenaje Sanitario		Monto: 70,165.56
Subclasificación: Señalética		Monto: 25,168.69
Subclasificación:		Monto:

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACION

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Daniel Hernández Gómez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Rafaela Alejo Costzo
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Sara Irma Macario
Vocal
Nombre completo y firma

María de la Luz Alvarez Escobar
Vocal
Nombre completo y firma

Hugo Lopez PATRICIO
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. ALEJANDRO DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
DIRECTOR DE PLANEACION

SECRETARIA DE PLANEACION DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Julisa Ruiz Guadarrama
Testigo

ESTEN BARRANCA NAVA
Testigo

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 02 de Noviembre del 2023 11:40		
Lugar de la capacitación: Col. Comercial Acapulco		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 3	Hombres: 4

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

   a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]
   b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]
   c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]
   d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]
   e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [ ] No [ ]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: DANIEL HERNANDEZ GOMEZ.
Domicilio y número telefónico: C. FRANCISCO I MADERO 2091, COL. MORELOS. CP. 39530, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☒ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: RAFAELA ALEJO CASTRO.
Domicilio y número telefónico: C. GIRASOL MZ 11 LTE 8, COL. ANGEL AGUIRRE RIVERO CP. 39405, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☒ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: SARA LIMA MACARIO
Domicilio y número telefónico: C. GRANJAS 124 1 COL. MOZIMBA CP. 39460 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☒ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: MARIA DE LA CRUZ ALVAREZ ESCUDERO
Domicilio y número telefónico: C. 2 COND. SANTA CRUZ MZA 25 LTE 87 COL. BELLA VISTA. CP. 39550, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☒ En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: HUGO QUIROZ PATRICIO
Domicilio y número telefónico: C 3 MZA 1 LTE 207, COL. POSTAL CP. 39700 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexicano? Sí ☐ No ☒ En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de Bienestar utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PLANEACION

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

COL. COMERCIAL ACAPULCO

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : COL. COMERCIAL ACAPULCO

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE :** 1,300.00 M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: CONSTRUCCION

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: M2 **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA 1300.00 M2

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

CONSTRUCCION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

COL. COMERCIAL ACAPULCO

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **1,300.00 M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: _____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

Fecha: 22/NOVIEMBRE/2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDA CABEZAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

RESIDENTE DE OBRA: ARQ. UBIEL MAURICIO SALMERON JIMENEZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA: ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

EMPRESA CONTRATISTA: MONREAL REYES ARQUITECTOS SA DE C.V

REQUISITOS:

A. CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA A REALIZAR

B. VISUALIZACION Y PUNTUALIZACION DE LOS CONCEPTOS A EJECUTARSE EN EL LUGAR DE VISITA.

C. ALINEAMIENTO: CHECAR LOS LINEAMIENTOS EN PLANO REGULADOR , ASI COMO CONFIRMAR SI ES ZONA REGULAR O NO, PARA EVITAR POSIBLES INVASIONES EN VIA PUBLICA, O BIEN PARA EVITAR CONSTRUIR EN ZONA FEDERAL PROTEGIDA.

EN VIALIDADES:

C.1. CONFIRMAR LA MEDIDA REAL DEL ANCHO DE L CALLE EN LA VISITA DE OBRA

C.2. VERIFICAR EL ANCHO DE LA CALLE EN LOS PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR

EN ESCUELAS:

C.3. ALINEAMIENTO EN PLANO REGULADOR (ZONA URBANA)

C.4. PLANO AUTORIZADO POR EL COMISARIO EJIDAL (ZONA RURAL)

D. RECOLECTAR LAS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR SOLO DE LAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA VERIFICAR LA DIRECCION CORRECTA DE LA MISMA.

E. VERIFICAR QUE EL COMITÉ CORRESPONDA A LA OBRA SOLICITADA, EN SU DEFECTO, FORMAR EL COMITÉ EN ESE MOMENTO Y VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA QUE ES GESTOR DE LA OBRA CITADA.

F. APOYARSE CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA DETERMINAR QUE ARBOLES SE PUEDEN TALAR.

G. APOYARSE CON LA DIRECCION DE CAPAMA PARA CUESTIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

H. MOVER LOS POSTES ELECTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA C.F.E.

NOTA (1): LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS REQUERIDO SE ANEXARAN A LA PRESENTE ACTA, ASI COMO **LA HOJA DE ASIGNACION** ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.

NOTA (2): EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS VERIDICOS, ASI COMO ACREDITAR A SU SUPERINTENDENTE DE OBRA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE DEBERA ESTAR DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, PARA CUALQUIER ACLARACION. BAJO NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA COMO REPRESENTANTE TECNICO Y/O SUPERINTENDENTE A CUALQUIER PERSONA AJENA A LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES: SE REALIZO VISITA DE OBRA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO, YA VISTO ESTO SE DA EL VISTO BUENO PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE OPERACION SE REVISO EL PRESUPUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

FIRMA DEL RESIDENTE

ARQ. UBIEL M. SALMERON JIMENEZ

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE

ARQ. RICARDO REYES CEBALLOS

IX.- PRESUPUESTO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO		IMPORTE
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO	$	40,132.18
PRELIMINARES	$	96,950.42
LOCALES DE CONCRETO	$	166,370.26
ALBAÑILERIAS	$	290,428.04
ACABADOS	$	614,448.19
ROTULACION	$	21,697.15
BAJA TENSION	$	533,318.82
DRENAJES	$	60,487.55
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	67,716.44
TOTAL:	$	1,893,549.07

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	1,893,549.07
IVA 16%	$	302,967.85
TOTAL	$	**2,196,516.92**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**					
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**					
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	M3	11.08	580.00	6,426.40	0.34%
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	11.14	1,063.37	11,845.94	0.63%
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	M2	267.81	34.63	9,274.26	0.49%
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA. INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M2	26.08	120.00	3,129.60	0.17%
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	M2	118.60	79.73	9,455.98	0.50%
	Total DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS				**40,132.18**	**2.12%**
A02	**PRELIMINARES**					
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	67.20	631.75	42,453.60	2.24%
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE	M2	1,086.00	28.85	31,331.10	1.65%
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	M3	42.55	255.00	10,850.25	0.57%
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	30.12	152.50	4,593.30	0.24%

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	M3	8.05	438.90	3,533.15	0.19%
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M3	8.94	468.57	4,189.02	0.22%
	Total PRELIMINARES				**96,950.42**	**5.12%**
A03	**LOCALES DE CONCRETO**					
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	PZA	7.00	2,265.00	15,855.00	0.84%
11-0167*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2. DE 15x25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	ML	34.82	657.22	22,884.40	1.21%
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	ML	32.40	624.00	20,217.60	1.07%
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	ML	20.20	490.41	9,906.28	0.52%
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	34.82	1,350.00	47,007.00	2.48%
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	35.00	1,500.00	52,500.00	2.77%
	Total LOCALES DE CONCRETO				**168,370.28**	**8.89%**
A04	**ALBAÑILERIAS**					
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.00	336.46	11,776.10	0.62%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco De Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	M2	36.00	502.65	18,095.40	0.96%
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	161.98	274.81	44,513.72	2.35%
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	ML	359.00	118.00	42,362.00	2.24%
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	M2	267.81	610.80	163,578.35	8.64%
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	ML	21.00	481.07	10,102.47	0.53%
	Total **ALBAÑILERIAS**				**290,428.04**	**15.34%**
A05	**ACABADOS**					
29-0431	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.	M2	10.00	1,454.49	14,544.90	0.77%
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	81.90	3,702.15	303,206.09	16.01%
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	37.51	2,961.72	111,094.12	5.87%
LAM-01*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.	M2	18.00	1,119.60	20,152.80	1.06%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	1,319.78	122.00	161,013.16	8.50%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN	M2	32.00	138.66	4,437.12	0.23%
	Total ACABADOS				**614,448.19**	**32.45%**
A06	**ROTULACION**					
ROT-01	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.	M2	1.00	2,500.00	2,500.00	0.13%
ROT-02	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	2,000.00	0.11%
ROT-03	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.	PZA	1.00	2,000.00	2,000.00	0.11%
ROT-04	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.	PZA	1.00	4,000.00	4,000.00	0.21%
ROT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)	PZA	3.00	1,800.00	5,400.00	0.29%
ROT-06	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.40	652.08	1,564.99	0.08%
ROT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)	PZA	12.00	352.68	4,232.16	0.22%
	Total ROTULACION				**21,697.15**	**1.15%**
A07	**BAJA TENSION**					
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO	PZA	1.00	4,191.43	4,191.43	0.22%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
	CON ESPUMA DE POLIURETANO.					
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.	JGO	5.00	657.36	3,286.80	0.17%
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	105.00	111.40	11,697.00	0.62%
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	ML	46.50	196.00	9,114.00	0.48%
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	ML	115.00	651.00	74,865.00	3.95%
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	115.00	159.60	18,354.00	0.97%
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8. MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO	ML	997.00	50.00	49,850.00	2.63%
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	ML	48.00	49.01	2,352.48	0.12%
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.	ML	498.50	150.47	75,009.30	3.96%
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN	PZA	1.00	10,050.59	10,050.59	0.53%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00	31,099.39	186,596.34	9.85%
EL-BT-012	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	PZA	4.00	7,000.00	28,000.00	1.48%
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE SOPORTE PARA CABLES CON VAR 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	6.00	2,600.00	15,600.00	0.82%
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	PZA	1.00	4,940.00	4,940.00	0.26%
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	PZA	11.00	1,361.08	14,971.88	0.79%
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.	PZA	1.00	24,440.00	24,440.00	1.29%
	Total BAJA TENSION				**533,318.82**	**28.17%**
A08	**DRENAJES**					
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	ML	41.72	379.53	15,833.99	0.84%
37-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.	ML	37.00	233.88	8,653.56	0.46%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS. A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	5.00	6,000.00	30,000.00	1.58%
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	6,000.00	6,000.00	0.32%
	Total DRENAJES				**60,487.55**	**3.19%**
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS) INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,086.00	10.55	11,457.30	0.61%
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	M3	95.68	101.73	9,733.53	0.51%
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	M3	287.04	30.93	8,878.15	0.47%
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	M3	46.16	336.00	15,509.76	0.82%
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	M2	1,014.00	10.55	10,697.70	0.56%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS	M2	1,300.00	8.80	11,440.00	0.60%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**67,716.44**	**3.58%**
	Total REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO				**1,893,549.07**	**100.00%**
	SUBTOTAL				**1,893,549.07**	
	I.V.A. 16.00%				**302,967.85**	
	Total del presupuesto				**2,196,516.92**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO		Importe
A	**REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**		
A01	DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS		40,132.18
A02	PRELIMINARES		96,950.42
A03	LOCALES DE CONCRETO		168,370.28
A04	ALBAÑILERIAS		290,428.04
A05	ACABADOS		614,448.19
A06	ROTULACION		21,697.15
A07	BAJA TENSION		533,318.82
A08	DRENAJES		60,487.55
A09	ACARREOS Y LIMPIEZA		67,716.44
	Total REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO		**1,893,549.07**
	IMPORTE PRESUPUESTO		1,893,549.07
		16% I.V.A.	302,967.85
		TOTAL	2,196,516.92

(* DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

REGION: 07.- ACAPULCO

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	900,388.37
MANO DE OBRA		$	560,496.74
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	35,993.62
SUB-TOTAL		**$**	**1,496,876.73**
INDIRECTOS	**15.0000%**	$	224,531.51
SUMA		$	1,721,408.24
FINANCIAMIENTO	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	1,721,408.24
UTILIDAD	**10.0000%**	$	172,140.82
SUMA		$	1,893,549.06
CARGOS ADICIONALES	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	1,893,549.07
I. V. A	**16.00%**	$	302,967.86
TOTAL		**$**	**2,196,516.92**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
AGUA	AGUA	M3	21.030072	150.00	3,154.51	0.21%
ALAMBRON	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	175.643706	26.93	4,730.09	0.32%
ALAREC	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	68.193188	50.00	3,409.66	0.23%
ANDTUB	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	73.391	57.75	4,238.33	0.28%
ANG1X3/16	ANGULO DE ACERO DE 1"X3/16"	KG	30.00	47.41	1,422.30	0.10%
ARENA*RIO	ARENA DE RIO	M3	39.64042	500.00	19,820.21	1.32%
BARROTE	BARROTE 3RA 2"X4"	PZA	21.254911	150.00	3,188.24	0.21%
BROCAL60D	BROCAL PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DEFoFo	PZA	0.999998	3,993.00	3,992.99	0.27%
CABCOB*8	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	2,246.20	30.17	67,767.85	4.53%
CARAMELO	CUADRADO CORDONEADO TIPO CARAMELO 3/8"	KG	80.00	47.41	3,792.80	0.25%
CEMENGRS	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	20.692676	4,310.34	89,192.47	5.96%
CIMBAR	CIMBRA APARENT/RENTA	M2	2.119426	115.50	244.79	0.02%
CLAVO*2	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	33.358804	50.00	1,667.94	0.11%
CORHER	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	37.51	2,039.27	76,493.02	5.11%
CUA1/2"	CUADRADO DE ACERO DE 1/2"	KG	40.00	47.41	1,896.40	0.13%
DICTAMEN	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	PZA	1.00	19,320.16	19,320.16	1.29%
DIESEL	DIESEL	LTO	122.389863	22.96	2,810.07	0.19%
DUELA3RA	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	92.737989	104.18	9,661.44	0.65%
FAJILLA	FAJILLA D/3RA. 5 CM	PZA	35.90	31.77	1,140.54	0.08%
GAB50X35X15	GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A	PZA	1.00	6,737.09	6,737.09	0.45%
GRAVA3/4	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	28.581788	660.00	18,863.98	1.26%
LALISC18	LAMINA LISA CALIBRE 18 ESPESOR DE 1.21 MM DE 3.00 X 6.00 MTS	KG	270.00	50.00	13,500.00	0.90%
LOUVER	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG	M2	81.90	2,624.59	214,953.92	14.36%
MALLA 6,6-10,10	MALLA 6,6-10,10	M2	294.591	25.96	7,647.58	0.51%
MATBANCO	MATERIAL DE BANCO	M3	10.465	175.00	1,831.38	0.12%
PINESM100	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	7.04	127.05	894.43	0.06%
PINVINMEX	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	292.058076	144.74	42,272.49	2.82%
POL3X3	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	16.128	150.00	2,419.20	0.16%
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	11.0007	300.00	3,300.21	0.22%
PRIMER	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	3.52	165.88	583.90	0.04%
RELE1	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS	PZA	6.00	2,055.34	12,332.04	0.82%
RELE2	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS	PZA	1.00	3,905.14	3,905.14	0.26%

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
ROTULO1	ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO	PZA	1.00	1,976.29	1,976.29	0.13%
ROTULO2	ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR"	PZA	1.00	1,581.03	1,581.03	0.11%
ROTULO3	ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO"	PZA	1.00	1,581.03	1,581.03	0.11%
ROTULO4	ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS	PZA	1.00	3,162.05	3,162.05	0.21%
ROTULO6	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	2.40	515.48	1,237.15	0.08%
SELLVIN	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	131.978	64.13	8,463.75	0.57%
SEÑAL1	SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION	PZA	3.00	1,422.92	4,268.76	0.29%
SEÑAL2	SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	12.00	278.80	3,345.60	0.22%
SERVMON5	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS	PZA	6.000002	23,376.45	140,258.75	9.37%
SOAC1 1/4X1/4	SOLERA DE ACERO DE 1 1/4"X1/4"	KG	20.00	47.41	948.20	0.06%
SOLDE-6010	SOLDADURA E-6010 1/8"	KG	10.00	100.33	1,003.30	0.07%
SUJETA	SUJETADORES PARA LAMINA GALVIZADA CAL. 18. TIPO REMACHE	PZA	108.00	5.25	567.00	0.04%
TABC10X14X28	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	1,790.005123	7.26	12,995.44	0.87%
TBOCPP25	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO	ML	548.35	19.18	10,517.35	0.70%
TBOPH2	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	21.599964	52.33	1,130.33	0.08%
TBOPVCS4	TUBERIA DE PVC TIPO SANITARIO DE 100 mm (4") DE DIAMETRO	ML	40.70	106.79	4,346.35	0.29%
TBOPVCSR6	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	45.892	186.38	8,553.35	0.57%
THINER	THINER	LTS	3.52	40.68	143.19	0.01%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	14.9692	832.94	12,468.45	0.83%
VARILLA 3	VARILLA NO 3	KG	506.001188	35.20	17,811.24	1.19%
VARILLA 4	VARILLA NO 4	KG	478.482703	35.20	16,842.59	1.13%
	Total MATERIALES				**900,386.37**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO			50,952.75	3.40%
MO001	PEON	JOR	368.518497	404.35	149,010.45	9.95%
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	270.880066	451.52	122,307.77	8.17%
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	2.147052	451.52	969.44	0.06%
MO010	OF. ALBANIL	JOR	113.315835	617.54	69,977.06	4.67%
MO011	OF. FIERRERO	JOR	8.264101	617.54	5,103.41	0.34%
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	21.521321	617.54	13,290.28	0.89%
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	135.131432	617.54	83,449.06	5.57%
MO014	OF. PLOMERO	JOR	3.281195	617.54	2,026.27	0.14%
MO017	OF. HERRERO	JOR	41.147746	617.54	25,410.38	1.70%
MO021	OF. PINTOR	JOR	61.534271	617.54	37,999.87	2.54%
	Total MANO DE OBRA				**560,496.74**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO02	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			15,285.82	1.02%
EQBAILAR	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	5.619038	116.69	655.69	0.04%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	28.7704	590.30	16,983.17	1.13%
EQPLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	1.58568	164.22	260.40	0.02%
EQREV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	21.470518	106.46	2,285.75	0.15%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	6.301596	82.43	519.44	0.03%
	Total EQUIPO Y HERRAMIENTA				**35,990.27**	

TOTALES DE INSUMOS

	Importe	%
Materiales	900,386.37	60.15%
Mano de obra	560,496.74	37.44%
Equipo	35,990.27	02.40%
Total	1,496,873.38	100.00%
INDIRECTOS	224,530.38	15.00%
FINANCIAMIENTO	0.00	00.00%
UTILIDAD	172,140.38	10.00%
SUBTOTAL	**1,893,549.07**	
I.V.A.	**302,967.85**	
TOTAL	**2,196,516.92**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

UBICACIÓN: **COL. COMERCIAL ACAPULCO** FECHA DE INICIO: **noviembre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 7	8	9	10	11	12
DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO	$ 40,132.18	10.94%	2.12%						
PRELIMINARES	$ 96,950.42	9.38%	5.12%						
LOCALES DE CONCRETO	$ 168,370.28	10.94%	8.89%						
ALBAÑILERIAS	$ 290,428.04	10.94%	15.34%						
ACABADOS	$ 614,448.19	9.38%	32.45%						
ROTULACION	$ 21,897.15	12.50%	1.15%						
BAJA TENSION	$ 533,318.82	12.50%	28.17%						
DRENAJES	$ 60,487.55	12.50%	3.19%						
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 67,716.44	10.94%	3.58%						
SUBTOTAL	$ 1,893,549.07	100%	100%						
16 % IVA	$ 302,967.85								
TOTAL	$ **2,196,516.92**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**

MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**

FECHA DE INICIO: **noviembre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REHABILITACIÓN DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO															
COL. COMERCIAL ACAPULCO	$ 1,893,549.07	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 1,893,549.07														
IVA	$ 302,967.85														
TOTAL	**$ 2,196,516.92**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**	**MOD.**	**LOC.**	**PROPIETARIO**			**M2**				
REMESC-01	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.	6	1				7.86	0.50	1.00	3.93	
		6	2				7.46	0.50	1.00	3.73	
		6	3				6.83	0.50	1.00	3.42	
								TOTAL	M3	11.08	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

REMESC-01 REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIESTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.

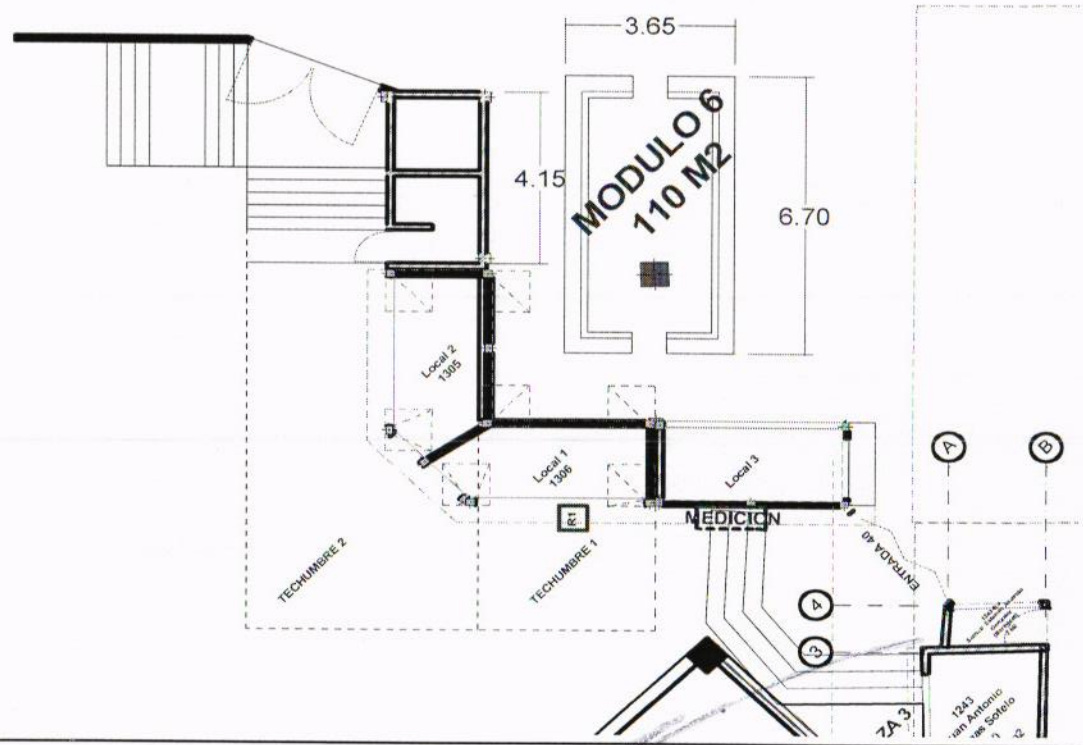

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**										
DEM-LOC	DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	**LOCAL 1 Y 2**				**ESP**	**LARGO**	**ALTO**	**PZAS**		
		6	1	MUROS		0.15	9.84	2.50	1.00	3.69	
		6	2	MUROS		0.15	5.82	2.50	1.00	2.18	
		6	3	MUROS		0.15	8.00	2.50	1.00	3.00	
							AREA	**H**	**PZA**		
		MOD. 6	1	CAD. DESPLANTE Y CERR.			0.03	11.40	2.00	0.68	
		MOD. 6	2	CAD. DESPLANTE Y CERR.			0.03	4.00	2.00	0.24	
		MOD. 6	3	CAD. DESPLANTE Y CERR.			0.03	10.00	2.00	0.60	
		MOD. 6		CASTILLOS			0.03	2.50	10.00	0.75	
								TOTAL	**M3**	**11.14**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

DEM-LOC DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

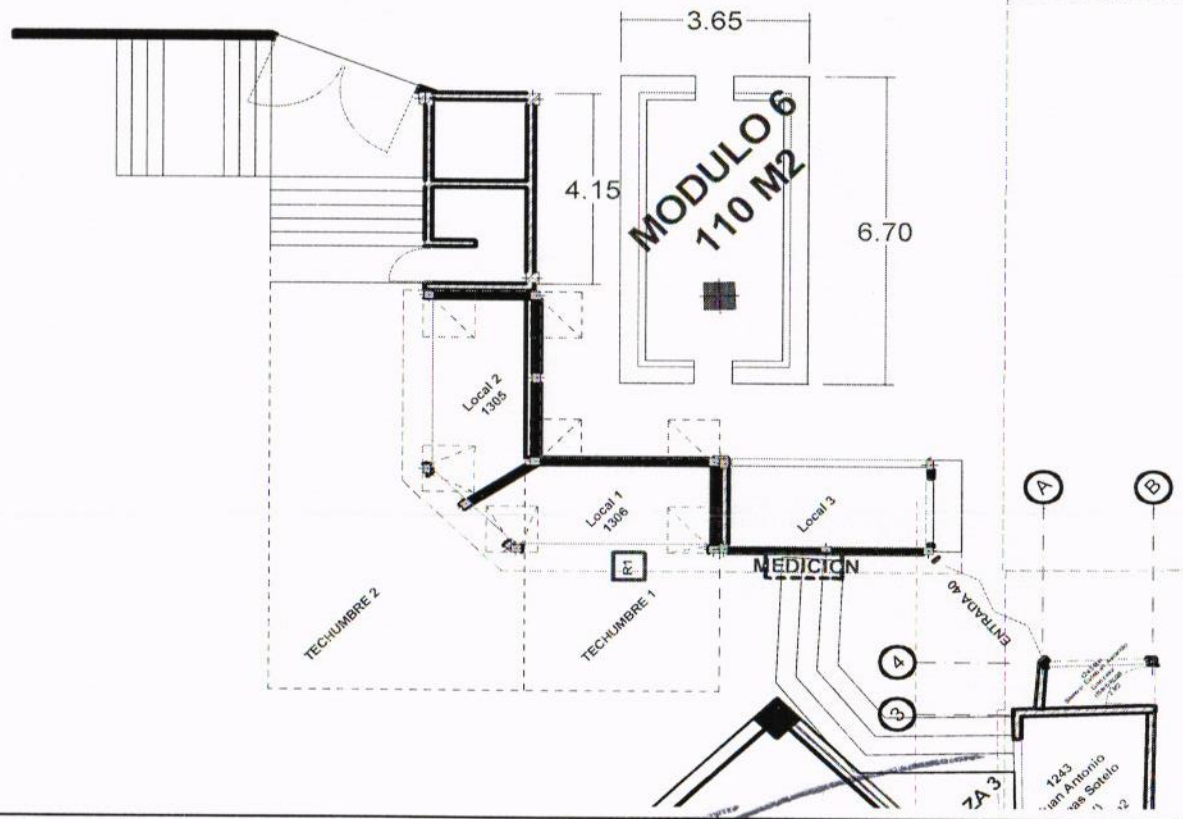

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**										
1-0016*	DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .	MODULO 3		JENNY GARCIA			10.00		1.00	10.00	
		MODULO 3		PASILLOS			42.00		1.00	42.00	
		MODULO 4					89.27		1.00	89.27	
		MODULO 5					98.33		1.00	98.33	
		MODULO 6					23.00		1.00	23.00	
		ENTRADA 40					10.00		1.00	10.00	
		PLAZA 3					5.21		1.00	5.21	
								TOTAL	M2	267.81	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

1-0016* DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

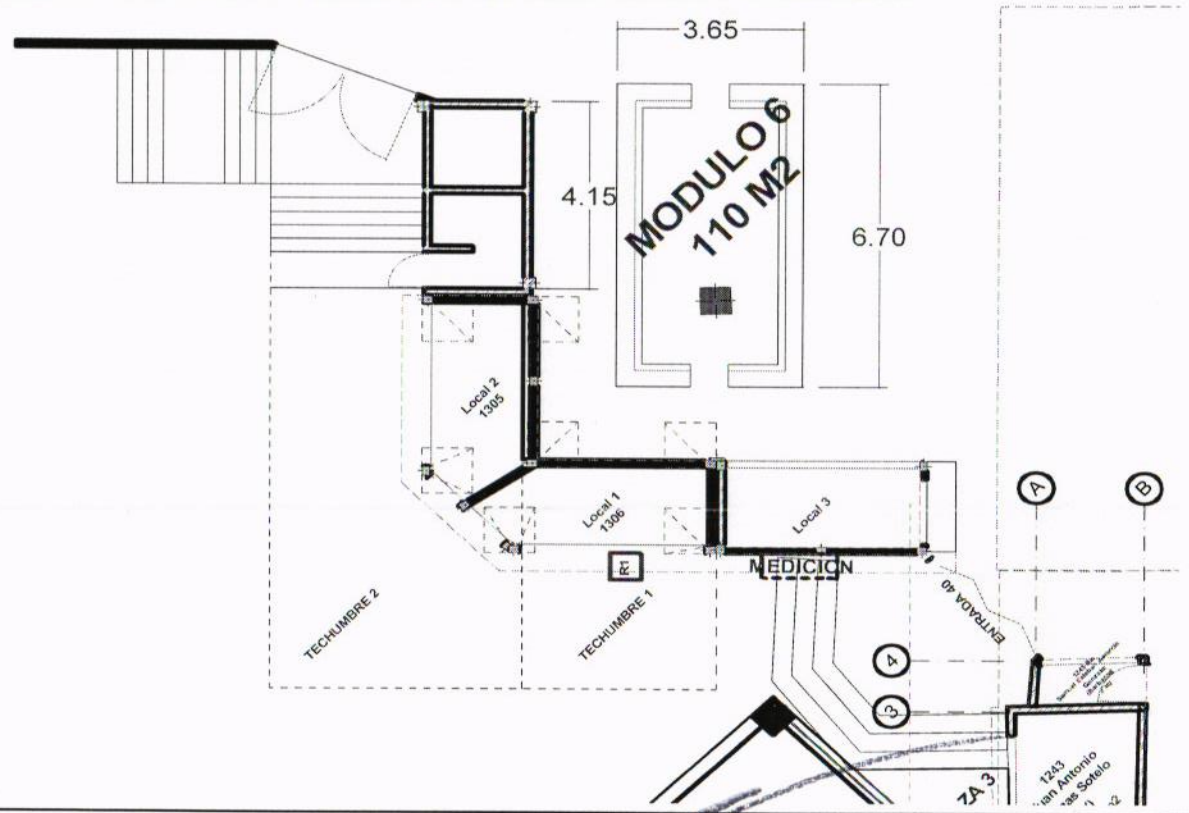

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**										
DESM-COR	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MOD. 6	L1				2.50	1.95	1.00	4.88	
		MOD. 6	L1				1.70	1.95	1.00	3.32	
		MOD. 6	L2				4.50	1.95	1.00	8.78	
		MOD. 6	L3				3.80	2.00	1.00	7.60	
		MOD. 6	L3				1.50	1.00	1.00	1.50	
								TOTAL	M2	26.08	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

DESM-COR DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

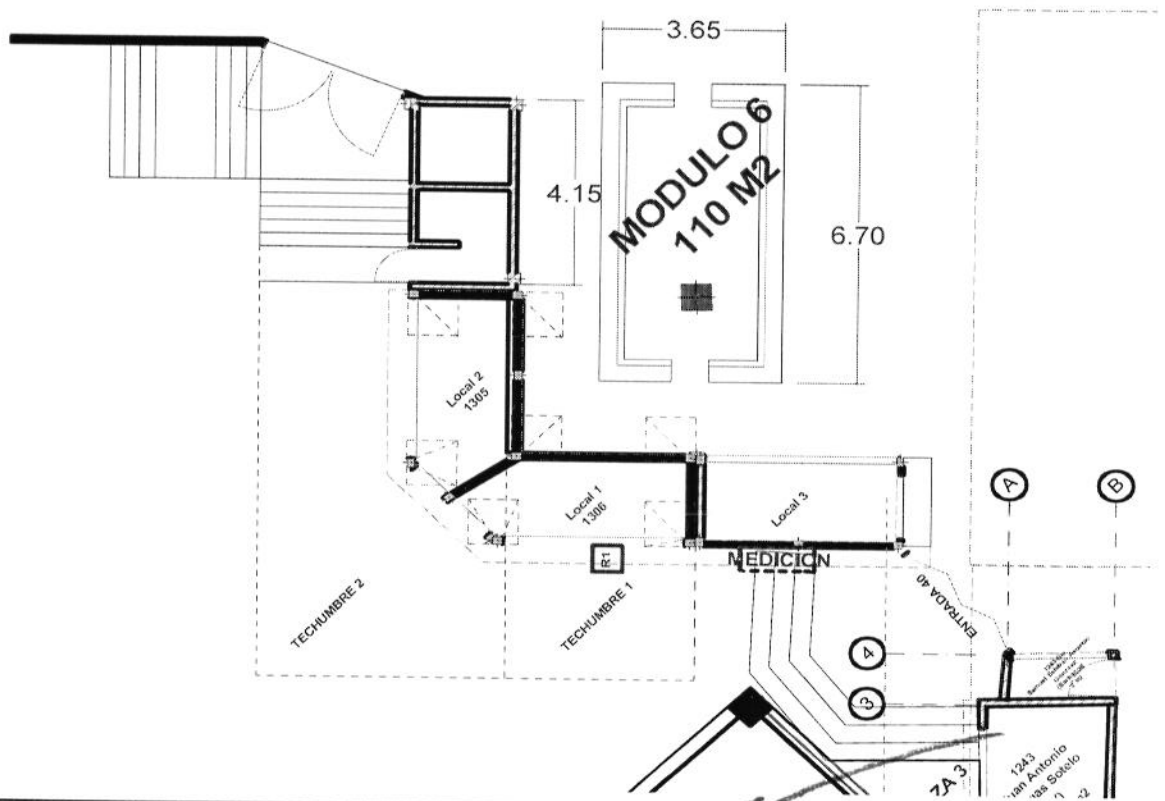

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A01	**DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**										
DES-LAM	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.	TECHUMBRE 1					3.80	5.00	1.00	19.00	
		TECHUMBRE 2					5.00	9.00	1.00	45.00	
		TAPAS DE SOMBRILLAS					13.00	0.60	7.00	54.60	
								TOTAL	M2	118.60	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A01 **DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS**

DES-LAM DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.

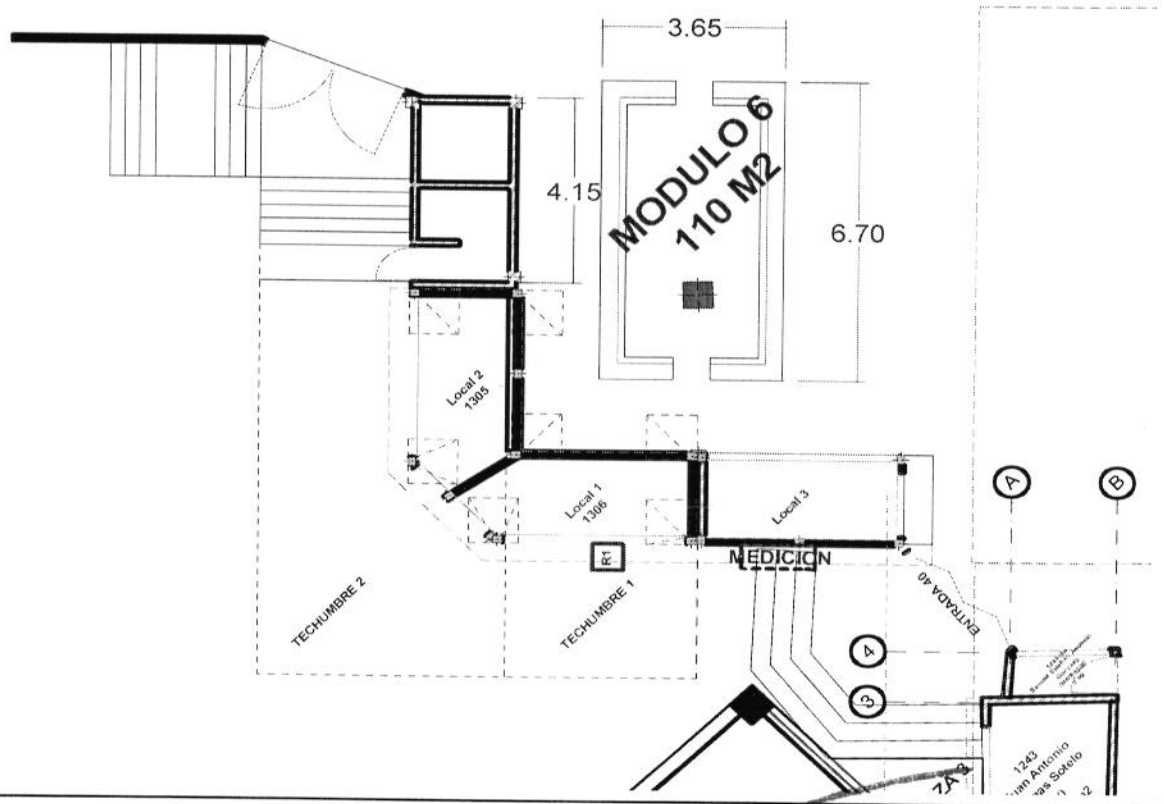

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
SUM-TAP	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	TAPIAL 1				9.60	2.40		1.00	23.04	
		TAPIAL 2				8.40	2.40		1.00	20.16	
		TAPIAL 3				10.00	2.40		1.00	24.00	
								TOTAL	M3	67.20	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

SUM-TAP SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

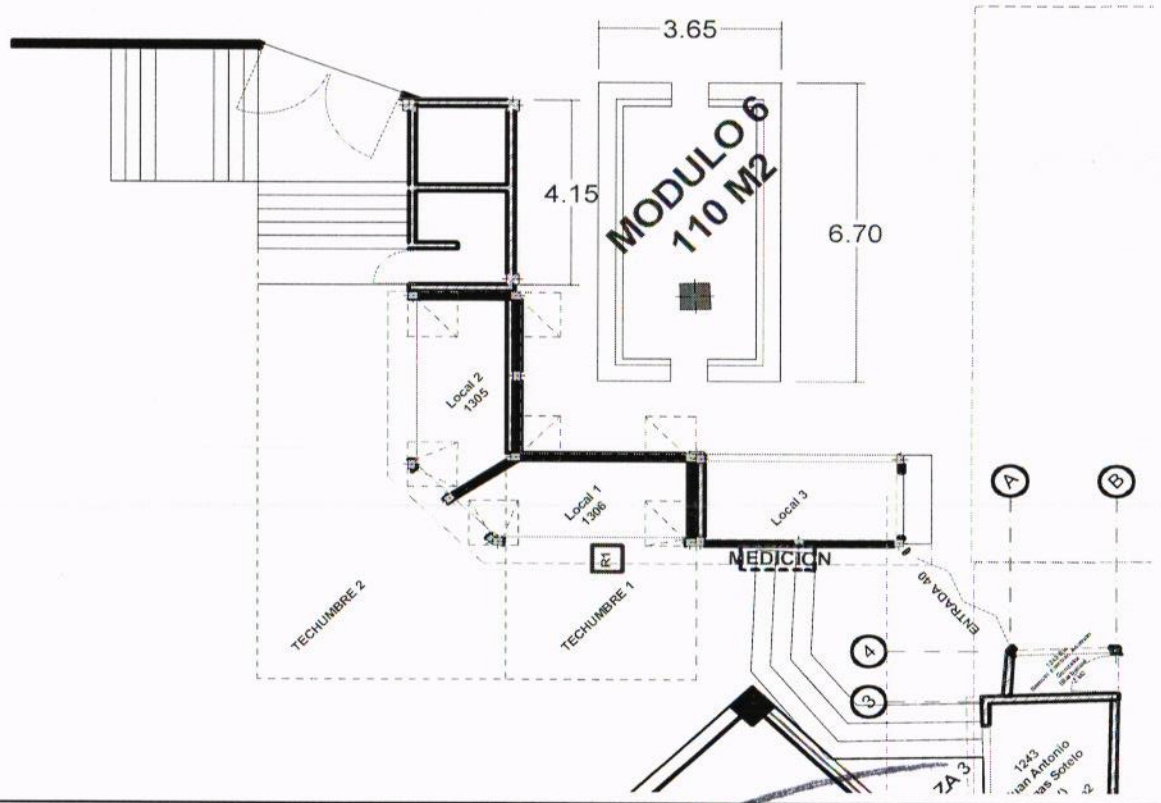

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	SOMBRILLAS					13.00	13.00	6.00	1,014.00	
		COLUMNAS					2.40	5.00	6.00	72.00	
								TOTAL	M2	1,086.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A02 **PRELIMINARES**

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

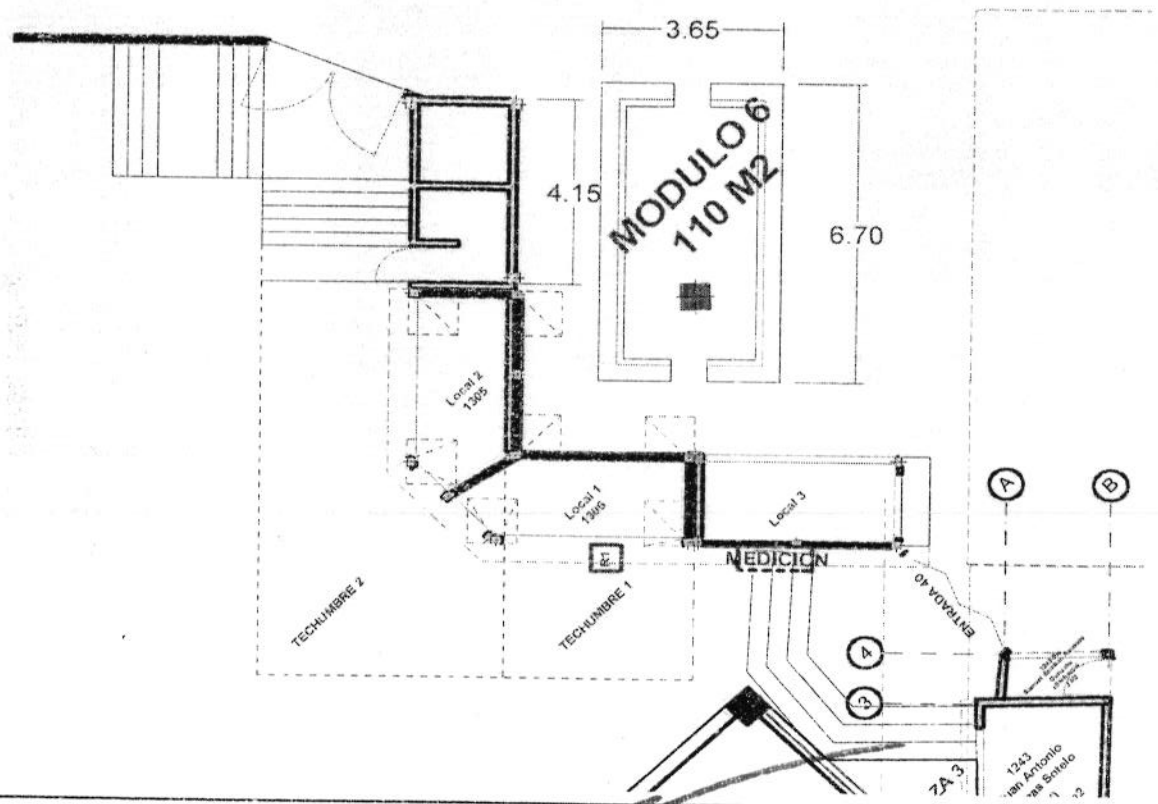

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**	**ELECTRICIDAD**									
EXC-11-A	EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD	R7	A	R4			8.50	0.50	0.50	2.13	
		R4	A	R3			9.50	0.50	0.50	2.38	
		R3	A	R2			6.00	0.50	0.50	1.50	
		R2	A	MOD. 3			6.00	0.50	0.50	1.50	
		R2	A	R1			9.50	0.50	0.50	2.38	
		R1	A	MOD. 6			3.00	0.50	0.50	0.75	
		R4	A	MOD. A			14.00	0.50	0.50	3.50	
		R4	A	R5			7.00	0.50	0.50	1.75	
		R5	A	MOD. 4			4.00	0.50	0.50	1.00	
		R5	A	R6			6.00	0.50	0.50	1.50	
		R6	A	MOD. 5			6.00	0.50	0.50	1.50	
		PLUVIAL									
		R1	A	R2			7.12	0.50	0.50	1.78	
		R2	A	R3			9.20	0.50	0.50	2.30	
		R3	A	R4			11.70	0.50	0.50	2.93	
		R3	A	R5			9.70	0.50	0.50	2.43	
		R5	A	GENERAL			4.00	0.50	0.50	1.00	
		ZAPATAS					1.00	1.00	7.00	7.00	
		CONTRATRABLES					34.82	0.50	0.30	5.22	
								TOTAL	M3	**42.55**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A02 **PRELIMINARES**

EXC-11-A EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

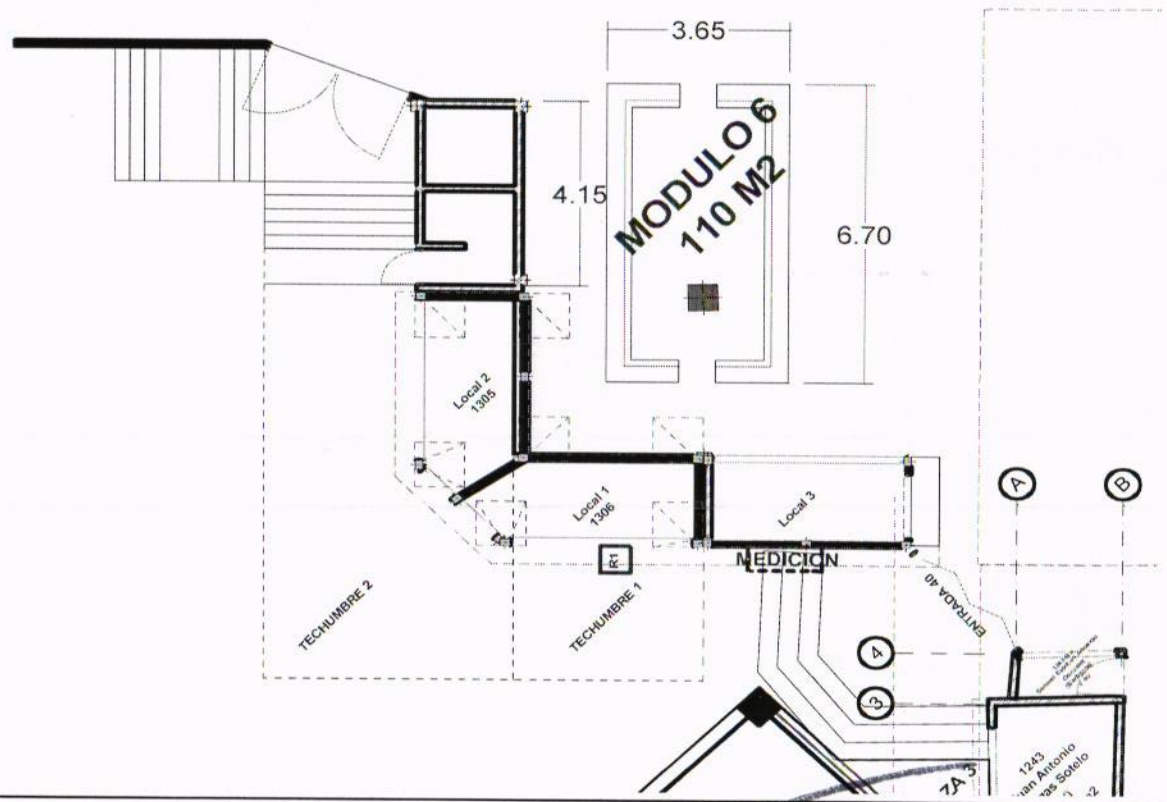

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
9-0139*	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	VOLUMEN DE EXCAVACION								42.55	
		MENOS RELLENO DE ARENA								-8.94	
		MENOS CONTRARABES					-34.82	0.20	0.30	-2.09	
		MENOS ZAPATAS				-1.00	1.00	0.20	7.00	-1.40	
								TOTAL	M3	30.12	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

9-0139* RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

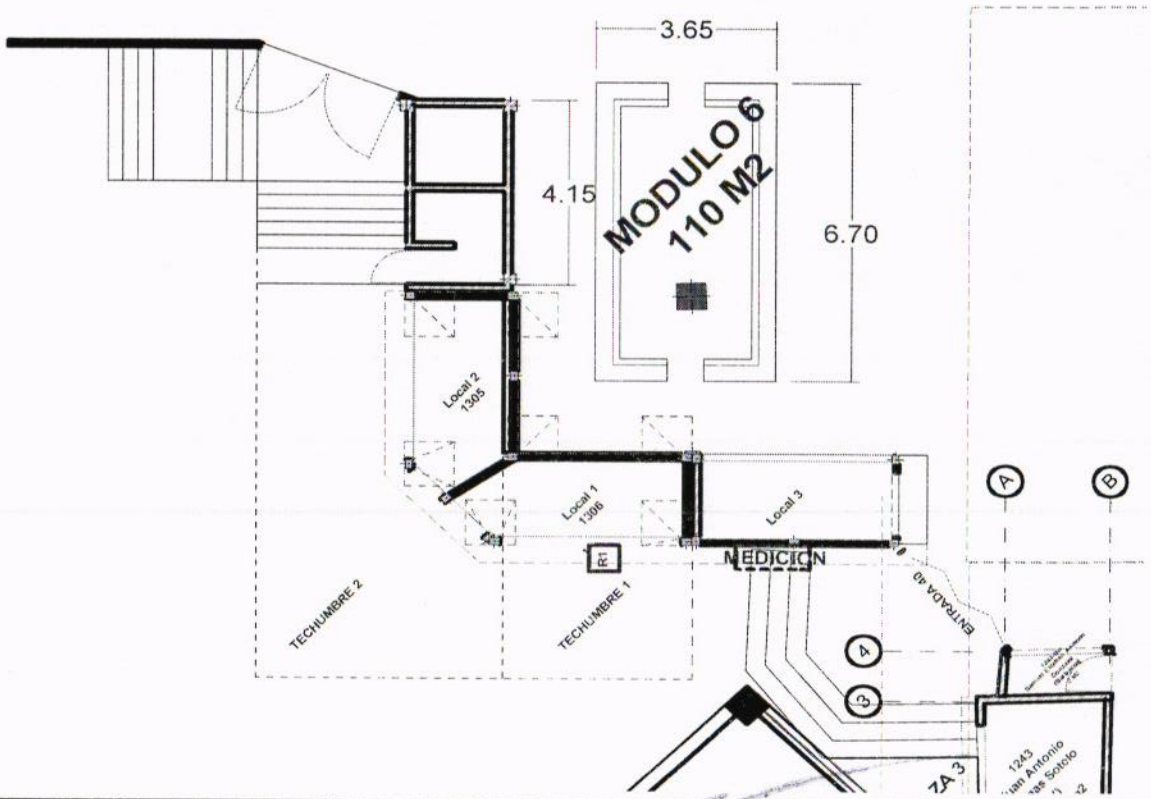

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**										
9-0138*	RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.	RELLENO DE PISOS			L1	4.20	1.85	0.50	1.00	3.89	
		RELLENO DE PISOS			L2	4.50	1.85	0.50	1.00	4.16	
								TOTAL	M3	8.05	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

9-0138* RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

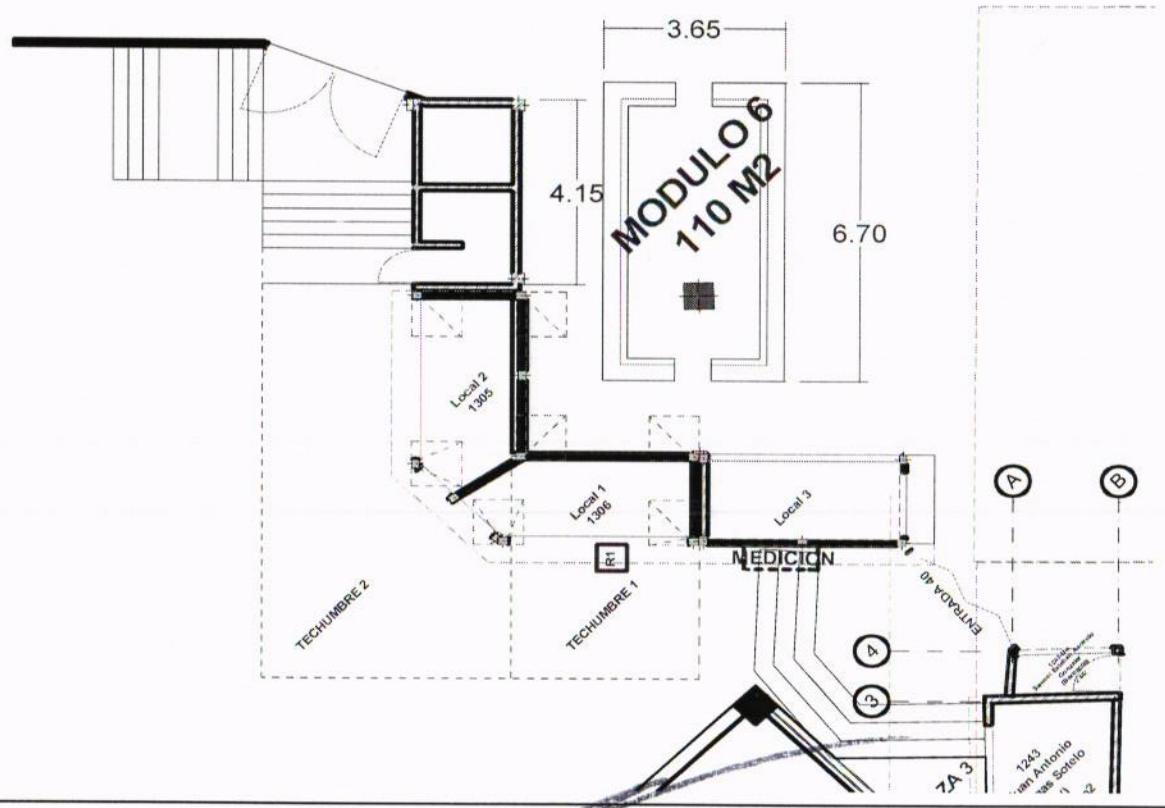

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**PRELIMINARES**	**ELECTRICIDAD**									
5-0102	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	R7	A	R4			8.50	0.30	0.20	0.51	
		R4	A	R3			9.50	0.30	0.20	0.57	
		R3	A	R2			6.00	0.30	0.20	0.36	
		R2	A	MOD. 3			6.00	0.30	0.20	0.36	
		R2	A	R1			9.50	0.30	0.20	0.57	
		R1	A	MOD. 6			3.00	0.30	0.20	0.18	
		R4	A	MOD. A			14.00	0.30	0.20	0.84	
		R4	A	R5			7.00	0.30	0.20	0.42	
		R5	A	MOD. 4			4.00	0.30	0.20	0.24	
		R5	A	R6			6.00	0.30	0.20	0.36	
		R6	A	MOD. 5			6.00	0.30	0.20	0.36	
		PLUVIAL									
		R1	A	R2			7.12	0.50	0.20	0.71	
		R2	A	R3			9.20	0.50	0.20	0.92	
		R3	A	R4			11.70	0.50	0.20	1.17	
		R3	A	R5			9.70	0.50	0.20	0.97	
		R5	A	GENERAL			4.00	0.50	0.20	0.40	
								TOTAL	M3	**8.94**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A02 **PRELIMINARES**

5-0102 CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

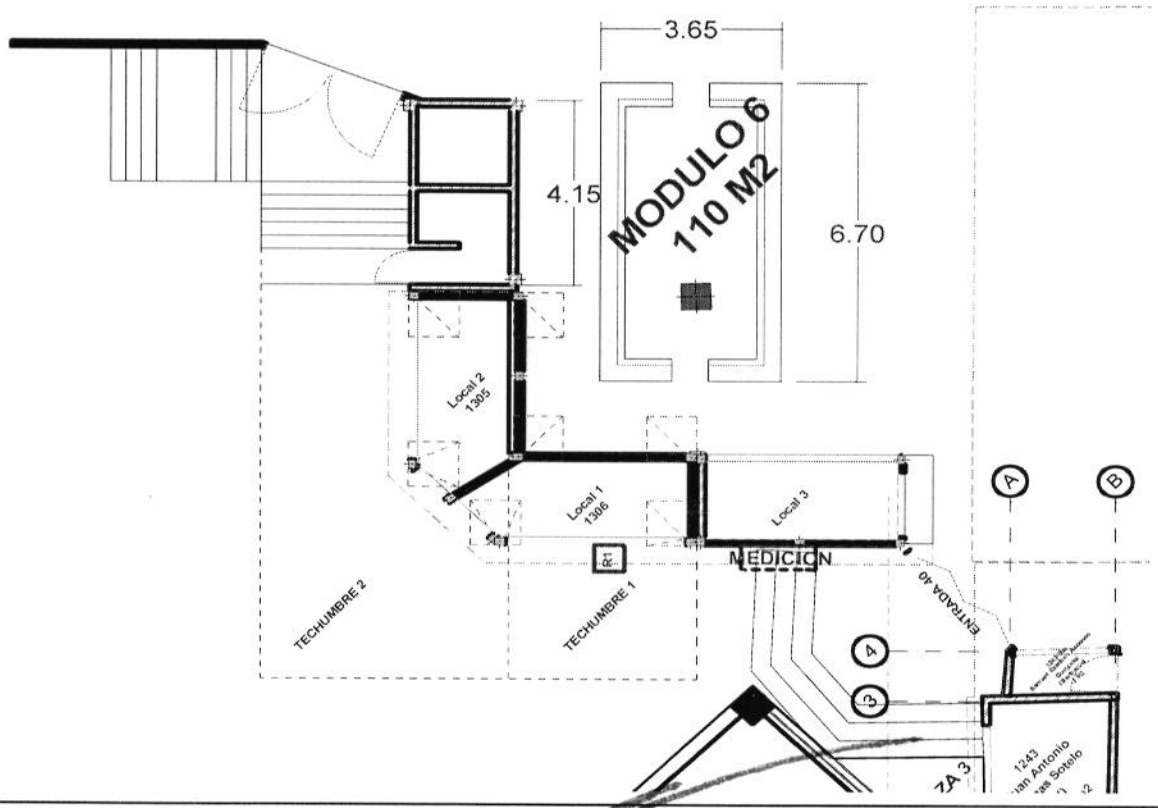

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**										
8-0126	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.	6	L1 Y L2						7.00	7.00	
								TOTAL	PZA	7.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A03 **LOCALES DE CONCRETO**

8-0126 ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.

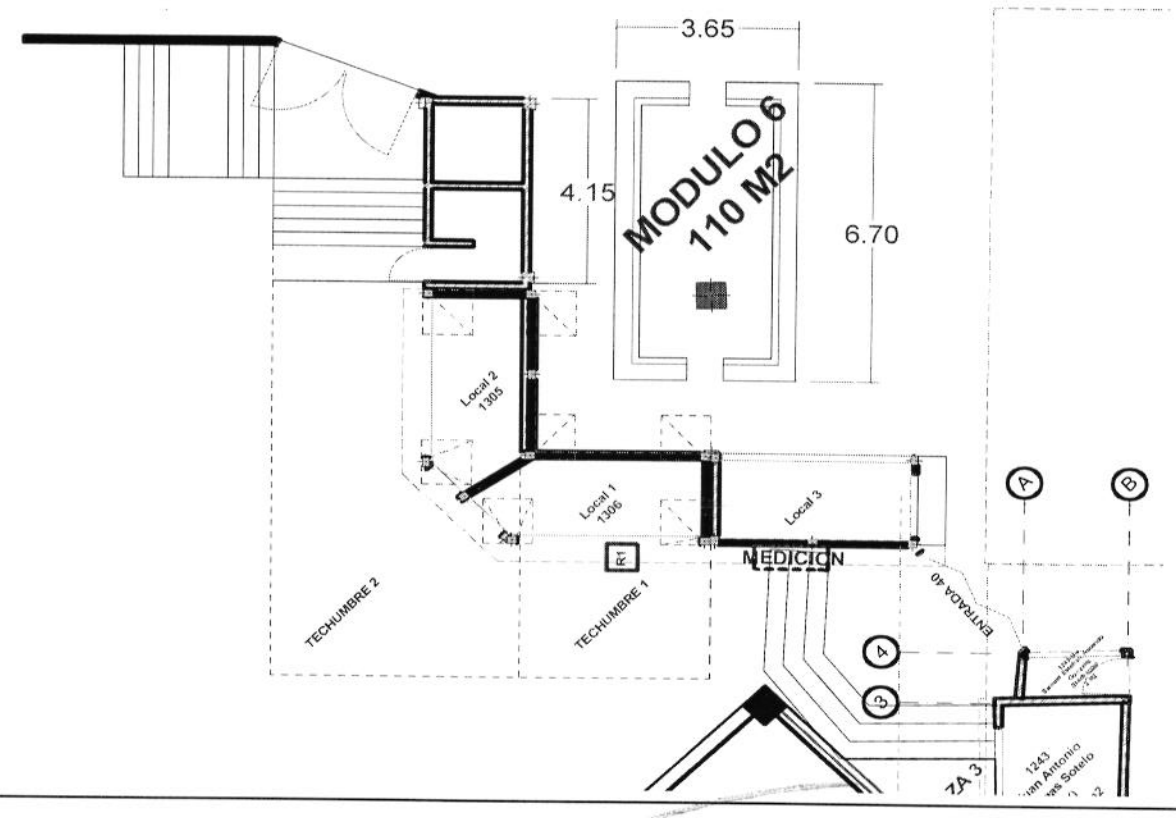

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**										
11-0167*	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION	6	L1					12.34	1.00	12.34	
		6	L2					10.58	1.00	10.58	
		6	L4					11.90	1.00	11.90	
								TOTAL	ML	34.82	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
ACAPULCO DE JUAREZ	**MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03 **LOCALES DE CONCRETO**

11-0167* CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION

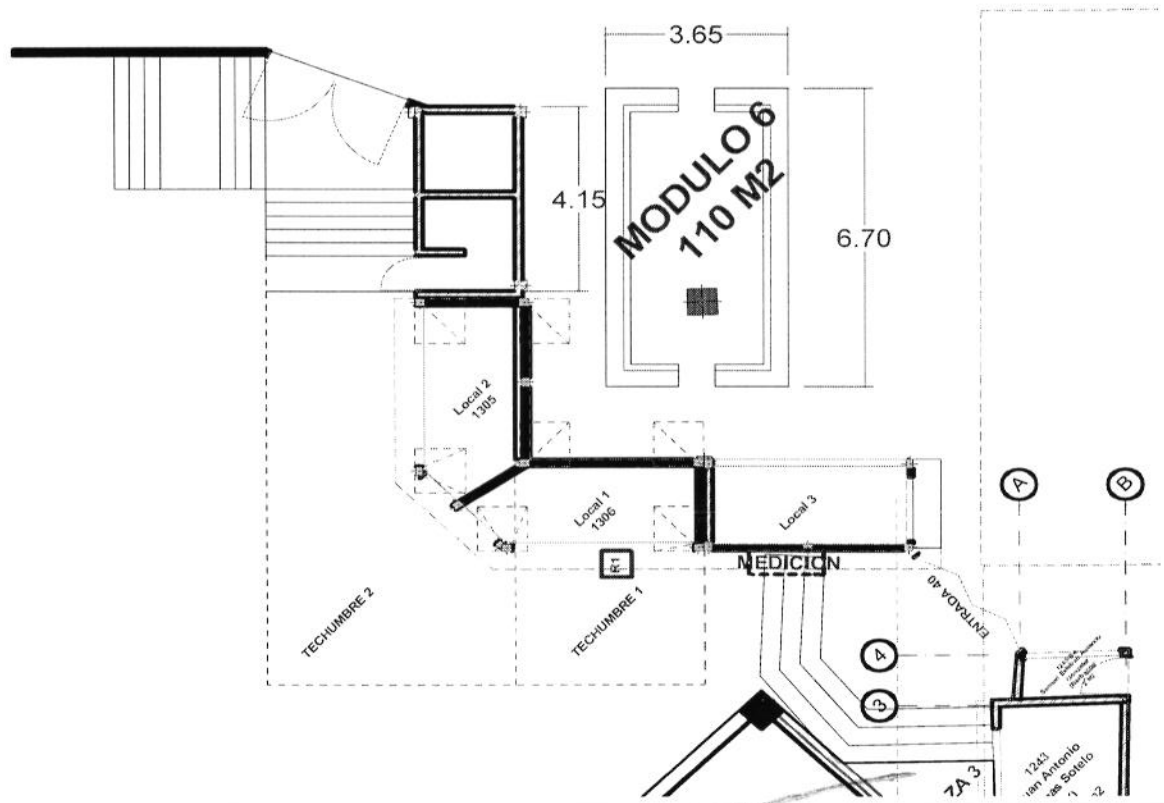

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**										
CAST-1520	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	6	1 Y 2					7.00	2.70	18.90	
		6	3					5.00	2.70	13.50	
								TOTAL	ML	32.40	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A03 **LOCALES DE CONCRETO**

CAST-1520 CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

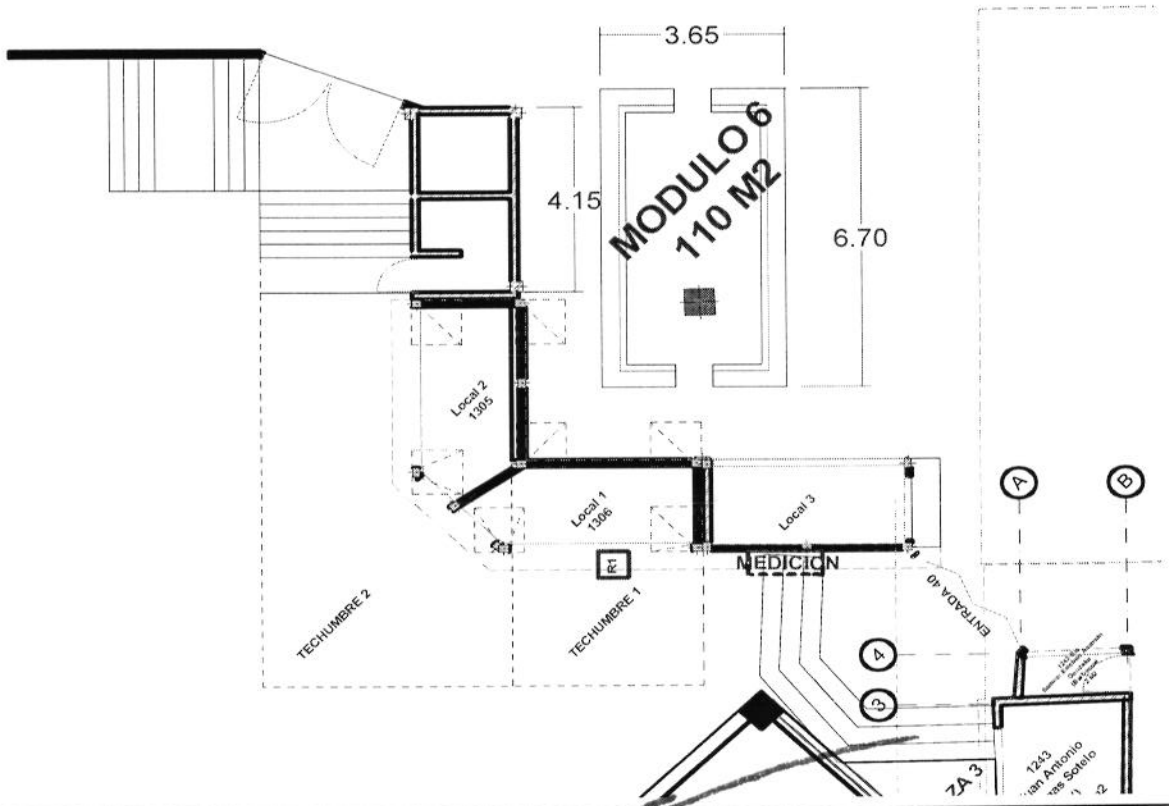

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**				**LARGO**	**PZAS**		
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	6	L1					7.00	1.00	7.00	
		6	L2					5.70	1.00	5.70	
		6	L3					7.50	1.00	7.50	
								TOTAL	**ML**	**20.20**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03	**LOCALES DE CONCRETO**	
DC-15X15*	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.	

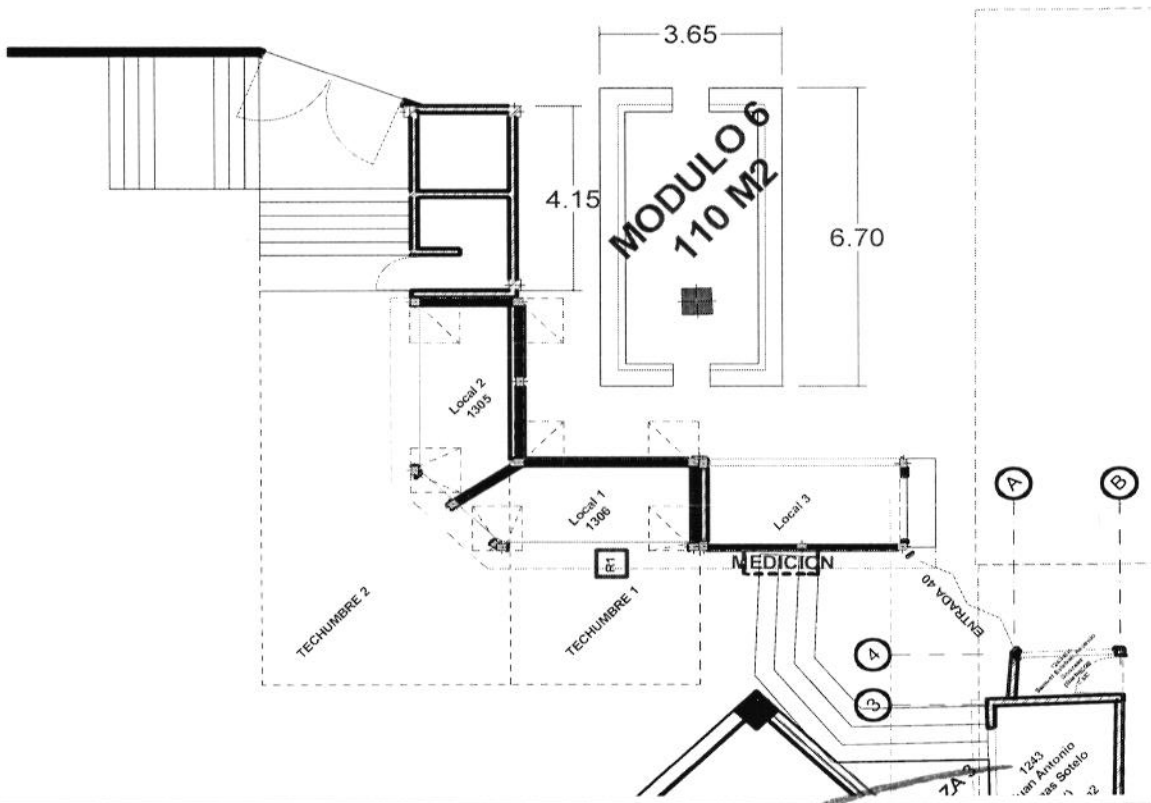

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**				**PZAS**	**LARGO**		
TR-1530	TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	6	L1					12.34	1.00	12.34	
		6	L2					10.58	1.00	10.58	
		6	L4					11.90	1.00	11.90	
								TOTAL	ML	34.82	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A03 **LOCALES DE CONCRETO**

TR-1530 TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

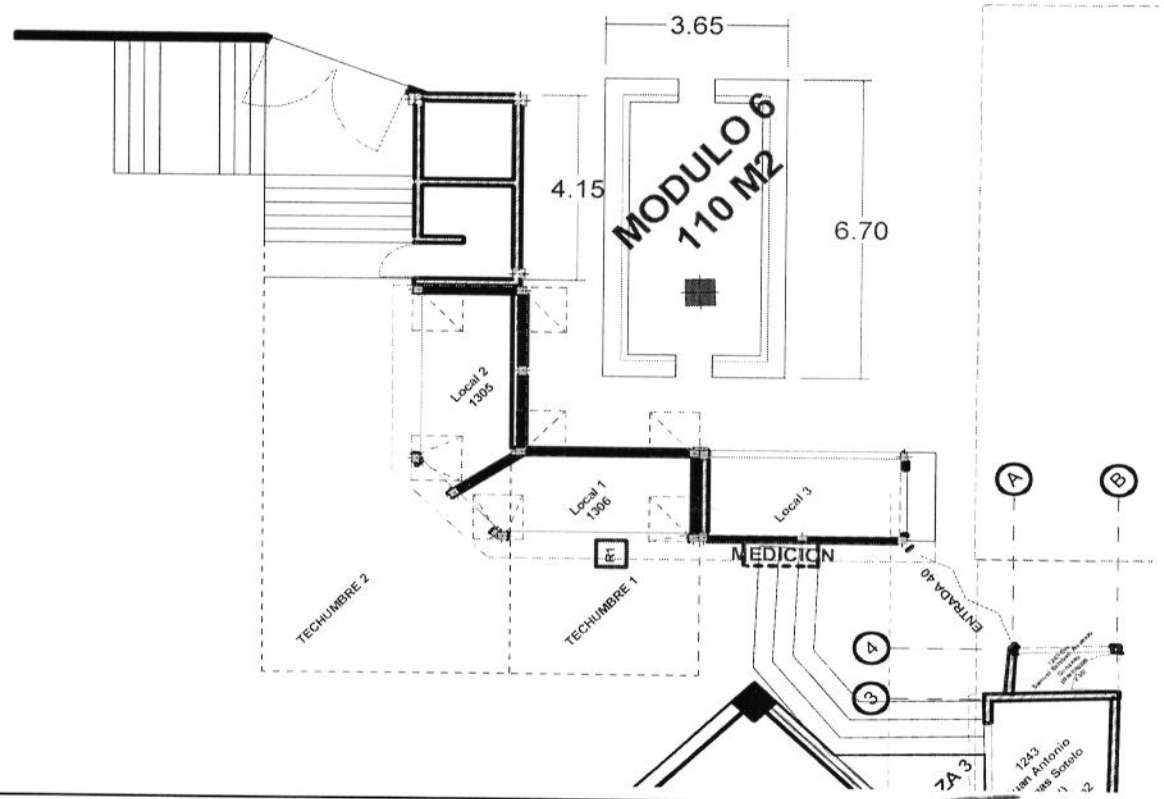

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**LOCALES DE CONCRETO**										
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *	LOSA LOCAL 1,2 Y 3								35.00	
								TOTAL	M2	**35.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A03	**LOCALES DE CONCRETO**	
11-0224	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. *	

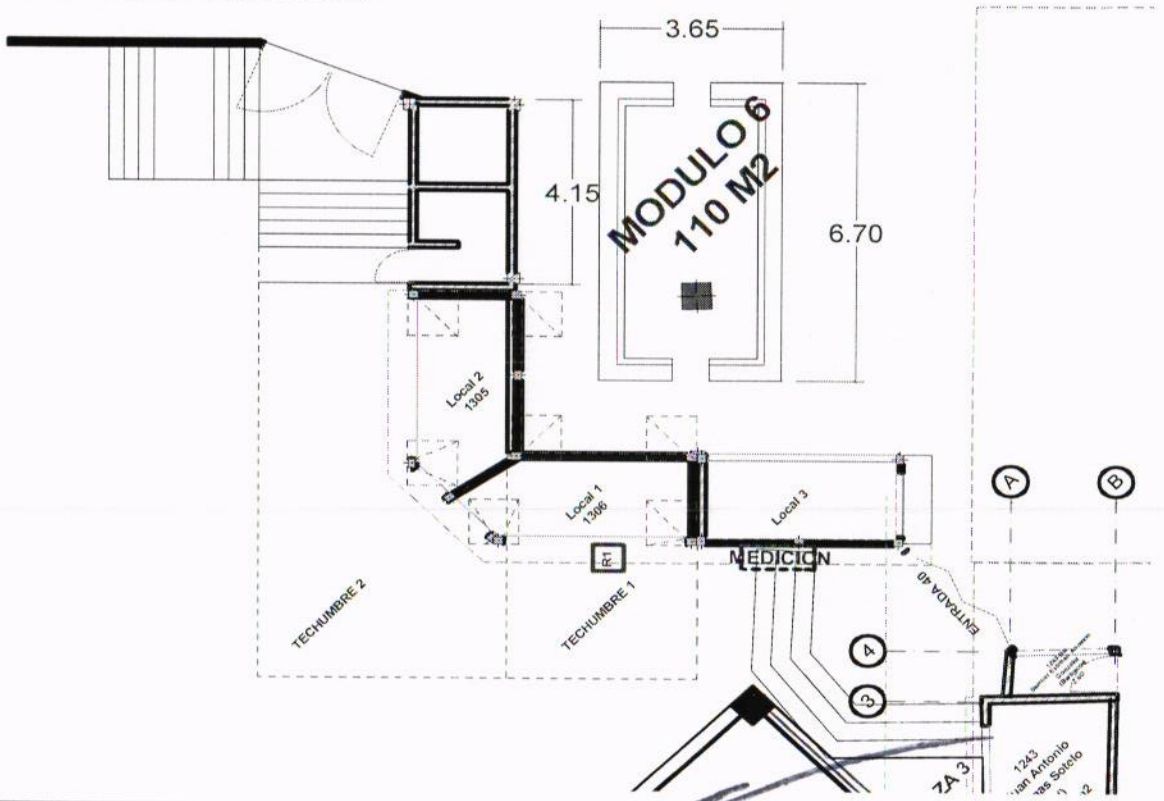

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**										
ENTOR3*	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									35.00	
								TOTAL	M2	35.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

ENTOR3* ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

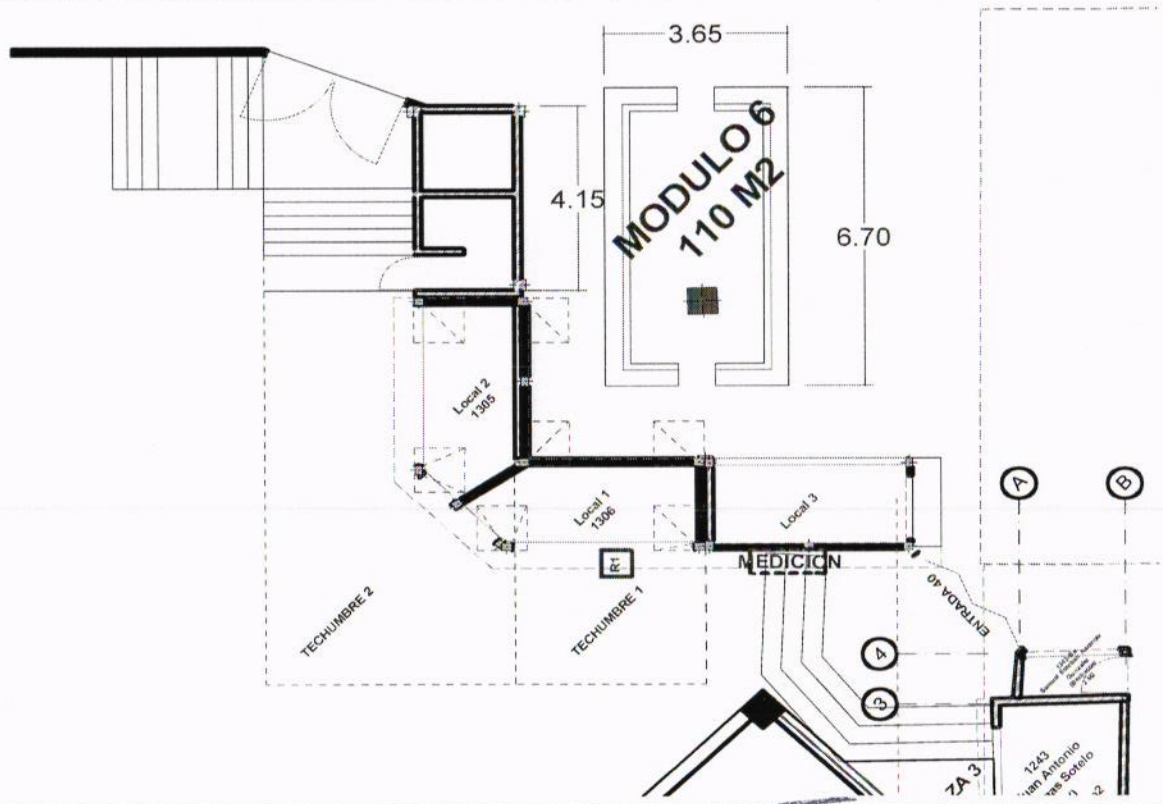

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**			**LARGO**	**ALTO**	**PZAS**		
MURO14	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.	6	1				1.50	2.00	1.00	3.00	
		6	1				3.50	2.00	1.00	7.00	
		6	1				1.90	2.00	1.00	3.80	
		6	2				2.00	2.00	1.00	4.00	
		6	2				3.50	2.00	1.00	7.00	
		6	3				5.60	2.00	1.00	11.20	
								TOTAL		**36.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A04 **ALBAÑILERIAS**

MURO14 MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.

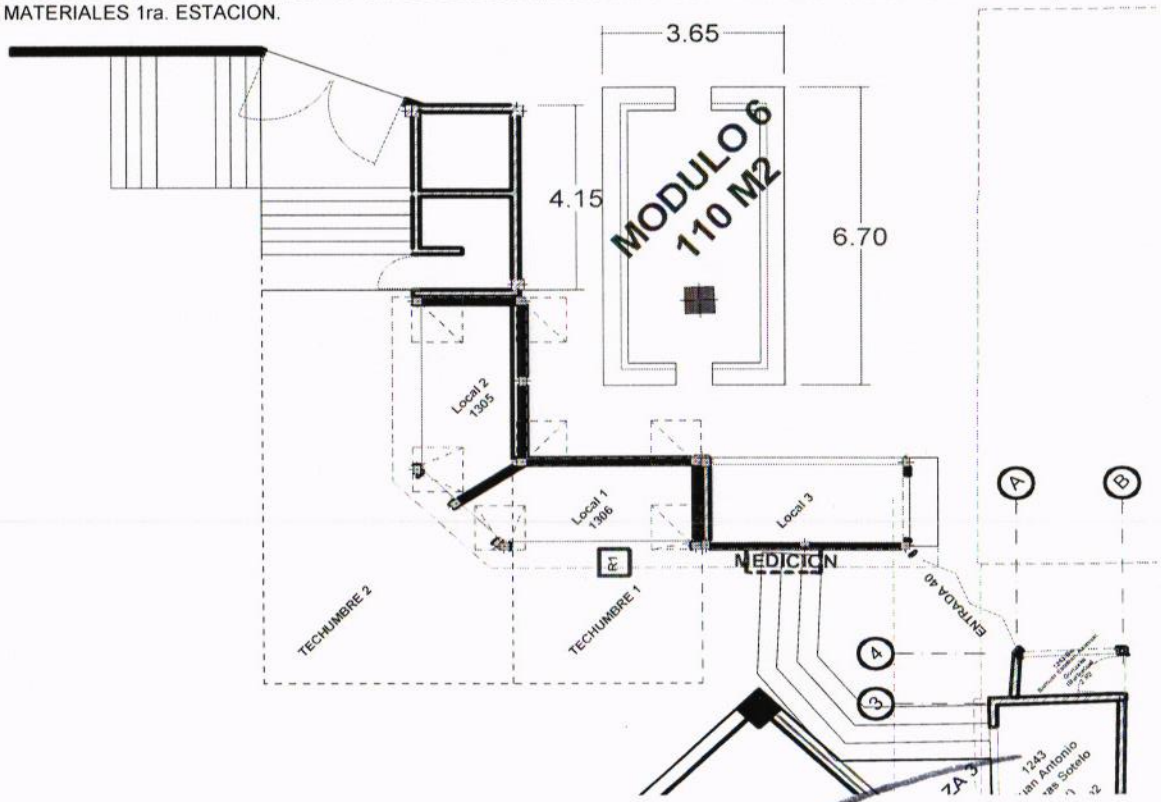

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**			**LARGO**	**ALTO**	**PZAS**		
11-0212	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	6	1 Y 2	MUROS EXTERIORES			30.00	2.70	2.00	162.00	
		6	1 Y 2	MUROS INTERIORES			8.00	2.50	2.00	40.00	
		MENOS CORTINAS					37.51	1.00	-2.00	-75.02	
		LOSA					35.00	1.00	1.00	35.00	
								TOTAL	M2	**161.98**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

11-0212 APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

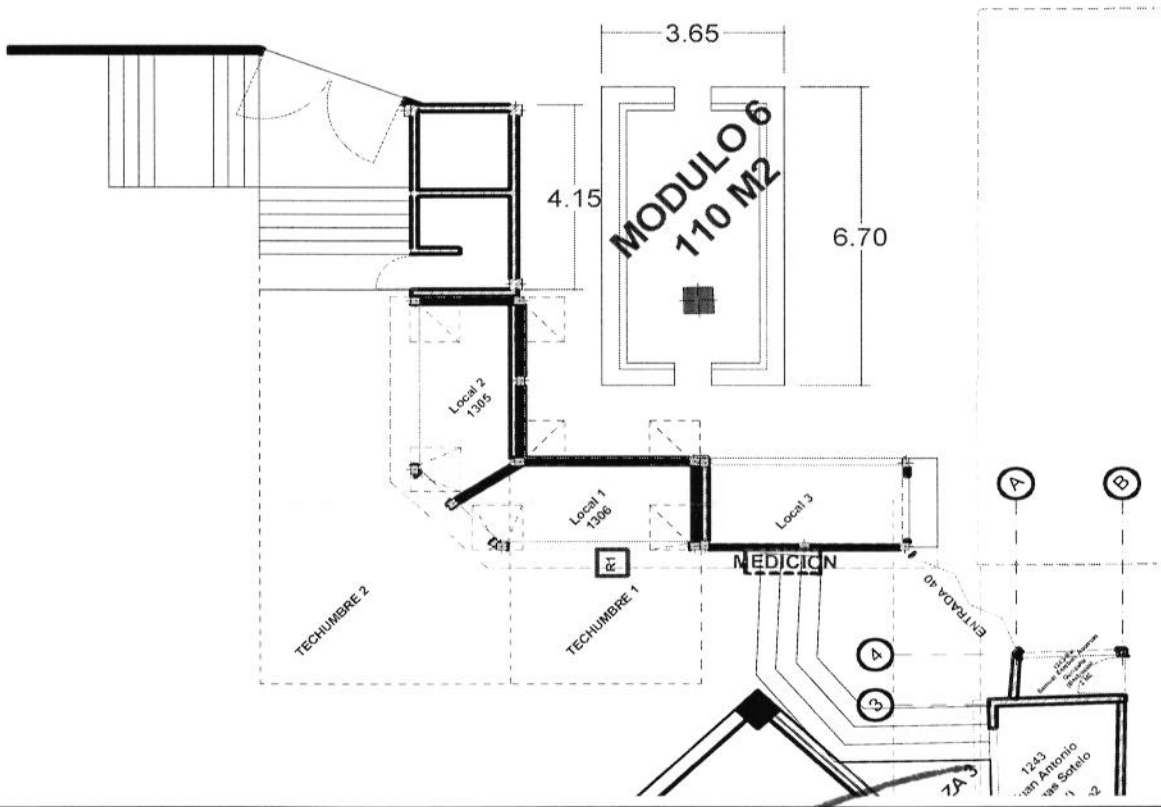

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**	**MOD.**	**LOC.**	**PROP**			**ALTO**	**PZAS**	**LADOS**		
11-0218	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .	6	1	CORTINAS			2.50	3.00	1.00	7.50	
		6	1	CASTILLO			2.70	3.00	1.00	8.10	
		6	2	CORTINAS			2.50	3.00	1.00	7.50	
		6	2	CASTILLO			2.70	3.00	1.00	8.10	
		6	3	CORTINAS			2.50	2.00	1.00	5.00	
		6	3	CASTILLO			2.70	4.00	1.00	10.80	
		SOMBRILLAS					13.00	6.00	4.00	312.00	
								TOTAL		**359.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A04 **ALBAÑILERIAS**

11-0218 EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .

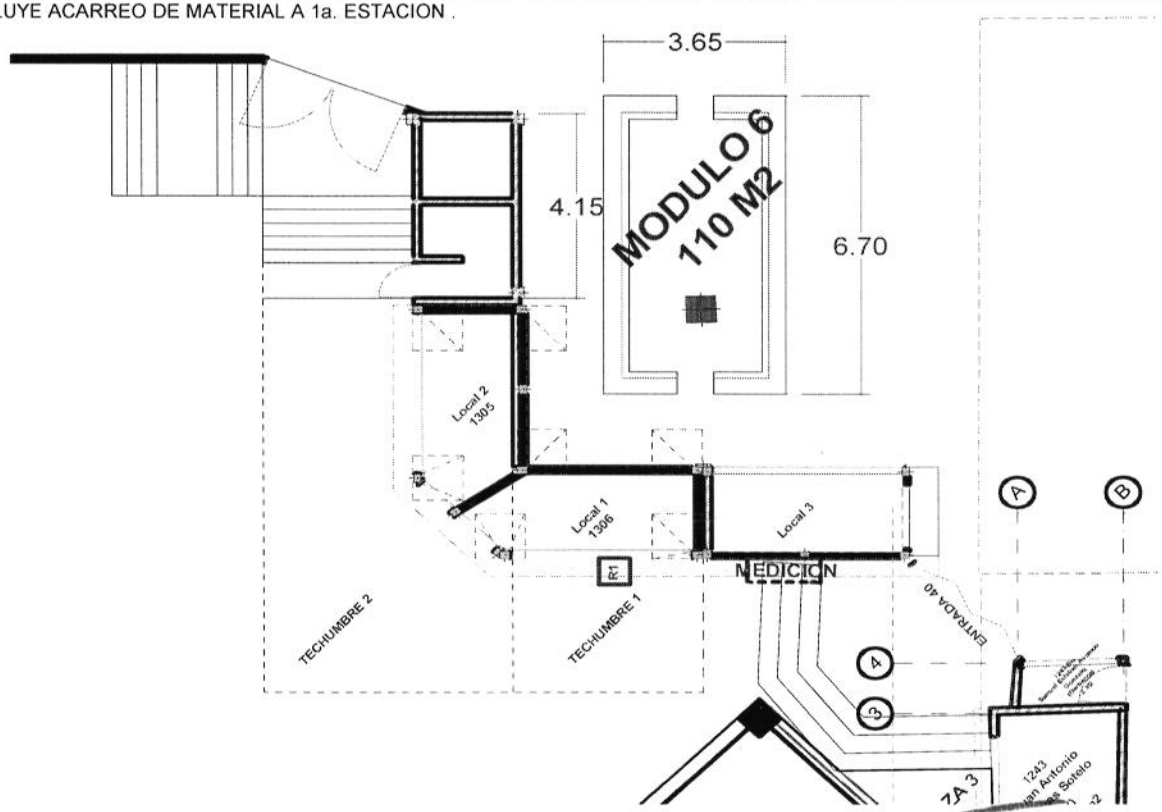

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**										
12-0239	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.	DEMOLICION DE PISOS				267.81				267.81	
								TOTAL	M2	267.81	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 **ALBAÑILERIAS**

12-0239 PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.

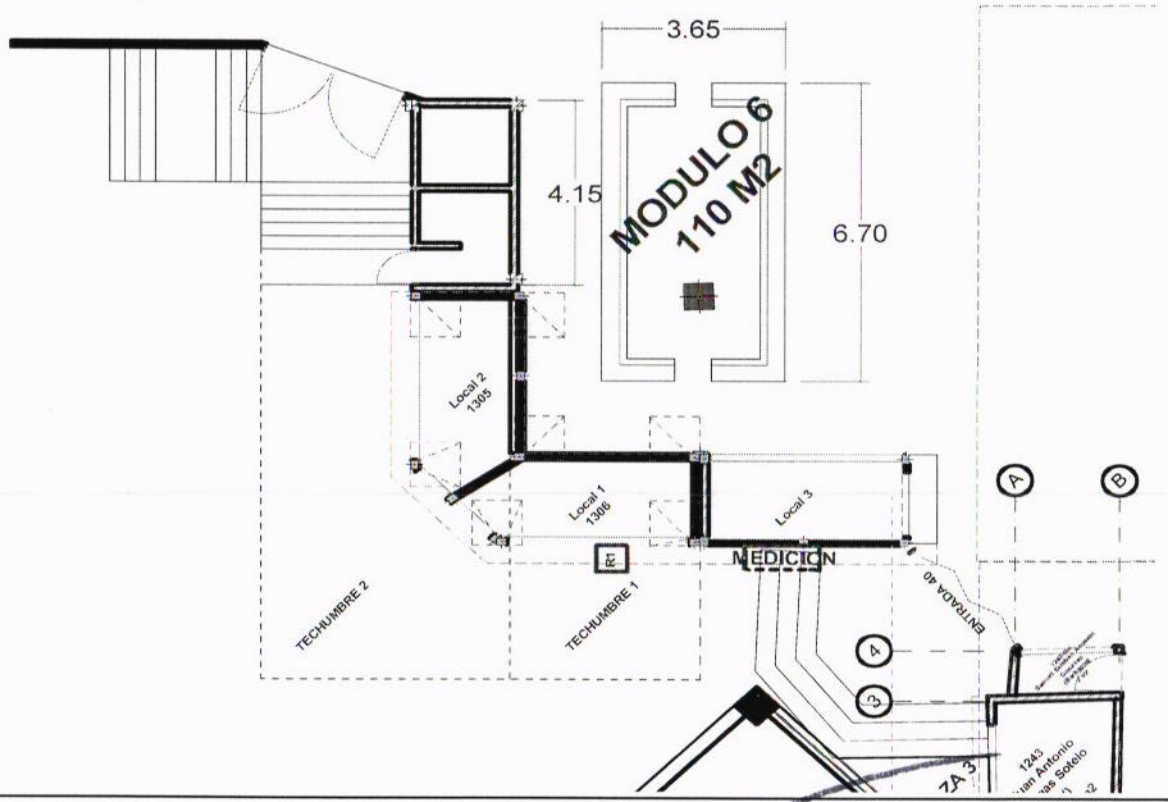

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**ALBAÑILERIAS**										
14-0264*	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.	PLAZOLETA 3				7.00			3.00	21.00	
								TOTAL		**21.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A04 ALBAÑILERIAS

14-0264* FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.

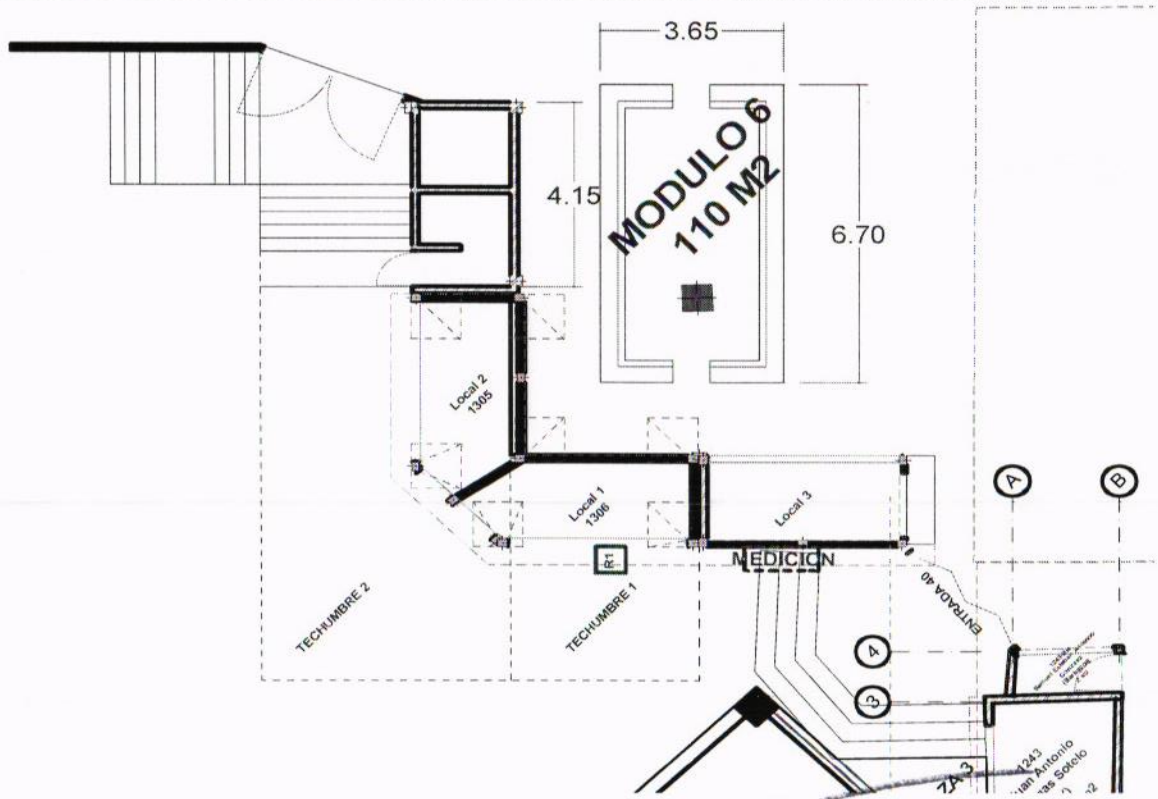

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
29-0431	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.	MODULO 3		JENNY GARCIA						10.00	
								TOTAL	M2	10.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05 **ACABADOS**

29-0431 PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.

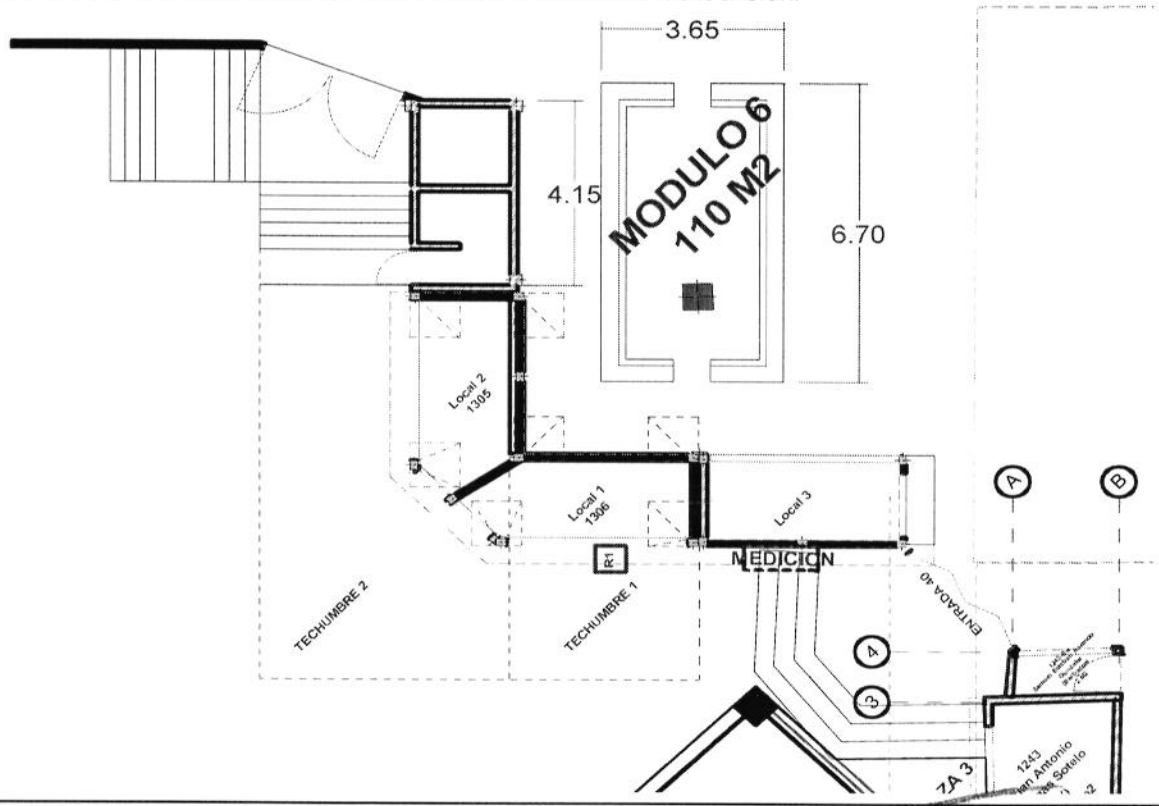

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SOMBRILLAS				13.00		0.90	7.00	81.90	
								TOTAL	M2	81.90	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A05	**ACABADOS**	
HERR-01-LOUV	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	

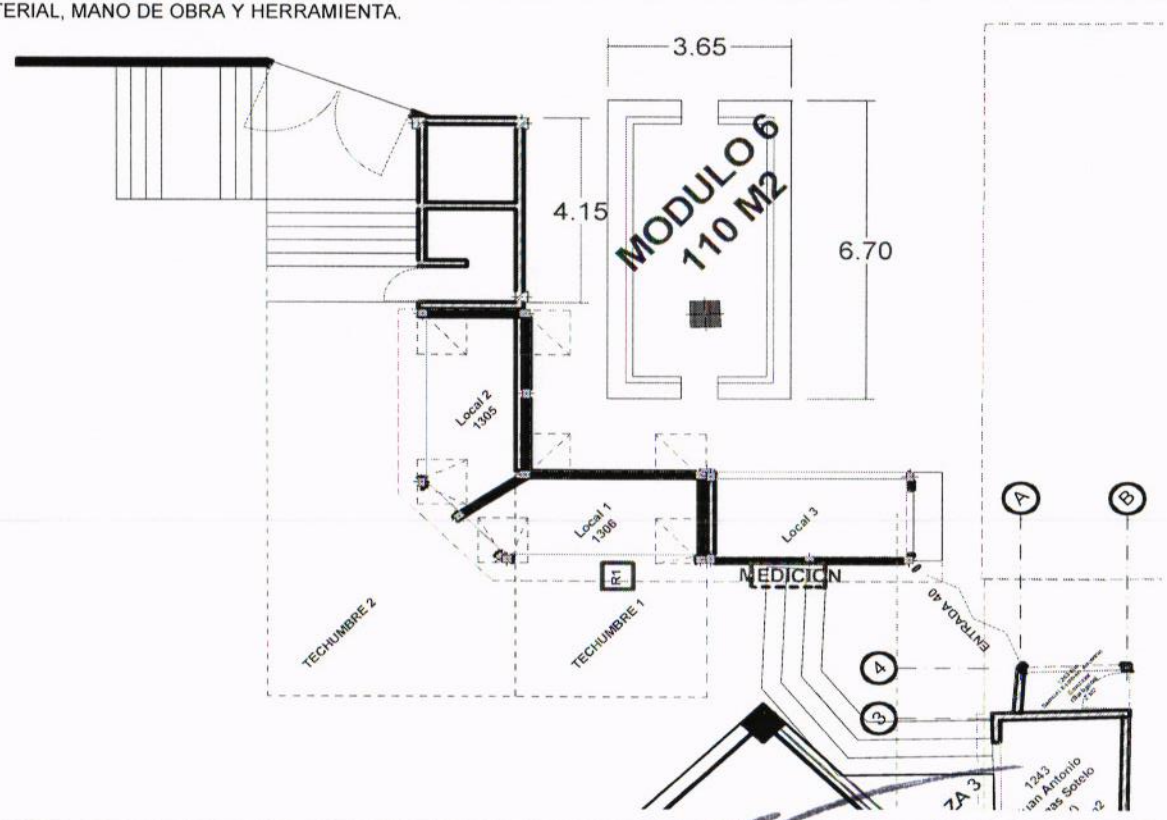

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
CORT-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	**MODULO 6**		LOCAL 1		3.75		2.50	1.00	9.38	
				LOCAL 1		1.00		2.50	1.00	2.50	
				LOCAL 2		3.60		2.50	1.00	9.00	
				LOCAL 2		1.00		2.50	1.00	2.50	
				LOCAL 3		3.85		2.50	1.00	9.63	
				LOCAL 3		1.80		2.50	1.00	4.50	
								TOTAL:	M2	37.51	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A05 **ACABADOS**

CORT-01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

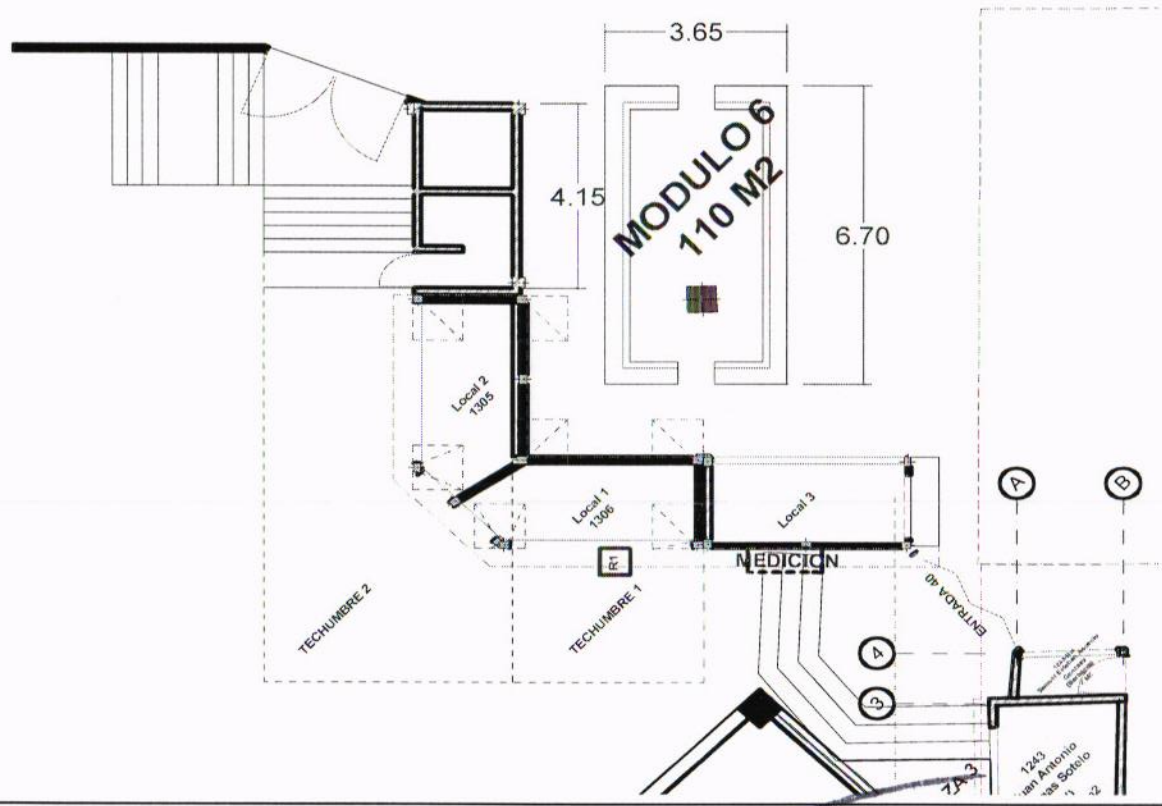

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
LAM-01*	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.					9.00		2.00	1.00	18.00	
								TOTAL:	M2	18.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A05 **ACABADOS**

LAM-01* SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.

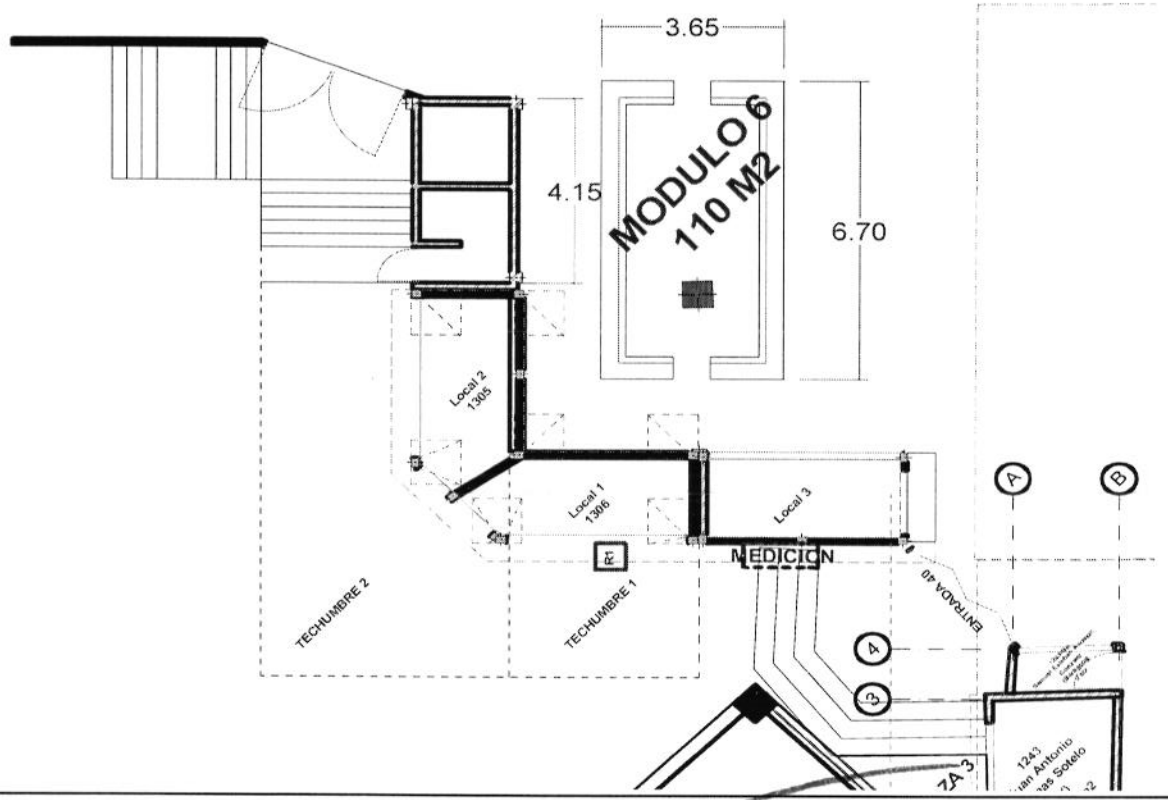

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	GENERADOR DE PREPARACION DE SUPERFICIE								1,086.00	
		GENERADOR DE APLANADOS								161.98	
		GENERADOR DE BOQUILLAS				359.00	ESPESOR PROMEDIO		0.20	71.80	
								TOTAL:	M2	1,319.78	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A05 **ACABADOS**

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

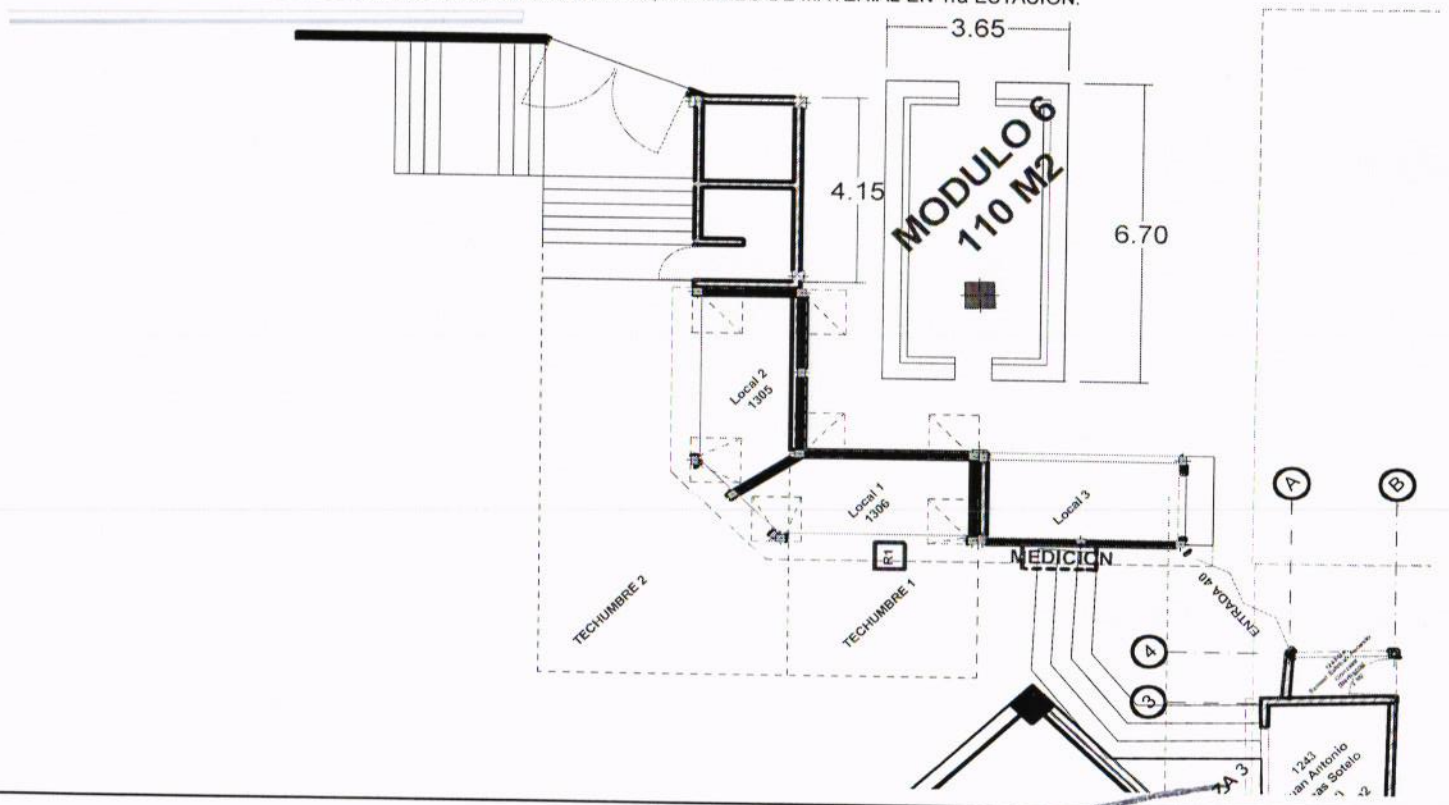

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A05	**ACABADOS**										
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	GENERADOR DE CORTINAS				16.00			2.00	32.00	
								TOTAL:	M2	32.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAM NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPU O DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A05 **ACABADOS**

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

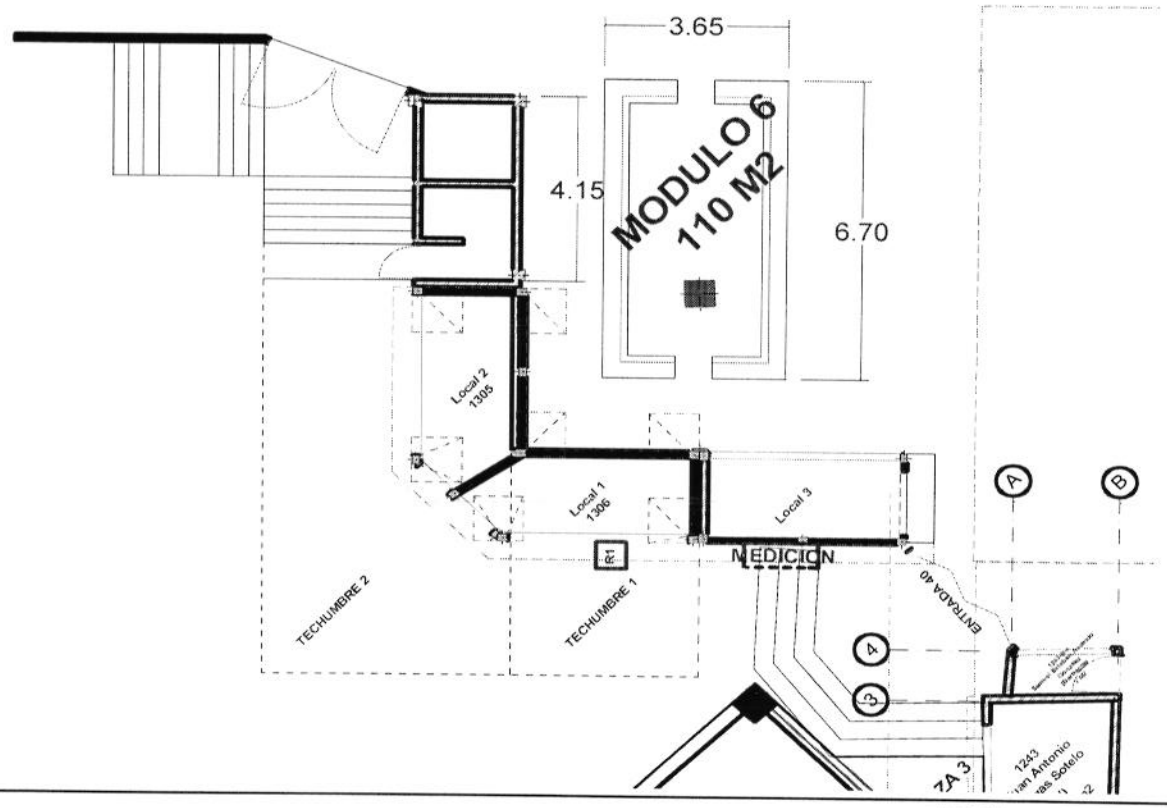

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-01	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.									1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 ROTULACION

ROT-01 ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.

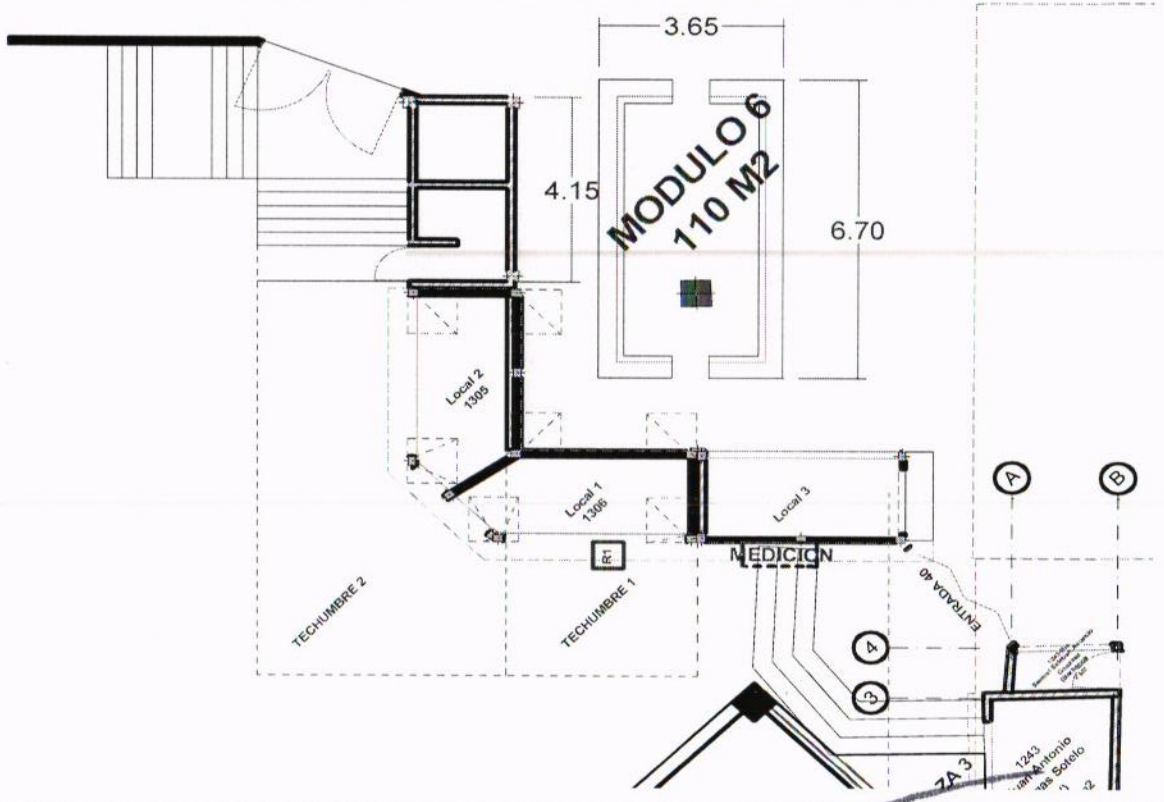

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-02	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.									1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 ROTULACION

ROT-02 ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.

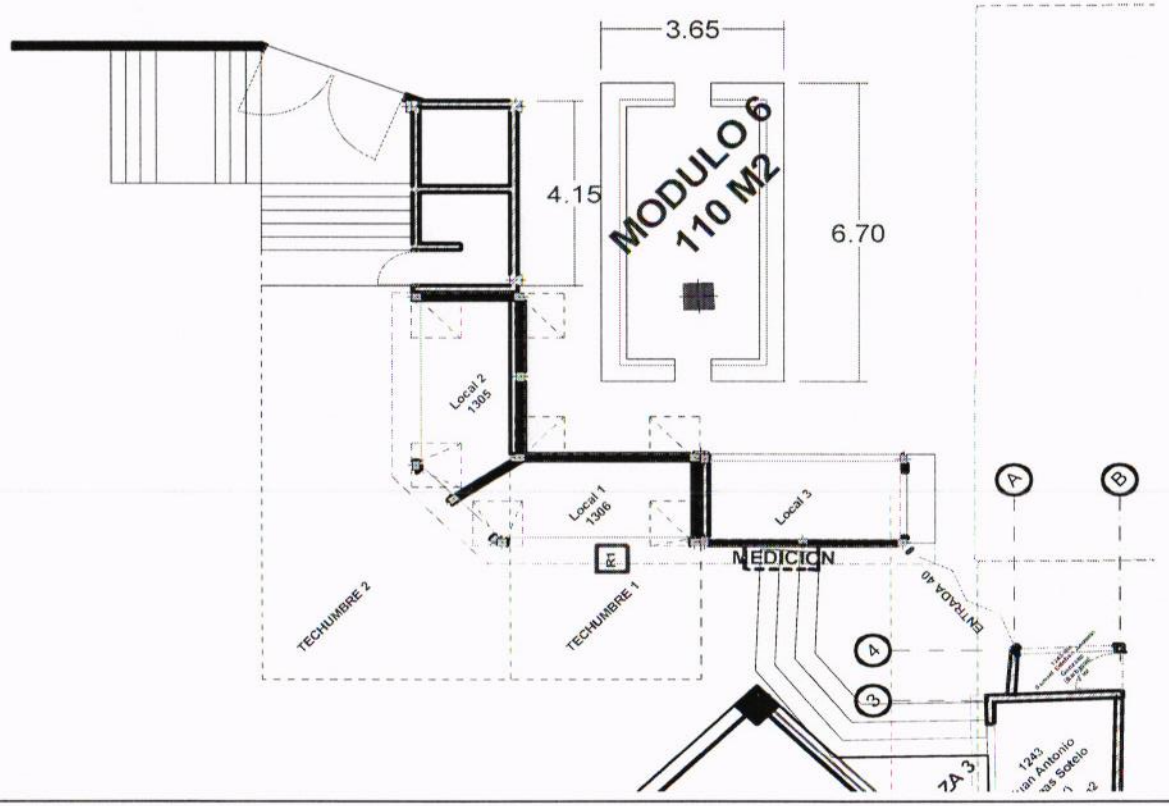

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-03	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.									1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ROTULACION**

ROT-03 ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.

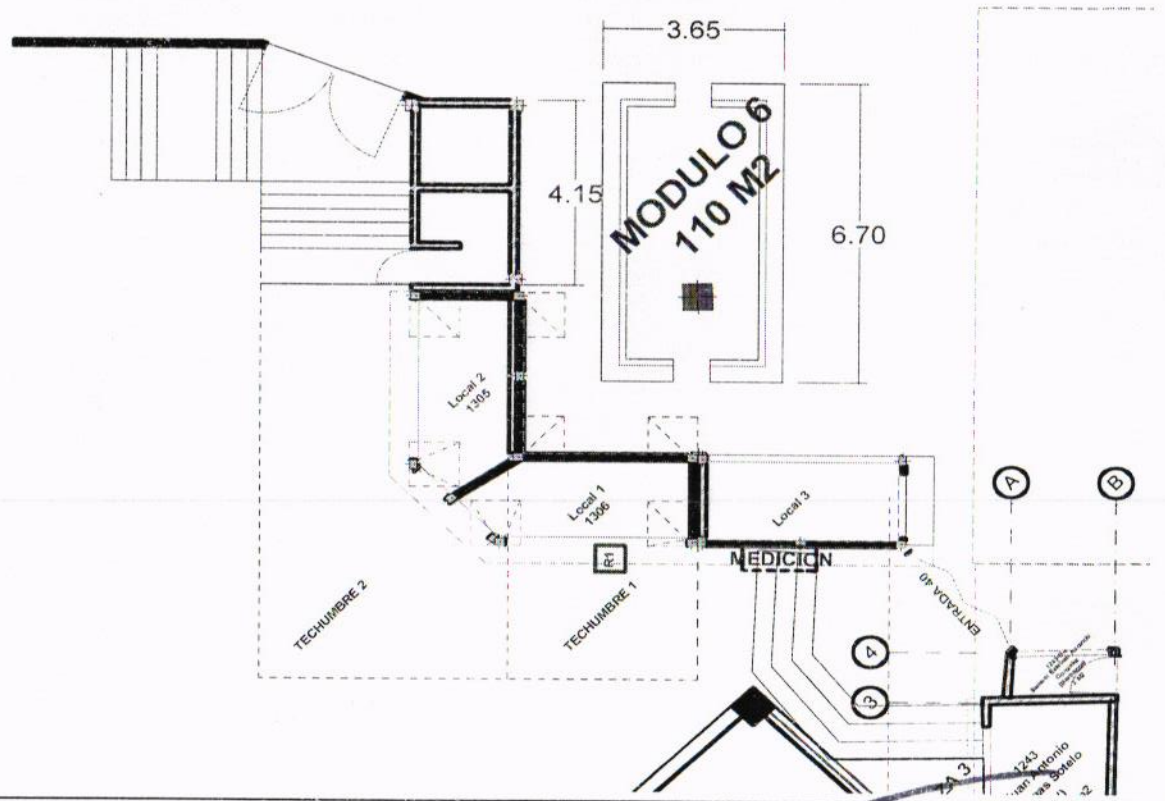

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-04	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.									1.00	
									TOTAL:	PZA 1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ROTULACION**

ROT-04 ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.

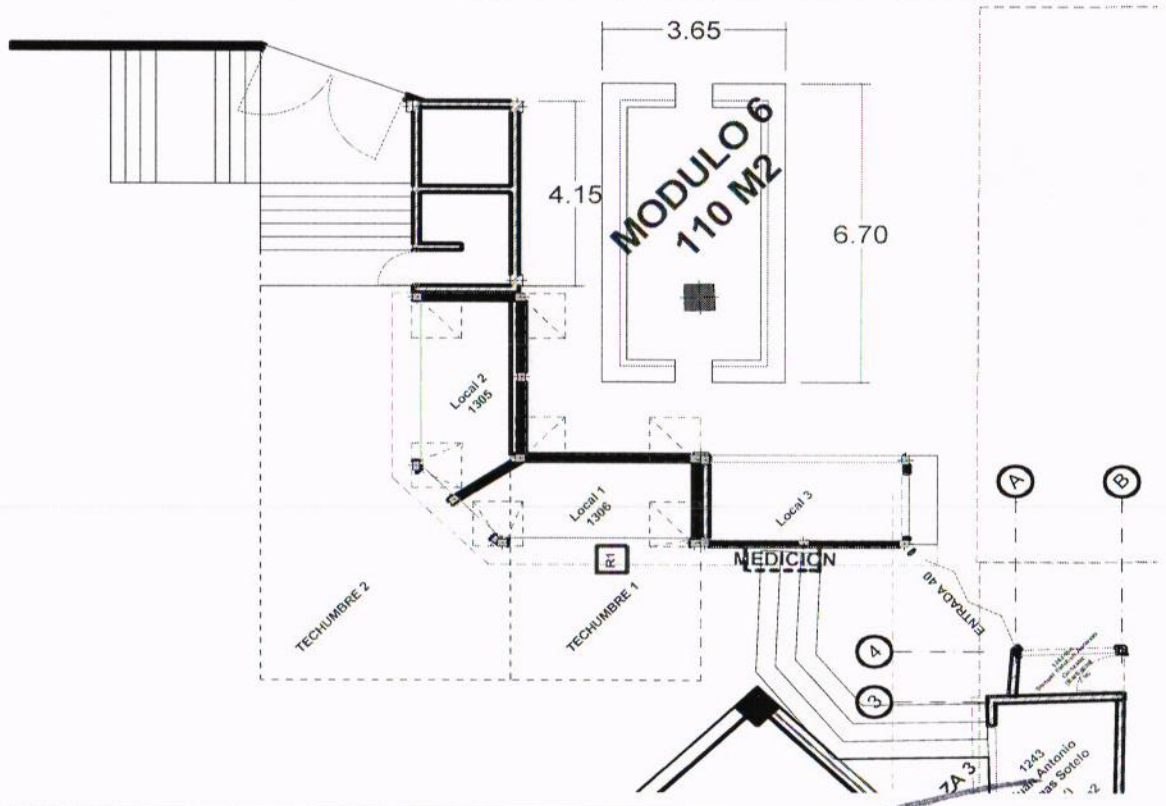

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)									3.00	
								TOTAL:	PZA	3.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ROTULACION**

ROT-05 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)

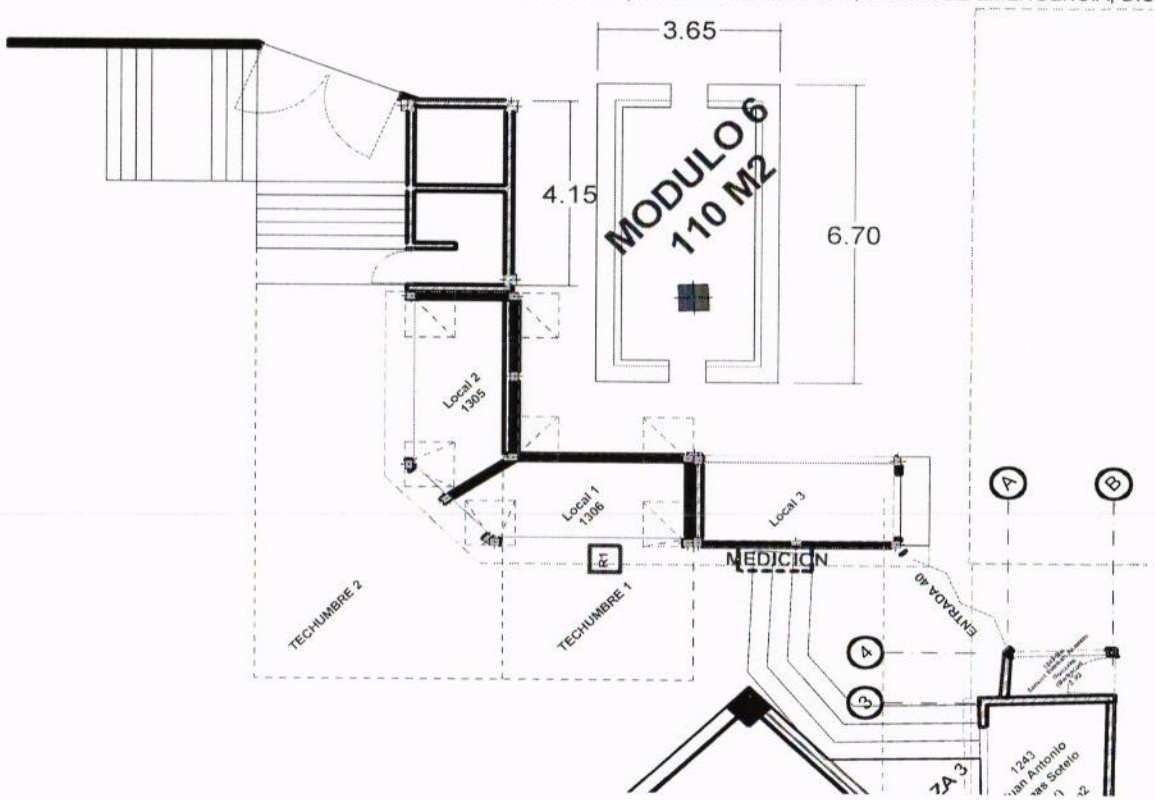

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-06	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.									2.40	
									TOTAL:	M2	2.40

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A06 **ROTULACION**

ROT-06 ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

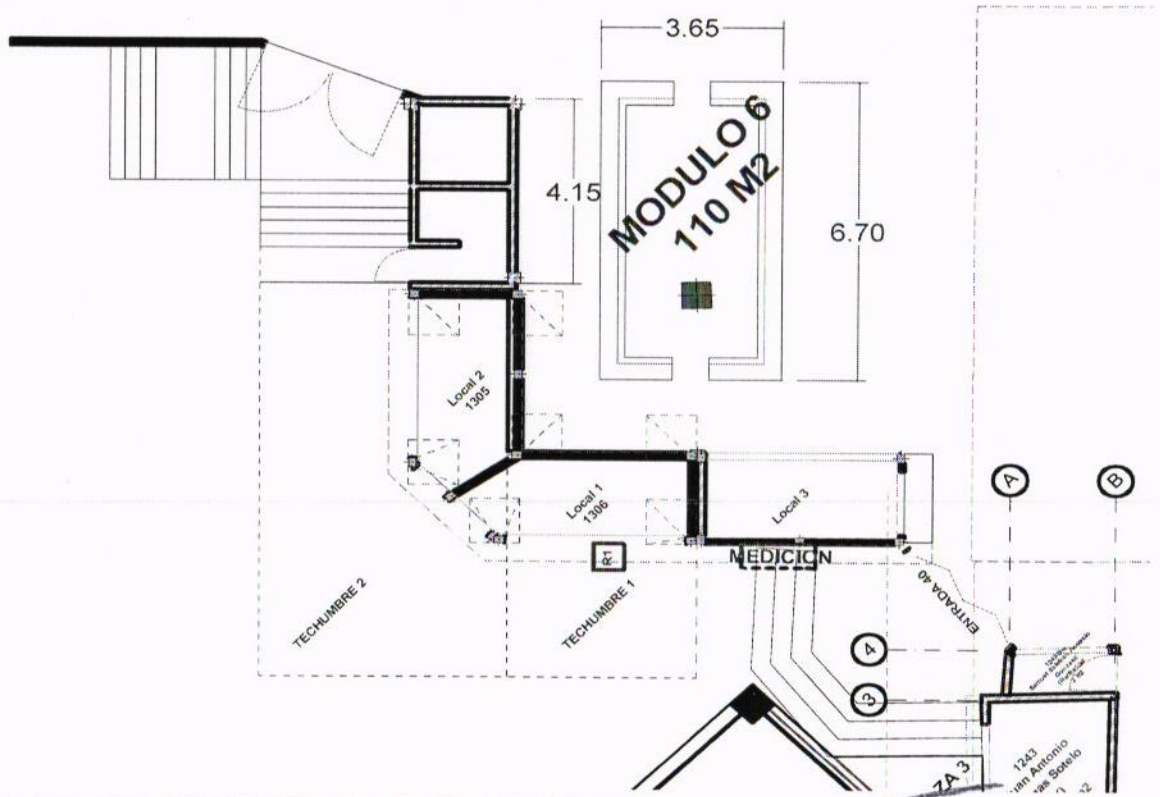

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A06	**ROTULACION**										
ROT-07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)									12.00	
								TOTAL:	PZA	**12.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR


BIENESTAR
SECRETARIA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A06 **ROTULACION**

ROT-07 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)

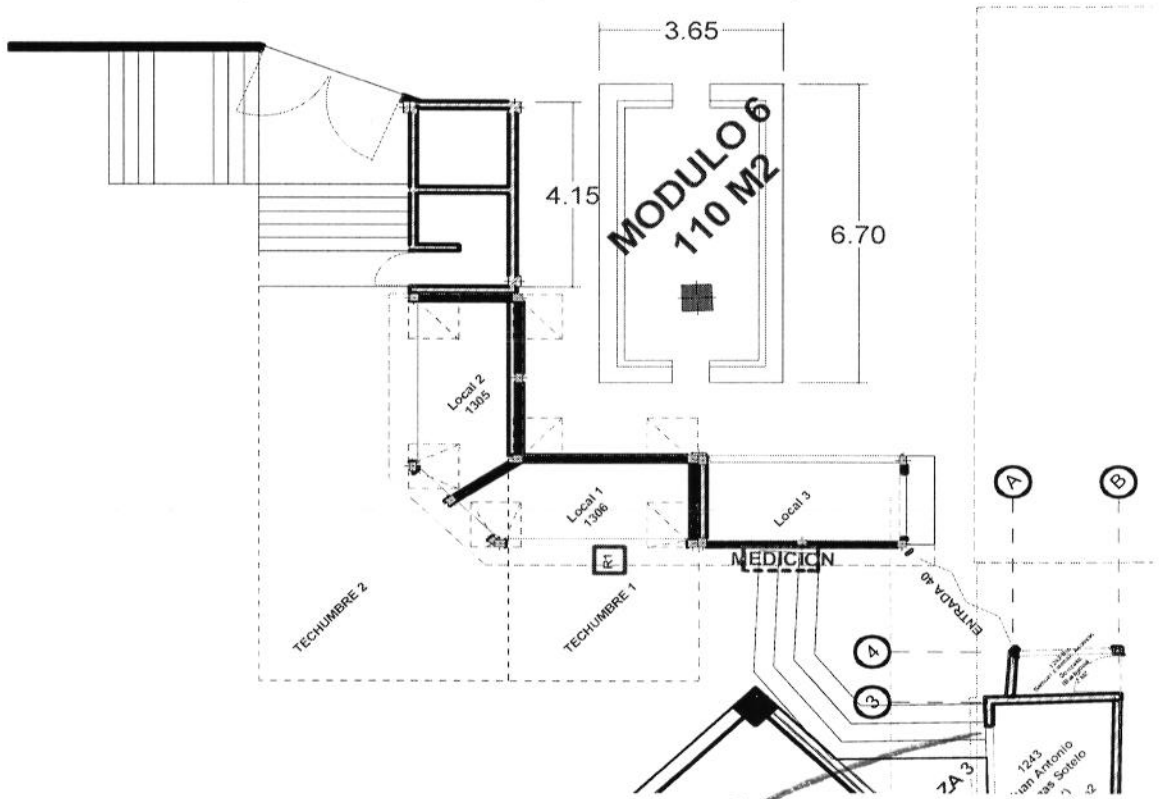

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-001	ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.									1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-001 ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.

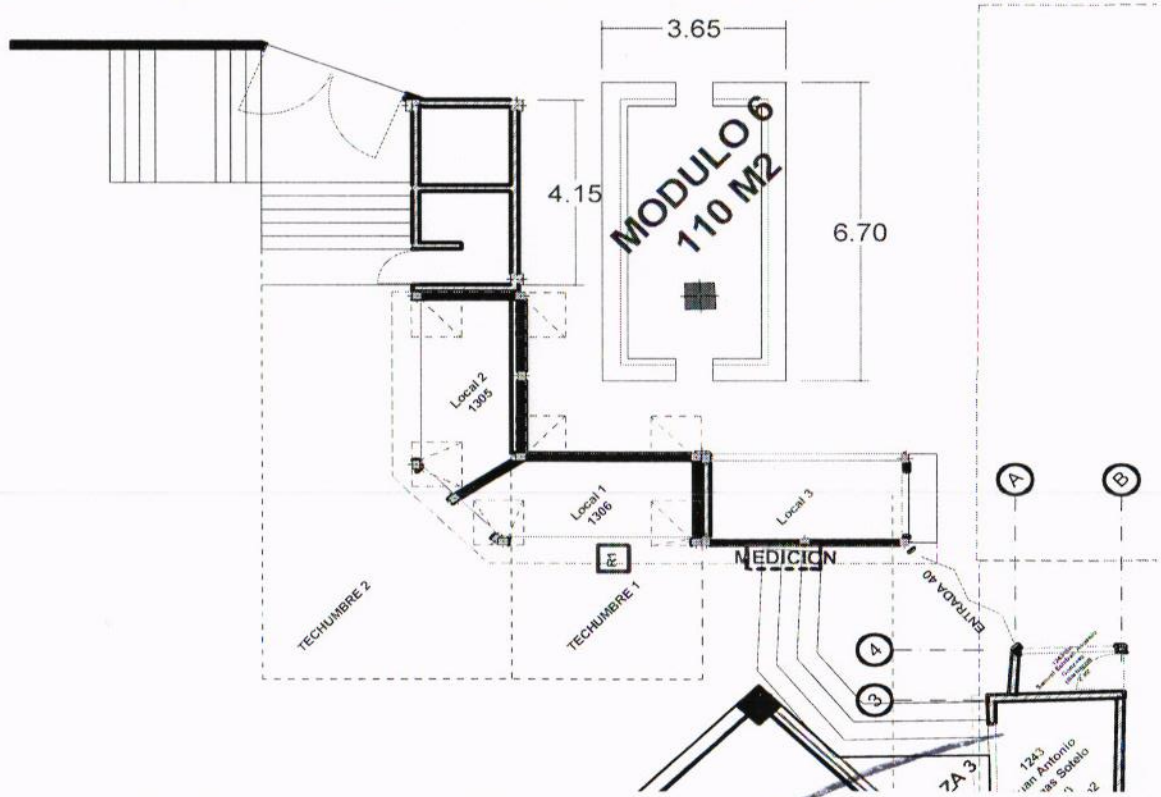

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-002	CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.									5.00	
									TOTAL:	JGO	5.00

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAM NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPU O DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-002 CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.

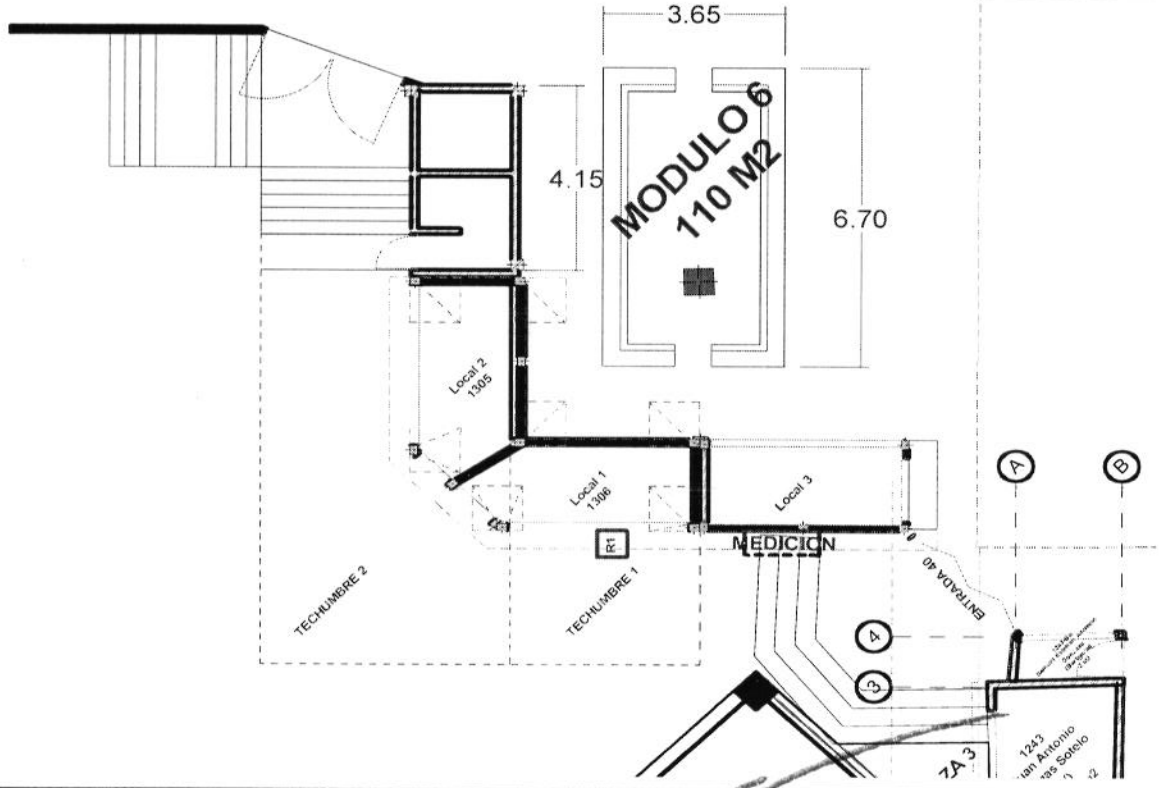

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-003	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	TRASFORMADOR A R1				24.00			1.00	24.00	
		R1 A R2				33.50			1.00	33.50	
		R2 A R3				33.50			1.00	33.50	
		R3 A MEDICION				14.00			1.00	14.00	
								TOTAL:	ML	105.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-003 INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.

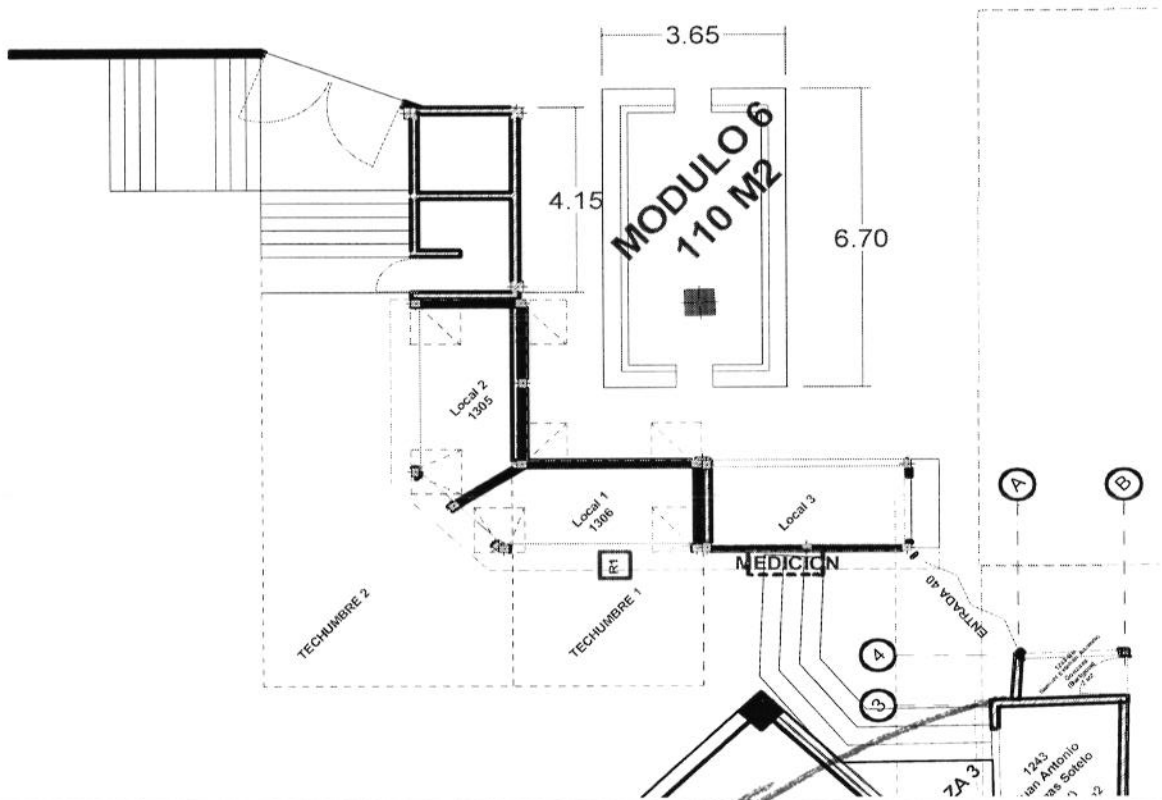

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-004	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.	R1	A	R2			9.50			9.50	
		R2	A	R2			6.00			6.00	
		R3	A	R4			9.50			9.50	
		R4	A	R5			7.00			7.00	
		R5	A	R6			6.00			6.00	
		R4	A	R7			8.50			8.50	
								TOTAL:	ML	**46.50**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAM NTO CONSTITUCIONAL DE ACAPU O DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-004 INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.

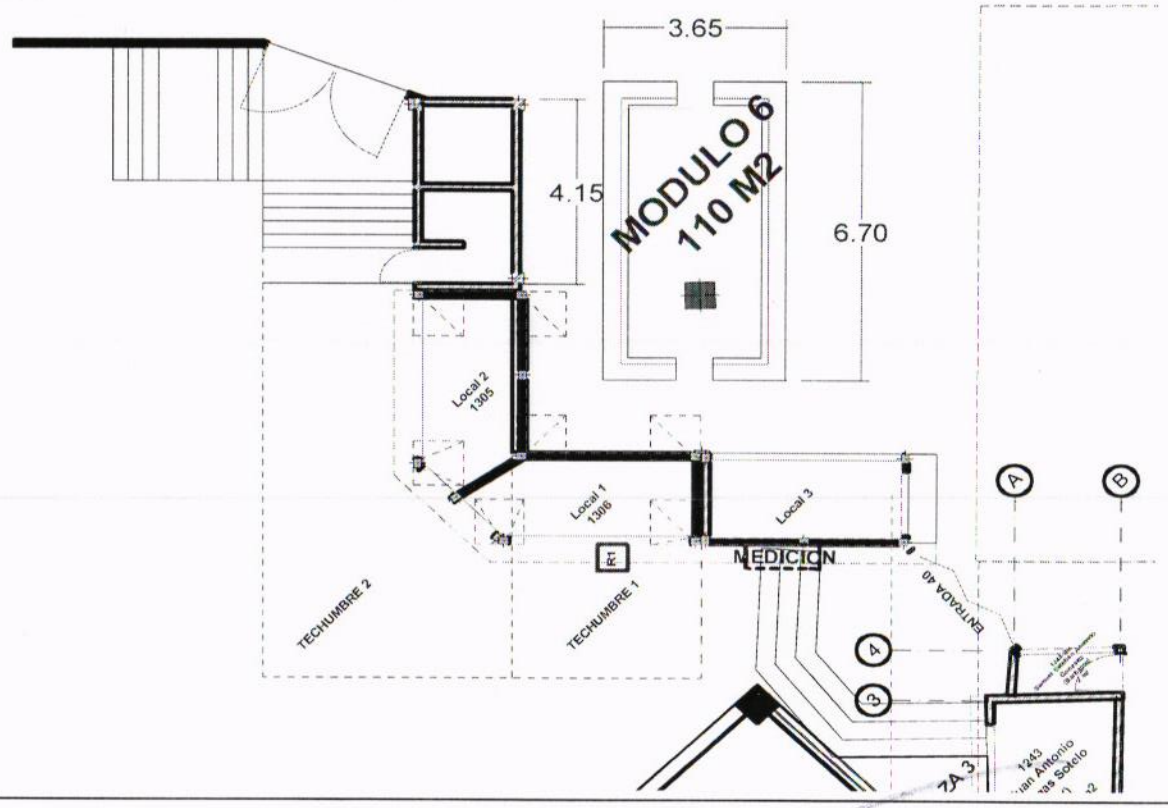

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**								HILOS		
EL-BT-005	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA	TRASFORMADOR A R1				24.00			1.00	24.00	
		R1 A R2				33.50			1.00	33.50	
		R2 A R3				33.50			1.00	33.50	
		R3 A MEDICION				14.00			1.00	14.00	
		ADICIONAL				10.00			1.00	10.00	
								TOTAL:	ML	115.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-005 INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA

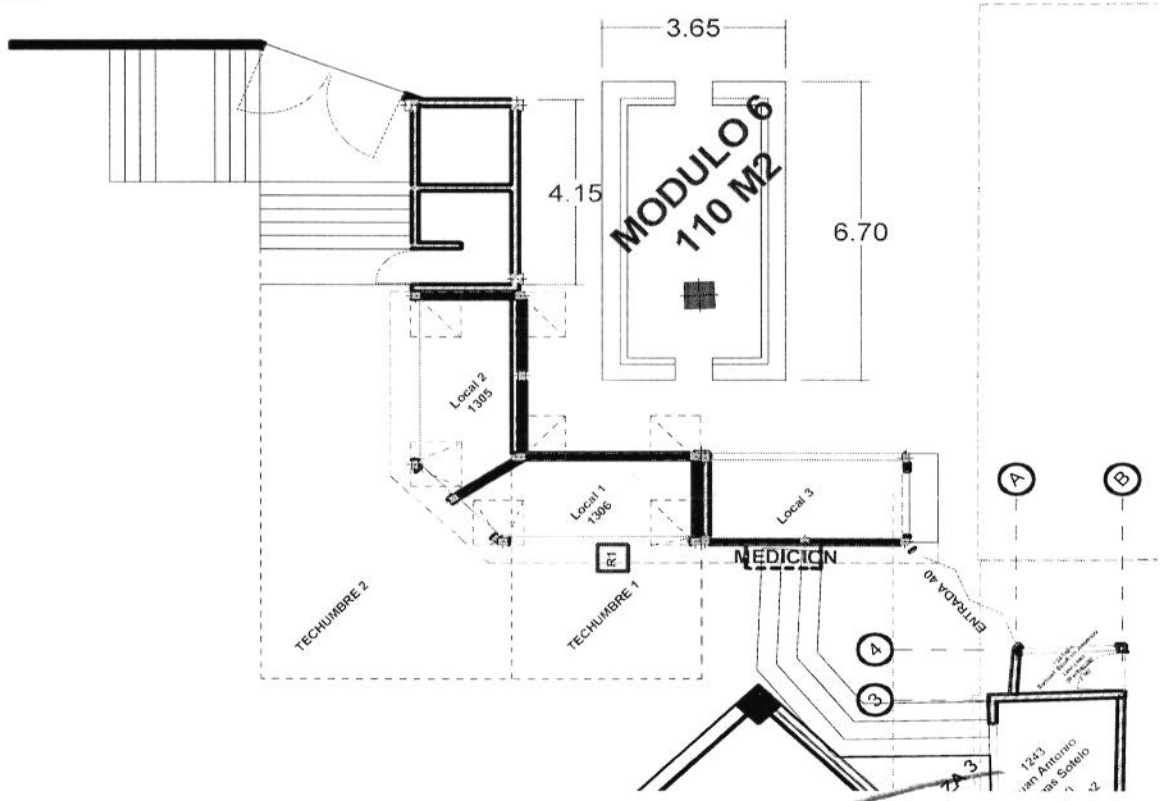

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**								HILOS		
EL-BT-006	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	TRASFORMADOR A R1				24.00			1.00	24.00	
		R1 A R2				33.50			1.00	33.50	
		R2 A R3				33.50			1.00	33.50	
		R3 A MEDICION				14.00			1.00	14.00	
		CENTROS MODULARES				10.00			1.00	10.00	
								TOTAL:	ML	**115.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-006 INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

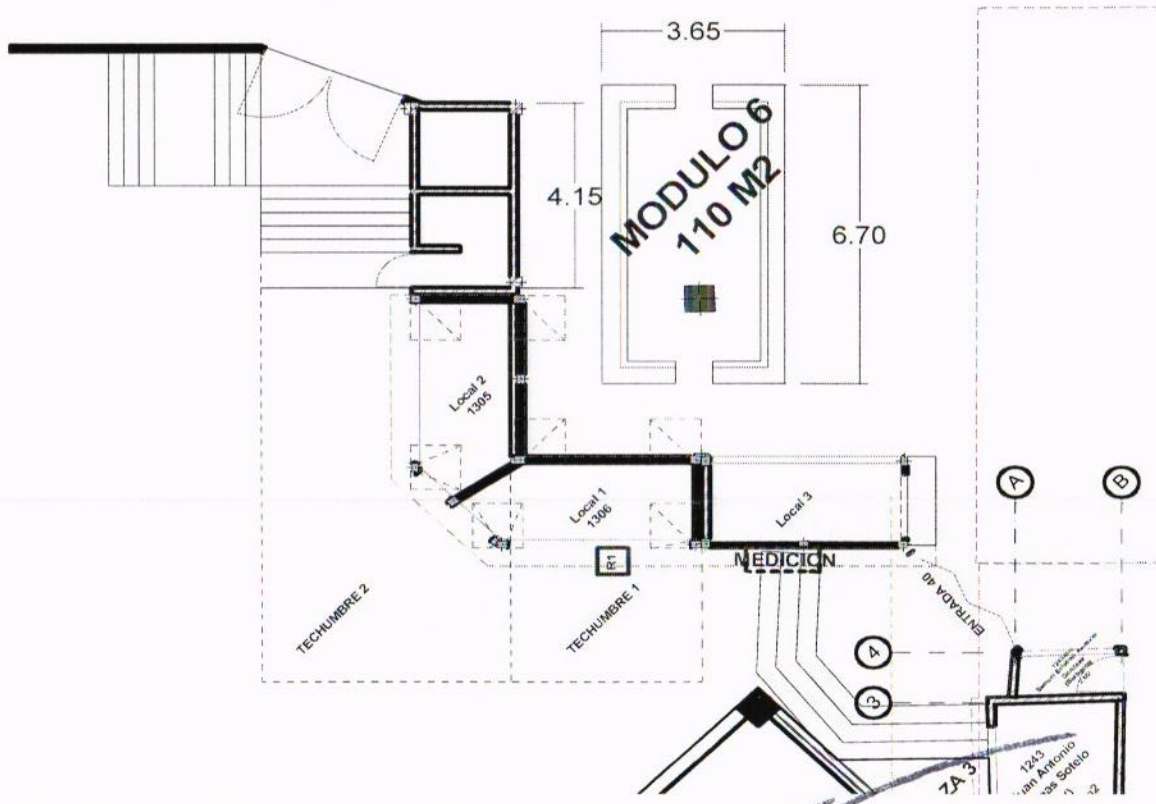

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**						**LONG**	**SERV.**	**HILOS**		
EL-BT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.	R7	A	R4			8.50	26.00	2.00	442.00	
		R4	A	R3			9.50	9.00	2.00	171.00	
		R3	A	R2			6.00	9.00	2.00	108.00	
		R2	A	R1			9.50	2.00	2.00	38.00	
		R4	A	R5			7.00	8.00	2.00	112.00	
		R5	A	R6			6.00	4.00	2.00	48.00	
		MEDICION	A	R7			1.50	26.00	2.00	78.00	
								TOTAL:	ML	**997.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-007 SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.

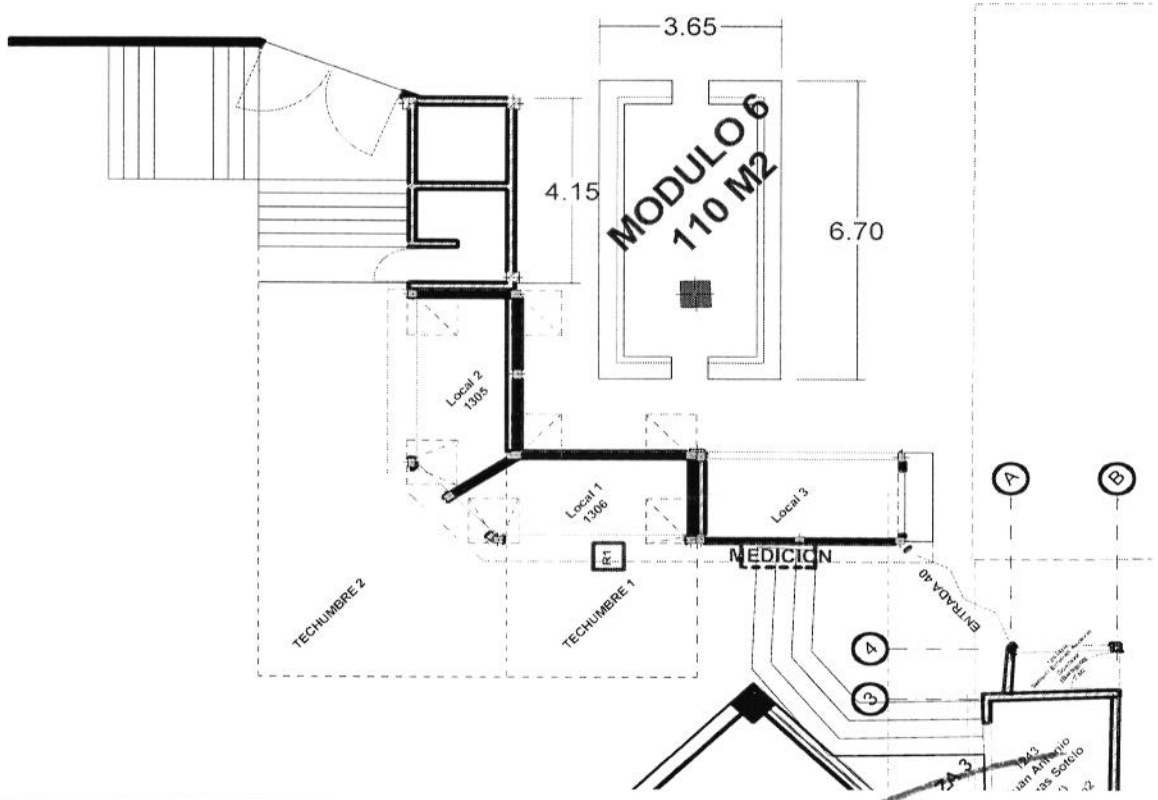

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**						**LONG**	**SERV.**	**HILOS**		
EL-BT-008	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.	R7	A	R4			8.50	1.00	1.00	8.50	
		R4	A	R3			9.50	1.00	1.00	9.50	
		R3	A	R2			6.00	1.00	1.00	6.00	
		R2	A	R1			9.50	1.00	1.00	9.50	
		R4	A	R5			7.00	1.00	1.00	7.00	
		R5	A	R6			6.00	1.00	1.00	6.00	
		MEDICION	A	R7			1.50	1.00	1.00	1.50	
								TOTAL:	ML	48.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-008 INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.

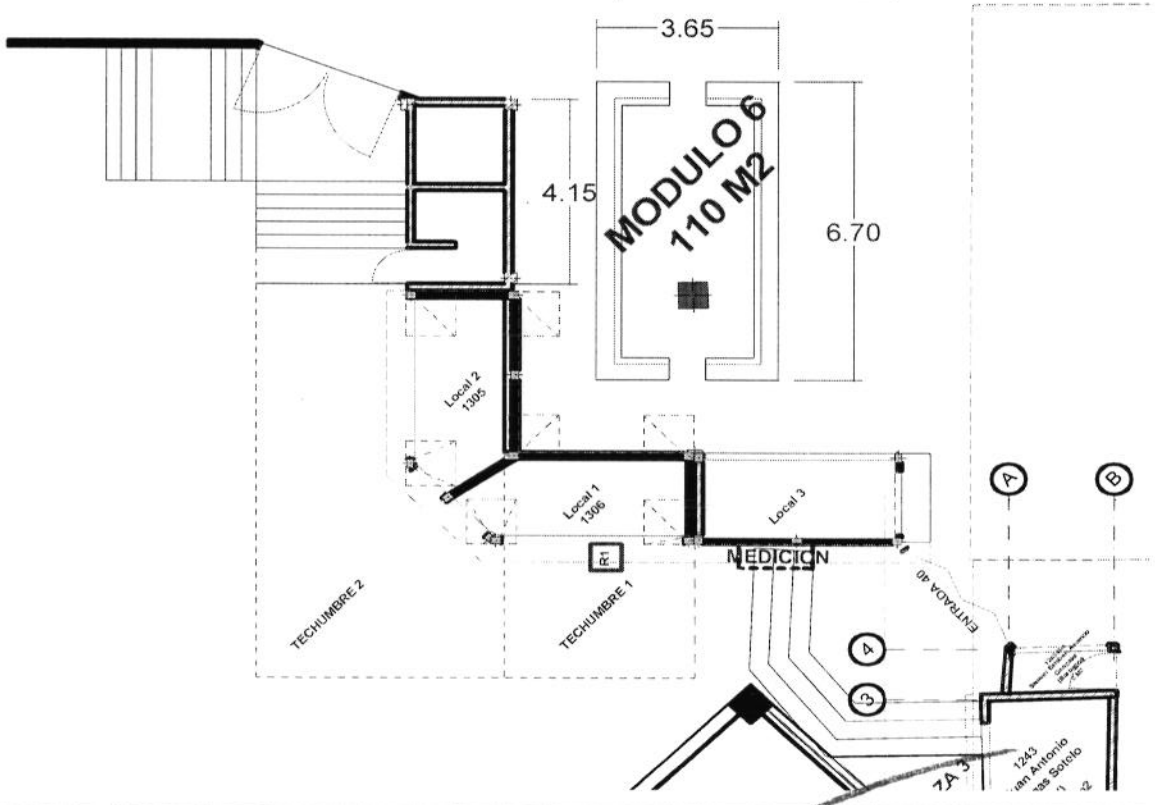

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-009	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.									498.50	
								TOTAL:	ML	498.50	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-009 ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.

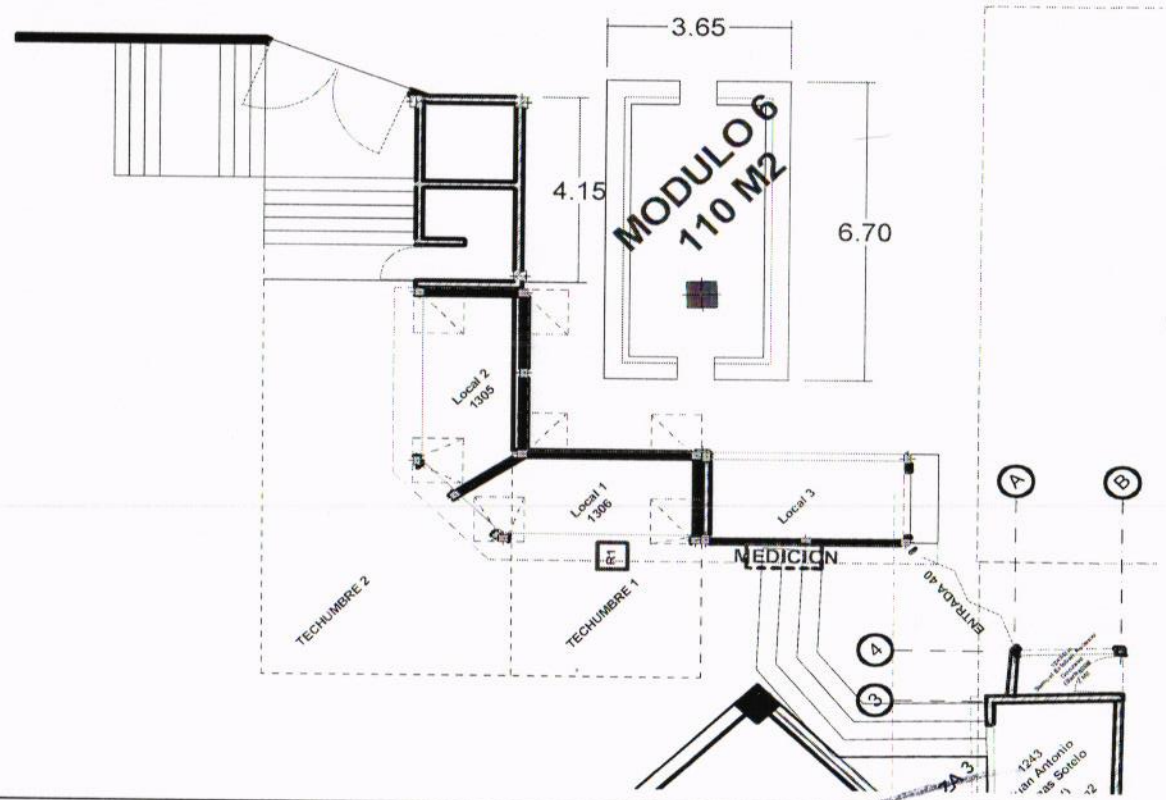

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTA .ENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPUL DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN									1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-010 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN

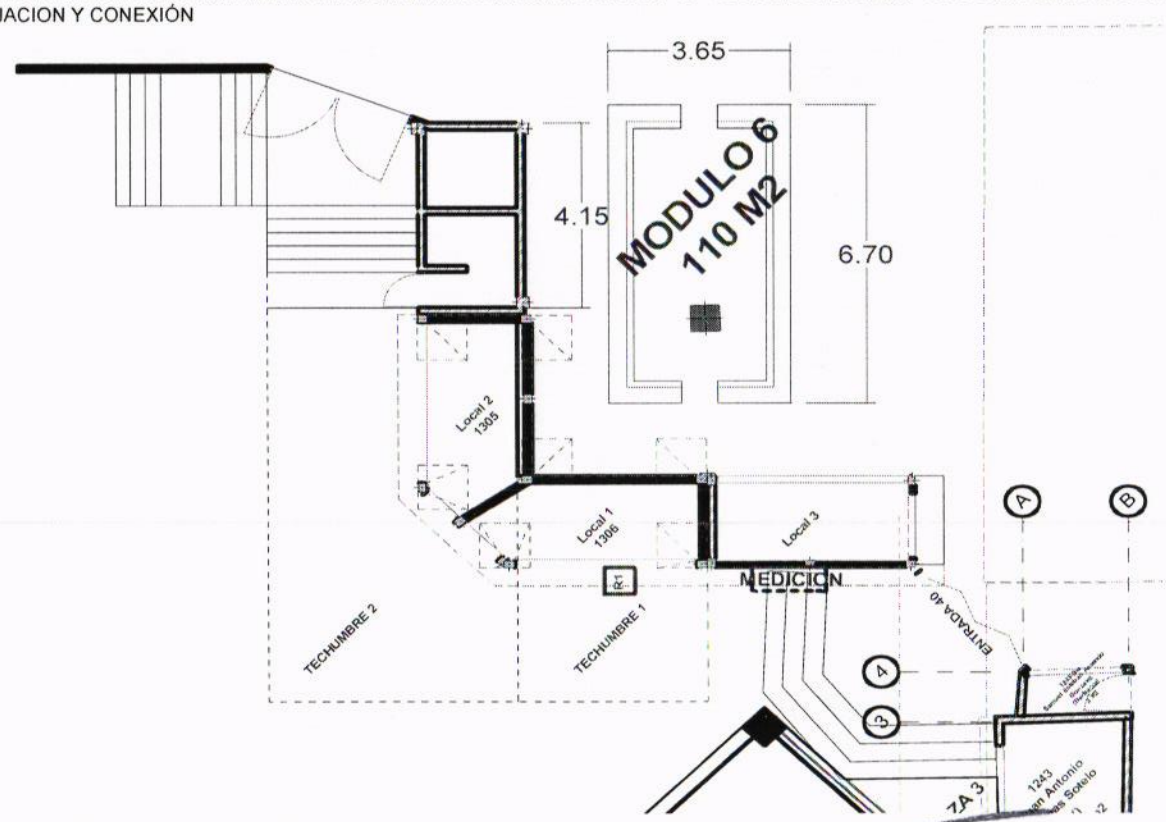

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-011	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO									6.00	
								TOTAL:	PZA	**6.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-011 CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO

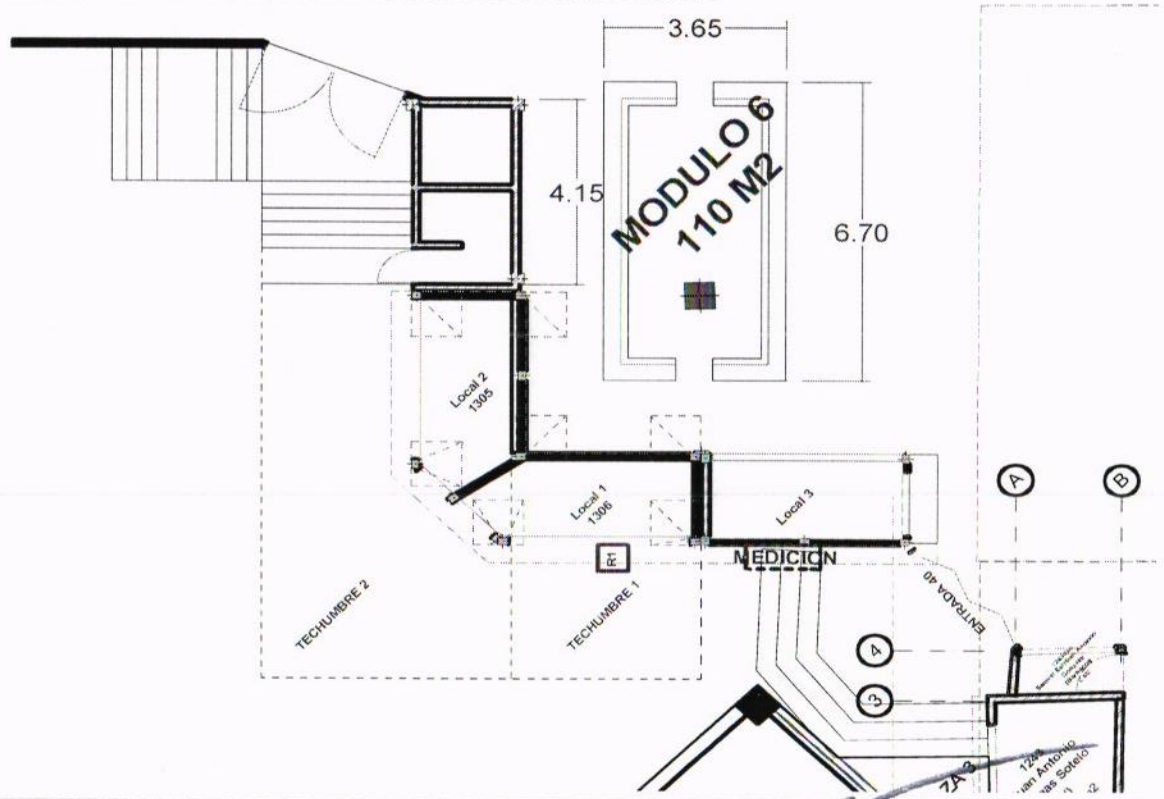

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-005	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE	R1, R2, R3 Y R4							4.00	4.00	
								TOTAL:	PZA	**4.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-012 INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE

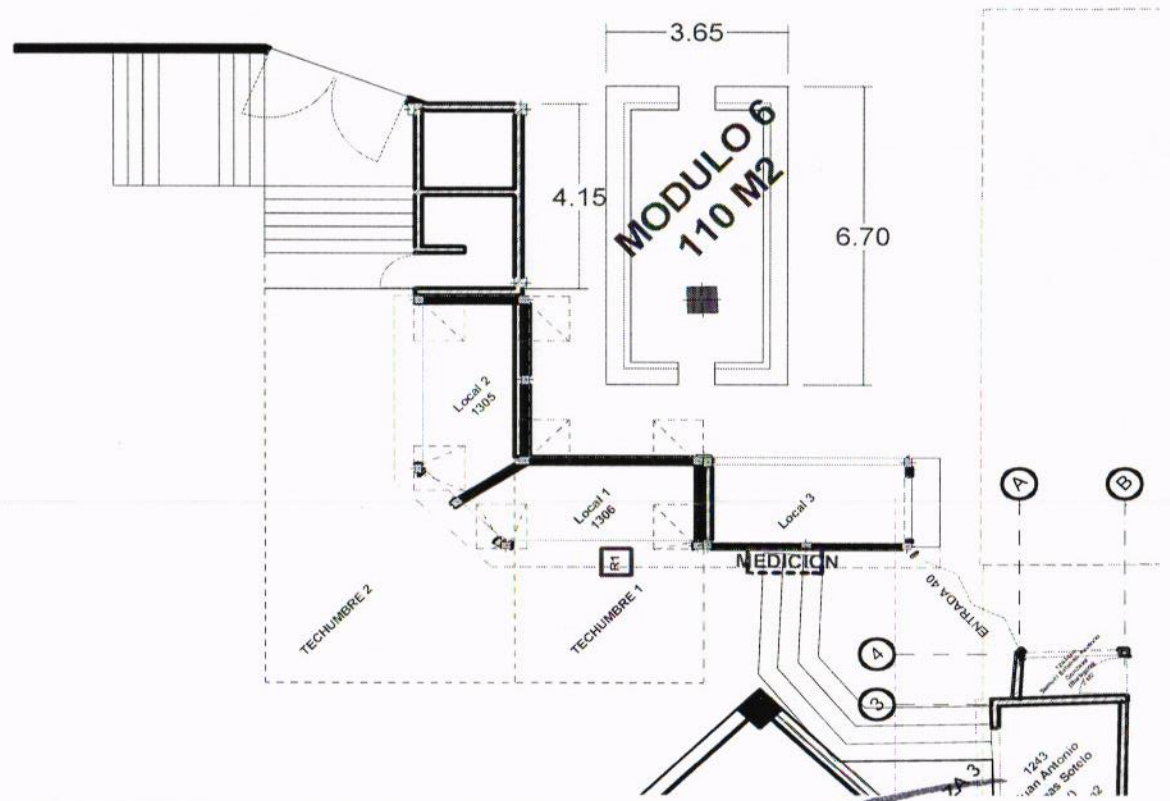

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	REGISTROS							6.00	6.00	
								TOTAL:	PZA	6.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07	**BAJA TENSION**	
EL-BT-013	REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	

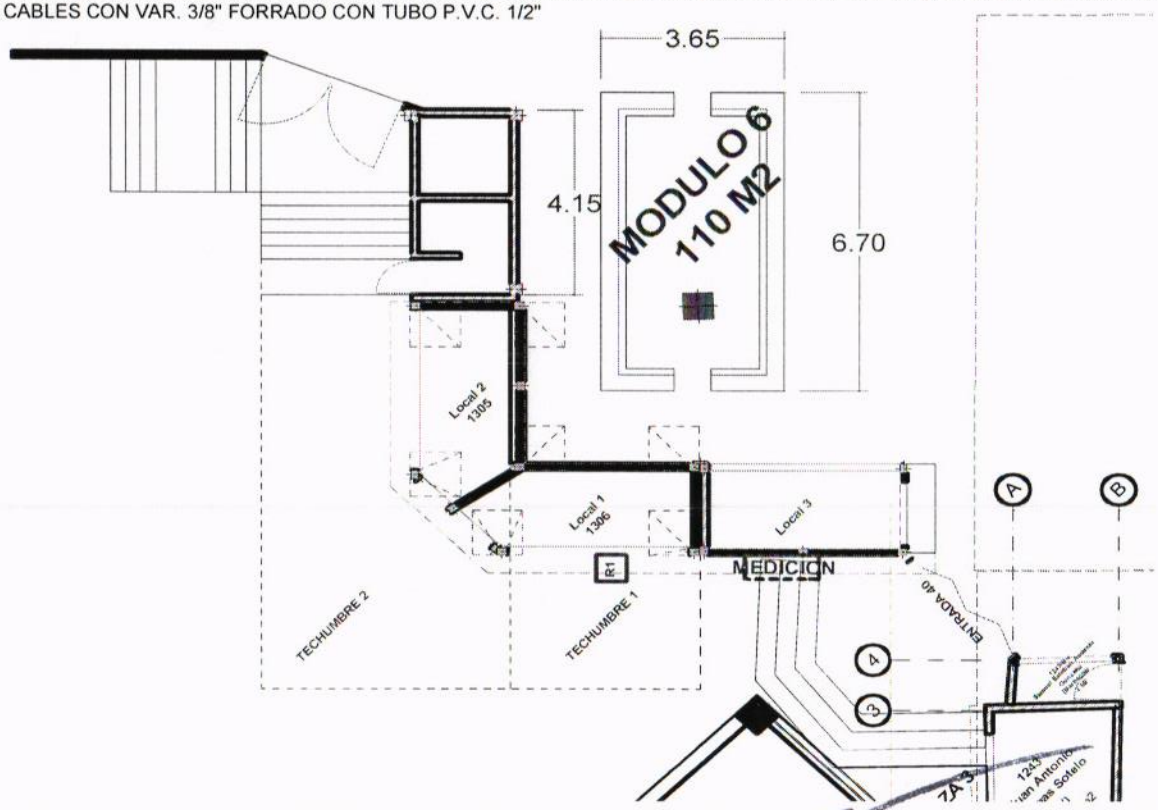

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	REGISTROS							1.00	1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A07	**BAJA TENSION**	
EL-BT-014	REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F´C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"	

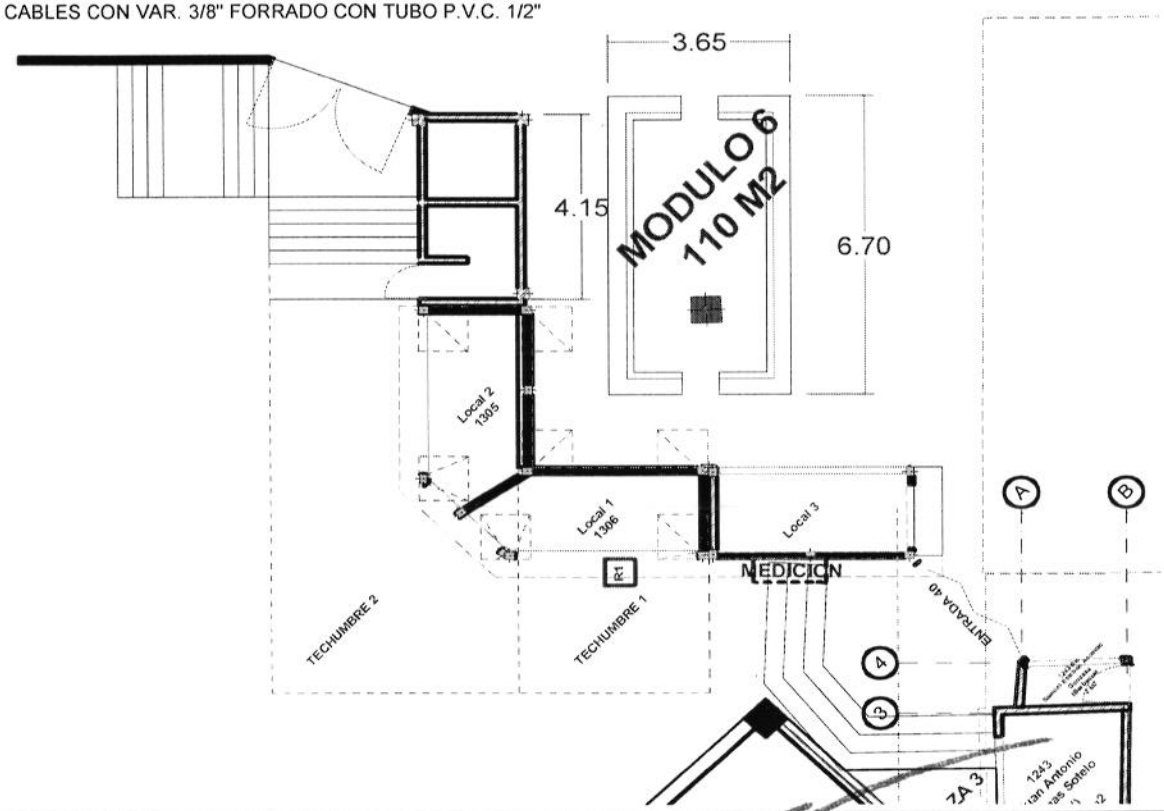

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-015	INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.	REGISTROS DE CFE							4.00	4.00	
		REGISTROS DE MEDIDORES MODULARES							1.00	1.00	
		REGISTROS DE ALIMENTACIONES							6.00	6.00	
								TOTAL:	PZA	11.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-015 INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.

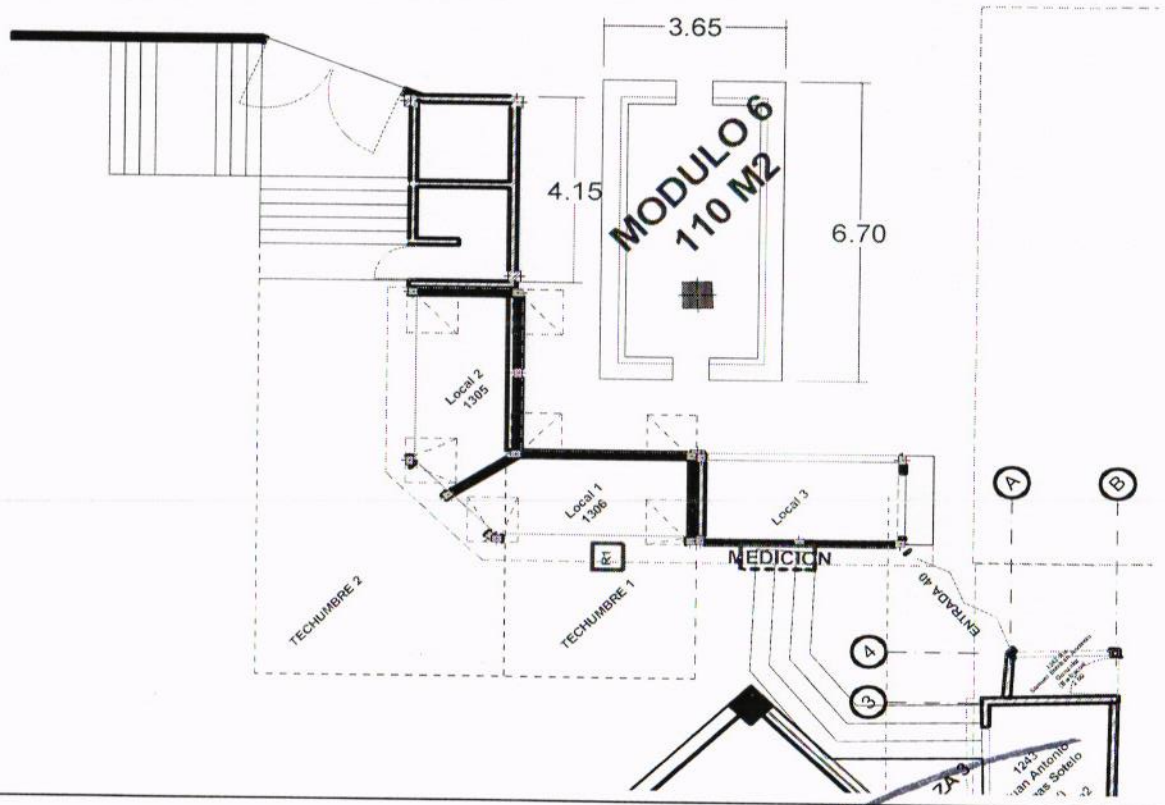

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**BAJA TENSION**										
EL-BT-016	DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.								1.00	1.00	
								TOTAL:	PZA	1.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A07 **BAJA TENSION**

EL-BT-016 DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN PARA UNA CARGA DE 25 KW.

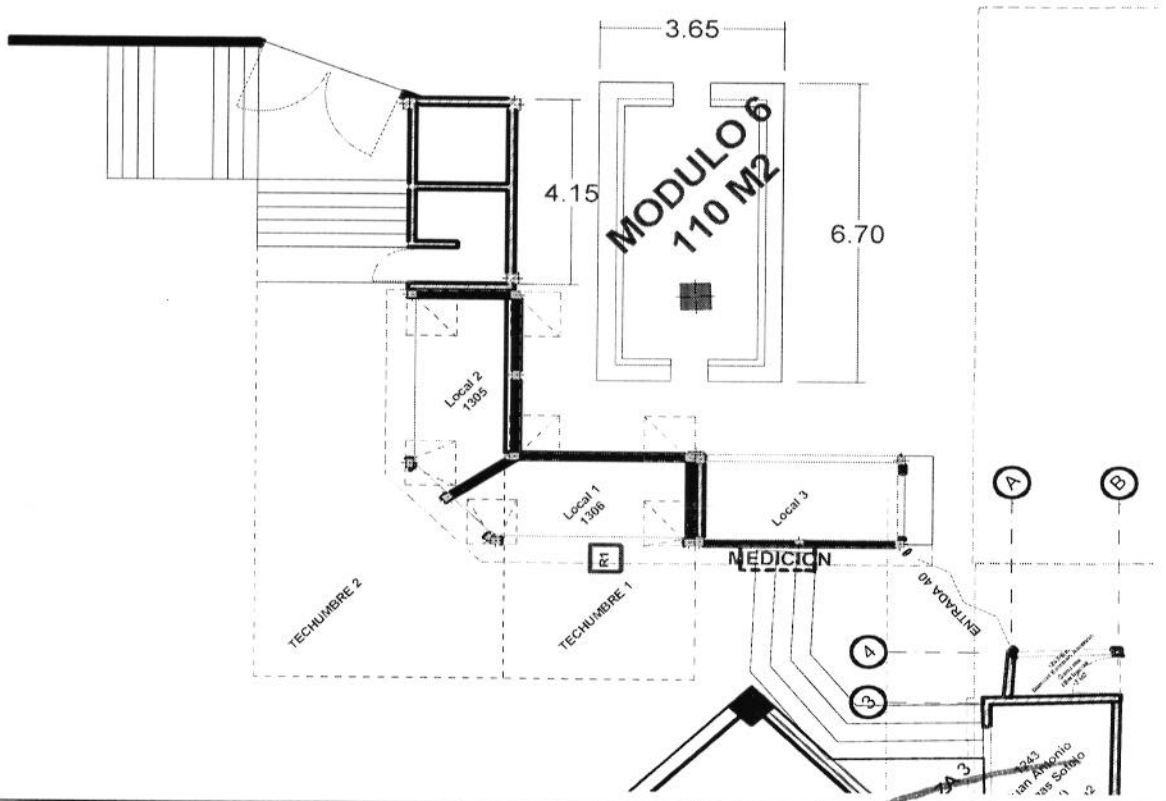

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**DRENAJES**										
SUM-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.	R1	A	R2			7.12			7.12	
		R2	A	R3			9.20			9.20	
		R3	A	R4			11.70			11.70	
		R3	A	R5			9.70			9.70	
		R5	A	GENERAL			4.00			4.00	
								TOTAL:	ML	**41.72**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **DRENAJES**

SUM-04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.

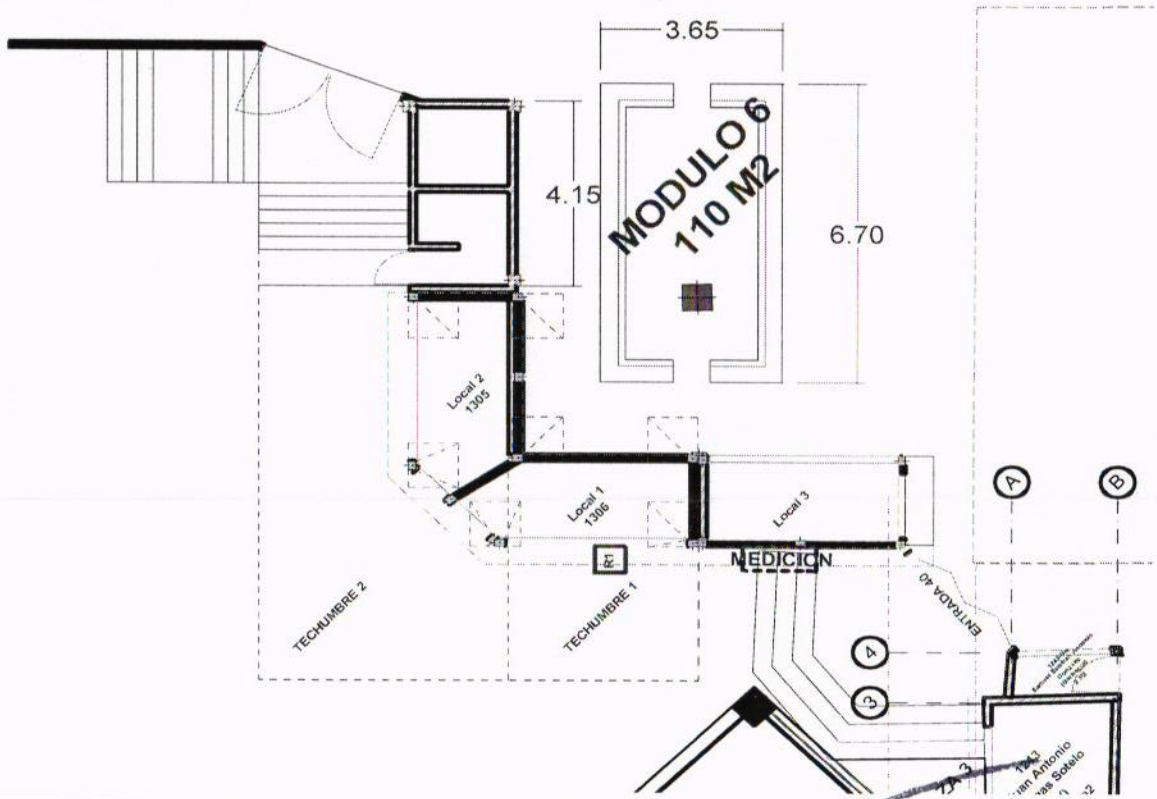

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**DRENAJES**										
37-0580	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.	MODULO	3							11.00	
		MODULO	4							14.00	
		MODULO	5							12.00	
								TOTAL:	ML	**37.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A08 **DRENAJES**

37-0580 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.

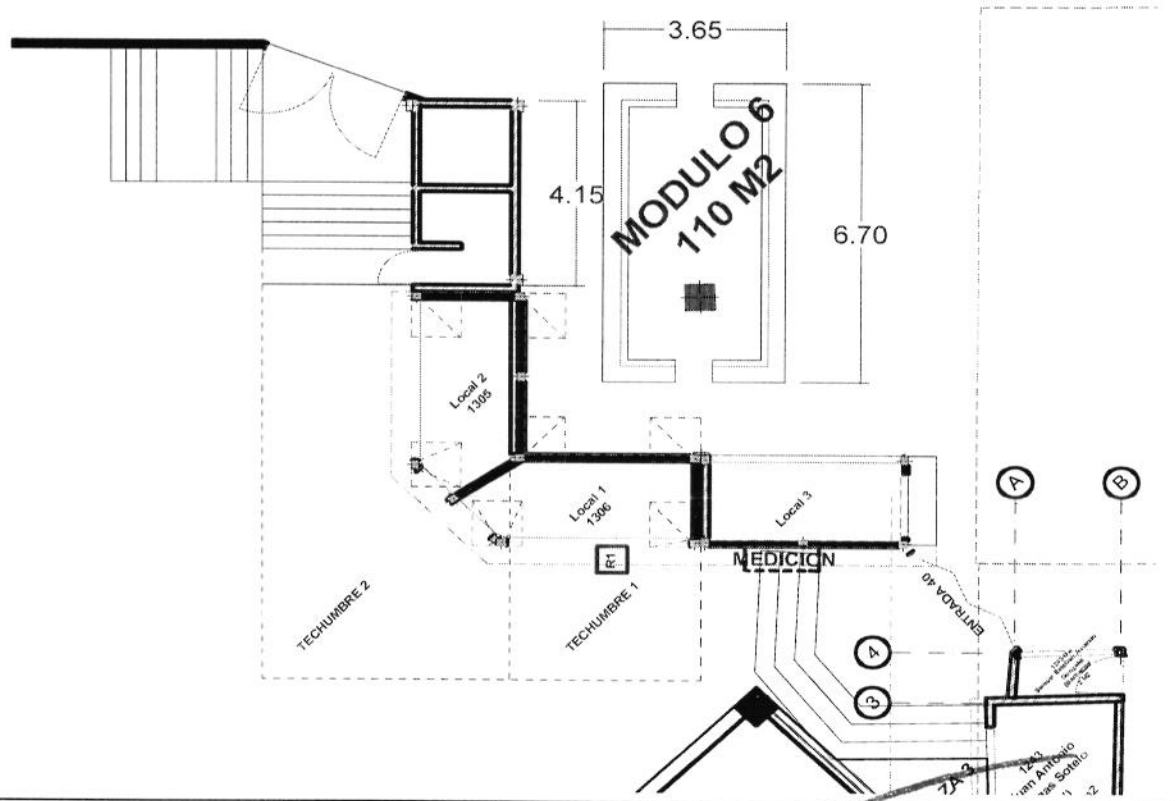

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**DRENAJES**										
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.									5.00	
								TOTAL:	PZA	**5.00**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A08	**DRENAJES**
REG-PLUV	REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, ACABADO EN MEDIA CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.

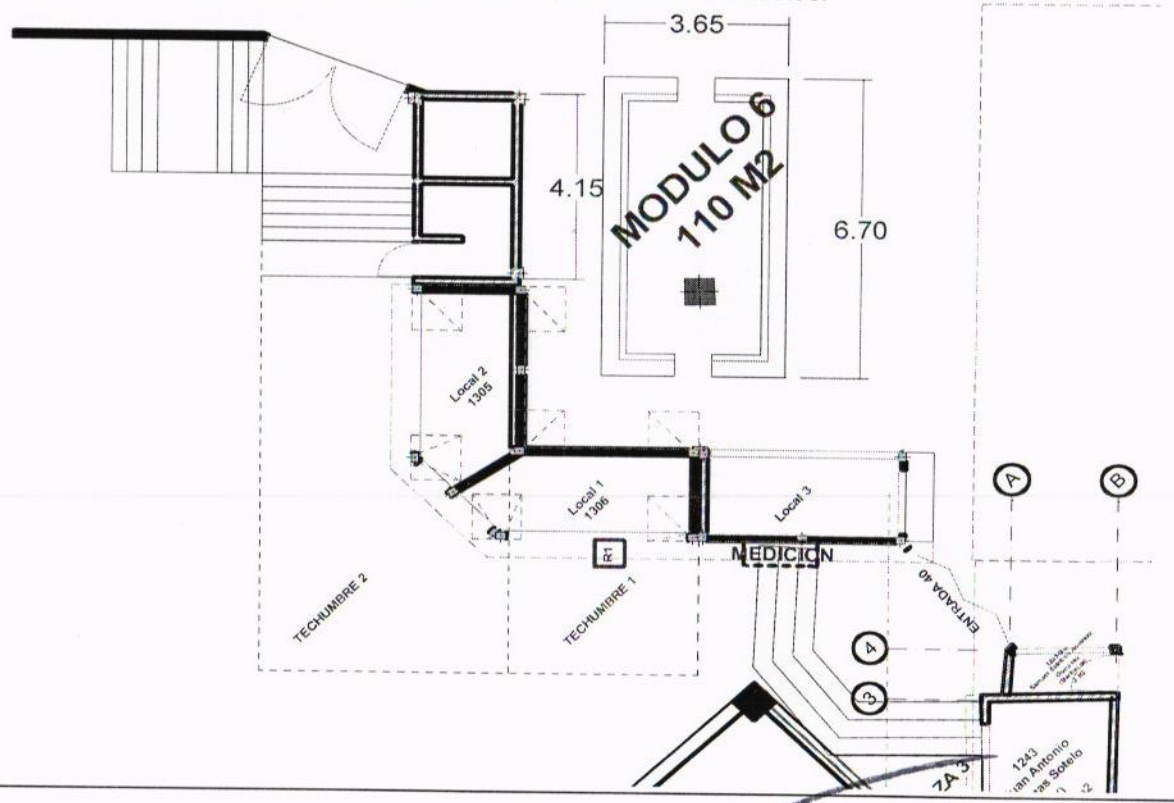

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**DRENAJES**										
37-0579	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.									1.00	
									TOTAL:	PZA	1.00

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A08 **DRENAJES**

37-0579 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

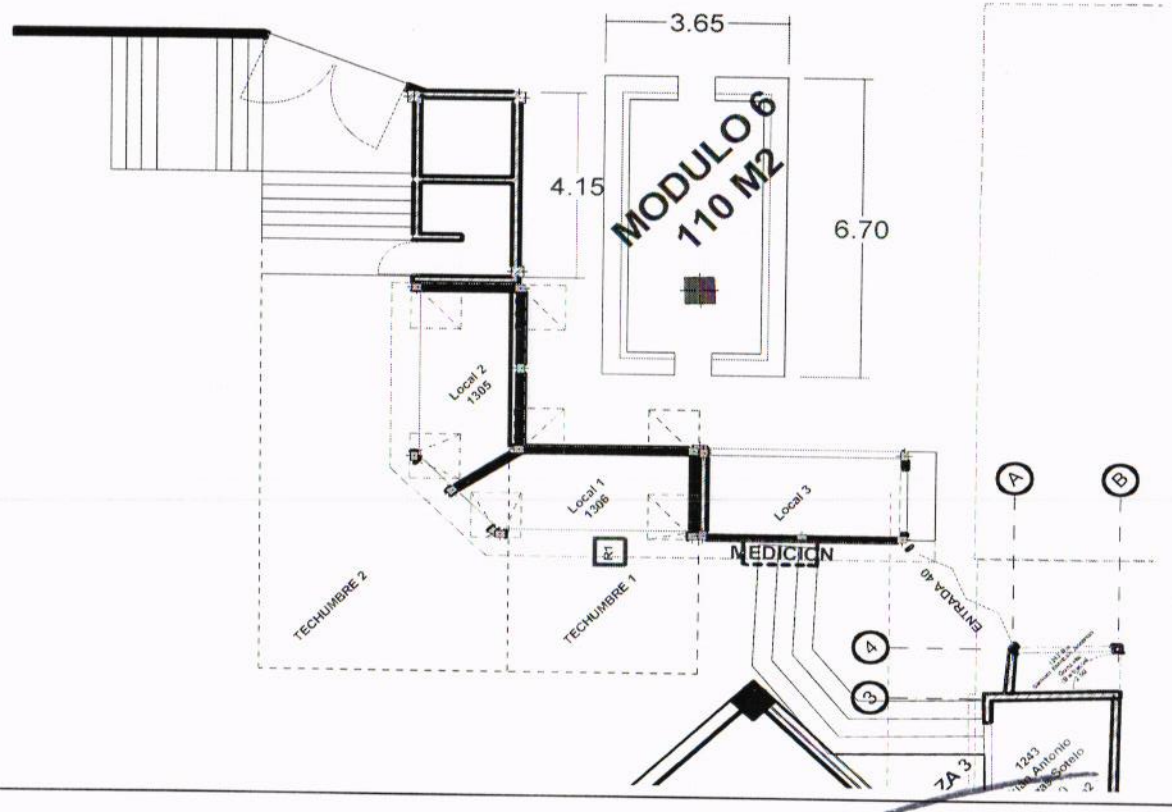

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
REMESC-02	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	GENERADOR DE PREPARACION DE SUPERFICIE								1,086.00	
								TOTAL:	M2	1,086.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

REMESC-02 LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.

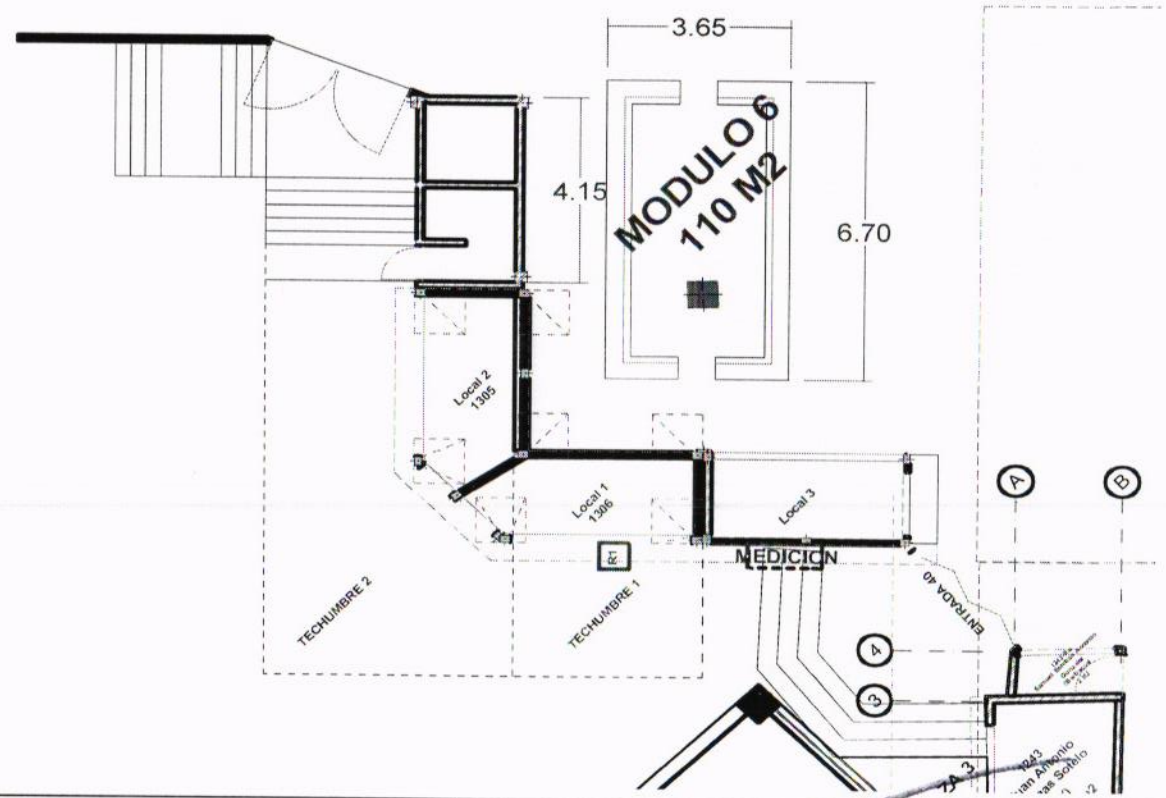

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					**M3**		**ABUND.**			
33-0496	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II	REMOCION DE ESCOMBROS				11.08		1.30		14.40	
		DEMOLICION DE MUROS				11.14		1.40		15.60	
		VOL. EXCAVACION-RELLENO EXC.				12.43		1.30		16.16	
								SUBTOTAL DEMOL		**46.16**	
				LARGO	**ANCHO**	**ALTO**	**PZAS**	**DESP.**			
		ZAPATA		1.00	1.00	0.15	7.00	1.05		1.10	
		CONTRATRABE		34.82	0.15	0.40	1.00	1.05		2.19	
		CASTILLO .15 X .20		0.15	0.20	32.40	1.00	1.05		1.02	
		CADENA		0.15	0.15	20.20	1.00	1.05		0.48	
		TRABE		0.15	0.30	34.82	1.00	1.05		1.65	
		LOSA		35.00		0.10	1.00	1.05		3.68	
						M2	**ESP**	**ABUND.**			
		ENTORTADO				35.00	0.06	1.05		2.21	
		MURO				36.00	0.15	1.05		5.67	
		APLANADO				161.98	0.02	1.05		3.40	
		PISO				267.81	0.10	1.05		28.12	
								SUBTOTAL MATE		**49.52**	
								TOTAL:	**M3**	**95.68**	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO** **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0496 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II

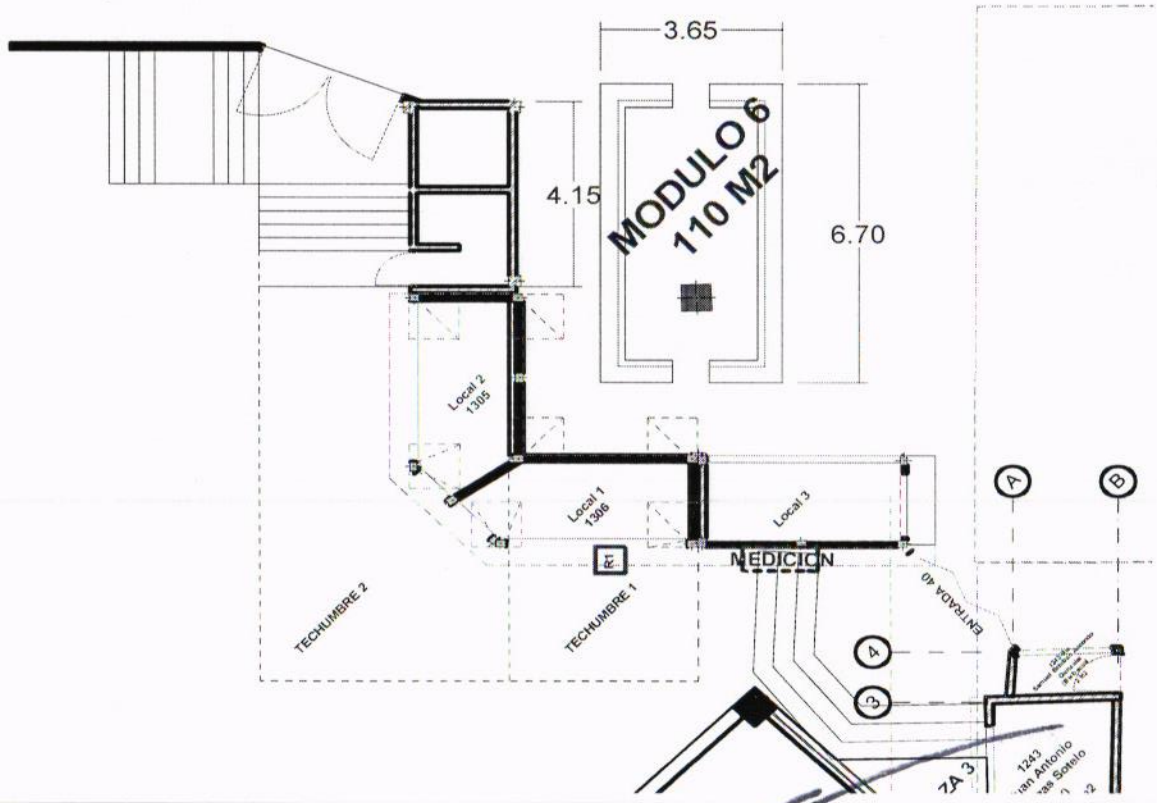

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0497	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.	GENERADOR DE ACARREO DE MAT.				95.68	No. Est.	3.00		287.04	
								TOTAL:	M3	287.04	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023


Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0497 ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.

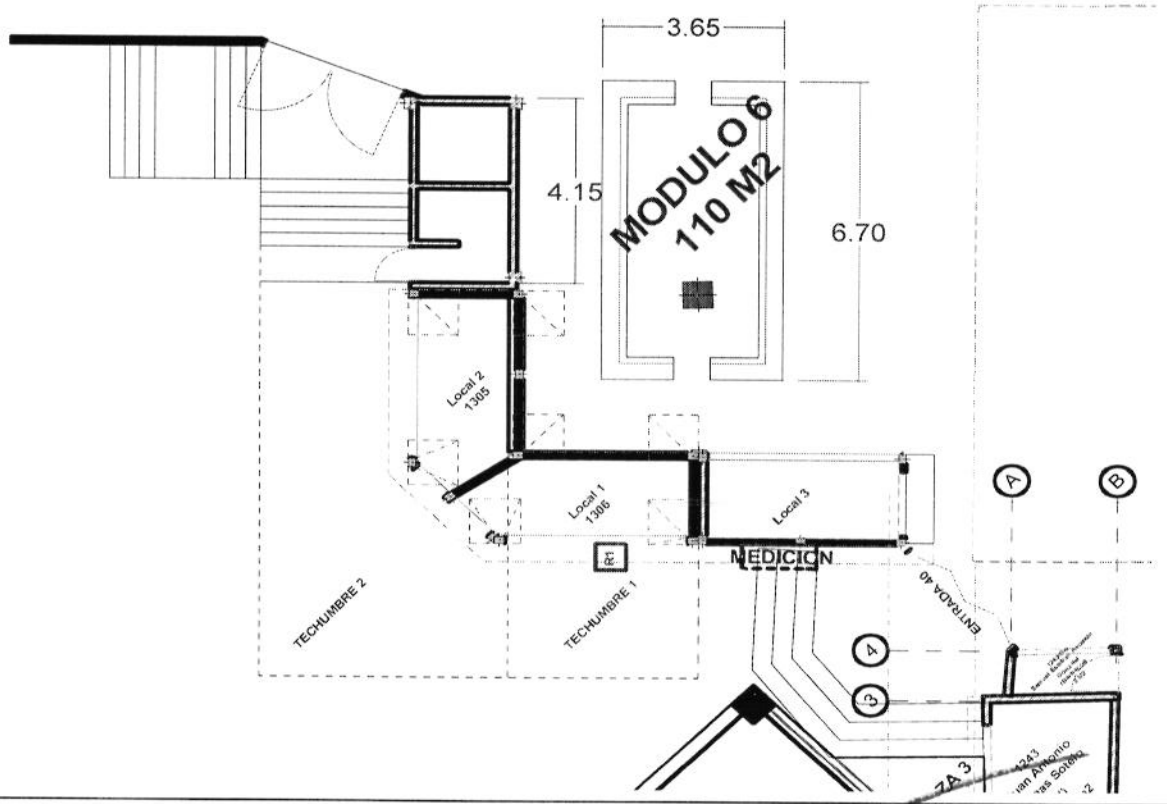

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					**M3**		**ABUND.**			
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)	REMOCION DE ESCOMBROS				11.08		1.30		14.40	
		DEMOLICION DE MUROS				11.14		1.40		15.60	
		VOL. EXCAVACION - RELLENO				12.43		1.30		16.16	
								TOTAL	M3	46.16	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)

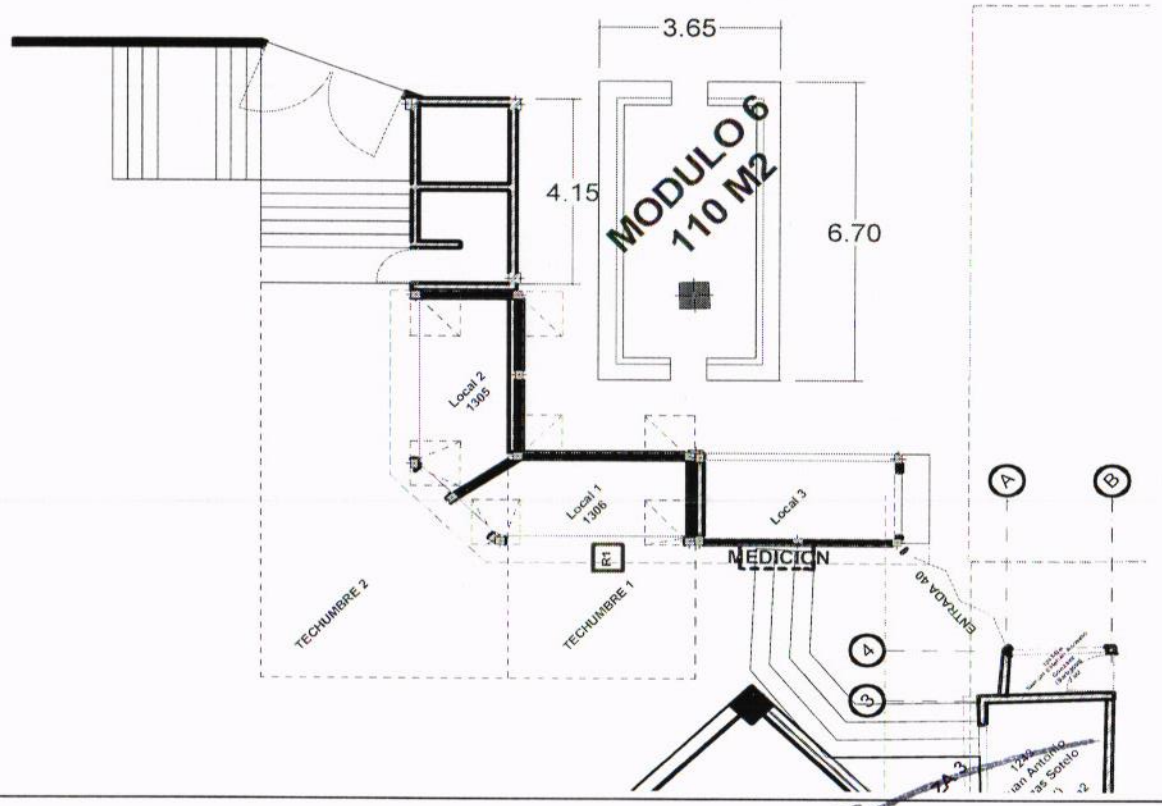

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
65	LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS, PISOS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.	PARAGUAS				13.00	13.00		6.00	1,014.00	
								TOTAL	M2	1,014.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE **ACAPULCO DE JUAREZ** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	**OBRA:** REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO **MUNICIPIO:** ACAPULCO DE JUAREZ **LOCALIDAD:** COL. COMERCIAL ACAPULCO

A09 ACARREOS Y LIMPIEZA

REMESC-02 LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS, PISOS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.

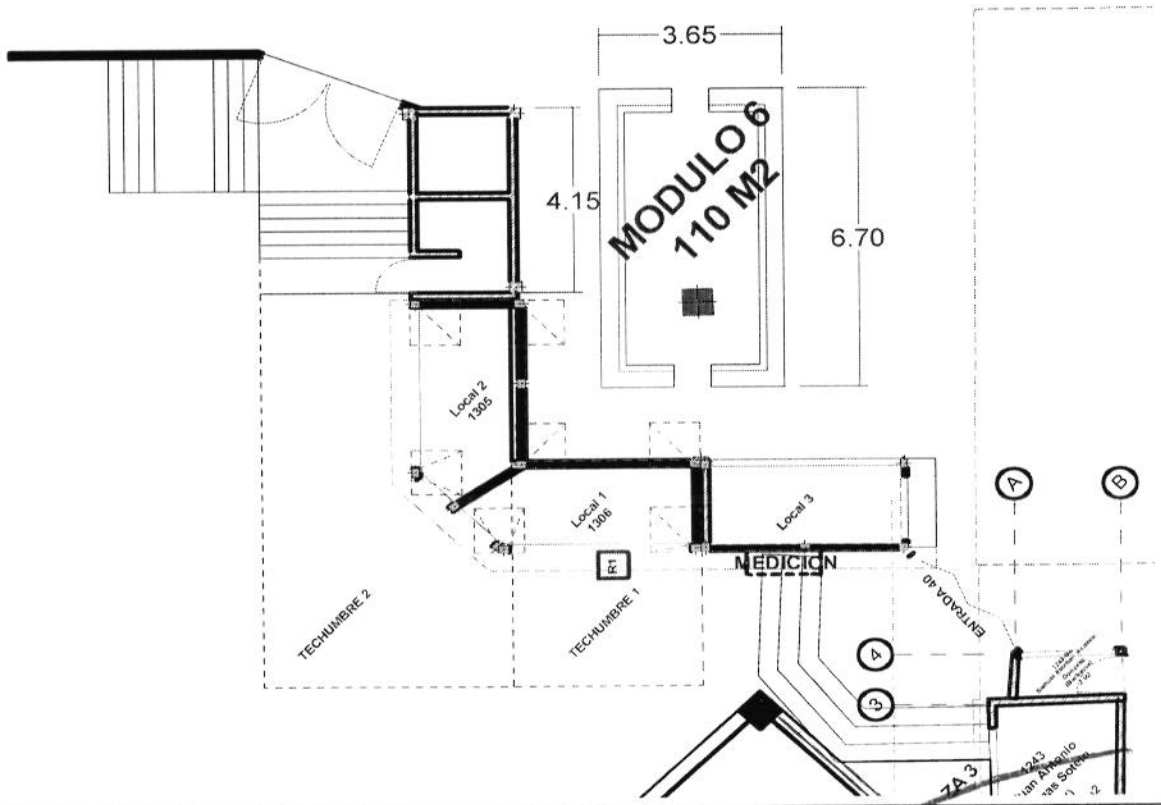

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO KG/ML	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					50.00	26.00			1,300.00	
								TOTAL	M2	1,300.00	

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


OBRA: **REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO**

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **COL. COMERCIAL ACAPULCO**

A09 **ACARREOS Y LIMPIEZA**

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

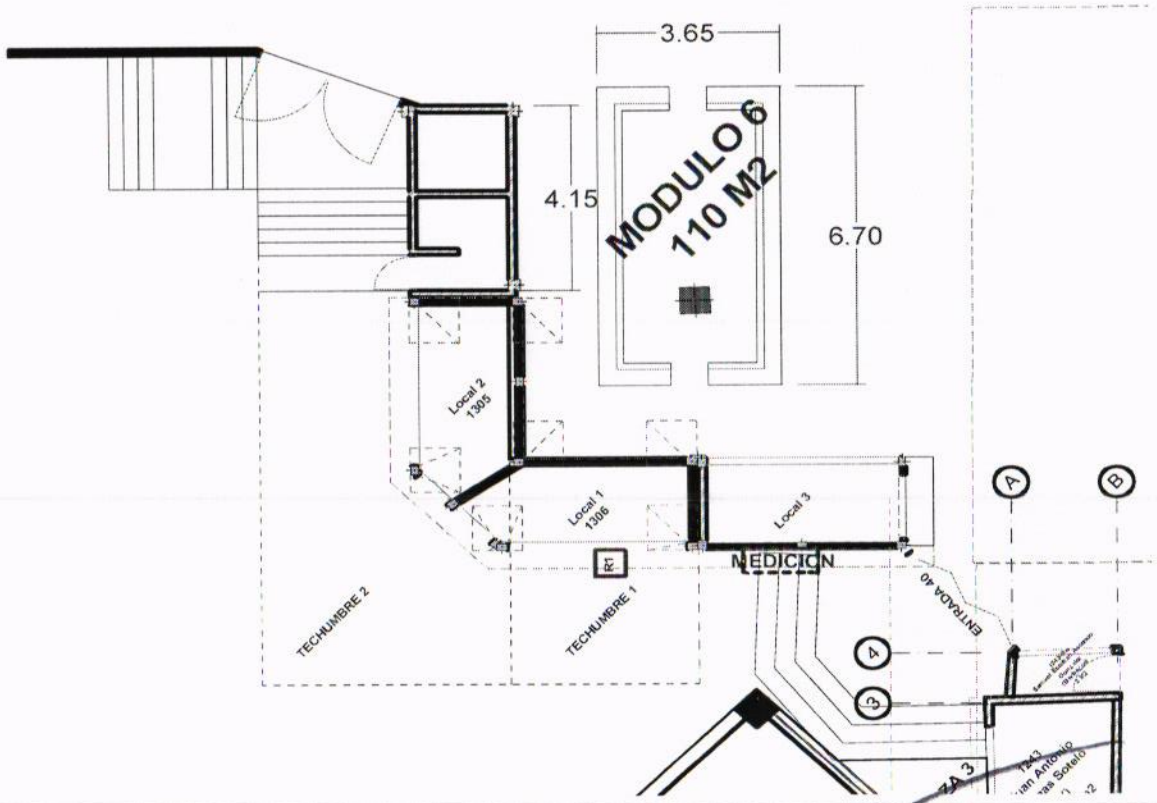

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: REMESC-01 **Unidad: M3**					
	REMOCION MANUAL DE ESCOMBROS PARA ELIMINACION DE FOCO DE INFECCION DE MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS, DERIVADO DE SINIENTRO. INCLUYE: ACARREO DEL LUGAR DEL SINIESTRO, A LA ESTACION DE CARGA INDICADA POR LA SUPERVISION, APILE DE MATERIAL PRODUCTO DE ESCOMBROS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	1.003458	$458.50	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$458.50**	100.00%
	Costo directo				**$458.50**	
	INDIRECTOS	15%			$68.78	
	SUBTOTAL				$527.28	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$527.28	
	UTILIDAD	10%			$52.72	
	PRECIO UNITARIO				**$580.00**	
	(* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: DEM-LOC **Unidad: M3**

DEMOLICION A MANO DE LOCALES DE MAMPOSTERIA DE TABIQUE Y BLOCK Y ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	1.839728	$840.61	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$840.61**	100.00%
Costo directo				**$840.61**	
INDIRECTOS	15%			$126.09	
SUBTOTAL				$966.70	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$966.70	
UTILIDAD	10%			$96.67	
PRECIO UNITARIO				**$1,063.37**	

(* UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 1-0016* **Unidad: M2**
DEMOLICION A MANO DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: ACARREO EN 1a. ESTACION .

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.059901	$27.37	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$27.37**	100.00%
Costo directo				**$27.37**	
INDIRECTOS	15%			$4.11	
SUBTOTAL				$31.48	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$31.48	
UTILIDAD	10%			$3.15	
PRECIO UNITARIO				**$34.63**	

(* TREINTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DESM-COR **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.078525	$94.86	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$94.86**	100.00%
	Costo directo				**$94.86**	
	INDIRECTOS	15%			$14.23	
	SUBTOTAL				$109.09	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$109.09	
	UTILIDAD	10%			$10.91	
	PRECIO UNITARIO				**$120.00**	
	(* CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. *)					

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DES-LAM **Unidad: M2**					
	DESMANTELAMIENTO DE LAMINA GALVANIZADA HASTA 5.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 R/HR PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)		$57.75	0.050000	$2.89	4.59%
	Subtotal: MATERIALES				**$2.89**	4.59%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.049783	$60.14	95.41%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.14**	95.41%
	Costo directo				**$63.03**	
	INDIRECTOS	15%			$9.45	
	SUBTOTAL				$72.48	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$72.48	
	UTILIDAD	10%			$7.25	
	PRECIO UNITARIO				**$79.73**	
	(* SETENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-TAP Unidad: M2					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPIAL DE TRIPLAY DE PINO DE 6MM, SOBRE BASTIDOR DE POLINES INDICADOS EN PISO Y PINTADOS CON PINTURA VINILICA COLOR BLANCO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.300000	$15.00	3.00%
	DUELA D/3RA 10 CM	PZA	$104.18	0.300000	$31.25	6.26%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.150000	$124.94	25.02%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.200000	$10.00	2.00%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.066667	$10.00	2.00%
	POLIN DE MADERA DE 3" X 3"	PZA	$150.00	0.240000	$36.00	7.21%
	Subtotal: MATERIALES				**$227.19**	45.49%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.165425	$199.84	40.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$199.84**	40.02%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,845.11	0.025440	$72.38	14.49%
	Subtotal: BASICOS				**$72.38**	14.49%
	Costo directo				**$499.41**	
	INDIRECTOS	15%			$74.91	
	SUBTOTAL				$574.32	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$574.32	
	UTILIDAD	10%			$57.43	
	PRECIO UNITARIO				**$631.75**	
	(* SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 75/100 M.N. *)					

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: PR-SUP **Unidad: M2**

PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.049913	$22.81	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$22.81**	100.00%
Costo directo				**$22.81**	
INDIRECTOS	15%			$3.42	
SUBTOTAL				$26.23	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$26.23	
UTILIDAD	10%			$2.62	
PRECIO UNITARIO				**$28.85**	

(* VEINTIOCHO PESOS 85/100 M.N. *)

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EXC-11-A **Unidad: M3**
EXCAVACION A MANO EN CEPAS DE 0 A 2 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.441174	$201.58	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$201.58**	100.00%
Costo directo				**$201.58**	
INDIRECTOS	15%			$30.24	
SUBTOTAL				$231.82	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$231.82	
UTILIDAD	10%			$23.18	
PRECIO UNITARIO				**$255.00**	

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 9-0139* **Unidad: M3**					
	RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXC. COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR, INC. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.180000	$27.00	22.40%
	Subtotal: MATERIALES				**$27.00**	22.40%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.166667	$76.15	63.16%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$76.15**	63.16%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$116.69	0.149199	$17.41	14.44%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$17.41**	14.44%
	Costo directo				**$120.56**	
	INDIRECTOS	15%			$18.08	
	SUBTOTAL				$138.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$138.64	
	UTILIDAD	10%			$13.86	
	PRECIO UNITARIO				**$152.50**	
	(* CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 9-0138* **Unidad: M3**

RELLENO DE MATERIAL INERTE DE BANCO, COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20.00 cm. DE ESPESOR, INC.ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTADO.

MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.180000	$27.00	7.78%
X	MATERIAL DE BANCO	M3	$175.00	1.300000	$227.50	65.57%
	Subtotal: MATERIALES				**$254.50**	73.35%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.166667	$76.15	21.95%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$76.15**	21.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	BAILARINA DE 4.5 HP	HOR	$116.69	0.139772	$16.31	4.70%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$16.31**	4.70%
	Costo directo				**$346.96**	
	INDIRECTOS	15%			$52.04	
	SUBTOTAL				$399.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$399.00	
	UTILIDAD	10%			$39.90	
	PRECIO UNITARIO				**$438.90**	

(* CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. *)

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 5-0102 Unidad: M3					
	CAMA DE ARENA PARA INSTALACION DE TUBERIA, INCLUYE: ACOSTILLADO, ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.649442	$324.72	87.67%
	Subtotal: MATERIALES				**$324.72**	87.67%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.100000	$45.69	12.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$45.69**	12.33%
	Costo directo				**$370.41**	
	INDIRECTOS	15%			$55.56	
	SUBTOTAL				$425.97	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$425.97	
	UTILIDAD	10%			$42.60	
	PRECIO UNITARIO				**$468.57**	
	(* CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 8-0126 Unidad: PZA					
	ZAPATA AISLADA DE CONCRETO EN CIMENTACION CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 250 KG/CM2. , DE 1.00x1.00 M. DE SECCION Y 15 CM DE PERALTE , ARMADA CON VARILLA DEL No. 3 A CADA 15 cm. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: CIMBRA Y ACARREO DE MATERIAL EN 1ra.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.581381	$671.34	37.49%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$671.34**	37.49%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.600000	$109.48	6.11%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,389.43	0.157500	$533.84	29.81%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	9.803200	$475.85	26.58%
	Subtotal: BASICOS				**$1,119.17**	62.51%
	Costo directo				**$1,790.51**	
	INDIRECTOS	15%			$268.58	
	SUBTOTAL				$2,059.09	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,059.09	
	UTILIDAD	10%			$205.91	
	PRECIO UNITARIO				**$2,265.00**	
	(* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0167* **Unidad: ML**					
	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'c=250 Kg/cm2, DE 15x25 cm, ARMADA CON 4 VARILLAS No. 4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 15 cm,INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.024811	$28.65	5.51%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$28.65**	5.51%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.	M2	$182.47	0.500000	$91.24	17.56%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,389.43	0.039375	$133.46	25.69%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$47.29	4.382400	$207.24	39.89%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.405600	$58.95	11.35%
	Subtotal: BASICOS				**$490.89**	94.49%
	Costo directo				**$519.54**	
	INDIRECTOS	15%			$77.93	
	SUBTOTAL				$597.47	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$597.47	
	UTILIDAD	10%			$59.75	
	PRECIO UNITARIO				**$657.22**	
	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CAST-1520 **Unidad: ML**					
	CASTILLO DE CONCRETO F C= 250 KG/CM2, DE 15X20 CMS, ARMADO CON 4 VARILLAS No.4 Y ESTRIBOS No. 2 A CADA 25 CMS, INCLUYE: CIMBRA COMUN, ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.058221	$67.23	13.63%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$67.23**	13.63%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$190.90	0.400000	$76.36	15.48%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,519.76	0.031500	$110.87	22.48%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$47.29	4.382400	$207.24	42.01%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	0.753000	$31.58	6.40%
	Subtotal: BASICOS				**$426.05**	86.37%
	Costo directo				**$493.28**	
	INDIRECTOS	15%			$73.99	
	SUBTOTAL				$567.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$567.27	
	UTILIDAD	10%			$56.73	
	PRECIO UNITARIO				**$624.00**	
	(* SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: DC-15X15* **Unidad: ML**					
	CADENA DE 15X15 CMS. CONCRETO F C= 250 KG/CM2. ARMADO CON 4 VARILLAS NO. 3 Y ESTRIBOS NO. 2 A CADA 10 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, ACARREO DE MATERIAL 1RA. ESTACIÓN.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.045274	$52.28	13.49%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$52.28**	13.49%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.380500	$57.90	14.93%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,519.76	0.023625	$83.15	21.45%
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.300000	$75.39	19.45%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	2.450800	$118.96	30.69%
	Subtotal: BASICOS				**$335.40**	86.51%
	Costo directo				**$387.68**	
	INDIRECTOS	15%			$58.15	
	SUBTOTAL				$445.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$445.83	
	UTILIDAD	10%			$44.58	
	PRECIO UNITARIO				**$490.41**	
	(* CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 41/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: TR-1530 **Unidad: ML**

TRABE DE CONCRETO ARMADO DE F C= 250 KG/CM2 DE 15 X 30 CMS. DE SECCION ARMADO CON 4 VAR. # 4, 2 VAR No. 3 Y ESTRIBOS DEL # 2 @10 Y 15 CMS. INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.

MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.280808	$324.26	30.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$324.26**	30.38%
BASICOS						
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$312.14	0.750000	$234.11	21.94%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,519.76	0.047250	$166.31	15.58%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION	KG	$47.29	4.382400	$207.24	19.42%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	1.225400	$59.48	5.57%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.	KG	$41.94	1.807200	$75.79	7.10%
	Subtotal: BASICOS				**$742.93**	69.62%
	Costo directo				**$1,067.19**	
	INDIRECTOS	15%			$160.08	
	SUBTOTAL				$1,227.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,227.27	
	UTILIDAD	10%			$122.73	
	PRECIO UNITARIO				**$1,350.00**	

(* UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0224 Unidad: M2					
	LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VAR. # 3 @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: ACERO, HABILITADO, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO, PLANA CERRADA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.127553	$147.29	12.42%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$147.29**	12.42%
BASICOS						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	7.350019	$356.77	30.09%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.	M2	$312.14	1.000000	$312.14	26.32%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,519.76	0.105000	$369.57	31.17%
	Subtotal: BASICOS				**$1,038.48**	87.58%
	Costo directo				**$1,185.77**	
	INDIRECTOS	15%			$177.87	
	SUBTOTAL				$1,363.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,363.64	
	UTILIDAD	10%			$136.36	
	PRECIO UNITARIO				**$1,500.00**	
	(* UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ENTOR3* **Unidad: M2**					
	ENTORTADO EN AZOTEA DE 6.00 CMS. DE ESPESOR, A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.088115	$101.75	38.26%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$101.75**	38.26%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,606.66	0.063000	$164.22	61.74%
	Subtotal: BASICOS				**$164.22**	61.74%
	Costo directo				**$265.97**	
	INDIRECTOS	15%			$39.90	
	SUBTOTAL				$305.87	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$305.87	
	UTILIDAD	10%			$30.59	
	PRECIO UNITARIO				**$336.46**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: MURO14 **Unidad: M2**					
	MURO DE TABICON DE CEMENTO, DE 10x14x28 cm. DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS. INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26	30.950000	$224.70	56.55%
	Subtotal: MATERIALES				**$224.70**	56.55%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.091563	$105.73	26.61%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$105.73**	26.61%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,606.66	0.025671	$66.92	16.84%
	Subtotal: BASICOS				**$66.92**	16.84%
	Costo directo				**$397.35**	
	INDIRECTOS	15%			$59.60	
	SUBTOTAL				$456.95	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$456.95	
	UTILIDAD	10%			$45.70	
	PRECIO UNITARIO				**$502.65**	
	(* QUINIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**					
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.128878	$148.82	68.50%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$148.82**	68.50%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,606.66	0.026250	$68.42	31.50%
	Subtotal: BASICOS				**$68.42**	31.50%
	Costo directo				**$217.24**	
	INDIRECTOS	15%			$32.59	
	SUBTOTAL				$249.83	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$249.83	
	UTILIDAD	10%			$24.98	
	PRECIO UNITARIO				**$274.81**	
	(* DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 11-0218 Unidad: ML					
	EMBOQUILLADO DE APLANADO DE 14 CMS. DE ANCHO A BASE DE MORTERO CEM-ARENA PROPORCION 1 :5 PERFILANDO UNA ARISTA HASTA 3.00 MTS. ACABADO PULIDO A LLANA DE 2.00 CM DE ESP. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A 1a. ESTACION .					
MATERIALES						
	FAJILLA D/3RA, 5 CM	PZA	$31.77	0.100000	$3.18	3.41%
	Subtotal: MATERIALES				**$3.18**	3.41%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.072943	$84.23	90.30%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$84.23**	90.30%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:5	M3	$2,036.58	0.002880	$5.87	6.29%
	Subtotal: BASICOS				**$5.87**	6.29%
	Costo directo				**$93.28**	
	INDIRECTOS	15%			$13.99	
	SUBTOTAL				$107.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$107.27	
	UTILIDAD	10%			$10.73	
	PRECIO UNITARIO				**$118.00**	
	(* CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 12-0239 Unidad: M2					
	PISO DE CONCRETO F`C= 200 KG/CM2. DE 10 CM. DE ESPESOR; REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10-10 ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, COLADO EN LOSAS DE 3.00 X 2.00 M. , JUNTAS FRIAS.					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.001000	$4.31	0.89%
	MALLA 6,6-10,10	M2	$25.96	1.100000	$28.56	5.92%
	Subtotal: MATERIALES				**$32.87**	6.81%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.100000	$115.47	23.91%
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.088002	$40.21	8.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$155.68**	32.24%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$251.30	0.100000	$25.13	5.20%
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,563.45	0.105000	$269.16	55.75%
	Subtotal: BASICOS				**$294.29**	60.95%
	Costo directo				**$482.84**	
	INDIRECTOS	15%			$72.43	
	SUBTOTAL				$555.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$555.27	
	UTILIDAD	10%			$55.53	
	PRECIO UNITARIO				**$610.80**	
	(* SEISCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 14-0264* **Unidad: ML**					
	FORJADO DE ESCALON A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 Kg/cm2, DE 40 cm DE HUELLA Y 18 cm DE PERALTE, INCLUYE:. CIMBRADO Y DECIMBRADO EN FRONTERAS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.131746	$152.13	40.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$152.13**	40.00%
BASICOS						
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS	M2	$190.90	0.180000	$34.36	9.04%
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,563.45	0.075600	$193.80	50.96%
	Subtotal: BASICOS				**$228.16**	60.00%
	Costo directo				**$380.29**	
	INDIRECTOS	15%			$57.04	
	SUBTOTAL				$437.33	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$437.33	
	UTILIDAD	10%			$43.74	
	PRECIO UNITARIO				**$481.07**	
	(* CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 29-0431 Unidad: M2					
	PROTECCION DE HERRERIA A BASE DE ANGULOS DE 1"X 1" X 3/16", CUADRADO DE 1/2" A CADA 10 CMS. DE SEPARACION C/U, CUADRADO COORDONEADO DE 1/2" TIPO CARAMELO Y SOLERA DE 2"X 1/4" DE 80 CMS. DE LARGO PARA RIGIDEZ INCLUYE: SUMINSTRO Y COLOCACION.					
MATERIALES						
	CUADRADO DE ACERO DE 1/2"	KG	$47.41	4.000000	$189.64	16.49%
	SOLERA DE ACERO DE 1 1/4"X1/4"	KG	$47.41	2.000000	$94.82	8.25%
	SOLDADURA E-6010 1/8"	KG	$100.33	1.000000	$100.33	8.73%
	ANGULO DE ACERO DE 1"X3/16"	KG	$47.41	3.000000	$142.23	12.37%
	CUADRADO CORDONEADO TIPO CARAMELO 3/8"	KG	$47.41	8.000000	$379.28	32.99%
	Subtotal: MATERIALES				**$906.30**	78.82%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.180000	$217.45	18.91%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$217.45**	18.91%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$164.22	0.158568	$26.04	2.26%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$26.04**	2.26%
	Costo directo				**$1,149.79**	
	INDIRECTOS	15%			$172.47	
	SUBTOTAL				$1,322.26	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,322.26	
	UTILIDAD	10%			$132.23	
	PRECIO UNITARIO				**$1,454.49**	
	(* UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: HERR-01-LOUV **Unidad: M2**

PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG. INCLUYE: DOBLEZ DE LAMINA, ANDAMIOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

MATERIALES						
	PROTECCION DE HERRERIA TIPO LOUVERS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 Y TUBULAR DE 2 X 1 PULG	M2	$2,624.59	1.000000	$2,624.59	89.68%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,624.59**	89.68%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.250000	$302.01	10.32%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	10.32%
	Costo directo				**$2,926.60**	
	INDIRECTOS	15%			$438.99	
	SUBTOTAL				$3,365.59	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$3,365.59	
	UTILIDAD	10%			$336.56	
	PRECIO UNITARIO				**$3,702.15**	

(* TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 15/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CORT-01 **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA, INCLUYE: SOLDADURA, CORTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	CORTINA DE HERRERIA TIPO MISCELANEA	M2	$2,039.27	1.000000	$2,039.27	87.10%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,039.27**	87.10%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.250000	$302.01	12.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	12.90%
	Costo directo				**$2,341.28**	
	INDIRECTOS	15%			$351.19	
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,692.47	
	UTILIDAD	10%			$269.25	
	PRECIO UNITARIO				**$2,961.72**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: LAM-01* **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 CON ESPESOR DE 1.21 MM					
	INCLUYE: CARGADORES DE 2 x 1", MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION.					
MATERIALES						
	SUJETADORES PARA LAMINA GALVIZADA CAL. 18. TIPO REMACHE	PZA	$5.25	6.000000	$31.50	3.56%
	LAMINA LISA CALIBRE 18 ESPESOR DE 1.21 MM DE 3.00 X 6.00 MTS	KG	$50.00	15.000000	$750.00	84.74%
	Subtotal: MATERIALES				**$781.50**	88.30%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.085725	$103.56	11.70%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$103.56**	11.70%
	Costo directo				**$885.06**	
	INDIRECTOS	15%			$132.76	
	SUBTOTAL				$1,017.82	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,017.82	
	UTILIDAD	10%			$101.78	
	PRECIO UNITARIO				**$1,119.60**	
	(* UN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 60/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITAÇION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0327 **Unidad: M2**					
	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.001000	$0.15	0.16%
	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	$64.13	0.100000	$6.41	6.65%
	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	$144.74	0.221293	$32.03	33.21%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.050000	$2.89	3.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$41.48**	43.01%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.045495	$54.96	56.99%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$54.96**	56.99%
	Costo directo				**$96.44**	
	INDIRECTOS	15%			$14.47	
	SUBTOTAL				$110.91	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$110.91	
	UTILIDAD	10%			$11.09	
	PRECIO UNITARIO				**$122.00**	
	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0335 **Unidad: M2**					
	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.					
MATERIALES						
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.220000	$27.95	25.50%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.046000	$2.66	2.43%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.110000	$18.25	16.65%
	THINER	LTS	$40.68	0.110000	$4.47	4.08%
	Subtotal: MATERIALES				**$53.33**	48.65%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.046590	$56.28	51.35%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$56.28**	51.35%
	Costo directo				**$109.61**	
	INDIRECTOS	15%			$16.44	
	SUBTOTAL				$126.05	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$126.05	
	UTILIDAD	10%			$12.61	
	PRECIO UNITARIO				**$138.66**	
	(* CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-01 **Unidad: M2**					
	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO, SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS HASTA DE 3.00 X 0.60 MTS.					
MATERIALES						
	ROTULO EN MURO, LOGO INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO "ACAPULCO	PZA	$1,976.29	1.000000	$1,976.29	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,976.29**	100.00%
	Costo directo				**$1,976.29**	
	INDIRECTOS	15%			$296.44	
	SUBTOTAL				$2,272.73	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$2,272.73	
	UTILIDAD	10%			$227.27	
	PRECIO UNITARIO				**$2,500.00**	
	(* DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-02 **Unidad: PZA**					
	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR" CON MEDIDAS DE HASTA 2.00 X 0.60 MTS.					
MATERIALES						
	ROTULO EN MURO, LOGO DE LAS 3 MANOS "SERVIR PARA TRANSFORMAR"	PZA	$1,581.03	1.000000	$1,581.03	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,581.03**	100.00%
	Costo directo				**$1,581.03**	
	INDIRECTOS	15%			$237.15	
	SUBTOTAL				$1,818.18	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,818.18	
	UTILIDAD	10%			$181.82	
	PRECIO UNITARIO				**$2,000.00**	
	(* DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-03 **Unidad: PZA**					
	ELABORACION DE ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO" CON MEDIDAS DE HASTA 6.50X 0.40 MTS.					
MATERIALES						
	ROTULO EN MURO, "MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO"	PZA	$1,581.03	1.000000	$1,581.03	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,581.03**	100.00%
	Costo directo				**$1,581.03**	
	INDIRECTOS	15%			$237.15	
	SUBTOTAL				$1,818.18	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,818.18	
	UTILIDAD	10%			$181.82	
	PRECIO UNITARIO				**$2,000.00**	
	(* DOS MIL PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-04 **Unidad: PZA**						
	ELABORACION DE ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS, DOS COLORES CON MEDIDAS DE HASTA 8.50 X 0.80 MTS.						
MATERIALES							
	ROTULO EN MURO CON PATRONES DE TRIANGULOS	PZA	$3,162.05		1.000000	$3,162.05	100.00%
	Subtotal: MATERIALES					**$3,162.05**	100.00%
	Costo directo					**$3,162.05**	
	INDIRECTOS	15%				$474.31	
	SUBTOTAL					$3,636.36	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$3,636.36	
	UTILIDAD	10%				$363.64	
	PRECIO UNITARIO					**$4,000.00**	
	(* CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-05 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION, SALIDA DE EMERGENCIA, DISCAPACITADOS)					
MATERIALES						
	SEÑAL PREVENTIVA EN PISO DE 0.80 X 0.80 MTS. (RUTA DE EVACUACION	PZA	$1,422.92	1.000000	$1,422.92	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,422.92**	100.00%
	Costo directo				**$1,422.92**	
	INDIRECTOS	15%			$213.44	
	SUBTOTAL				$1,636.36	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$1,636.36	
	UTILIDAD	10%			$163.64	
	PRECIO UNITARIO				**$1,800.00**	
	(* UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: ROT-06 **Unidad: M2**					
	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	ROTULOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$515.48	1.000000	$515.48	100.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$515.48**	100.00%
	Costo directo				**$515.48**	
	INDIRECTOS	15%			$77.32	
	SUBTOTAL				$592.80	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$592.80	
	UTILIDAD	10%			$59.28	
	PRECIO UNITARIO				**$652.08**	
	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: ROT-07 **Unidad: PZA**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALETICA (SISMO, INCENDIO, NO. LOCAL, SALIDA DE EMERGENCIA)

MATERIALES

SEÑALETICA PREVENTIVA (SISMO, INCENDIO)	PZA	$278.80	1.000000	$278.80	100.00%
Subtotal: MATERIALES				**$278.80**	100.00%
Costo directo				**$278.80**	
INDIRECTOS	15%			$41.82	
SUBTOTAL				$320.62	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$320.62	
UTILIDAD	10%			$32.06	
PRECIO UNITARIO				**$352.68**	

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-001 **Unidad: PZA**

ADECUACIONES PARA INSTALACION DE TUBERIA EN REGISTRO DE CONCRETO EXISTENTE PARA LLEGADA A TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: DEMOLICION EN PARED DE REGISTRO PARA ACOPLE DE TUBERIA, REPARACION EN CARA EXTERIOR DE REGISTRO, ABOCINADO DE TUBERIA Y SELLO CON ESPUMA DE POLIURETANO.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	2.742776	$3,313.38	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$3,313.38**	100.00%
Costo directo				**$3,313.38**	
INDIRECTOS	15%			$497.01	
SUBTOTAL				$3,810.39	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$3,810.39	
UTILIDAD	10%			$381.04	
PRECIO UNITARIO				**$4,191.43**	

(* CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 43/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-002 **Unidad: JGO**

CONEXIÓN DE CIRCUITO 3F-4H EN LADO DE BAJA TENSION DEL TRANSFORMADOR DE PEDESTAL, INCLUYE: ZAPATA BIMETALICA PONCHABLE CAÑON LARGO DE DOBLE OJILLO, MANGA TERMORETRACTIL, TORNILLOS, RONDANAS Y TUERCAS DE ACERO INOXIDABLE, PARA CONEXIÓN EN TERMINAL DE BAJA TENSION EN TRANFORMADOR DE PEDESTAL.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.430161	$519.65	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$519.65**	100.00%
Costo directo				**$519.65**	
INDIRECTOS	15%			$77.95	
SUBTOTAL				$597.60	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$597.60	
UTILIDAD	10%			$59.76	
PRECIO UNITARIO				**$657.36**	

(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-003 **Unidad: ML**					
	INSTALACION DE DUCTO PADC DE 4" PARA LINEA PRINCIPAL DE ALIMENTACION GENERAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.072898	$88.06	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$88.06**	100.00%
	Costo directo				**$88.06**	
	INDIRECTOS	15%			$13.21	
	SUBTOTAL				$101.27	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$101.27	
	UTILIDAD	10%			$10.13	
	PRECIO UNITARIO				**$111.40**	
	(* CIENTO ONCE PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-004 **Unidad: ML**					
	INSTALACION DE POLIDUCTO DE PVC PESADO DE 4" PARA PARA LINEA SECUNDARIA DE ALIMENTACION INDIVIDUAL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. CON AVISO DE PRUEBA CFE.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.128258	$154.94	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$154.94**	100.00%
	Costo directo				**$154.94**	
	INDIRECTOS	15%			$23.24	
	SUBTOTAL				$178.18	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$178.18	
	UTILIDAD	10%			$17.82	
	PRECIO UNITARIO				**$196.00**	
	(* CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-005 **Unidad: ML**					
	INSTALACION DE CABLE AL CUADRUPLEX DRS 3X350 +1X4/0 AWG. PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.426000	$514.63	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$514.63**	100.00%
	Costo directo				**$514.63**	
	INDIRECTOS	15%			$77.19	
	SUBTOTAL				$591.82	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$591.82	
	UTILIDAD	10%			$59.18	
	PRECIO UNITARIO				**$651.00**	
	(* SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-006 **Unidad: ML**					
	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 2 PARA TIERRA FISICA PRINCIPAL DE CENTROS MODULARES DE MEDICION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.104442	$126.17	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$126.17**	100.00%
	Costo directo				**$126.17**	
	INDIRECTOS	15%			$18.93	
	SUBTOTAL				$145.10	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$145.10	
	UTILIDAD	10%			$14.50	
	PRECIO UNITARIO				**$159.60**	
	(* CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. *)					

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-007 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION Y CONEXION DE CABLE THW CAL 8, MARCA CONDUMEX INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y ACARREO.					
MATERIALES						
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$30.17	1.100000	$33.19	83.98%
	Subtotal: MATERIALES				**$33.19**	83.98%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.005240	$6.33	16.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$6.33**	16.02%
	Costo directo				**$39.52**	
	INDIRECTOS	15%			$5.93	
	SUBTOTAL				$45.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$45.45	
	UTILIDAD	10%			$4.55	
	PRECIO UNITARIO				**$50.00**	
	(* CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-008 **Unidad: ML**					
	INSTALACION DE CABLE CU DESNUDO CAL 8 PARA TIERRA FISICA SECUNDARIA, DE REGISTROS INTERNOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA.					
MATERIALES						
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$30.17	1.100000	$33.19	85.67%
	Subtotal: MATERIALES				**$33.19**	85.67%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.004597	$5.55	14.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$5.55**	14.33%
	Costo directo				**$38.74**	
	INDIRECTOS	15%			$5.81	
	SUBTOTAL				$44.55	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$44.55	
	UTILIDAD	10%			$4.46	
	PRECIO UNITARIO				**$49.01**	
	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-009 **Unidad: ML**					
	ALIMENTACION ELECTRICA DE LA RED EXTERIOR A CENTRO DE CARGA Qo-4; A BASE DE TUBO CONDUIT DE PVC. TIPO PESADO DE 25 MM. DE DIAMETRO Y 2 CABLES THW. CAL No. 8, INCLUYE: COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS.					
MATERIALES						
	TUBO CONDUIT DE PVC PESADO DE 25 MM DE DIAMETRO	ML	$19.18	1.100000	$21.10	17.74%
	CABLE THW # 8 CONDUMEX	ML	$30.17	2.200000	$66.37	55.80%
	Subtotal: MATERIALES				**$87.47**	73.54%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.026058	$31.48	26.46%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$31.48**	26.46%
	Costo directo				**$118.95**	
	INDIRECTOS	15%			$17.84	
	SUBTOTAL				$136.79	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$136.79	
	UTILIDAD	10%			$13.68	
	PRECIO UNITARIO				**$150.47**	
	(* CIENTO CINCUENTA PESOS 47/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-010 Unidad: PZA					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - 900 A. INCLUYE: KIT DE SOLERA PARA ACOMETIDA 5100 A 3 FASES 900 AMPERES, TRAZO, NIVELACION, FIJACION Y CONEXIÓN					
MATERIALES						
	GABINETE PARA ACOMETIDA DERECHA 50 X 35 X 15 - PZA 900 A		$6,737.09	1.000000	$6,737.09	84.80%
	Subtotal: MATERIALES				**$6,737.09**	84.80%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	1.000000	$1,208.04	15.20%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,208.04**	15.20%
	Costo directo				**$7,945.13**	
	INDIRECTOS	15%			$1,191.77	
	SUBTOTAL				$9,136.90	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$9,136.90	
	UTILIDAD	10%			$913.69	
	PRECIO UNITARIO				**$10,050.59**	
	(* DIEZ MIL CINCUENTA PESOS 59/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-011 **Unidad: PZA**					
	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS, PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA , INCLUYE: ACARREOS, ENSAMBLE, FIJACION SOBRE MURO EXISTENTE, PRUEBAS, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
MATERIALES						
	CENTRO MODULAR DE MEDICION DE 5 SERVICIOS MONOFASICOS	PZA	$23,376.45	1.000000	$23,376.45	95.09%
	Subtotal: MATERIALES				**$23,376.45**	95.09%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	1.000000	$1,208.04	4.91%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,208.04**	4.91%
	Costo directo				**$24,584.49**	
	INDIRECTOS	15%			$3,687.67	
	SUBTOTAL				$28,272.16	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$28,272.16	
	UTILIDAD	10%			$2,827.23	
	PRECIO UNITARIO				**$31,099.39**	
	(* TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: EL-BT-012 **Unidad: PZA**					
	INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BAJA TENSION TIPO "1" EN BANQUETA (CFE-RBTB1). INCLUYE: ACARREO, MANIOBRAS DE INSTALACION. CON AVISO DE PRUEBA CFE					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	4.580640	$5,533.60	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$5,533.60**	100.00%
	Costo directo				**$5,533.60**	
	INDIRECTOS	15%			$830.04	
	SUBTOTAL				$6,363.64	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$6,363.64	
	UTILIDAD	10%			$636.36	
	PRECIO UNITARIO				**$7,000.00**	
	(* SIETE MIL PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-013 **Unidad: PZA**

REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

MATERIALES

REGISTRO ELECTRICO DE 0.60 X 0.60 X 0.80 MTS	PZA	$2,055.34	1.000000	$2,055.34	100.00%
Subtotal: MATERIALES				**$2,055.34**	100.00%
Costo directo				**$2,055.34**	
INDIRECTOS	15%			$308.30	
SUBTOTAL				$2,363.64	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$2,363.64	
UTILIDAD	10%			$236.36	
PRECIO UNITARIO				**$2,600.00**	

(* DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-014 **Unidad: PZA**

REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS. DE PROF. MURO DE TABIQUE DE CONCRETO DE 14 CMS. DE ESP. FONDO DE GRAVA, APLANADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3, TAPA DE CONCRETO SIMPLE DE F C=150 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO DE 1 1/4" X 1 1/4"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVA ACABADO CON ESMALTE, INCLUYE: SOPORTE PARA CABLES CON VAR. 3/8" FORRADO CON TUBO P.V.C. 1/2"

MATERIALES

REGISTRO ELECTRICO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 MTS	PZA	$3,905.14	1.000000	$3,905.14	100.00%
Subtotal: MATERIALES				**$3,905.14**	100.00%
Costo directo				**$3,905.14**	
INDIRECTOS	15%			$585.77	
SUBTOTAL				$4,490.91	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$4,490.91	
UTILIDAD	10%			$449.09	
PRECIO UNITARIO				**$4,940.00**	

(* CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-015 **Unidad: PZA**

INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTROS DE BAJA TENSION, INCLUYE: ELECTRODO DE TIERRA DE 5/8" X 3 MTS. CONECTOR A COMPRESION TIPO C DE COBRE.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.890666	$1,075.96	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,075.96**	100.00%
Costo directo				**$1,075.96**	
INDIRECTOS	15%			$161.39	
SUBTOTAL				$1,237.35	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$1,237.35	
UTILIDAD	10%			$123.73	
PRECIO UNITARIO				**$1,361.08**	

(* UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: EL-BT-016 **Unidad: PZA**
DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA CENTROS MODULARES DE MEDICIN
PARA UNA CARGA DE 25 KW.

MATERIALES

DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	PZA	$19,320.16	1.000000	$19,320.16	100.00%
Subtotal: MATERIALES				**$19,320.16**	100.00%
Costo directo				**$19,320.16**	
INDIRECTOS	15%			$2,898.02	
SUBTOTAL				$22,218.18	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$22,218.18	
UTILIDAD	10%			$2,221.82	
PRECIO UNITARIO				**$24,440.00**	

(* VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-04 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC SANITARIO DE 6" DE DIAM. INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES SECUNDARIOS, CONEXION Y M.O.					
MATERIALES						
	TUBO DE PVC SAN REXOLIT DE 6" DIAM	ML	$186.38	1.100000	$205.02	68.33%
	Subtotal: MATERIALES				**$205.02**	68.33%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.078648	$95.01	31.67%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$95.01**	31.67%
	Costo directo				**$300.03**	
	INDIRECTOS	15%			$45.00	
	SUBTOTAL				$345.03	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$345.03	
	UTILIDAD	10%			$34.50	
	PRECIO UNITARIO				**$379.53**	
	(* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 53/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 37-0580 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 4 " PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL INCLUYE: COLOCACION DE SOPORTES A PARED.					
MATERIALES						
	TUBERIA DE PVC TIPO SANITARIO DE 100 mm (4") DE DIAMETRO ML		$106.79	1.100000	$117.47	63.54%
	Subtotal: MATERIALES				**$117.47**	63.54%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.055806	$67.42	36.46%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$67.42**	36.46%
	Costo directo				**$184.89**	
	INDIRECTOS	15%			$27.73	
	SUBTOTAL				$212.62	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$212.62	
	UTILIDAD	10%			$21.26	
	PRECIO UNITARIO				**$233.88**	
	(* DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: REG-PLUV **Unidad: PZA**

REGISTRO SANITARIO PARA AGUAS PLUVIALES DE 0.50x0.50x0.60 MTS, A BASE DE TABICON 10x14x28, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO FINO CON MORTERO CEMENTO-AREA 1:3, PISO DE 10 cm, DE CONCRETO SIMPLEF'c= 150 Kg/cm2, CAÑA. INCLUYE: REJILLA TIPO IRWING PARA TRAFICO PEATONAL, TRAZO, NIVELACION,ACABADO EN MEDIA EXCAVACION, MATERIAL, ACARREO Y MANO DE OBRA, MARCO Y CONTRAMARCO.

MATERIALES						
	AGUA	M3	$150.00	0.008460	$1.27	0.03%
	TUBO D/PVC HID RD26 2" 50MM	ML	$52.33	4.320000	$226.07	4.77%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.004372	$18.84	0.40%
	Subtotal: MATERIALES				**$246.18**	5.19%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.063685	$73.54	1.55%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$73.54**	1.55%
BASICOS						
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 cm. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$418.02	4.367084	$1,825.53	38.49%
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$48.54	10.970149	$532.49	11.23%
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$2,845.11	0.128209	$364.77	7.69%
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA INC. RENTA Y MANO DE OBRA.	M2	$178.35	0.423886	$75.60	1.59%
	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO, ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.	M2	$217.24	4.366138	$948.50	20.00%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,519.76	0.192195	$676.48	14.26%
	Subtotal: BASICOS				**$4,423.37**	93.26%
	Costo directo				**$4,743.09**	
	INDIRECTOS	15%			$711.46	
	SUBTOTAL				$5,454.55	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$5,454.55	
	UTILIDAD	10%			$545.45	
	PRECIO UNITARIO				**$6,000.00**	

(* SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 37-0579 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL DE FIERRO FoFo ABIERTO PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DE DIAMETRO, DE 135 Kg, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	BROCAL PARA POZO DE VISITA DE 60 cm DEFoFo	PZA	$3,993.00	1.000000	$3,993.00	84.19%
	Subtotal: MATERIALES				**$3,993.00**	84.19%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.649575	$750.09	15.81%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$750.09**	15.81%
	Costo directo				**$4,743.09**	
	INDIRECTOS	15%			$711.46	
	SUBTOTAL				$5,454.55	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$5,454.55	
	UTILIDAD	10%			$545.45	
	PRECIO UNITARIO				**$6,000.00**	
	(* SEIS MIL PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: REMESC-02 **Unidad: M2**
LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.018252	$8.34	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$8.34**	100.00%
Costo directo				**$8.34**	
INDIRECTOS	15%			$1.25	
SUBTOTAL				$9.59	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$9.59	
UTILIDAD	10%			$0.96	
PRECIO UNITARIO				**$10.55**	

(* DIEZ PESOS 55/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0496 **Unidad: M3**						
	ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. A 20.00 MTS. EN 1ra. ESTACION, INLCUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL I Y II						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92		0.176005	$80.42	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$80.42**	100.00%
	Costo directo					**$80.42**	
	INDIRECTOS	15%				$12.06	
	SUBTOTAL					$92.48	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$92.48	
	UTILIDAD	10%				$9.25	
	PRECIO UNITARIO					**$101.73**	
	(* CIENTO UN PESOS 73/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 33-0497 **Unidad: M3**
ACARREO EN CARRETILLA DE 70 LTS. EN ESTACIONES SUBSECUENTES, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES I Y II.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.053519	$24.45	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$24.45**	100.00%
Costo directo				**$24.45**	
INDIRECTOS	15%			$3.67	
SUBTOTAL				$28.12	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$28.12	
UTILIDAD	10%			$2.81	
PRECIO UNITARIO				**$30.93**	

(* TREINTA PESOS 93/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0521 **Unidad: M3**					
	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION. (12 KM)					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.064475	$29.46	11.09%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$29.46**	11.09%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	22.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$59.03**	22.22%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	66.68%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	66.68%
	Costo directo				**$265.61**	
	INDIRECTOS	15%			$39.84	
	SUBTOTAL				$305.45	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$305.45	
	UTILIDAD	10%			$30.55	
	PRECIO UNITARIO				**$336.00**	
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: REMESC-02 **Unidad: M2**

LIMPIEZA GENERAL DE AREA AFECTADA POR SINIESTRO (MUROS Y LOSAS). INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERCIE Y LAVADO CON CARTCHER.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.018252	$8.34	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$8.34**	100.00%
Costo directo				**$8.34**	
INDIRECTOS	15%			$1.25	
SUBTOTAL				$9.59	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$9.59	
UTILIDAD	10%			$0.96	
PRECIO UNITARIO				**$10.55**	

(* DIEZ PESOS 55/100 M.N. *)



JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0528 **Unidad: M2**					
	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.005000	$2.28	32.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	32.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.007928	$4.68	67.24%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$4.68**	67.24%
	Costo directo				**$6.96**	
	INDIRECTOS	15%			$1.04	
	SUBTOTAL				$8.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$8.00	
	UTILIDAD	10%			$0.80	
	PRECIO UNITARIO				**$8.80**	
	(* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0143 Unidad: M2					
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA A BASE DE TRIPLAY DE16 mm. INLCUYE: CIMBRADO Y DECIMBRADO, CHAFLANES, FRENTES ACARREO DE MATERIAL EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.050000	$7.50	2.40%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00	0.180000	$54.00	17.30%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.080000	$66.64	21.35%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.165523	$8.28	2.65%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.250000	$12.50	4.00%
X	DIESEL	LTO	$22.96	1.000000	$22.96	7.36%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.380000	$39.59	12.68%
	Subtotal: MATERIALES				**$211.47**	67.75%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.083333	$100.67	32.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$100.67**	32.25%
	Costo directo				**$312.14**	
	(* TRESCIENTOS DOCE PESOS 14/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0145 **Unidad: M2**					
	CIMBRA COMUN EN CIMENTACION , INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO ACARREO EN 1ERA. ESTACION.					
MATERIALES						
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.500000	$52.09	28.55%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.273490	$41.02	22.48%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.100000	$5.00	2.74%
X	DIESEL	LTO	$22.96	1.000000	$22.96	12.58%
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.020000	$1.00	0.55%
	Subtotal: MATERIALES				**$122.07**	66.90%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	33.10%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	33.10%
	Costo directo				**$182.47**	
	(* CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 47/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 10-0149 **Unidad: M2**					
	CIMBRA APARENTE EN ESTRUCTURA INC. RENTA Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	CIMBRA APARENT/RENTA	M2	$115.50	1.000000	$115.50	64.76%
	Subtotal: MATERIALES				**$115.50**	64.76%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.052024	$62.85	35.24%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$62.85**	35.24%
	Costo directo				**$178.35**	
	(* CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 35/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 11-0212 **Unidad: M2**

APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, DE 2.5 cm. DE ESPESOR PROMEDIO. ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACABADO FINO , INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.

MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.128878	$148.82	68.50%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$148.82**	68.50%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,606.66	0.026250	$68.42	31.50%
	Subtotal: BASICOS				**$68.42**	31.50%
	Costo directo				**$217.24**	

(* DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 18-0314 **Unidad: M2**					
	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION CON TABICON DE CEMENTO DE 10 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, JUNTAS DE 1.5 cm. DE 14 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMUN, ALTURA HASTA 3.00 MTS., INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	TABICON DE CONCRETO DE 10X14X28	PZA	$7.26	30.950000	$224.70	53.75%
	Subtotal: MATERIALES				**$224.70**	53.75%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.109459	$126.40	30.24%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$126.40**	30.24%
BASICOS						
	MORTERO CEM-ARE 1:3	M3	$2,606.66	0.025671	$66.92	16.01%
	Subtotal: BASICOS				**$66.92**	16.01%
	Costo directo				**$418.02**	
	(* CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 02/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 33-0522 **Unidad: M3-KM**
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.025000	$14.76	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$14.76**	100.00%
Costo directo				**$14.76**	

(* CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0110 **Unidad: KG**						
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA CON ALAMBRON No.2 Fy=2,200 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIAL 1a . ESTACION.						
MATERIALES							
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00		0.030000	$1.50	3.58%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$26.93		1.070000	$28.82	68.72%
	Subtotal: MATERIALES					**$30.32**	72.29%
MANO DE OBRA							
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04		0.009621	$11.62	27.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$11.62**	27.71%
	Costo directo					**$41.94**	
	(* CUARENTA Y UN PESOS 94/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0111 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #3,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.09%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	1.070000	$37.66	77.59%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	80.68%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.007768	$9.38	19.32%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$9.38**	19.32%
	Costo directo				**$48.54**	
	(* CUARENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0112 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA, CON VARILLA #4,Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO. HABILITADO,ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERDICIOS, ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.17%
	VARILLA NO 4	KG	$35.20	1.070000	$37.66	79.64%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	82.81%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.006734	$8.13	17.19%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$8.13**	17.19%
	Costo directo				**$47.29**	
	(* CUARENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0116 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2, R.N., HECHO EN OBRA EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.100000	$298.24	10.48%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$298.24**	10.48%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.45%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.45%
BASICOS						
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"	M3	$2,386.33	1.050000	$2,505.65	88.07%
	Subtotal: BASICOS				**$2,505.65**	88.07%
	Costo directo				**$2,845.11**	
	(* DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0118 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.156300	$466.15	13.75%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$466.15**	13.75%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.22%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.22%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,744.82	1.050000	$2,882.06	85.03%
	Subtotal: BASICOS				**$2,882.06**	85.03%
	Costo directo				**$3,389.43**	
	(* TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0121 Unidad: M3 CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.200000	$596.48	16.95%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$596.48**	16.95%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.17%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.17%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,744.82	1.050000	$2,882.06	81.88%
	Subtotal: BASICOS				**$2,882.06**	81.88%
	Costo directo				**$3,519.76**	
	(* TRES MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: C.C.C. Unidad: M2					
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.100000	$5.00	1.99%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	0.99%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	7.31%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	9.40%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	32.23%
	Subtotal: MATERIALES				**$130.50**	51.93%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.100000	$120.80	48.07%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$120.80**	48.07%
	Costo directo				**$251.30**	
	(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CIM*COM*EST **Unidad: M2**					
	CIMBRA COMUN EN CADENAS Y CASTILLOS					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.100000	$5.00	2.62%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.050000	$2.50	1.31%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.800000	$18.37	9.62%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.157500	$23.63	12.38%
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.777500	$81.00	42.43%
	Subtotal: MATERIALES				**$130.50**	68.36%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	31.64%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	31.64%
	Costo directo				**$190.90**	
	(* CIENTO NOVENTA PESOS 90/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=150 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.319100	$1,375.43	57.64%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.571400	$285.70	11.97%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.685000	$452.10	18.95%
	AGUA	M3	$150.00	0.229600	$34.44	1.44%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,147.67**	90.00%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	7.77%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	7.77%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	2.23%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	2.23%
	Costo directo				**$2,386.33**	
	(* DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=200 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, FABRICADO EN OBRA. T.M.A. 3/4"					
MATERIALES						
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.670700	$442.66	17.27%
	AGUA	M3	$150.00	0.224200	$33.63	1.31%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.540100	$270.05	10.53%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.366200	$1,578.45	61.58%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,324.79**	90.69%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	7.23%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	7.23%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	2.08%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	2.08%
	Costo directo				**$2,563.45**	
	(* DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=250 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34	0.411200	$1,772.41	64.57%
	AGUA	M3	$150.00	0.226700	$34.01	1.24%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.647100	$427.09	15.56%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.545300	$272.65	9.93%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,506.16**	91.31%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	6.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	6.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	1.94%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	1.94%
	Costo directo				**$2,744.82**	
	(* DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 82/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU001 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	88.49%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$404.35	0.100000	$40.44	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$444.79**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$404.35	0.030000	$12.13	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$12.13**	2.65%
	Costo directo				**$456.92**	
	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU002 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,021.89	0.100000	$102.19	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	53.48%
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	35.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,124.08**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,021.89	0.030000	$30.66	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$30.66**	2.66%
	Costo directo				**$1,154.74**	
	(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU003 02-0420 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	5.000000	$2,021.75	67.79%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$2,639.29	0.100000	$263.93	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	20.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2,903.22**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$2,639.29	0.030000	$79.18	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$79.18**	2.65%
	Costo directo				**$2,982.40**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU004 02-0620 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. FIERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: CU005 **Unidad: JOR**						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)						
MANO DE OBRA							
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52		1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06		0.100000	$106.91	8.85%
	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	$617.54		1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06		0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA					**$32.07**	2.65%
	Costo directo					**$1,208.04**	
	(" UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. ")						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU006 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. ELECTRICISTA	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU007 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	OF. PLOMERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU010 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. HERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU014 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. PINTOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU027 02-1030 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$3,281.97	0.100000	$328.20	8.85%
	PEON	JOR	$404.35	7.000000	$2,830.45	76.32%
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	12.17%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3,610.17**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$3,281.97	0.030000	$98.46	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$98.46**	2.65%
	Costo directo				**$3,708.63**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 63/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:3 **Unidad: M3**						
	MORTERO CEM-ARE 1:3						
MATERIALES							
	AGUA	M3	$150.00		0.330500	$49.58	1.90%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		1.088300	$544.15	20.88%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34		0.467000	$2,012.93	77.22%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,606.66**	100.00%
	Costo directo					**$2,606.66**	
	(* DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 66/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: MORTERO 1:5 **Unidad: M3**						
	MORTERO CEM-ARE 1:5						
MATERIALES							
	ARENA DE RIO	M3	$500.00		1.201400	$600.70	29.50%
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,310.34		0.322500	$1,390.08	68.26%
	AGUA	M3	$150.00		0.305300	$45.80	2.25%
	Subtotal: MATERIALES					**$2,036.58**	100.00%
	Costo directo					**$2,036.58**	
	(* DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS 58/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQBAILAR		
MAQUINA:	BAILARINA DE 4.5 HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$45,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	4.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL		VIDA ECONOMICA (Ve):	4,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,500.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,000.00 - 4,500.00 / 4,000.00 =		$10.13	
b) - INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.10 / 2 * 1,000.00 =		$2.48	
c) - SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,000.00 + 4,500.00) * 0.04 / 2 * 1,000.00 =		$0.99	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 10.13 =		$8.10	
SUMA CARGOS FIJOS		**$21.70**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$31.21**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$116.69**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO	EQCAMION		
MAQUINA:	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$870,292.50	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$45,738.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 160 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$824,554.50	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $82,455.45	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	128.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.09375
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 824,554.50 - 82,455.45 / 10,000.00 =		$74.21	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$22.68	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.07	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 74.21 =		$59.37	
SUMA CARGOS FIJOS		**$165.33**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.09375 * 128.00 * 22.96 =		$275.52	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c) - LUBRICANTE.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 128.00) + 36 / 200] * $100/Lt. =		$62.80	
d) - LLANTAS.....N = Pn/Vn = $45,738.00 / 2,000.00 =		$22.87	
e) - PIEZAS ESPECIALES.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$361.19**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$590.30**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQPLAN		
MAQUINA:	PLANTA DE SOLDAR MILLER		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$30,000.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,600 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $.00 / LTS.	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$30,000.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.00 / LTS.	
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $3,000.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$151.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,208.04	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 30,000.00 - 3,000.00 / 8,000.00 =		$3.38	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (30,000.00 + 3,000.00) * 0.10 / 2 * 1,600.00 =		$1.03	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (30,000.00 + 3,000.00) * 0.04 / 2 * 1,600.00 =		$0.41	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.50 * 3.38 =		$1.69	
SUMA CARGOS FIJOS		**$6.51**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....ENERGIA ELECTRICA: = 6.7 * 1 = $6.7		$6.70	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$6.70**	
OTROS CONSUMOS			
SUMA DE OTROS CONSUMOS		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 11 (1 OF. SOLDADOR + 1 AY JOR Po = Sr / (Ht) = $1,208.04/8 $151.01			
OPERACION		$151.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$151.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$164.22**	

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQREV		
MAQUINA:	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$2,420.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	1,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,223.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,522.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,223.75 - 4,522.38 / 5,000.00 =		$8.14	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$1.24	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.50	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 8.14 =		$6.51	
SUMA CARGOS FIJOS		**$16.39**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d) - LLANTAS.....N = Pn/Vn = $2,420.00 / 1,000.00 =		$2.42	
e) - PIEZAS ESPECIALES.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$33.63**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$106.46**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQVIB		
MAQUINA:	VIBRADOR PARA CONCRETO		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$16,198.88	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 4 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$16,198.88	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $1,619.89	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	4.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,198.88 - 1,619.89 / 5,000.00 =		$2.92	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$0.45	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.18	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 2.92 =		$2.34	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.89**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 4.00 * 22.96 =		$13.90	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:.....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 4.00) + 5 / 100] * $100/Lt. =		$6.20	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e) - PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$20.10**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR — Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$82.43**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Ubicación: COL. COMERCIAL ACAPULCO

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	746.67	0.000000	0.00
MO001	PEON	JOR	228.57	1.769024	404.35
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO010	OF. ALBANIL	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO011	OF. FIERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO014	OF. PLOMERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO017	OF. HERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO021	OF. PINTOR	JOR	357.14	1.729120	617.54

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES. LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DIAS CALENDARIO		365.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO		15.00
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL		3.00
	Prima dominical		
	Horas extras gravables en el SBC		
	Horas extras no gravables en el SBC		
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO**	SUMA:	**383.00**
DIDOM	DIAS DOMINGO		52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES		12.00
DIFEO	DIAS FESTIVOS POR LEY		7.00
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)		1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE		5.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL		1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)		
	Dias no Trabajados por Guardia		
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO**	SUMA:	**78.00**
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**		287.00
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS		1.334495
(Tp -Te) / TI	(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)/ DIAS LABORADOS		1.334495
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS		1.049315

UMA 2023 103.74
SALARIO MINIMO 2023 207.44
Porcentaje de pagos (Otros cargos) 2.00%


TABLA DE SALARIOS REALES

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal veces DF	Tp / TI	Obligacion Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp-Te)/TI	Otros Cargos	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 2 %	H = D + F + G
MO001	PEON	2.203297	1.334495	0.310626	0.414529	0.020000	1.769024
MO002	AYUDANTE GENERAL	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SA(	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO010	OF. ALBANIL	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO011	OF. FIERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO013	OF. ELECTRICISTA	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO014	OF. PLOMERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO017	OF. HERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO018	OF. SOLDADOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO021	OF. PINTOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO032	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

U.M.A.	1.00	3 veces salario U.M.A.	3.00	25 veces U.M.A.	25.00	25 veces U.M.A.	25.00

Clave de Categoria	Salario Nominal veces DF	Factor Salario Base de Cotizacion	Salario Base de Cotización	Excedente de tres salarios minimos DF	Aplicación IMSS al excedente	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	Prestaciones en dinero	Invalidez y vida	Cesantia en edad avanzada y vejez	Riesgos de trabajo	Guarderías	SAR	INFONAVIT	Suma prestaciones	Ps= Obligacion Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			BxC	D-3SMDF	ExF	GxSMDF	HxD	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	SUMA(F:O)	P / D
	Sn	FSBC	SBC		1.1000%	20.4000%	1.0500%	0.7000%	1.7500%	3.1500%	7.58880%	1.00%	2.00%	5.00%	SP	SP/SBC
MO001	2.203297	1.0493	2.311953			0.204	0.024276	0.016184	0.040459	0.072827	0.175449	0.02312	0.046239	0.115598	0.718152	0.310626
MO002	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO003	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO010	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO011	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO012	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO013	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO014	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO017	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO018	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO021	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO032	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822

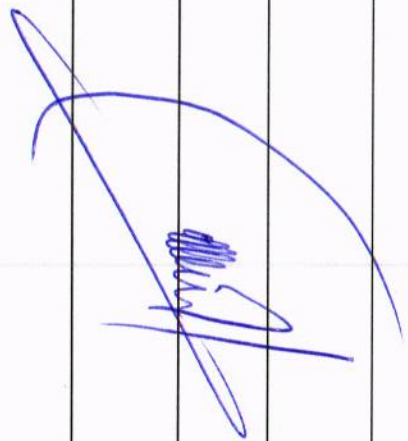

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO001**
CATEGORIA (S): **PEON**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.203297**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.311953**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.024276
0.7% Prestaciones en dinero	0.016184
2% Sar	0.046239
5% Infonavit	0.115598
1.75% Invalidez y vida	0.040459
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.072827
7.5888% Riesgos de trabajo	0.175449
1% Guarderias	0.02312
SP = Suma de Prestaciones	21.677112
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.310626

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.414529

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.769024**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO002**
CATEGORIA (S): **AYUDANTE GENERAL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00	Dias Calendario (DICAL)	365.00
Dias no Trabajados		Aguinaldo por Ley	15.00
Domingos	52.00	Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Dias festivos por Ley	7.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Dias por costumbre	5.00	Tiempo Extra	
Dias sindicato	0.00	Horas extras gravables en el SBC	0.00
Vacaciones	12.00	Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	1.00	Prestaciones por contrato (anexar	
Condiciones Climatologicas	1.00	copia del contrato y analisis correspon.)	
Horas inactivas por arrastre		**TOTAL Tp =**	383.00
Dias no trabajados por guardia	0.00		
		Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02
TOTAL TI =	287.00		

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO003**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO010**
CATEGORIA (S): **OF. ALBANIL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACION: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO011**
CATEGORIA (S): **OF. FIERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00	Dias Calendario (DICAL)	365.00
Dias no Trabajados		Aguinaldo por Ley	15.00
Domingos	52.00	Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Dias festivos por Ley	7.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Dias por costumbre	5.00	Tiempo Extra	
Dias sindicato	0.00	Horas extras gravables en el SBC	0.00
Vacaciones	12.00	Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	1.00	Prestaciones por contrato (anexar	
Condiciones Climatologicas	1.00	copia del contrato y analisis correspon.)	
Horas inactivas por arrastre		**TOTAL Tp =**	383.00
Dias no trabajados por guardia	0.00		
		Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02
TOTAL TI =	287.00		

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI =	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI =	0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO012**
CATEGORIA (S): **OF. CARPINTERO O. NEGRA.**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00	Dias Calendario (DICAL)	365.00
Dias no Trabajados		Aguinaldo por Ley	15.00
Domingos	52.00	Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Dias festivos por Ley	7.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Dias por costumbre	5.00	Tiempo Extra	
Dias sindicato	0.00	Horas extras gravables en el SBC	0.00
Vacaciones	12.00	Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	1.00	Prestaciones por contrato (anexar	
Condiciones Climatologicas	1.00	copia del contrato y analisis correspon.)	
Horas inactivas por arrastre		**TOTAL Tp =**	383.00
Dias no trabajados por guardia	0.00		
TOTAL TI =	287.00	Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantia en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO013**
CATEGORIA (S): **OF. ELECTRICISTA**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACION: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO014**
CATEGORIA (S): **OF. PLOMERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
còpia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO017**
CATEGORIA (S): **OF. HERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÒN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO018**
CATEGORIA (S): **OF. SOLDADOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00	Dias Calendario (DICAL)	365.00
Dias no Trabajados		Aguinaldo por Ley	15.00
Domingos	52.00	Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Dias festivos por Ley	7.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Dias por costumbre	5.00	Tiempo Extra	
Dias sindicato	0.00	Horas extras gravables en el SBC	0.00
Vacaciones	12.00	Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	1.00	Prestaciones por contrato (anexar	
Condiciones Climatologicas	1.00	copia del contrato y analisis correspon.)	
Horas inactivas por arrastre		**TOTAL Tp =**	383.00
Dias no trabajados por guardia	0.00		
		Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02
TOTAL TI =	287.00		

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	**En Veces SMDF**
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO021**
CATEGORIA (S): **OF. PINTOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO		DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00	Dias Calendario (DICAL)	365.00
Dias no Trabajados		Aguinaldo por Ley	15.00
Domingos	52.00	Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Dias festivos por Ley	7.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Dias por costumbre	5.00	Tiempo Extra	
Dias sindicato	0.00	Horas extras gravables en el SBC	0.00
Vacaciones	12.00	Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	1.00	Prestaciones por contrato (anexar	
Condiciones Climatologicas	1.00	copia del contrato y analisis correspon.)	
Horas inactivas por arrastre		**TOTAL Tp =**	383.00
Dias no trabajados por guardia	0.00		
		Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02
TOTAL TI =	287.00		

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	**En Veces SMDF**
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

UBICACIÓN: COL. COMERCIAL ACAPULCO

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO032**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,496,873.38

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	11,649.12	0.7782%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	28,822.80	1.9255%	57,800.00	3.8614%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	10,561.69	0.7056%	54,500.00	3.6409%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**51,033.61**		**112,300.00**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	2,993.75	0.2000%	1,496.87	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	1,496.87	0.1000%	2,245.31	0.1500%
c. Bodegas	1,122.66	0.0750%	2,245.31	0.1500%
d. Instalaciones Generales	1,197.50	0.0800%	1,496.87	0.1000%
e. Muebles y enseres	673.59	0.0450%	748.44	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	898.12	0.0600%	2,245.31	0.1500%
g. Campamentos			1,496.87	0.1000%
SUBTOTALES	**8,382.49**		**11,974.99**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			2,993.75	0.2000%
b. Estudios e Investigación	2,993.75	0.2000%	2,245.31	0.1500%
SUBTOTALES	**2,993.75**		**5,239.06**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			1,122.66	0.0750%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			3,742.18	0.2500%
SUBTOTALES			**4,864.84**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papeleria y útiles de escritorio	1,496.87	0.1000%		
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	299.37	0.0200%		
c. equipo de computación				
d. Situación de fondos				
e. Copias y duplicados	374.22	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	673.59	0.0450%	149.69	0.0100%
g. Gastos de la licitación	1,272.34	0.0850%		
SUBTOTALES	**4,116.40**		**149.69**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**1,272.34**	0.0850%	**149.69**	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**1,272.34**	0.0850%	**149.69**	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	4,490.62	0.3000%		
b. Primas por Fianzas	2,245.31	0.1500%	8,858.59	0.5918%
SUBTOTALES	**6,735.93**		**8,858.59**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			1,459.45	0.0975%
2. De equipo de construcción			1,291.80	0.0863%
3. De plantas y elementos para instalaciones			1,187.02	0.0793%
4. Letrero nominativo de obra			1,098.71	0.0734%
SUBTOTALES			**5,036.98**	
TOTALES	75,806.87	5.0643%	148,723.51	9.9356%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

TOTALES $ 224,530.38 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 1,496,873.38

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	51,033.61	3.4093%	112,300.00	7.5023%	163,333.61	10.9117%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	8,382.49	0.5600%	11,974.99	0.8000%	20,357.48	1.3600%
III. SERVICIOS	2,993.75	0.2000%	5,239.06	0.3500%	8,232.80	0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS			4,864.84	0.3250%	4,864.84	0.3250%
V GASTOS OFICINA	4,116.40	0.2750%	149.69	0.0100%	4,266.09	0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1,272.34	0.0850%	149.69	0.0100%	1,422.03	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	1,272.34	0.0850%	149.69	0.0100%	1,422.03	0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	6,735.93	0.4500%	8,858.59	0.5918%	15,594.52	1.0418%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			5,036.98	0.3365%	5,036.98	0.3365%
TOTALES	75,806.87	5.0643%	148,723.51	9.9356%	224,530.38	15.0000%

TOTALES $ 224,530.38 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO
LUGAR: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	1,496,873.38	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	10.0000%	% APLICABLE AL PERIODO	
INDIRECTO DE OBRA:	15.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.1233%	
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	1,721,404.39	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0274%	LOP ART. 54 P. 1 y 2	
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	1,893,549.07	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41		

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	TIIE A 28 DIAS
30.00%	0.00%	1,893,549.07	0.00	568,064.72	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio		%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00		2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio		%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Ipa2=Spa1+2do.anticipo	0.00	0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION 1
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
0	568,064.72	0.00		568,064.72	0.00	0.00	568,064.72	568,064.72	0.00
SEM 1	0.00	68,541.29	20,562.39	47,978.90	62,310.12	0.00	-14,331.22	553,733.50	0.00
SEM 2	0.00	68,541.30	20,562.39	47,978.91	62,310.13	0.00	-14,331.22	539,402.28	0.00
SEM 3	0.00	229,399.16	68,819.75	160,579.41	208,544.22	0.00	-47,964.81	491,437.47	0.00
SEM 4	0.00	229,399.16	68,819.75	160,579.41	208,544.22	0.00	-47,964.81	443,472.65	0.00
SEM 5	0.00	307,224.09	92,167.23	215,056.86	279,294.00	0.00	-64,237.14	379,235.52	0.00
SEM 6	0.00	307,224.09	92,167.23	215,056.86	279,294.00	0.00	-64,237.14	314,998.38	0.00
SEM 7	0.00	10,848.58	3,254.57	7,594.01	9,862.32	0.00	-2,268.32	312,730.06	0.00
SEM 8	0.00	10,848.58	3,254.57	7,594.01	9,862.32	0.00	-2,268.32	310,461.74	0.00
SEM 9	0.00	266,659.42	79,997.83	186,661.59	242,417.11	0.00	-55,755.52	254,706.23	0.00
SEM 10	0.00	266,659.42	79,997.83	186,661.59	242,417.11	0.00	-55,755.52	198,950.71	0.00
SEM 11	0.00	30,243.78	9,073.13	21,170.65	27,494.28	0.00	-6,323.64	192,627.07	0.00
SEM 12	0.00	66,709.08	20,012.72	46,696.36	60,644.48	0.00	-13,948.13	178,678.94	0.00
SEM 13	0.00	31,251.12	9,375.34	21,875.78	28,410.05	0.00	-6,534.26	172,144.68	0.00
TOTALES	568,064.72	1,893,549.07		1,893,549.07	1,721,404.39	0.00		(-)	0.00
				0.00					

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 0.00 / 1,721,404.39 %= 0.0000%

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES)
DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

Lugar: COL. COMERCIAL ACAPULCO

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		1,496,873.38	
CI	I.-INDIRECTO		224,530.38	15.0000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			5.8000%
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		55,084.92	32.00%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		17,214.04	10.00%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (ISR+PTU)]	%U =5.8 % / [1- (32%+ 10%)]		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	($ 1,496,873.38 + $ 224,530.38 + $ 0.00) * 10% =	172,140.38	
	TOTAL UTILIDAD		172,140.38	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 172,140.38 / ($ 1,496,873.38 + $ 224,530.38 + $ 0.00)] * 100%		10.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

LIC. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

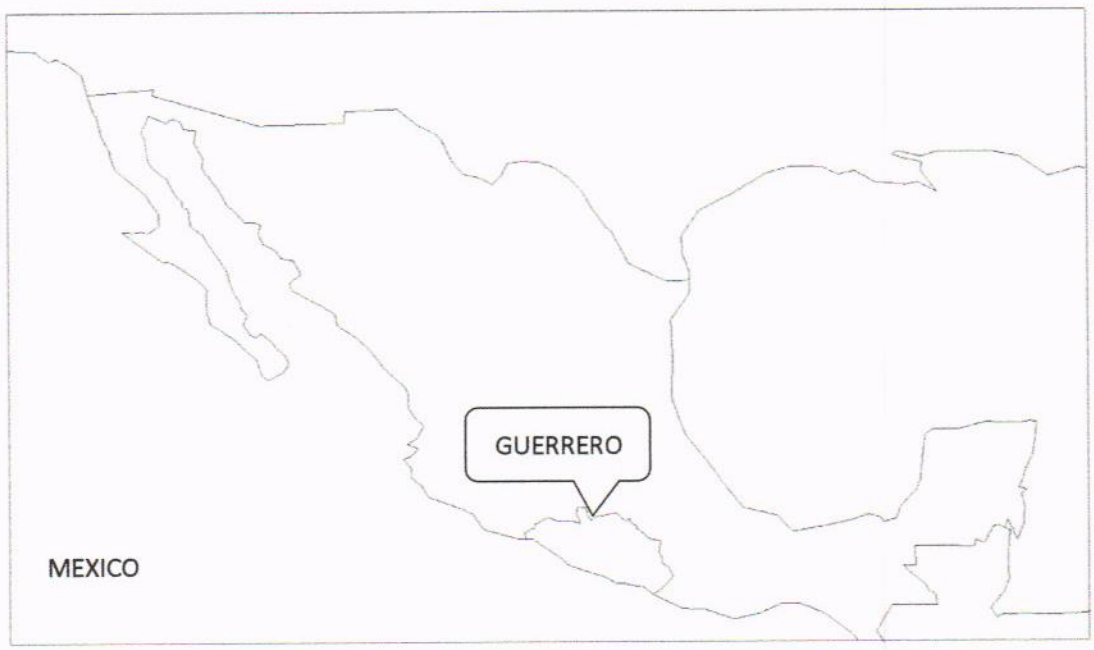

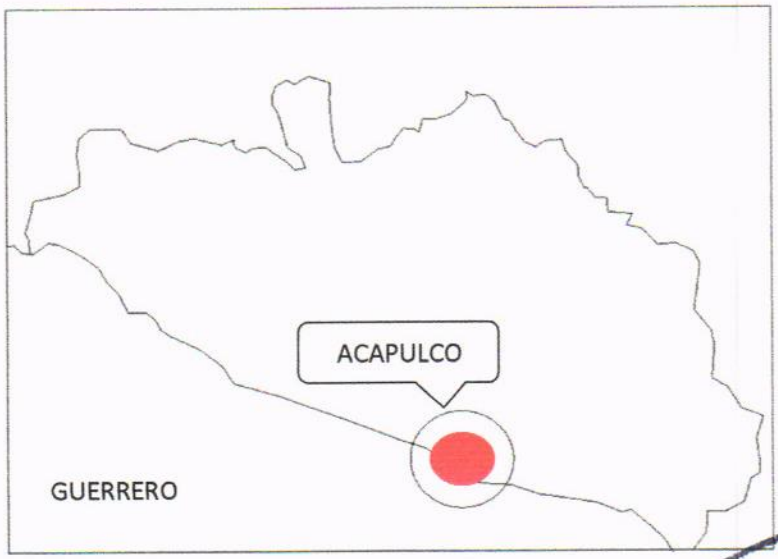

LATITUD: 16°51'32.0"N

LONGITUD: 99°54'09.0"W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR MUNICIPIO:

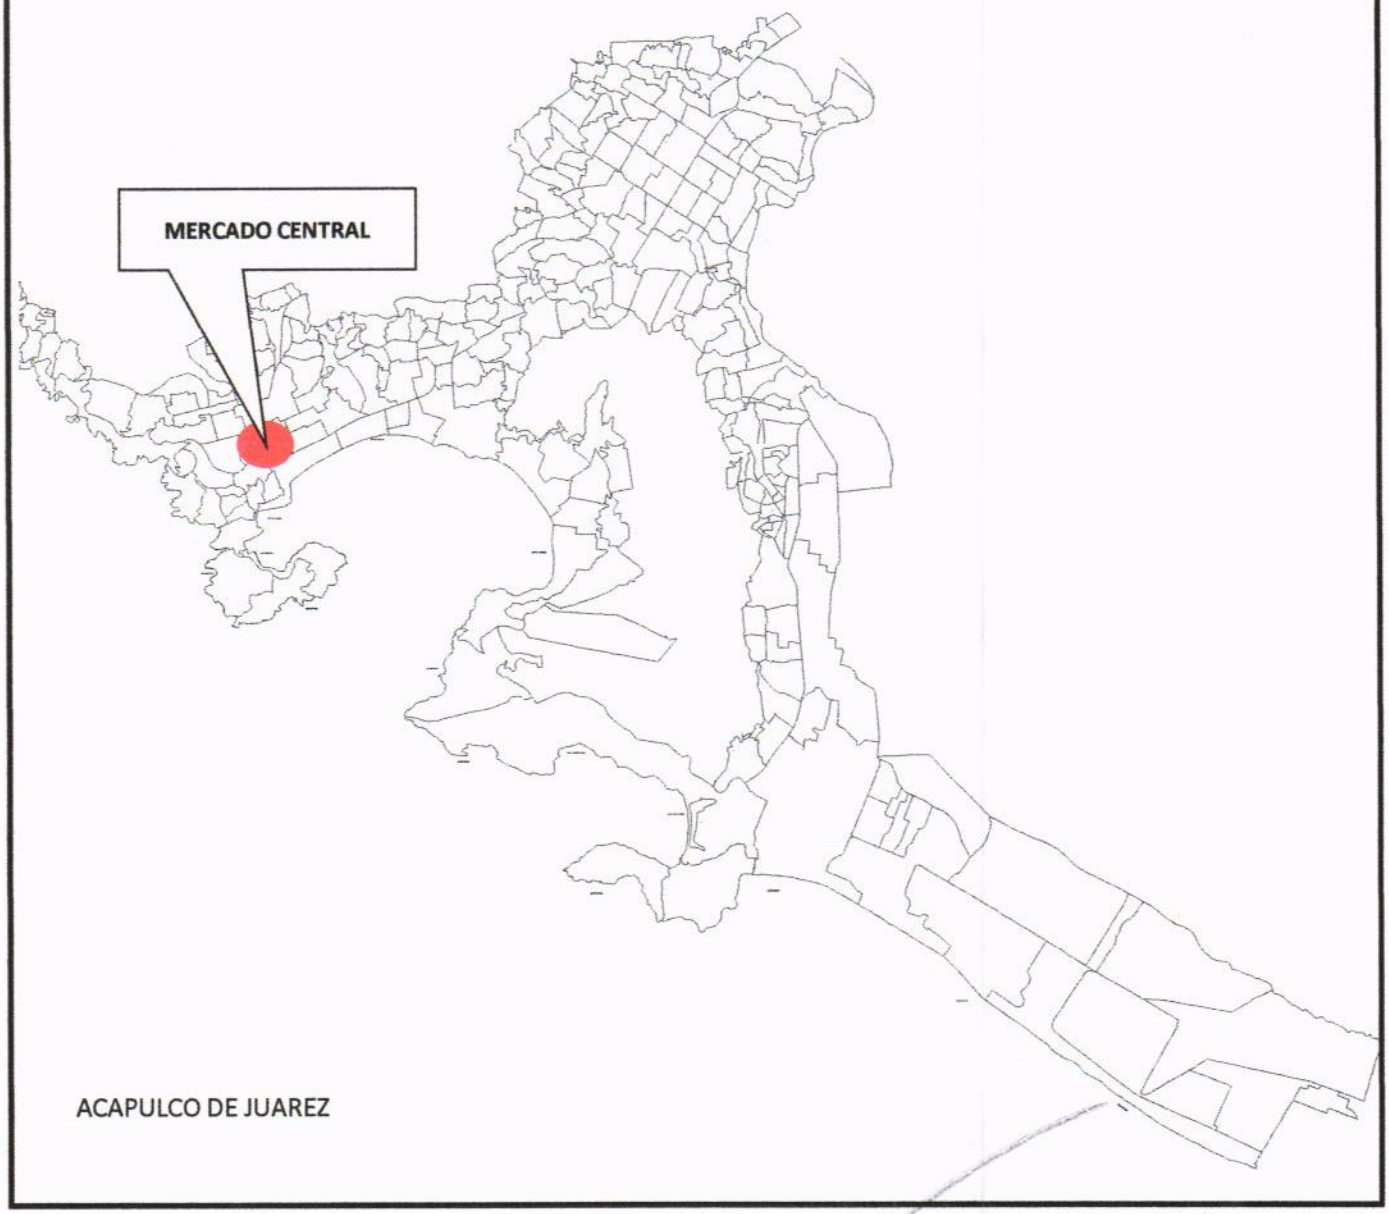

ACAPULCO DE JUAREZ

LATITUD: 16°51'32.0"N

LONGITUD: 99°54'09.0"W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR COLONIA:

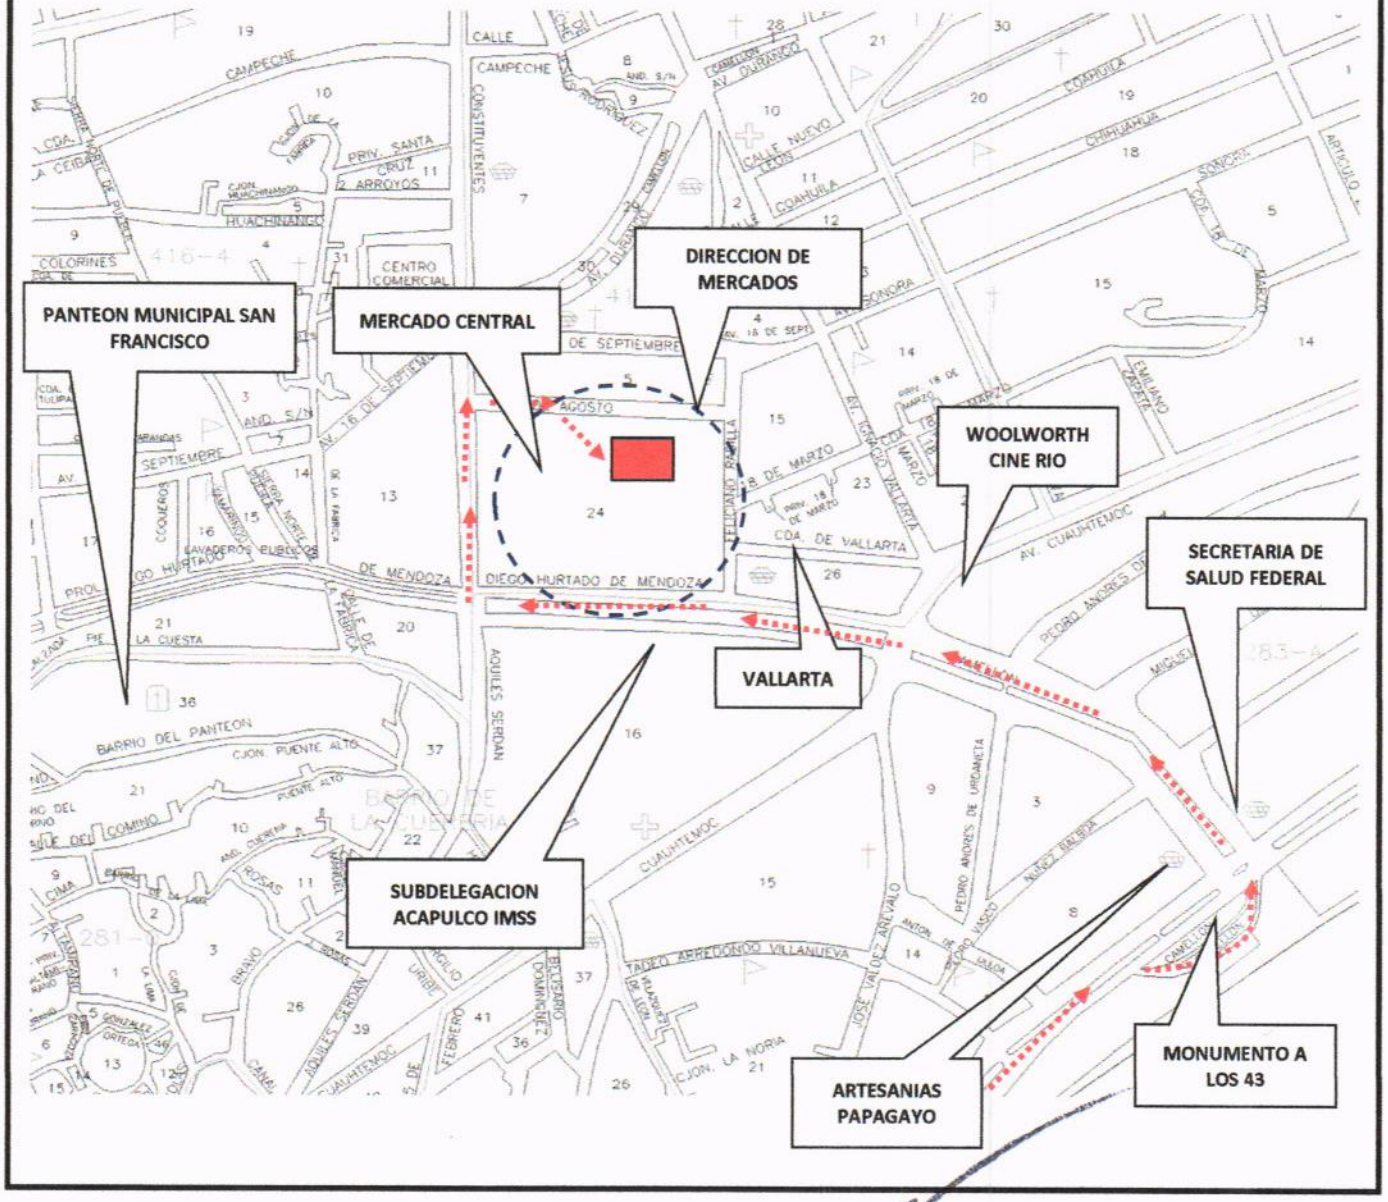

LATITUD: 16°51'32.0"N

LONGITUD: 99°54'09.0"W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:

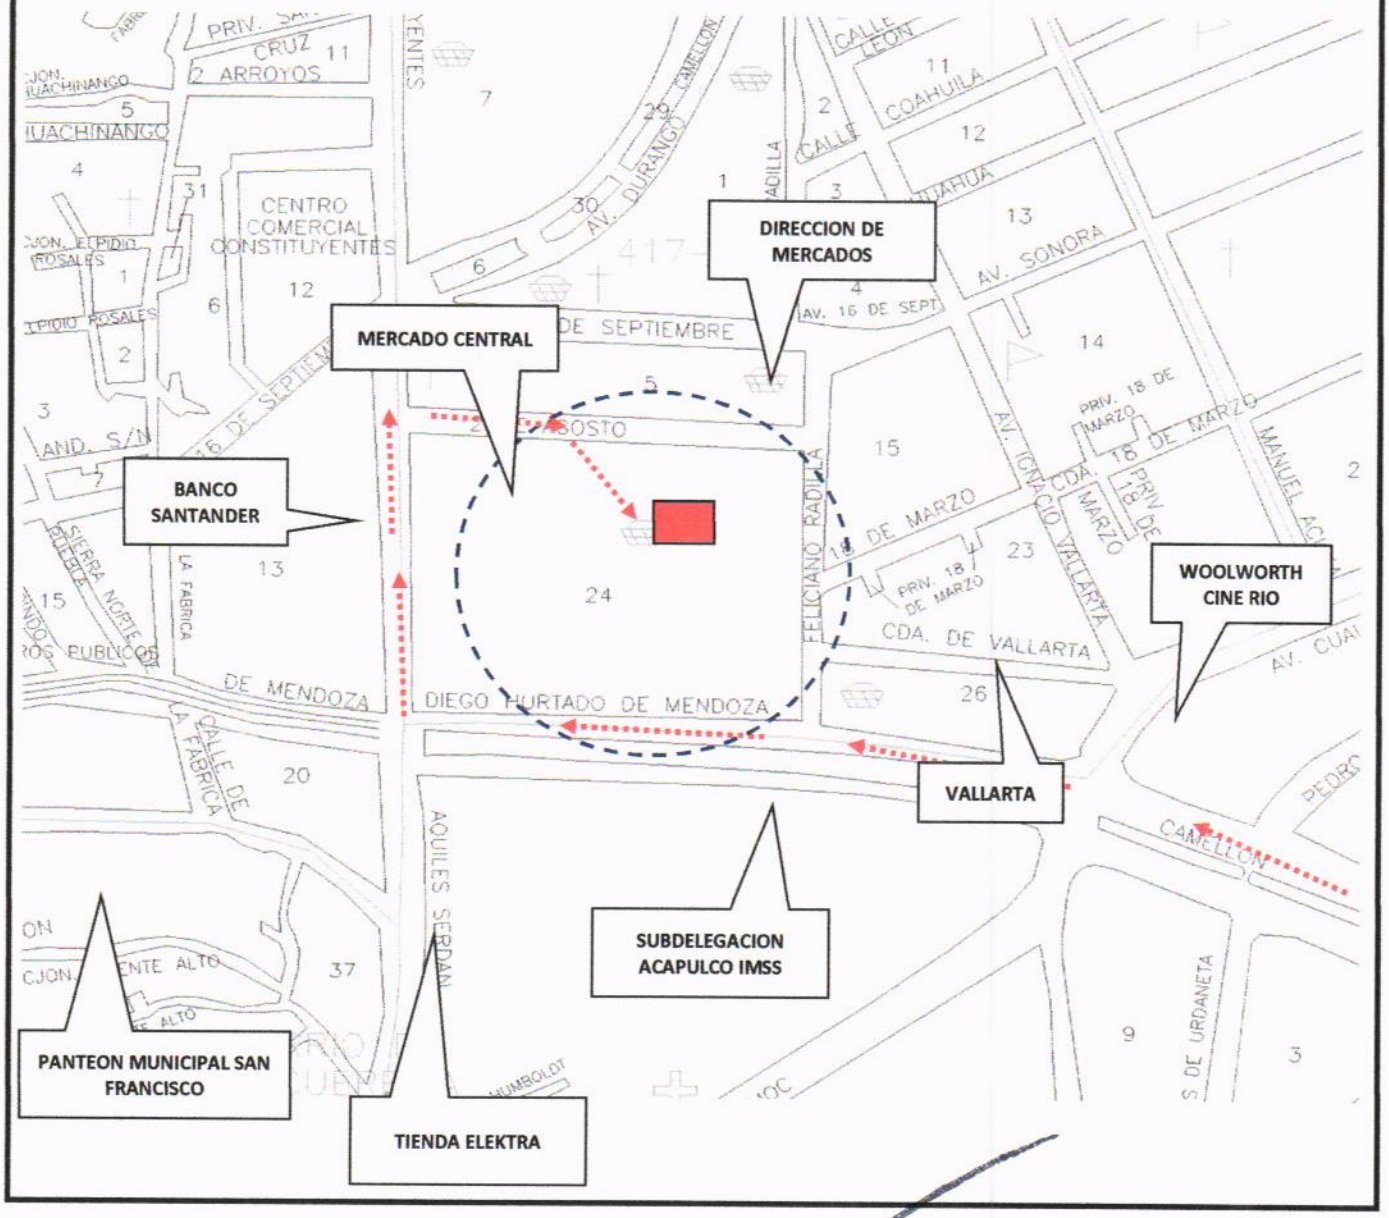

LATITUD: 16°51'32.0"N

LONGITUD: 99°54'09.0"W

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5


OBRA-. REHABILITACION DE MERCADO NAVE DE FONDAS (AREAS GENERALES) DEL MERCADO CENTRAL DE ACAPULCO

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO

LOCALIDAD: COL. COMERCIAL ACAPULCO

POR CALLE:

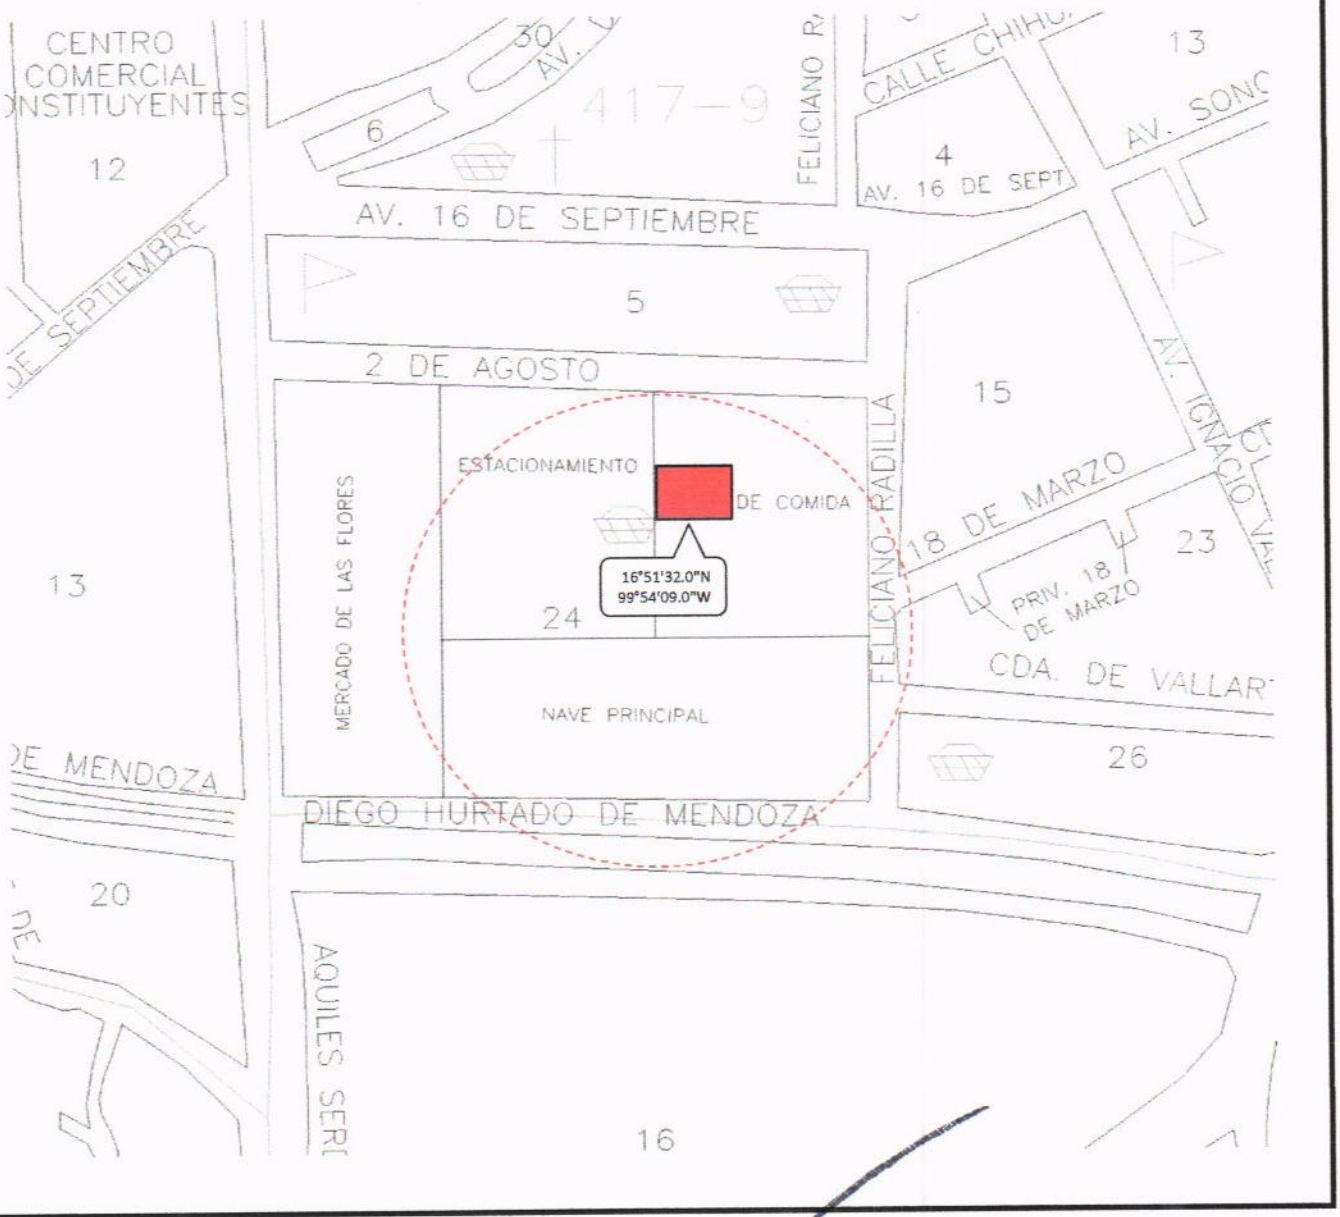

LATITUD: 16°51'32.0"N

LONGITUD: 99°54'09.0"W

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS
