194

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FODO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS.**

UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS.**

CONTRATISTA: **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**

NUMERO DE: **ZONA DE ATENCION PRIORITARIA (ZAP) 1672**

CLAVE DE LA LOCALIDAD:**12001 001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 1672**

ORIGINAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS. COL. JARDIN MANGOS

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	23-dic.-23	MARCELINO LUNA ALEJANDRO FACTURA 125	432,000.00	133,324.14	298,675.86
		SUBTOTAL $	432,000.00	**133,324.14**	298,675.86
		TOTAL $	**432,000.00**	**133,324.14**	**298,675.86**

sábado 23 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 1134

19 DE MARZO DE 2024

Paguese vía transferencia a:
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

La cantidad de:
298,675.86

(** DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
		19/03/2024 1134	298,675.86
	Cuenta		

Concepto
Pago de solicitudes : 1501-1270, PAGO FACTURA NO.125 EST. 02 (DOS Y FINIQUITO) REHABILITACION DE PAR QUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, COL. JARDÍN MANGOS, CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III 2023 (DPCP/880-FIII/2023) Con facturas : CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A,

Facturas: CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A,

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00365	Generado por cuenta por pagar	298,675.86	
11120-00000-02005-00005	MARCELINO LUNA ALEJANDRO		298,675.86
		298,675.86	298,675.86

Solicitud de pago 504 1082

Póliza 11 3 109

OPERADO
FISM 2023

Elaboró	Revisó	Autorizó
JCM	LRMO	CAMR

Santander

1134

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 3P748

Referencias del Movimiento: 563123P748

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 65508744941 - MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Importe: $ 298,675.86 MXN

Concepto: R33FIII F125 EST2 REHAB PARQUE PUBLICO

Fecha aplicación: 19/03/2024

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

OPERADO
FAISMUN - 2023

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

RFC EMISOR: **LUAM920218FK4**

DOMICILIO: **CALLE EMILIANO ZAPATA, NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEXICO**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS**
NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **10 DE OCTUBRE DE 2023**
PERIODO DE CONTRATO: **20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023**
PERIODO ESTIMADO: **20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$1,080,000.00**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$324,000.00**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **117.33 M2 M2**
METAS ALCANZADAS **100 %**
No. DE OBRA: **MAJ/539**

OPERADO
FAISMUN - 2023

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE $ 298,675.86 (* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.*) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 (DOS Y FINIQUITO) , DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN LA COL. JARDIN MANGOS , DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

DEDUCCIONES:

Amort. Anticipo	**$129,600.00**
5 AL MILLAR C.M.I.C.	**$1,862.07**
5 al Millar INSP. DE OBRAS	**$1,862.07**
TOTAL DE DEDUCCIONES:	**$133,324.14**

CALCULO DE LA ESTIMACION

Estimación C/IVA:	**$**	**432,000.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$**	**133,324.14**
SALDO A PAGAR:	**$**	**298,675.86**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15/NOV/2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUBTOTAL:	**$**	**260,689.66**
IVA 16%	**$**	**41,710.34**
5 AL MILLAR C.M.I.C.		**$1,862.07**
5 al Millar INSP. DE OBRAS		**$1,862.07**
TOTAL:	**$**	**298,675.86**

(* DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.*)

Servicios en ingeniería civil

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

LUAM920218FK4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AYUNTAMIENTO, 24, La Villa, 39200, Ayutla de los Libres, Ayutla de los Libres, Guerrero, México
Tel. 7451070859

CLIENTE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

MAJ010101NA3

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 39350

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 125

FOLIO FISCAL (UUID)
CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700199165
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-12-23T10:20:07
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-12-23T10:06:58
LUGAR DE EXPEDICIÓN
39200

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.50%	5 al millar C.M.I.C	$ 1,862.07
0.50%	5 AL MILLAR INSP.DE OBRA	$ 1,862.07
	Total	$ 3,724.14

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	ESTIMACION No.02 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA :REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION:COL. JARDIN MANGOS , CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023 /AD DE FECHA:10 DE OCTUBRE DE 2023 PERIODO DE CONTRATO:20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Clave Prod. Serv. - 70151805 Servicios de conservación de parques o reservas forestales Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 260689.66 Tasa - 0.160000 Importe - $ 41,710.34	$ 260,689.66	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 260,689.66

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 86/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 260,689.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 41,710.34
RETENCIÓN LOCAL 5 al millar C.M.I.C 0.50%	$ 1,862.07
RETENCIÓN LOCAL 5 AL MILLAR INSP.DE OBRA 0.50%	$ 1,862.07
TOTAL	$ 298,675.86

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B3rAQZj8doqZ6vm9GDgY8RLLIK7W+SmRKgxhIJO/NT2dUeTfiICjw4DsOpuFCU7ZR6ZPG4qWuRIYLunjg7sTIAbv8nM0n050fvY8mKvQ1v8CaQT6IKA6Np1UPaG4EEZvAGG/ttKz6eGZKRk9o+5URvYGQbmyUsrVJIIXCjEYrX/2F2P5qOwd6W81WRuWd5mpP5F/R2DeFOoUFU+yGP7EsAs+ZbUBW6AFFNTLrZYgP3Pm0qnNeCCIpi5OAT3ukBwdvRWox5Dh8yXa20jugqUFK0hrzRyB2mdg7qtvnOI1bK597+UU//IEshci18EA1G1cmdHdmX7AThIN8N88RC0KUg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mVathpyYoeFIWzdzGVyduU7bI4KfgIb1B70OLfupr+OjQHp+pIGWc5q66j56AAcv/nuxCz05dcQza2Jv5le6a5EdAwnSTTQVzu54UttiYUkN8DQ7orrAAIMvo1dCF5h+8DqOvc0KJuEwkSRJVHX8SzB+GlzlcrWWGeiCUqSP01QjTkUN8nf/13RXcNoK2MYkaAVRcDWAZiFd2X8RiV8TMNqrJAR59IU2QJR+IrcmQrHgZuMO7AsxXo7VIIU3SLtnTVc4nzLXG5xyGc7RphY8Q1qGK1byqqMH1Kx1P5ekM6voS6Nx9/mISjUx0iVzm2hjl141IE582Pv67UJyVvEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A|2023-12-23T10:20:07|STA0903206B9|B3rAQZj8doqZ6vm9GDgY8RLLIK7W+SmRKgxhIJO/NT2dUeTfiICjw4DsOpuFCU7ZR6ZPG4qWuRIYLunjg7sTIAbv8nM0n050fvY8mKvQ1v8CaQT6IKA6Np1UPaG4EEZvAGG/ttKz6eGZKRk9o+5URvYGQbmyUsrVJIIXCjEYrX/2F2P5qOwd6W81WRuWd5mpP5F/R2DeFOoUFU+yGP7EsAs+ZbUBW6AFFNTLrZYgP3Pm0qnNeCCIpi5OAT3ukBwdvRWox5Dh8yXa20jugqUFK0hrzRyB2mdg7qtvnOI1bK597+UU//IEshci18EA1G1cmdHdmX7AThIN8N88RC0KUg==|00001000000506204896||

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="298675.86" Moneda="MXN" SubTotal="260689.66"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDAxOTkxNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
NoCertificado="00001000000700199165" FormaPago="99"
Sello="B3rAQZj8doqZ6vm9GDgY8RLLIK7W+SmRKgxhlJO/NT2dUeTfiICjw4DsOpuFCU7ZR6ZPG4qWuRIYLunjg7sTIAbv8nM0n050fvY8mKvQ1v8CaQT6IK
Fecha="2023-12-23T10:06:58" Folio="125" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARCELINO LUNA ALEJANDRO" Rfc="LUAM920218FK4"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="260689.66" ValorUnitario="260689.66" Descripcion="ESTIMACION No.02 (DOS Y FINIQUITO) DE LA
        OBRA :REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION:COL. JARDIN MANGOS , CON CARGO AL FONDO III
        RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023 /AD DE FECHA:10 DE OCTUBRE DE 2023
        PERIODO DE CONTRATO:20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
        ClaveProdServ="70151805">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="41710.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="260689.66"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="41710.34">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="41710.34" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="260689.66"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="3724.14" version="1.0">
          <implocal:RetencionesLocales Importe="1862.07" TasadeRetencion="0.50" ImpLocRetenido="5 al millar C.M.I.C"/>
          <implocal:RetencionesLocales Importe="1862.07" TasadeRetencion="0.50" ImpLocRetenido="5 AL MILLAR INSP.DE OBRA"/>
        </implocal:ImpuestosLocales>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
            SelloSAT="mVslhpyYooFIWxdzGVyxluU7bl4KfgIb1B70OLfupr+OjQHp+plGWc5q66j56AAcv/nuxCz05dcQza2Jv5Ie6a5EdAwnSTTQVzu54UttiYU
            NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
            SelloCFD="B3rAQZj8doqZ6vm9GDgY8RLLIK7W+SmRKgxhlJO/NT2dUeTfiICjw4DsOpuFCU7ZR6ZPG4qWuRIYLunjg7sTIAbv8nM0n050fvY8m
            FechaTimbrado="2023-12-23T10:20:07" UUID="CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUAM920218FK4	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
CB1E6CEB-EFB2-43BD-AF98-163FD8C79F4A	2023-12-23T10:06:58	2023-12-23T10:20:07	STA0903206B9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$298,675.86	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISION FISCAL POSITIVA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 18 del mes de DICIEMBRE del año 2023, a las 12:00 horas en el domicilio Col. JARDIN MANGOS, localizado en el municipio ACAPULCO DE JUAREZ, de la entidad federativa GUERRERO, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 18 DE DICIEMBRE DE 2023			
Nombre de la obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS			
Folio asignado en la MIDS: 374909		Monto total planeado: $1080,000.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 20/10/23	Fecha de conclusión: 18/12/23	
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO	Localidad: Col. JARDIN MANGOS	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: Parque Público		Monto: $ 801,600.00	
Subclasificación: Alumbrado Público		Monto: 278,400.00	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO DIRECCION DE PLANEACION

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA DE JUAREZ

M. SALVADOR DIAZ LOPEZ
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

NANCY MINERVA CISNEROS TICAS
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

SALVADOR LUZ ESPIRITU BALDERRAMA
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

INES YOJEL ESPIRITU BALDERRAMA
Vocal
Nombre completo y firma

PEDRO JUAN BELLO CRUZ
Vocal
Nombre completo y firma

JOSE LEOPOLDO PEREZ BATAS
Vocal
Nombre completo y firma

ROSA ELDA DAMIAN MEDINA
Testigo
Nombre completo y firma

SILVIA AGUIRRE CABRERA
Testigo
Nombre completo y firma

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 18 DE DICIEMBRE DE 2023		
Nombre de la obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS		
Folio asignado en la MIDS: 374909	Monto total planeado: $1'080,000.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 20/10/23	Fecha de conclusión: 18/12/23
Entidad: GUERRERO	Municipio: ACAPULCO	Localidad: COL. JARDIN MANGOS
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación: Parque Público	Monto: $ 801,600.00	
Subclasificación: Alumbrado Público	Monto: 278,400.00	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

2

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí.	✓
b) No, concluyó antes de la fecha informada.	
c) No, concluyó después de la fecha informada.	
d) No ha concluido.	

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [✓]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. 2021-2024
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

- MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES
- CONTAR CON ADECUADOS SERVICIOS DE RECREACION Y BIENESTAR CULTURAL

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Nancy Mendoza Cisneros Flores
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Sandra Luz Espinoza Balderrama
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Ixel Yisel Espinoza Balderrama
Vocal
Nombre completo y firma

Pedro Julian Bello Cruz
Vocal
Nombre completo y firma

Jose Leopoldo Perez Bates
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. Alejandro Diaz Lopez
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	DEL: 20-nov-23
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	AL: 18-dic-23
TIPO DE OBRA: URBANIZACION		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$1,080,000.00	**DEL: 20 de oct de 2023**	**AL: 18 de dic de 2023**	**$324,000.00**	**8 de diciembre de 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	DEL: 20-oct-23 AL: 19-nov-23	$558,620.69	$89,379.31	$2,793.10	$2,793.10	$194,400.00	$199,986.20	$448,013.80
2 (DOS Y FINIQUITO)	DEL: 20-nov-23 AL: 18-dic-23	$372,413.79	$59,586.21	$1,862.07	$1,862.07	$129,600.00	$133,324.14	$298,675.86
	TOTAL	**$931,034.48**	**$148,965.52**	**$4,655.17**	**$4,655.17**	**$324,000.00**	**$333,310.34**	**$746,689.66**
	SALDO	**$0.00**			**SALDO POR AMORTIZAR**	**$0.00**		

CONTRATISTA
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I O N

	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-nov-23
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	AL: 18-dic-23
	CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**	
		$0.00
A01	**PRELIMINARES**	**$0.00**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**	**$0.00**
A03	**ALUMBRADO**	**$208,796.75**
A04	**HERRERIA**	**$132,244.10**
A05	**ACABADOS**	**$28,597.60**
A06	**JARDINERIA**	**$2,775.34**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	
	TOTAL DE PARTIDAS $	**372,413.79**
	SUBTOTAL $	**372,413.79**
	16% I.V.A. $	**59,586.21**
	TOTAL $	**432,000.00**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 432,000.00 (* CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.*)

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR	60.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL	40.00%
AVANCE FINANCIERO TOTAL	100.00%

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

E S T I M A C I O N

MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	DEL: 20-nov-23
	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	AL: 18-dic-23
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 1 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**								
A01	**PRELIMINARES**								
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	$38.01	505.3600	332.0200	0.0000	332.0200	0.0000	$0.00
DESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.	M2	$11.56	280.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	$509.39	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.	M2	$28.91	102.7100	98.0000	0.0000	98.0000	0.0000	$0.00
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	$256.97	14.0000	18.0000	0.0000	18.0000	4.0000	$0.00
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANITILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$382.04	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total PRELIMINARES								**$0.00**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**								
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$84.63	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$122.87	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	$3,762.42	10.0000	8.0000	0.0000	8.0000	0.0000	$0.00
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	$1,744.72	2.0000	4.0000	0.0000	4.0000	2.0000	$0.00
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$0.00**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I O N

	MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	DEL: 20-nov-23
		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	AL: 18-dic-23
	CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 2 DE: 4

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$10,091.35	2.0000	3.0000	0.0000	3.0000	1.0000	$0.00
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	PZA	$5,500.00	1.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	$0.00
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA								**$0.00**
A03	**ALUMBRADO**								
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$2,500.67	8.0000	10.0000	0.0000	10.0000	2.0000	$0.00
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	$30,000.00	8.0000	10.0000	0.0000	10.0000	2.0000	$0.00
	Total ALUMBRADO								**$0.00**
A04	**HERRERIA**								
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	$23,249.44	6.0000	5.0000	6.3800	11.3800	5.3800	$148,331.43
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.	M2	$310.02	102.7100	78.8200	19.1800	98.0000	0.0000	$5,946.18
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	$3,304.19	1.8000	0.0000	16.5000	16.5000	14.7000	$54,519.14
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$208,796.75**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

E S T I M A C I O N

MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	DEL: 20-nov-23
	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	AL: 18-dic-23
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 3 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.	PZA	$130,930.00	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total HERRERIA								**$208,796.75**
A05	**ACABADOS**								
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	$122.00	505.3600	0.0000	333.0900	333.0900	0.0000	$40,636.98
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	$128.59	25.0000	0.0000	33.0000	33.0000	8.0000	$4,243.47
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$61.29	780.0000	0.0000	831.2400	831.2400	51.2400	$50,946.70
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$154.44	241.9600	0.0000	235.8000	235.8000	0.0000	$36,416.95
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$37.66	142.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total ACABADOS								**$132,244.10**
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$132,244.10**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

E S T I M A C I O N		ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-nov-23
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 18 de diciembre de 2023	AL: 18-dic-23
	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 4 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A06	**JARDINERIA**								
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..	M3	$529.56	56.0000	0.0000	10.0000	10.0000	0.0000	$5,295.60
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	M2	$172.19	280.0000	0.0000	100.0000	100.0000	0.0000	$17,219.00
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	PZA	$121.66	140.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	$6,083.00
	Total JARDINERIA								**$28,597.60**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	$331.00	26.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	$8.80	117.3300	0.0000	315.3800	315.3800	198.0500	$2,775.34
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA								**$2,775.34**
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$31,372.94**

TOTAL DE ESTA ESTIMACION **$372,413.79**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I.VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
D I R E C C I O N D E O B R A S P U B L I C A S
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
FINIQUITO DE OBRA

ACAPULCO — BIENESTAR

MAJ/539	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	CONSTRUCTORA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	FECHA: 18 de diciembre de 2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)		**MONTO CONTRATADO:** $1,080,000.00	HOJA: 1 DE: 4
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA.		**MONTO ESTIMADO:** $1,080,000.00	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	U	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - CONCEPTOS NO EJECUTADOS			VARIACIONES + CONCEPTOS ADICIONALES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**														
A01	**PRELIMINARES**														
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	505.3600	$38.01	$19,208.73	332.0200	$38.01	$12,620.08	173.3400	$38.01	$6,588.65	0.0000	$38.01	$0.00	1 (UNO)
DESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.	M2	280.0000	$11.56	$3,236.80	0.0000	$11.56	$0.00	280.0000	$11.56	$3,236.80	0.0000	$11.56	$0.00	
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	4.0000	$509.39	$2,037.56	0.0000	$509.39	$0.00	4.0000	$509.39	$2,037.56	0.0000	$509.39	$0.00	
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.	M2	102.7100	$28.91	$2,969.35	98.0000	$28.91	$2,833.18	4.7100	$28.91	$136.17	0.0000	$28.91	$0.00	1 (UNO)
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	14.0000	$256.97	$3,597.58	18.0000	$256.97	$4,625.46	0.0000	$256.97	$0.00	4.0000	$256.97	$1,027.88	1 (UNO)
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.0000	$382.04	$2,292.24	0.0000	$382.04	$0.00	6.0000	$382.04	$2,292.24	0.0000	$382.04	$0.00	
	Total PRELIMINARES				**$33,342.26**			**$20,078.72**			**$14,291.42**			**$1,027.88**	
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**														
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.0000	$84.63	$846.30	0.0000	$84.63	$0.00	10.0000	$84.63	$846.30	0.0000	$84.63	$0.00	
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15.0000	$122.87	$1,843.05	0.0000	$122.87	$0.00	15.0000	$122.87	$1,843.05	0.0000	$122.87	$0.00	
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10.0000	$3,762.42	$37,624.20	8.0000	$3,762.42	$30,099.36	2.0000	$3,762.42	$7,524.84	0.0000	$3,762.42	$0.00	1 (UNO)
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	$1,744.72	$3,489.44	4.0000	$1,744.72	$6,978.88	0.0000	$1,744.72	$0.00	2.0000	$1,744.72	$3,489.44	1 (UNO)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBUI
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
D I R E C C I O N D E O B R A S P U B L I C A S
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
FINIQUITO DE OBRA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

MAJ/539	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	CONSTRUCTORA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	FECHA: 18 de diciembre de 2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	HOJA: 2 DE: 4
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)		**MONTO CONTRATADO:** $1,080,000.00	
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA.		**MONTO ESTIMADO:** $1,080,000.00	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	U	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - CONCEPTOS NO EJECUTADOS			VARIACIONES + CONCEPTOS ADICIONALES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.0000	$10,091.35	$20,182.70	3.0000	$10,091.35	$30,274.05	0.0000	$10,091.35	$0.00	1.0000	$10,091.35	$10,091.35	1 (UNO)
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	$5,500.00	$5,500.00	1.0000	$5,500.00	$5,500.00	0.0000	$5,500.00	$0.00	0.0000	$5,500.00	$0.00	1 (UNO)
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				**$69,485.69**			**$72,852.29**			**$10,214.19**			**$13,580.79**	
A03	**ALUMBRADO**														
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.0000	$2,500.67	$20,005.36	10.0000	$2,500.67	$25,006.70	0.0000	$2,500.67	$0.00	2.0000	$2,500.67	$5,001.34	1 (UNO)
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	8.0000	$30,000.00	$240,000.00	10.0000	$30,000.00	$300,000.00	0.0000	$30,000.00	$0.00	2.0000	$30,000.00	$60,000.00	1 (UNO)
	Total ALUMBRADO				**$260,005.36**			**$325,006.70**			**$0.00**			**$65,001.34**	
A04	**HERRERIA**														
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.0000	$23,249.44	$139,496.64	11.3800	$23,249.44	$264,578.63	0.0000	$23,249.44	$0.00	5.3800	$23,249.44	$125,081.99	1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.	M2	102.7100	$310.02	$31,842.15	98.0000	$310.02	$30,381.96	4.7100	$310.02	$1,460.19	0.0000	$310.02	$0.00	1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	1.8000	$3,304.19	$5,947.54	16.5000	$3,304.19	$54,519.14	0.0000	$3,304.19	$0.00	14.7000	$3,304.19	$48,571.60	2 (DOS Y FINIQUITO)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBUI
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ESOR-07
REV-1

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
FINIQUITO DE OBRA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FECHA: 18 de diciembre de 2023

MAJ/539	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	CONSTRUCTORA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	HOJA: 3 DE: 4
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)		**MONTO CONTRATADO:** $1,080,000.00	
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA.		**MONTO ESTIMADO:** $1,080,000.00	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	U	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - CONCEPTOS NO EJECUTADOS			VARIACIONES + CONCEPTOS ADICIONALES			ESTIMACION
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.	PZA	1.0000	$130,930.00	$130,930.00	0.0000	$130,930.00	$0.00	1.0000	$130,930.00	$130,930.00	0.0000	$130,930.00	$0.00	
	Total HERRERIA				**$308,216.33**			**$349,479.73**			**$132,390.19**			**$173,653.59**	
A05	**ACABADOS**														
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	505.3600	$122.00	$61,653.92	333.0900	$122.00	$40,636.98	172.2700	$122.00	$21,016.94	0.0000	$122.00	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	25.0000	$128.59	$3,214.75	33.0000	$128.59	$4,243.47	0.0000	$128.59	$0.00	8.0000	$128.59	$1,028.72	2 (DOS Y FINIQUITO)
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	780.0000	$61.29	$47,806.20	831.2400	$61.29	$50,946.70	0.0000	$61.29	$0.00	51.2400	$61.29	$3,140.50	2 (DOS Y FINIQUITO)
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	241.9600	$154.44	$37,368.30	235.8000	$154.44	$36,416.95	6.1600	$154.44	$951.35	0.0000	$154.44	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	142.4800	$37.66	$5,365.80	0.0000	$37.66	$0.00	142.4800	$37.66	$5,365.80	0.0000	$37.66	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
	Total ACABADOS				**$155,408.97**			**$132,244.10**			**$27,334.09**			**$4,169.22**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBUI
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
D I R E C C I O N D E O B R A S P U B L I C A S
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)
FINIQUITO DE OBRA

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

MAJ/539	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	CONSTRUCTORA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	FECHA: 18 de diciembre de 2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO: 1 (UNO), 2 (DOS Y FINIQUITO)		**MONTO CONTRATADO: $1,080,000.00**	HOJA: 4 DE: 4
MODALIDAD DE EJECUCION: ADJUDICACION DIRECTA.		**MONTO ESTIMADO: $1,080,000.00**	

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	U	CONTRATADO			ESTIMADO			VARIACIONES - CONCEPTOS NO EJECUTADOS			VARIACIONES + CONCEPTOS ADICIONALES			
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	ESTIMACION
A06	**JARDINERIA**														
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..	M3	56.0000	$529.56	$29,655.36	10.0000	$529.56	$5,295.60	46.0000	$529.56	$24,359.76	0.0000	$529.56	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	M2	280.0000	$172.19	$48,213.20	100.0000	$172.19	$17,219.00	180.0000	$172.19	$30,994.20	0.0000	$172.19	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	PZA	140.0000	$121.66	$17,032.40	50.0000	$121.66	$6,083.00	90.0000	$121.66	$10,949.40	0.0000	$121.66	$0.00	2 (DOS Y FINIQUITO)
	Total JARDINERIA				**$94,900.96**			**$28,597.60**			**$66,303.36**			**$0.00**	
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**														
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	26.1100	$331.00	$8,642.41	0.0000	$331.00	$0.00	26.1100	$331.00	$8,642.41	0.0000	$331.00	$0.00	
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	117.3300	$8.80	$1,032.50	315.3800	$8.80	$2,775.34	0.0000	$8.80	$0.00	198.0500	$8.80	$1,742.84	2 (DOS Y FINIQUITO)
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**$9,674.91**			**$2,775.34**			**$8,642.41**			**$1,742.84**	
	SUB-TOTAL				**$931,034.48**			**$931,034.48**			**$259,175.66**			**$259,175.66**	
	I. V. A. 16 %				**$148,965.52**			**$148,965.52**			**$41,468.11**			**$41,468.11**	
	TOTAL				**$1,080,000.00**			**$1,080,000.00**			**$300,643.77**			**$300,643.77**	

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONANDO CON EL CONTRATO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBU
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ESOR-07
REV-1

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

ACAPULCO, GRO. A 11 DE DICIEMBRE DE 2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE MARCELINO LUNA ALEJANDRO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCELINO LUNA ALEJANDRO ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE ACUERDO CON LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO. CABE MENCIONAR QUE ESTOS VOLUMENES ESTAN AVALADOS EN LA ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO), Y NO EXCEDE EL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO, POR LO QUE ENLISTO LOS SIGUENTES CONCEPTOS.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	$23,249.44	6.00	11.38	5.38	$125,081.99
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	$3,304.19	1.80	16.50	14.70	$48,571.59
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	$128.59	25.00	33.00	8.00	$1,028.72
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$61.29	780.00	831.24	51.24	$3,140.50
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	$8.80	117.33	315.38	198.05	$1,742.84

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

OFICIO: DOP/1458-1/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 12 DE DICIEMBRE DE 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
Representante legal de la Empresa:
MARCELINO LUNA ALEJANDRO
P R E S E N T E.

En relación al escrito, de fecha **11 DE DICIEMBRE DE 2023**, mediante el cual solicita la autorización para las cantidades adicionales a **5 (cinco) conceptos de obra**, referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**, formalizado a favor de su representada con fecha **10 DE OCTUBRE DE 2023**. Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,** en mi carácter de **Residente de Obra,** una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera procedente autorizar la ejecución de cantidades adicionales a los **5 (cinco) conceptos de obra** asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico**, No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de Mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS** , UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS** , **EN ACAPULCO DE JUÁREZ**, por un importe de Contrato de **$1,080,000.00** **UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.**

Con fecha 10 DE OCTUBRE DE 2023 , fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** , entre la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y la empresa contratista **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** para la ejecución de la obra **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS** , UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS** **, EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023

Con fecha 11 DE DICIEMBRE DE 2023 , fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** , para la ejecución de cantidades adicionales en 5 (cinco) conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** , solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1.En referencia a los trabajos de desmontaje de muebles sanitarios, suministro y colocación de portón de 3.00 mts. de altura, con solera de 6" x 3/8" como refuerzo horizontal, abajo y arriba, tubo de acero de 4" de diam. cedula 40, a cada 15 cms. libre entre tubo, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de los baños en el parque publico, estas son las causas fundamentales.

2. En el área exterioe los trabajos de suministro y colocación de portón de 3.00 mts. de altura, con solera de 6" x 3/8", puerta de herreria a base de perfil ptr 1"x1" cal.14, lamina zintro cal.20, angulo 1 1/4"x 1/8, solera de 1/2" 1/8, pintura esmalte comex en elementos metalicos, trabajo terminado, pintura de esmalte en tubo de 4" de diámetro y limpieza ultima general de obra para entrega con acopio y acarreo horizontal a 20.00 mts., estos no fueron considerados en su momento en el catalogo de conceptos por tal motivo se solicitan como volumen excedente.

• Con fecha 11 de diciembre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 17, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

• A través de la nota de bitácora No. 18 con fecha 12 de diciembre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los 5 (cinco) conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No.MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los 5 (cinco) conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No.MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los 5 (cinco) conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el artículo 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105 y 106 de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los 5 (cinco) conceptos de obra mencionados en el anexo 2.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los Artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como anexo 3.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
C.c.p. Archivo.

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	$23,249.44	6.00	11.38	5.38	$125,081.99
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	$3,304.19	1.80	16.50	14.70	$48,571.59
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	$128.59	25.00	33.00	8.00	$1,028.72
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$61.29	780.00	831.24	51.24	$3,140.50
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	$8.80	117.33	315.38	198.05	$1,742.84

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO — **PERIODO DE CONTRATO:** 20-oct-23 — 18-dic-23

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD — **IMPORTE DE CONTRATO:** $ 1,080,000.00

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — **PERIODO DE EJECUCION:** 20-nov-23 — 18-dic-23





POR.01.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3[illegible]MO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A[illegible]CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **5.38 M2**


PTAHERR.- PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION . **14.70 M2**





22-0335.- PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO A[illegible]ORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE A[illegible]REO EN 1RA. ESTACIÓN. **8.00 M2**

PINT-04.- PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO. **51.24 ML**

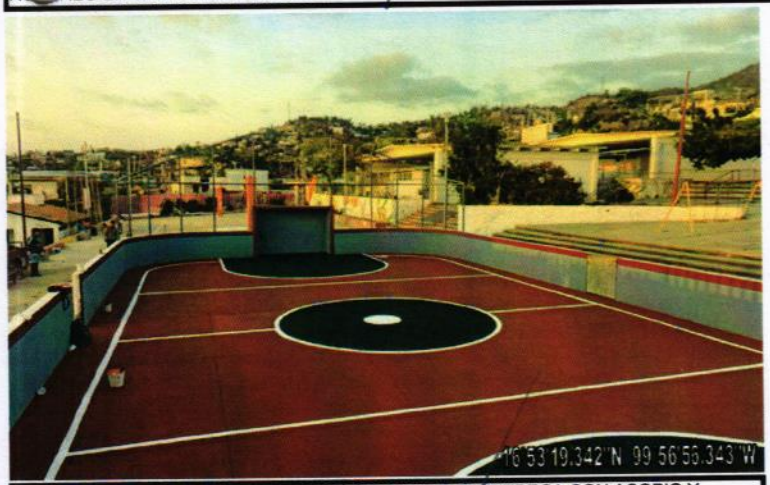

33-0528.- LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS. **198.05 M2**

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

D I R E C C I Ó N D E O B R A S P U B L I C A S

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL **18** DE **DICIEMBRE** DE **2023** HABIENDOSE VERIFICADO LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**
CONSISTENTES EN: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
U B I C A D A E N: **COL. JARDIN MANGOS**

SE PROCEDERA A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**
HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA EL: **ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR**

POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ESTUBO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISION Y VERIFICACION DE LA CORRECTA REALIZACION DE LA OBRA LA S U P E R V I S I O N: **ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ**

EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO FUE DE:
$1,080,000.00 (* UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)
I.V.A. INCLUIDO. HABIENDO EXISTIDO UN CONVENIO ADICIONAL POR UN MONTO TOTAL DE: **$ 0.00** I.V.A. INCLUIDO.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **20 de Octubre de 2023** , FECHA DE TERMINACION: **18 de Diciembre de 2023**

EL PERIODO REAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL CONVENIO ADICIONAL FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **20 de Octubre de 2023** , FECHA DE TERMINACION: **18 de Diciembre de 2023**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACION No. **1 (UNO)**	PERIODO DEL: **20 de Noviembre de 2023** AL: **19 de Noviembre de 2023**	**$648,000.00 I.V.A. INCLUIDO**
ESTIMACION No. **2 (DOS Y FINIQUITO)**	PERIODO DEL: **20 de Noviembre de 2023** AL: **18 de Diciembre de 2023**	**$432,000.00 I.V.A. INCLUIDO**

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
D I R E C C I Ó N D E O B R A S P U B L I C A S

SE HACE CONSTAR QUE EN ESTA ACTA POR PARTE DE AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN EL PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ ASI TAMBIEN SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTARES EN LOS TRABAJOS DEL OBJETO DEL C O N T R A T O No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA I NCURRIDO EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTIA DE LOS ANTES SEÑALADO, LA FIANZA No. **2245033** EXPEDIDA POR LA A F I A N Z A D O R A: **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION

INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA. PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SIENDO LAS: **14:30** HORAS DEL DIA DE SU INICIO SE CIERRA LA PRESENTE ACTA FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ.

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO DE JUAREZ.

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. : **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** Y CONVENIO No. _____
RELATIVO A LA OBRA:
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
UBICADA EN: **COL. JARDIN MANGOS**

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
INFORMACION BASICA INICIAL
ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a " EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en la _ **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS** _____ en la: **COL. JARDIN MANGOS** _____ y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de " **EL CONTRATISTA** ", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION: SEPLADE/321/2023

NÚMERO DEL CONCURSO:

FECHA DE ADJUDICACION: 10 DE OCTUBRE DE 2023

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 20 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **9:00 HORAS** DEL DIA **30 DE DICIEMBRE DE 2023** SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO,GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS DE LA DORECCION DE OBRAS PUBLICLAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION ",LOS CC. M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES, JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA.
LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**
EL **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** EN SU CARACTER DE PERSONA FISICA O MORAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA.

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO DE JUAREZ.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.
LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA ,
BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS.
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K,
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL,
PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX,

III.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA _____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOSORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA, REFERENTE _____ ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DEL 2020, **FIRMA DE CONVENIO**_____.

ANTICIPO: $ 324.000.00 **8 DE DICIEMBRE DEL 2023**

FIANZAS:

CONTRATO

DE CUMPLIMIENTO:	**2245033**	DE FECHA: **10 DE OCTUBRE DEL 2023**
DE ANTICIPO:	**2245231**	DE FECHA: **10 DE OCTUBRE DEL 2023**
DE VICIOS OCULTOS:	**2245033**	DE FECHA: **10 DE OCTUBRE DEL 2023**

CONVENIO

DE CUMPLIMIENTO:	_____	DE FECHA: _____
DE ANTICIPO:	_____	DE FECHA: _____
DE VICIOS OCULTOS:	_____	DE FECHA: _____

TERMINACION DE TRABAJOS: **18 de Diciembre de 2023**

FINIQUITO: **18 de Diciembre de 2023**

ENTREGA - RECEPCION: **18 de Diciembre de 2023**

MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL: **$1,080,000.00** **I.V.A. INCLUIDO**

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR
2021-2024

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300 ACAPULCO DE JUAREZ.

MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTOS DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL CONTRATADO: $1,080,000.00 IVA INCLUIDO

SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No **2245033** DE FECHA **10 DE OCTUBRE DEL 2023**
POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**
REPRESENTADA POR EL **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** EN SU CALIDAD DE PERSONA FISICA
Y SUPERINTENDENTE DE OBRA, MANIFIESTA QUE SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**
Y CONVENIO No _____

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **14.00** HORAS DEL DIA **30 DE DICIEMBRE DEL 2023**
FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

POR LA EMPRESA:
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

FIANZA OTORGADA ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MARCELINO LUNA ALEJANDRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA No. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON R.F.C. LUAM920218FK4, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR, ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO AUTORIZADAS O SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.

E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

F) ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA CONVOCANTE, HASTA QUE SE

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
hGHULsKfkPpeMsGmkTm7Yd9ngTFE6TaDatkCLEBePkO5RdfvpkvmZXYB2DGjE2EalbcGrgJdPApTmSlaXEUgGK1LUh6iVMrq3DAzwYngLkHNQ8ZQIVKUov.tdaBCFBNcqsJ/UOpECsrNRLvfpx1/Kmz7tuUfc846IqEXo4s
h9DPqeNc6+oTEm5ZKJb7gWgAl0eXcpbiDSpyyA7s0Z0rPXiDCEobaiy+FGeuAtYvMPmAPnGEUa57YBzLmMmxVUAAMfKuXcXkYS9FvwaulCGl3ujvAHezYHmerOYxTGCUOT1f5m8ZxxoqSGnB4mTNjdqp27e6bYIFnWj3vipTBA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE.

I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUI ESTIPULADOS;

J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO. EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:

hGHULsKfkPpeMsGmkTm7/td9ngTFE6TaDatdCLEBePlxO5RdfnpkvmZ/YB2DGjE2EaAbc0gJdPApTmSlaXE1gGK1LUh6fWMog3DAzwYngLHNO8ZQWKUovJdaBCFBNcqsJlUOpECsaNRLvfjx1/KmzTbUfo84bi0pExo4s
h9D/9pNc6+oTEm5ZKJb7gWgjAl0eXcpblDSpyyA7sOZ0rPXDCCeoba/y+F0euAlYvMPmAPnGEUa57WBzLmMmxVUAAIMuXXxYSSFvwaulkCjl3ujAHez/HmerOYcTGCU0Tl5zm8ZxxoqSGrB4nTNjdqn27e6bYrFnWj3wlpTBA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

PLAZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

M) LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:
hGHULsKfkPpeMsGmkTm7'/id9ngTFE5TaDatsCLEBePlxO5RdfrpkvmZXYB2DGiE2EaIbcDqUdPApTmSlaXEIJgGK1UIh6YMxg3DAzaYngLkHNQ8ZQWKUovJdaBCFBNcqsJUOpECsrNRLvfp1/KmzTuUfc846lgExo4s
h9DrSpNc6+oTEm5ZKJb7gVgjA0eXcpbDSpyyA7slZDrPXtDCEobaiy+F0euAfYvMPmAPnGEUa57N6zLmMmAVUAAMkuX/XkYS9FvwaulC/3ujuHHez7/HmerOYcTGCJ0T1f5m8ZxxoqSGnR4nTNjdqn27e6bYtFnW/3/ipTBA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera ...lmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal ...ada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u ...ados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y ...s de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.*

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
324,000.00	PESOS	2245231	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 324,000.00 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

FIANZA OTORGADA ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MARCELINO LUNA ALEJANDRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA No. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON R.F.C. LUAM920218FK4, LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% (TREINTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $324,000.00 (TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.), INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA MARCELINO LUNA ALEJANDRO Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO;

B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACION AL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION O EJECUCION DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA LA FIANZA CONTINUARA VIGENTE EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;

D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO, EN SU

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

Firma Digital: QaF108A91pCUy01D83FqgTgB24ysVMSdhuKq+GqlOlG+Xvd8FL2ubvKXp9lKQlNzG9N6/2GsnuCRzPOR25pgGs0ekGU0uEKlaia56uXfR5T5wQBz3nD9N2zGs0/ILYSVHtvpIJjQsfae7+o2mvXbRTkCCmkhEUvJleZn490s043 D6qpy/CgFHY8/6Ghd6IL6gNLOjRRJ6S0V6z4f2RHAJlm10gLQnlCQRMecculTRuBPk+M6JyqmSF+QuU4pNCCOtayWqOqIGJjpPOwqtS1g6JTUwDcmVt6jsYozzC5a8jv0BKQuffrOD41FgtzXlF1mJXjaVGR+Cst6qrw3A==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

LINEA DE VALIDACION

0927 3A6E E7

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA BENEFICIARIO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
324,000.00	PESOS	2245231	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 324,000.00 TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

CASO, LOS ACCESORIOS.

E) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

G) QUE PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZON DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ESTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCIÓN.

Firma Digital: QaF/08A/01pCUy/01D83FngTgB24ysVM/SdhuKg+GgIOlG+Xvd8FL2u6vkXjx9fKOiNzG9N62GsnuCRzPOR2SpqGdsdekGU0uEKiala56uXtR6T5wQBz3nD9N2zGoMLYSVHhxpUjlQsfae7+o2mvXbfRTkCCmkhiELUvJleZn490s043
D8qpy/CgFHY6/9GhdbLfg9WLQRRJ6SlW/s2df2R4AJm10gLQniQRMeccuTRu9Pk+M6Jyqm5F+QvU4qNCCQlayWqQqIGJipjPOwq6S1q6JTUwDcmVl6ljsYozrCa8jv0BxOjdfrC0D41FjpzXlF1mJXjaVGR+Cs6qrw3A==

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 18 DE DICIEMBRE DE 2023

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO LA TERMINACION DE LA OBRA QUE LLEVA POR NOMBRE: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS, CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD LA CUAL HA TERMINADO LOS TRABAJOS AL 100 % TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 18 DE DICIEMBRE DE 2023

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA FORMAL DE LA ESTIMACION: 2 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS, CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LUNA
ALEJANDRO
MARCELINO

SEXO H

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.

CLAVE DE ELECTOR LNALMR92021812H300

CURP
LUAM920218HGRNLR00

AÑO DE REGISTRO
2010 03

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1992

SECCIÓN
2234

VIGENCIA
2023 - 2033



INE

IDMEX2510067946<<2234086436091
9202184H3312315MEX<03<<26003<2
LUNA<ALEJANDRO<<MARCELINO<<<<<

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 18 DE DICIEMBRE DE 2023

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA FORMAL DE LA ESTIMACION: 2 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS, CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023 LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO. ASI MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
REPRESENTANTE TECNICO
CED. PROF. 12957362

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GERONIMO
SALVADOR
BLADIMIR

FECHA DE NACIMIENTO
09/04/1996

SEXO H



DOMICILIO
C SIN NOMBRE SN
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GRSLBL96040912H500

CURP GESB960409HGRRLL03 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 12 MUNICIPIO 057 SECCIÓN 2234

LOCALIDAD 0034 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

Escaneado con CamScanner

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1803796956<<2234098412563
9604098H2812313MEX<01<<30952<5
GERONIMO<SALVADOR<<BLADIMIR<<<

Escaneado con CamScanner

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
12957362

Clave Única de Registro de Población
GESB960409HGRRLL03

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1295	410	1	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

BLADIMIR	GERONIMO	SALVADOR
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	511301
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	120001
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica

02/08/2022	12:46:08
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original
||12957362|1295|410|1|C1|01/08/2022 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|GESB960409HGRRLL03|BLADIMIR|GERONIMO|SALVADOR|11890|120001|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO|5647|511301|LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL||

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado
guRXBNcMCaMLQjU7GWfYb4VRR3tKbsIC23AlcKwCF+5AEUWGFtZ+/md3C6GCoyGTKMxZOR0oVJsldSGCYg9Y7zfl3gCGeg7UDVtelyVdnmDxqboUSSe+1FlsmHhm7iDC/3XD/Au2ructBMrBhYlNVX4lcLBeYieD9lxOCAUxvmH6Z/p8SFawXF+KAlSlbkHI8uqcbNJDHua+MXrdwDfzcolhR8VVHAGCqqL63j7mSLB14WVWpah6+nA6B/UgTLfWDMPjwwirMM9SSjg8NxmN52qzGHI6VgoSvfiza2fE9B2EpiqhjNuCr0JGKZ4pzcv/79dK277VYkJcCQcasz4j6w==

LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES.

Sello digital de tiempo SEP
5A+45Q5R2WxzO5yjc7o8i6AxqpnozlmRhlUOwHXmcSPU2t4ouz0v7tODqVKfUOcEab1mE4eNa5UqAMbNT/n7l0lqqEz3ODl9MHREDWt0VMxuUMZWTmQfsSkgJuDL9rKl2TcBS26JOZ5W2OiobuhFlBPtMC13mWHa3WPPkDJM0YG4kpwTgHofL0kEdMn6rCgW8jHODRuel8hr5Stb4Db2x6RY5JGVyKLvyCgeQcQqwmKstXNlgKE2xuOqsWfxKHcc3/ER/SFilhuC5f5clmX6dyQXBNIoRP1BE0bccrA3QirzzOrykqkBxyCPmisQANW3fKLlgc3n+J8WqBv9aRc4HA==

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**

Identificador electrónico - cédula
12957362

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

CARTA DE RECEPCION DE FINIQUITO DE LA OBRA

ACAPULCO, GRO. A 16 DE DICIEMBRE DE 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HORAS EN EL SITIO DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS UBICADO EN: COL. JARDIN MANGOS PARA CONCILIAR VOLUMENES DE LA OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTICULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DE SUPERVISION DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

C.C.P.- M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN Direccion de Obras Públicas.-Mismo Fin.

C.C.P.- Archivo / Minutario.

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023

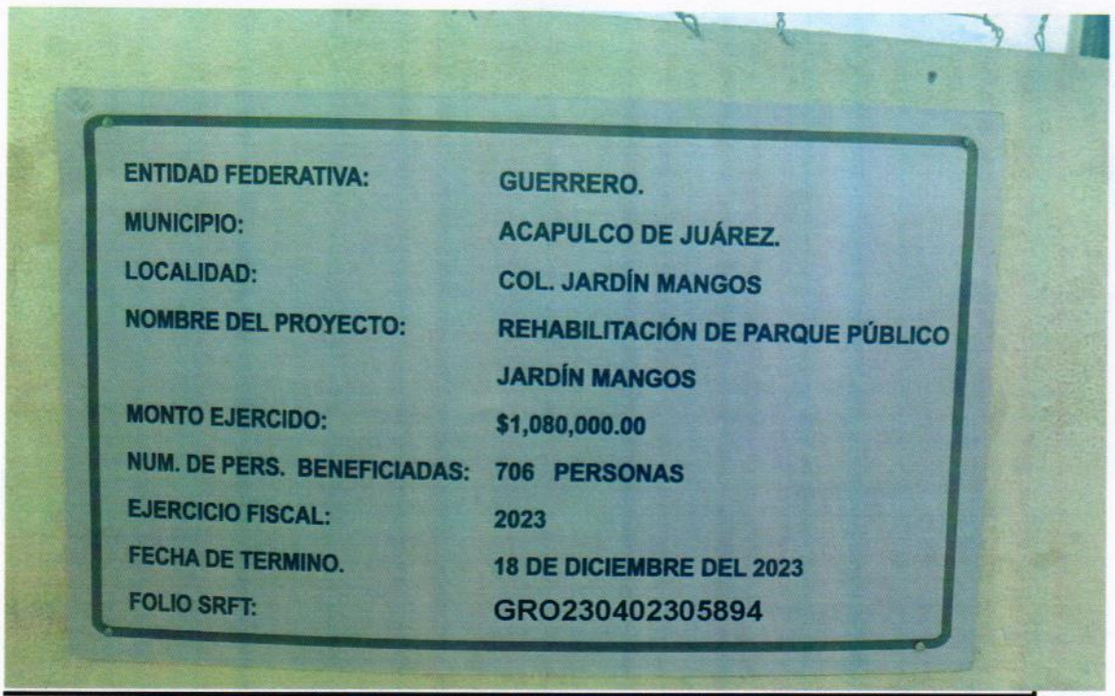



PLACA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





FOTO DE INICIO DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





FOTO DE INICIO DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





FOTO DE PROCESO DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



FOTO DE PROCESO DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023



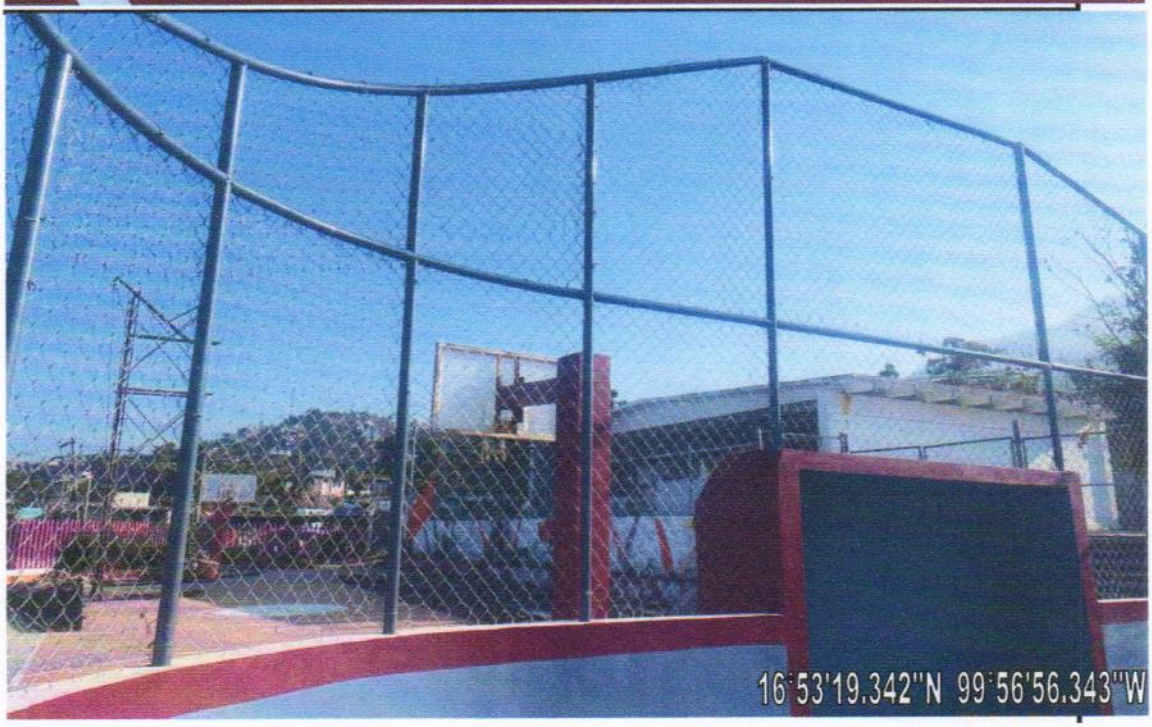


FOTO DE TERMINACION DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023



FOTO DE TERMINACION DE OBRA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO — **IMPORTE DE CONTRATO:** **$ 1,080,000.00**
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — **PERIODO DE CONTRATO:** DEL 20-oct-23 AL 18-dic-23

AVANCES POR PARTIDAS: — **PERIODO DE REPORTE:** DEL 20-nov-23 AL 29-nov-23


1	PRELIMINARES		100%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		100%
3	ALUMBRADO		100%
4	HERRERIA		70%

5	ACABADOS	50%
6	JARDINERIA	

AVANCE TOTAL
70%

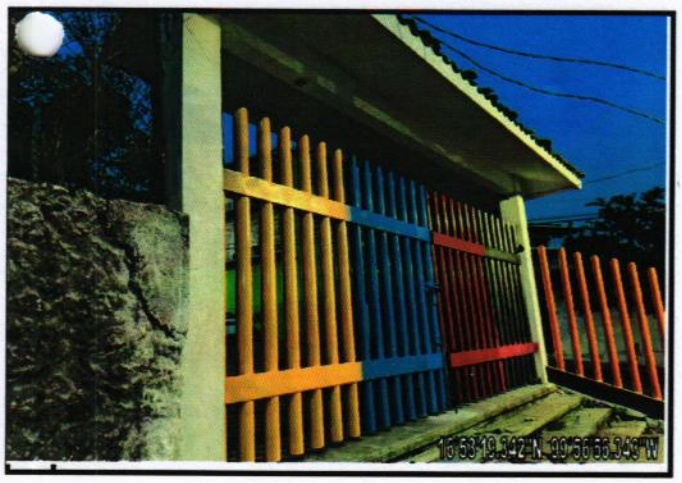

PORTON

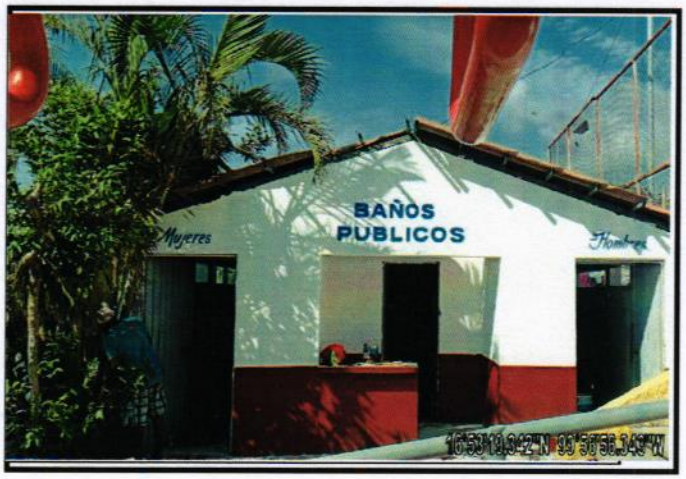

PINTURA EN MUROS Y PLAFONES



PINTURA ESMALTE ELEMENTOS METALICOS



PINTURA ESMALTE EN TUBO DE 4"

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.


NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD — **IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,080,000.00**
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — **PERIODO DE CONTRATO: DEL 20-oct-23 AL 18-dic-23**
PERIODO DE REPORTE: DEL 30-nov-23 AL 10-dic-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	PRELIMINARES		100%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		100%
3	ALUMBRADO		100%
4	HERRERIA		100%

5	ACABADOS	80%
6	JARDINERIA	50%


AVANCE TOTAL
88%

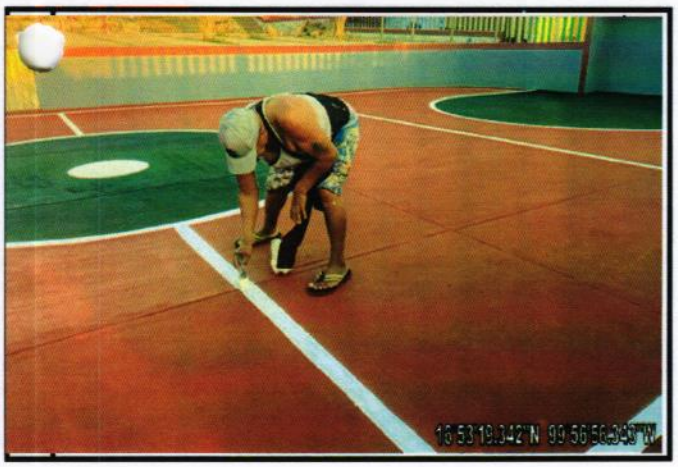


PINTURA TOP DEPORTIVO



PINTURA TOP DEPORTIVO

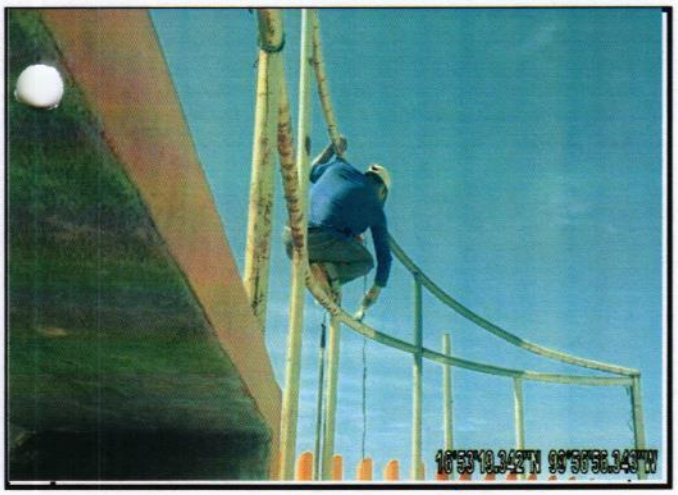

PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA

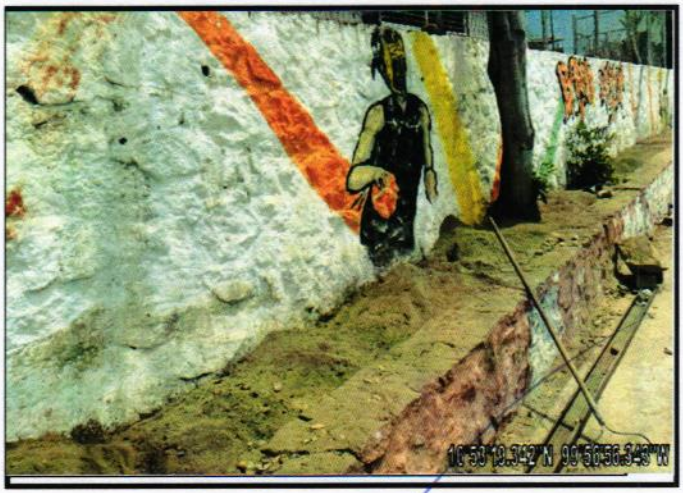

MEJORAMIENTO DE TIERRA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD — **IMPORTE DE CONTRATO:** **$ 1,080,000.00**
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — **PERIODO DE CONTRATO:** DEL 20-oct-23 AL 18-dic-23
PERIODO DE REPORTE: DEL 11-dic-23 AL 18-dic-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	PRELIMINARES		100%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		100%
3	ALUMBRADO		100%
4	HERRERIA		100%
5	ACABADOS		100%
6	JARDINERIA		100%


AVANCE TOTAL
100%




PASTO ALFOMBRA



PLANTAS DE ORNATO

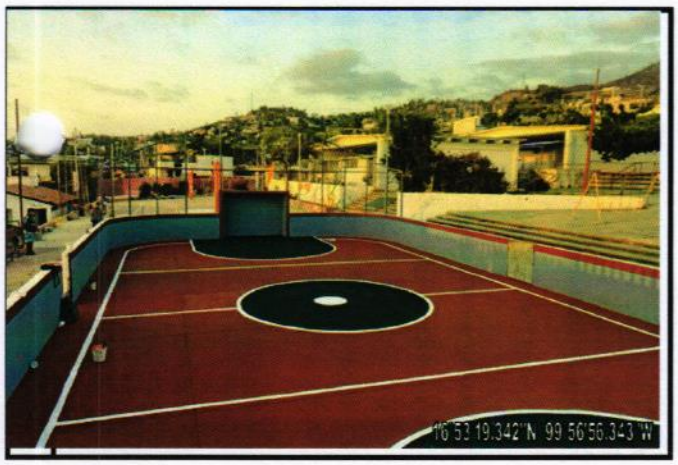

LIMPIEZA

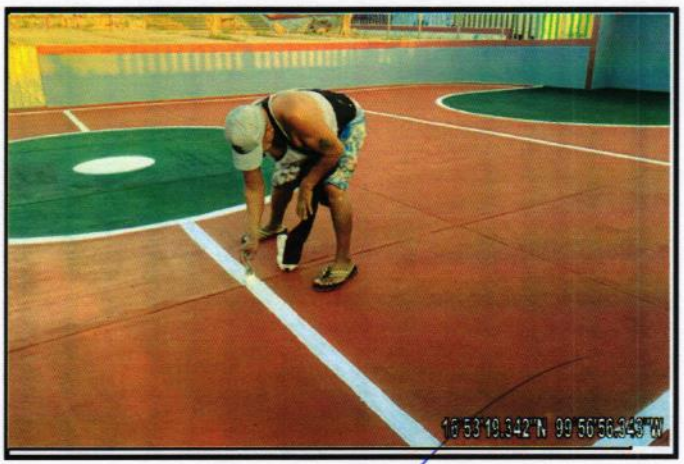

LIMPIEZA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	**HERRERIA**		**PORTON**							
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P1	1.00	5.20			ML	5.20	
			P2	1.00	6.18			ML	6.18	
								ML	-5.00	VOLUMEN COBRADO EN EST. 1
							TOTAL	**ML**	**6.3800**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

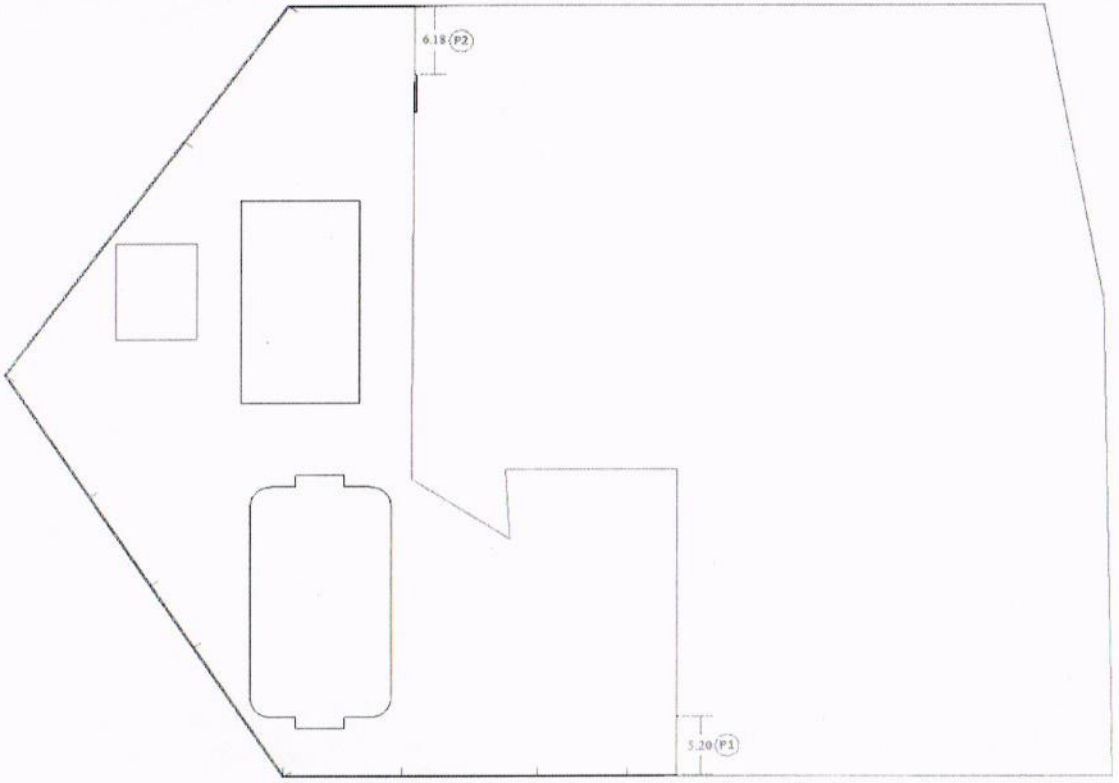

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023





POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023





POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
RESIDENTE DE OBRA

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			PORTERIA NORTE							
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.		M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			PORTERIA SUR							
			M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
								M2	-78.82	VOLUMEN COBRADO EN EST. 1
							TOTAL	**M2**	**19.1800**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

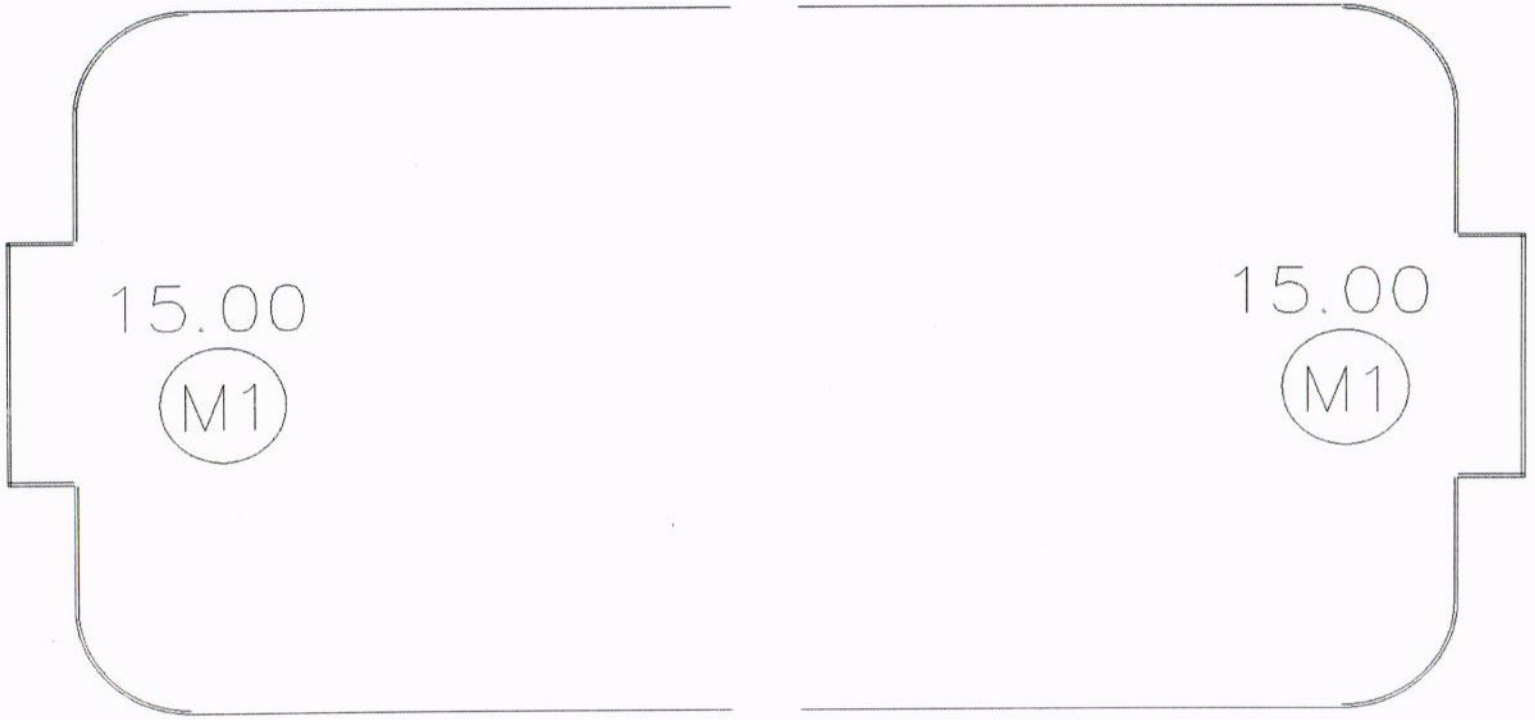

PLANTA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

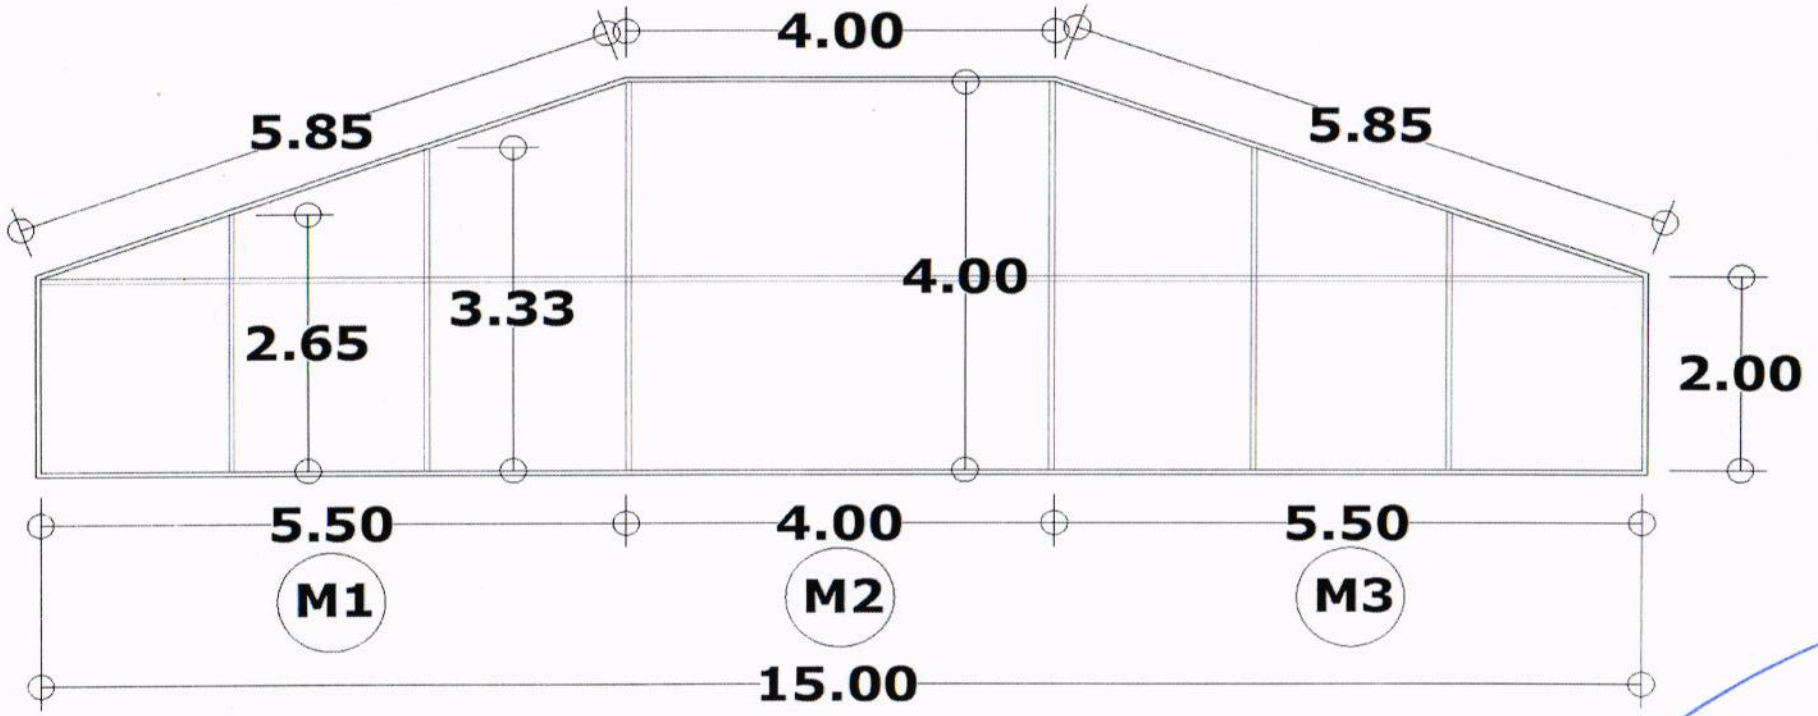

ALZADO CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de Diciembre de 2023





MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de Diciembre de 2023





MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

No. DE OBRA: MAJ/539

ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		SANITARIOS								
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	A-B	1-3	6.00	1.00		1.50	M2	9.00	
		A-B	3-5	5.00	1.00		1.50	M2	7.50	
							TOTAL	**M2**	**16.5000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PTAHERR PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .

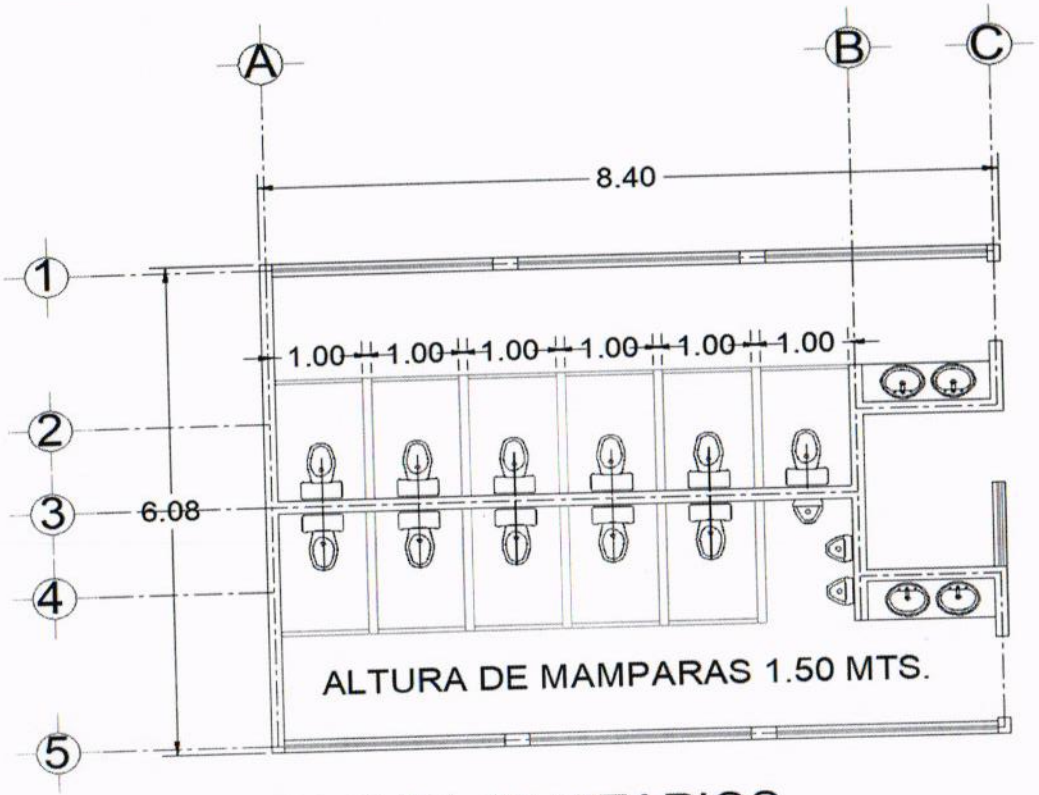

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





PTAHERR PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



PTAHERR PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

No. DE OBRA: MAJ/539

ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		SANITARIOS								
A05	**ACABADOS**									
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	1 Y 5	A-C	2.00	8.40		2.28	M2	38.30	MURO EXTERIOR
		A Y C	1-5	2.00	6.08		2.91	M2	35.39	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		1	A-C	1.00	8.10		2.28	M2	18.47	MURO INTERIOR
		3	A-C	2.00	6.50		3.53	M2	45.89	MURO INTERIOR
		5	A-C	1.00	8.10		2.28	M2	18.47	MURO INTERIOR
		A	A-C	2.00	2.82		2.91	M2	16.41	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		B	A-C	2.00	1.52		2.28	M2	6.93	MURO INTERIOR
		C	A-C	2.00	2.82		2.91	M2	16.41	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		1	A-C	-6.00	2.51		0.25	M2	-3.77	VENTANAS
		5	A-C	-6.00	2.51		0.25	M2	-3.77	VENTANAS
		C	3-4	-2.00	1.05		1.15	M2	-2.42	VENTANAS
		C	1-2	-2.00	1.00		1.98	M2	-3.96	PUERTAS
		C	2-3	-2.00	0.89		1.98	M2	-3.52	PUERTAS
		C	4-5	-2.00	1.00		1.98	M2	-3.96	PUERTAS
		CANCHA								
			M1	2.00	12.45		1.50	M2	37.35	
			M2	2.00	12.45		1.50	M2	37.35	
			M3	2.00	13.90		1.50	M2	41.70	
			M4	2.00	13.94		1.50	M2	41.82	
							TOTAL	**M2**	**333.0800**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

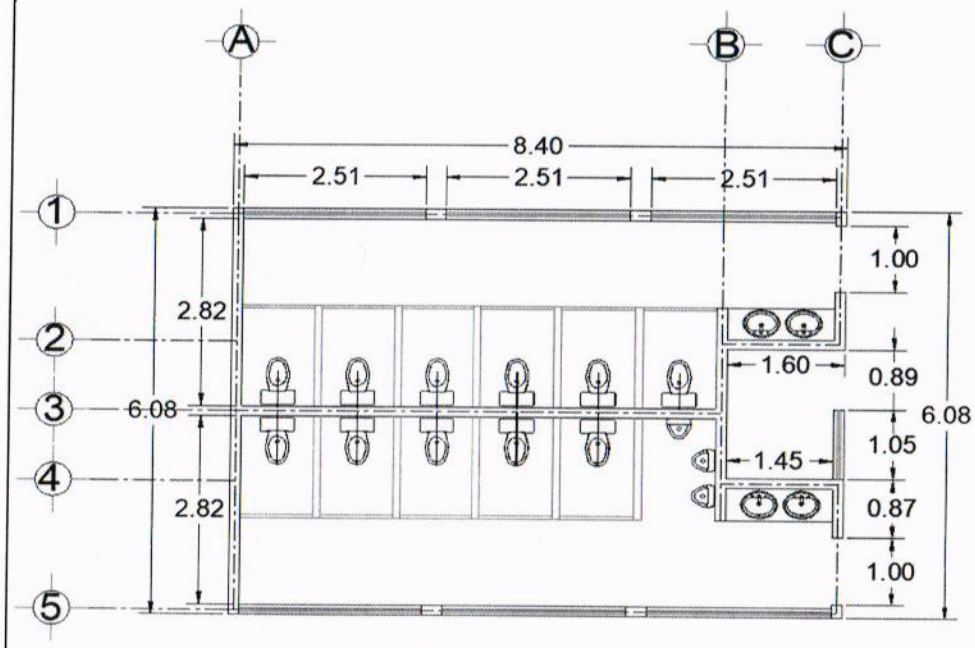

PLANTA SANITARIOS

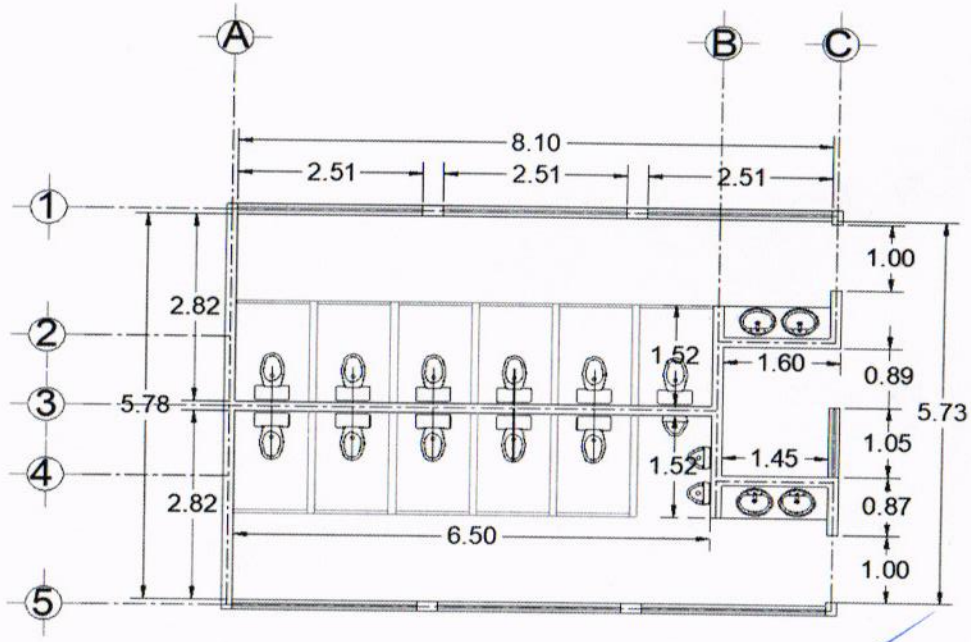

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO


NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

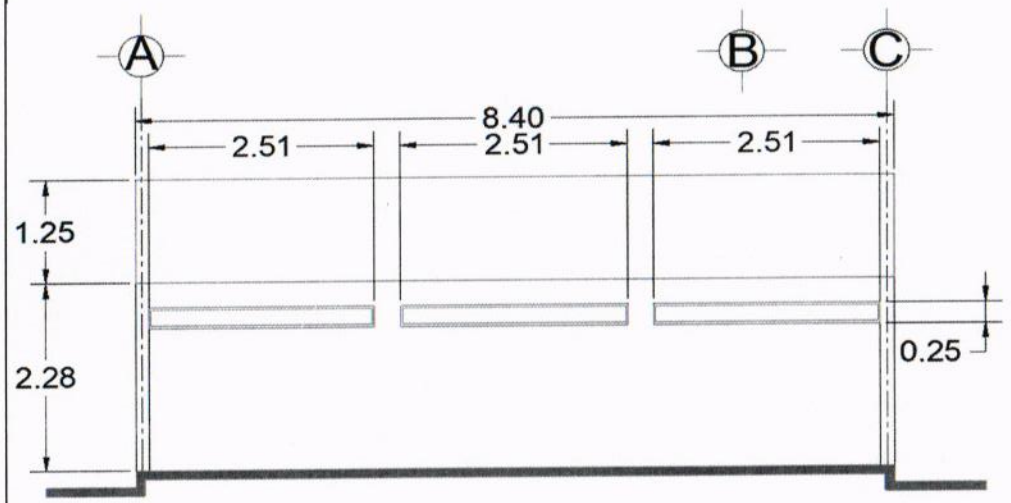

FACHADA SANITARIOS

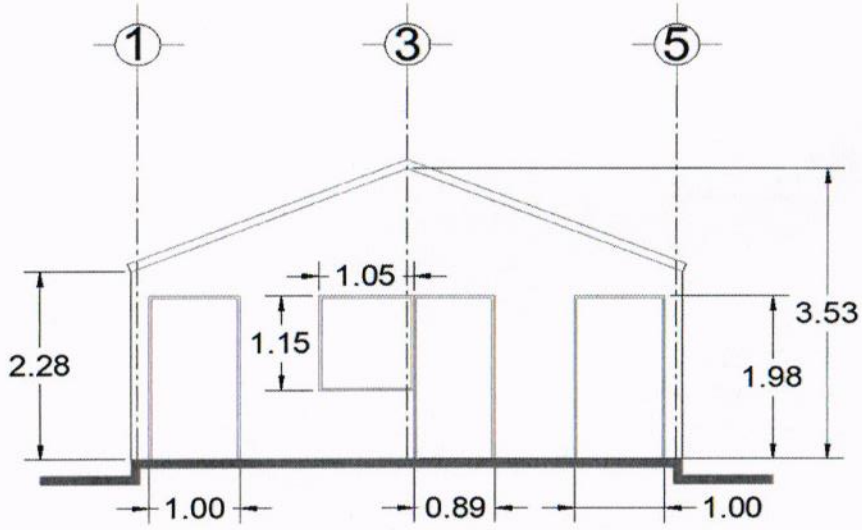

FACHADA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

ALTURA DE MURO 1.50 MTS.

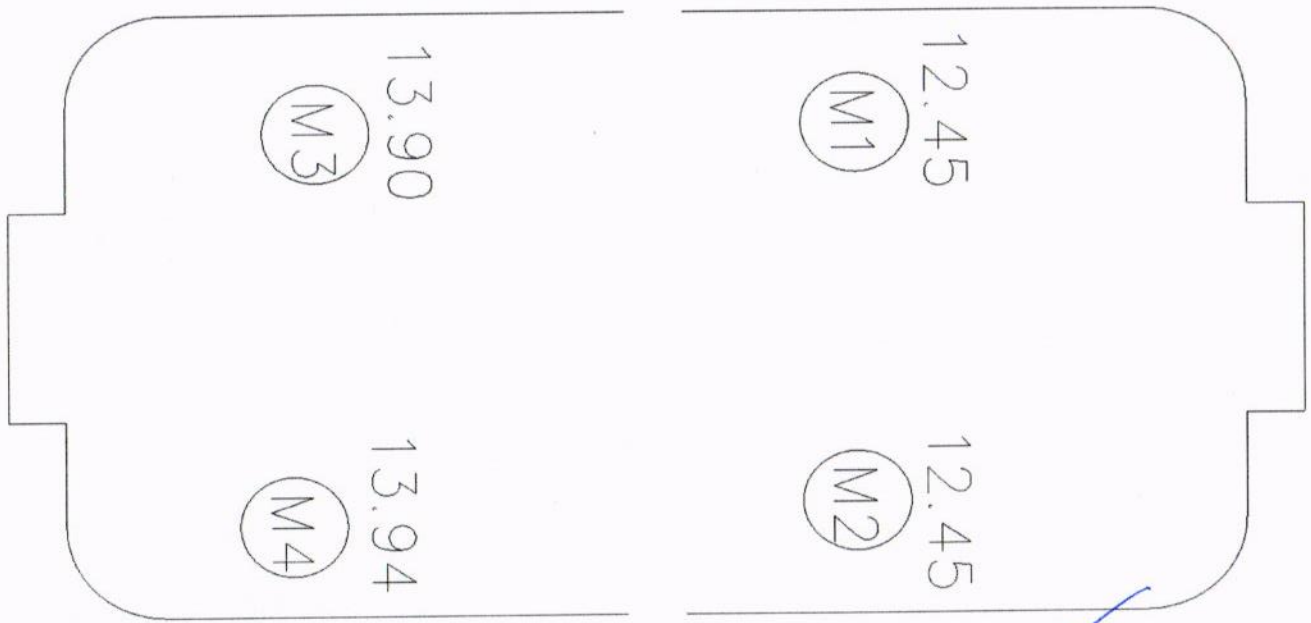

PLANTA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



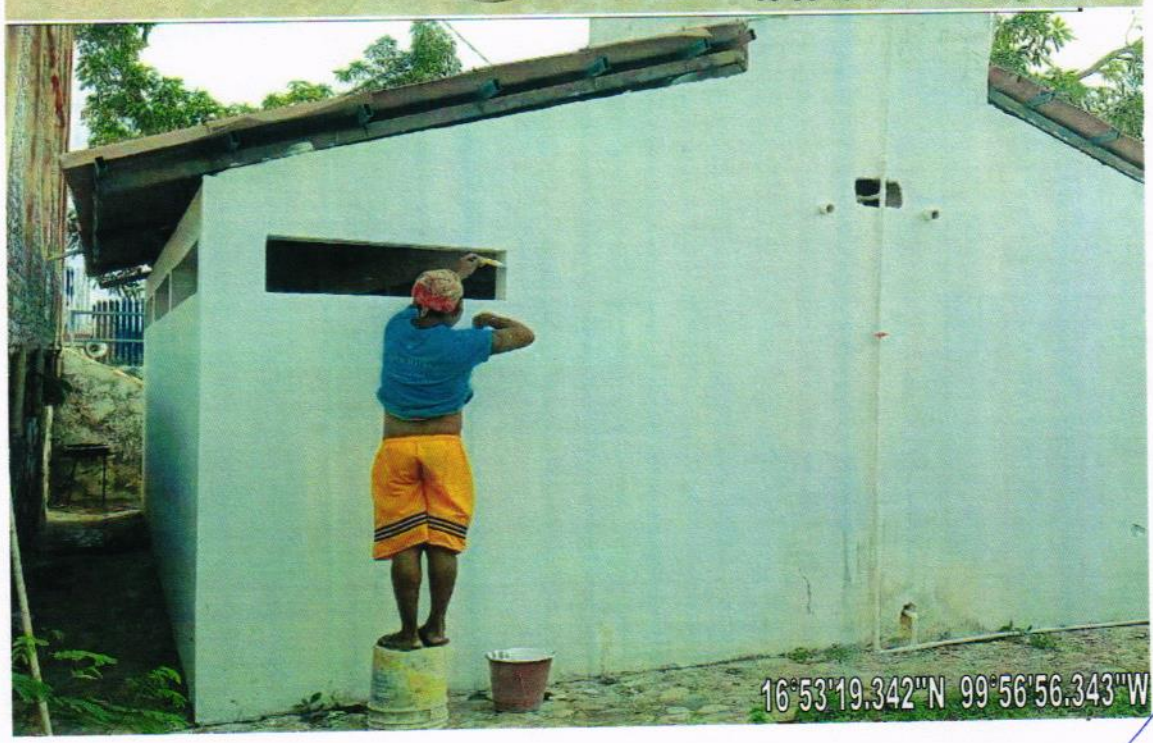

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO


ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023

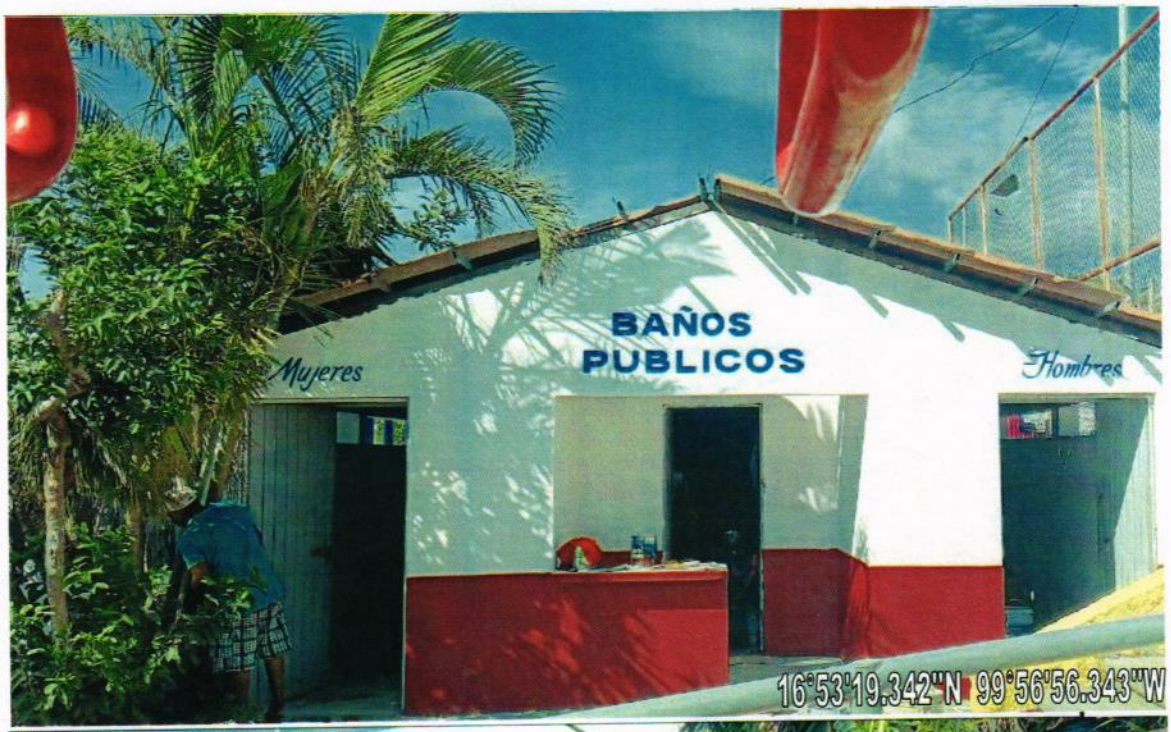

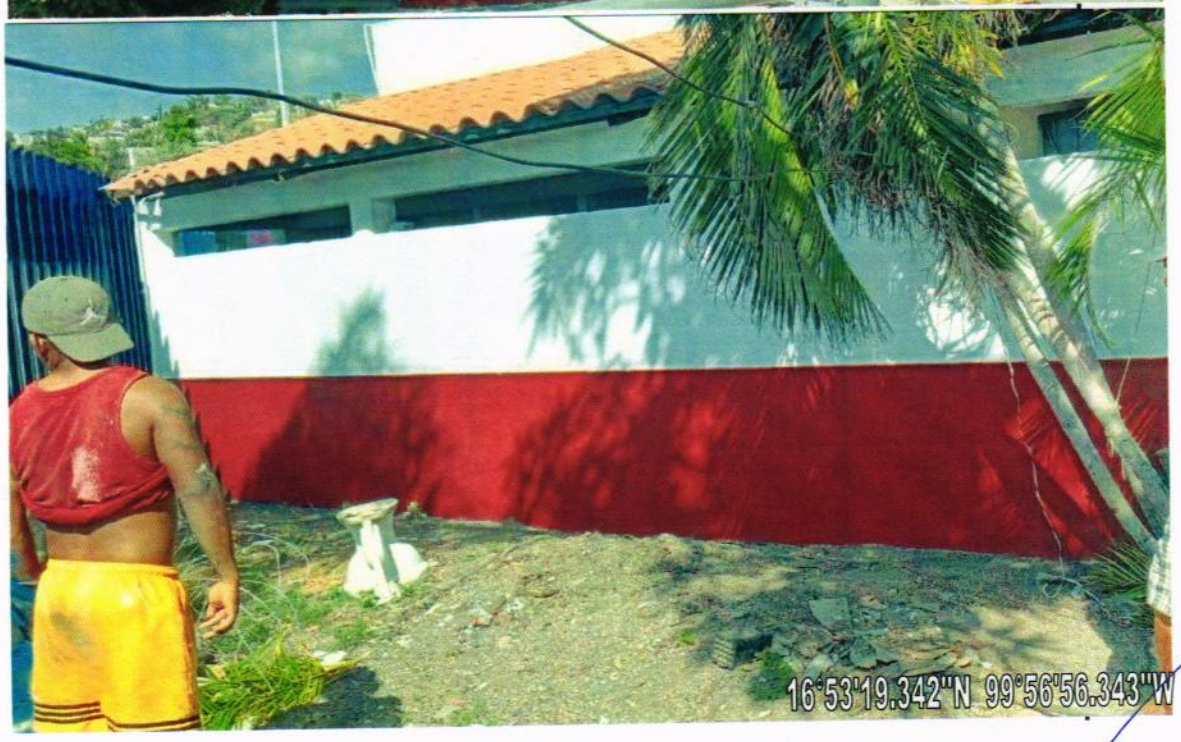

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
			ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		SANITARIOS								
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	A-B	1-3	12.00	1.00		1.50	M2	18.00	
		A-B	3-5	10.00	1.00		1.50	M2	15.00	
							TOTAL	**M2**	**33.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

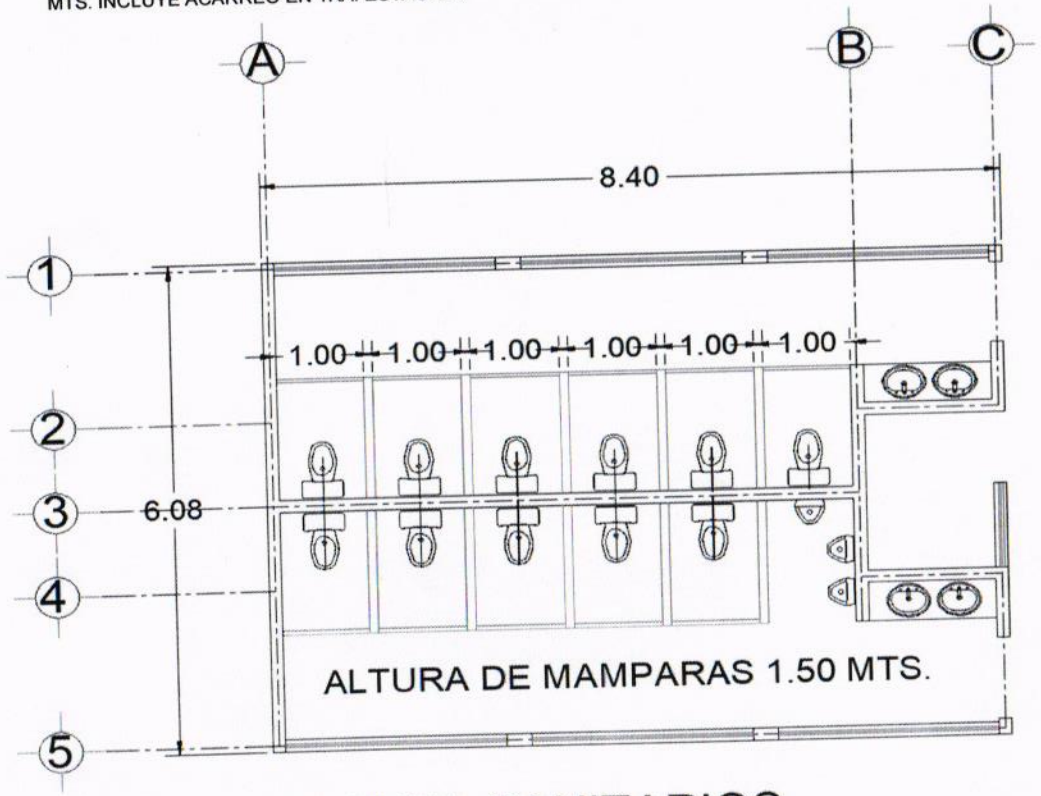

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023



22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023

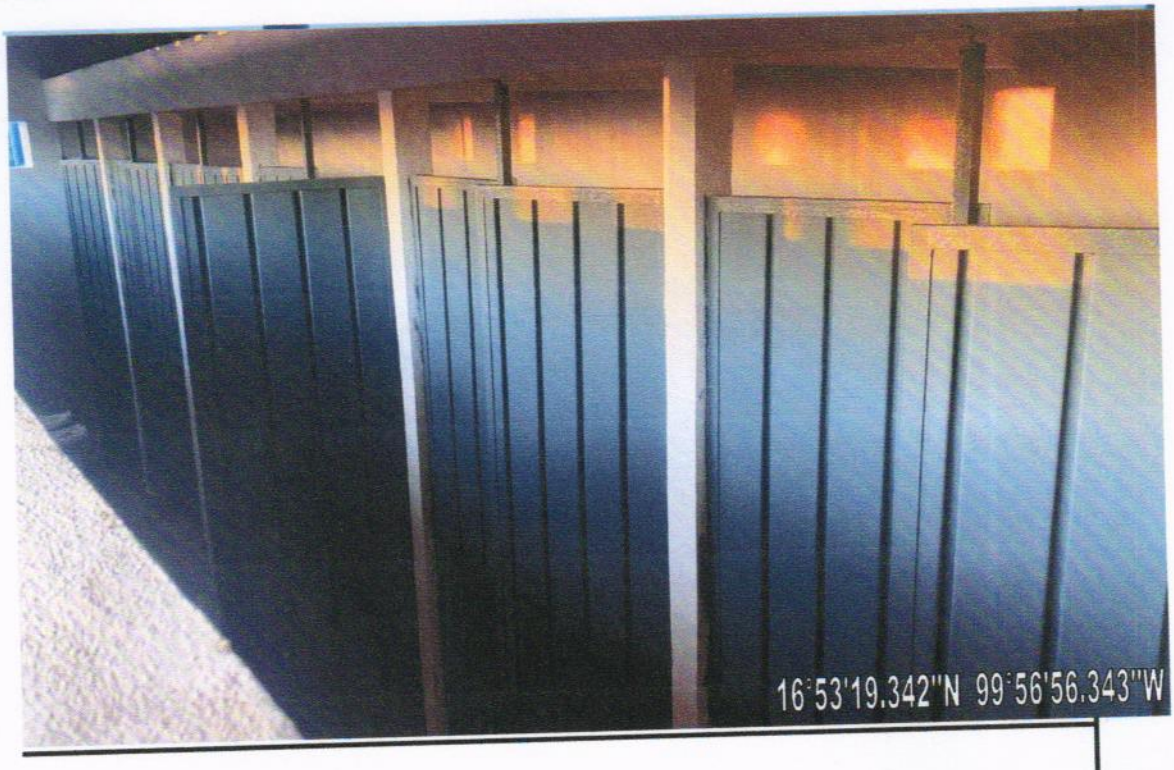

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
		FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.		**BARDA**							
			M1	11.00			1.95	ML	21.45	
			M2	29.00			1.95	ML	56.55	
			M3	44.00			1.95	ML	85.80	
			M4	39.00			1.95	ML	76.05	
			M5	54.00			1.95	ML	105.30	
			M6	23.00			1.95	ML	44.85	
			M7	31.00			1.95	ML	60.45	
			M8	44.00			1.95	ML	85.80	
			M9	85.00			1.94	ML	164.90	
			M10	52.00			1.90	ML	98.80	
			M11	37.00			1.90	ML	70.30	
			M12	12.00			1.90	ML	22.80	
			PORTON							
			P1	17.00			3.00	ML	51.00	
			P2	21.00			3.00	ML	63.00	
							SUBTOTAL	ML	1,007.05	
							POR AJUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA:	ML	831.24	
							TOTAL	**ML**	**831.2400**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

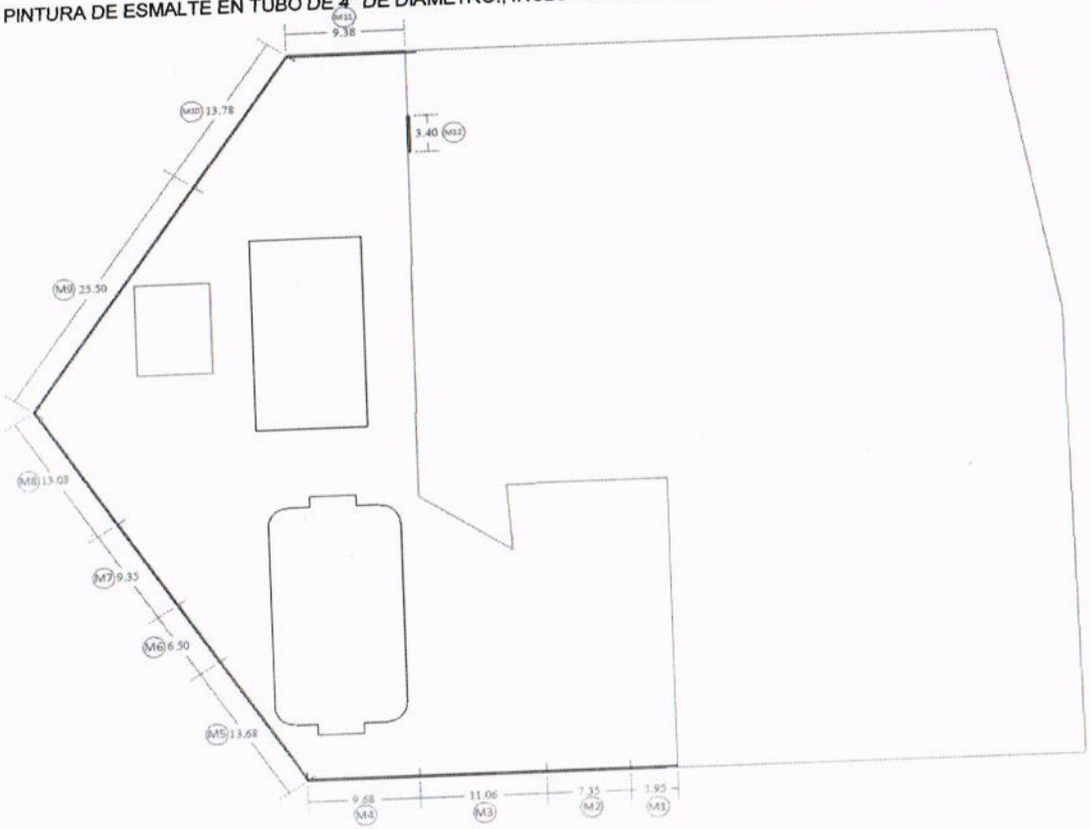

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

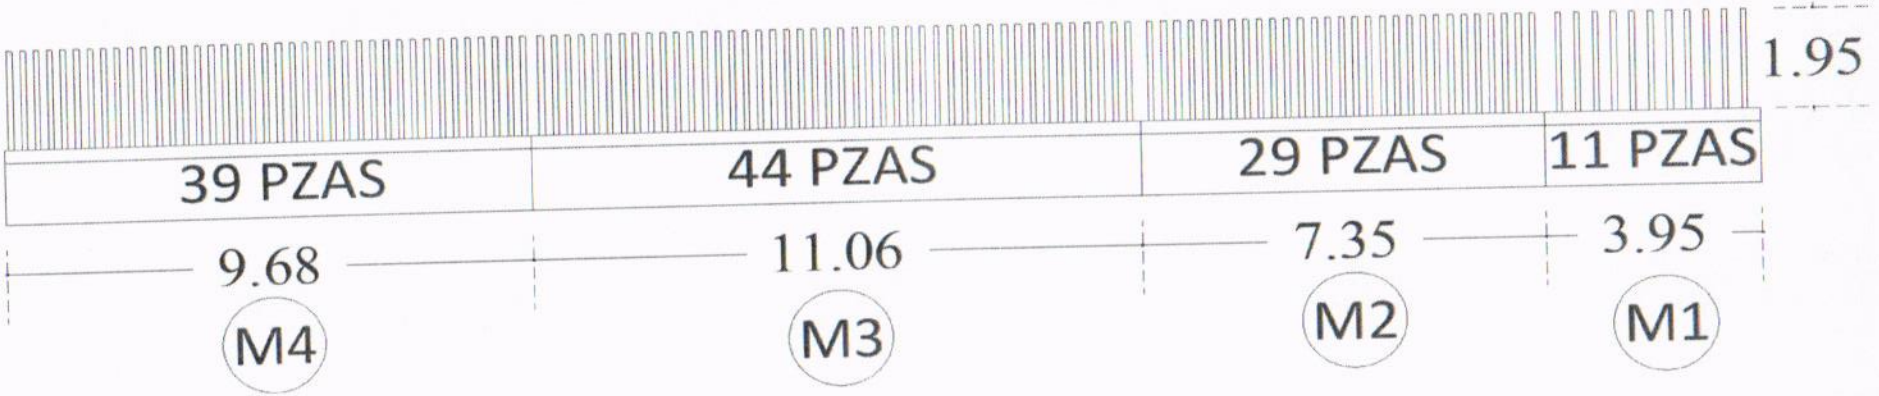

PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS / TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

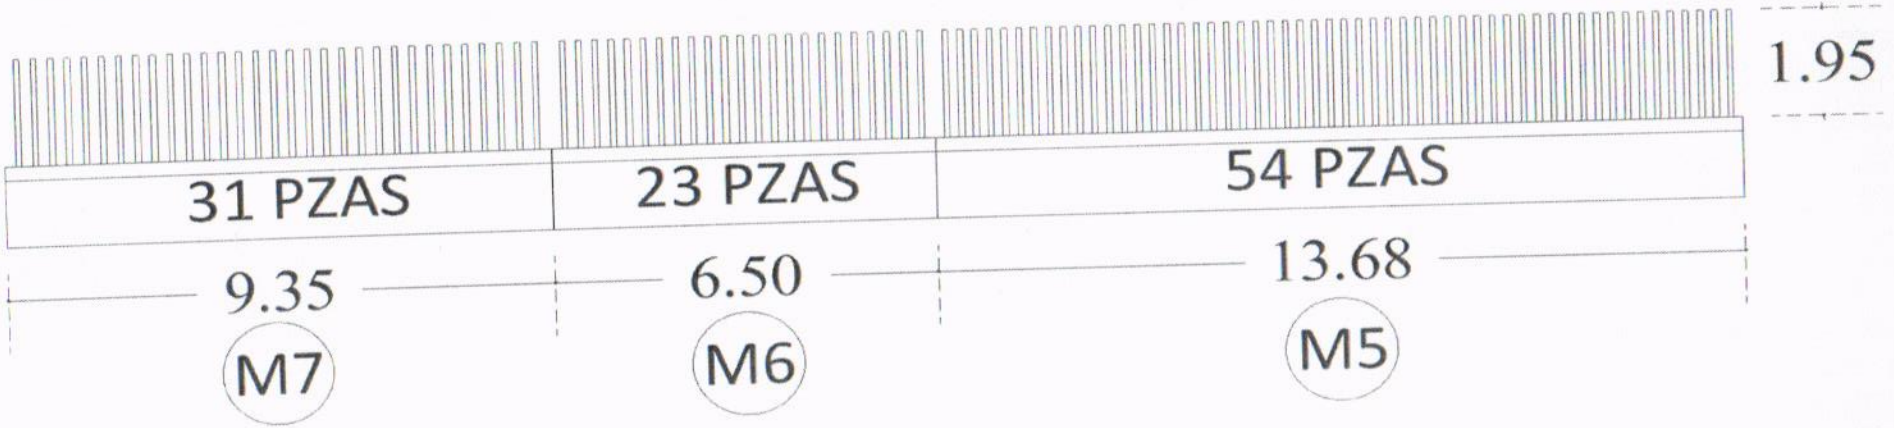

PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

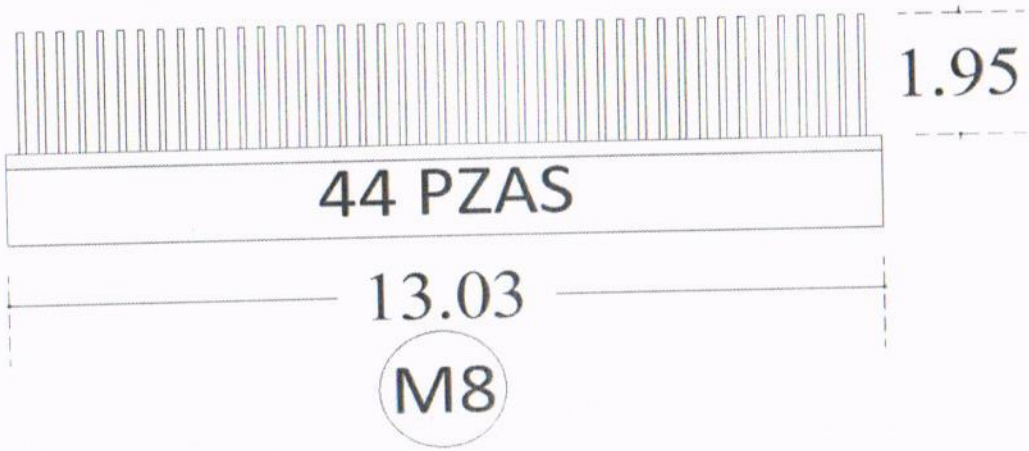

PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

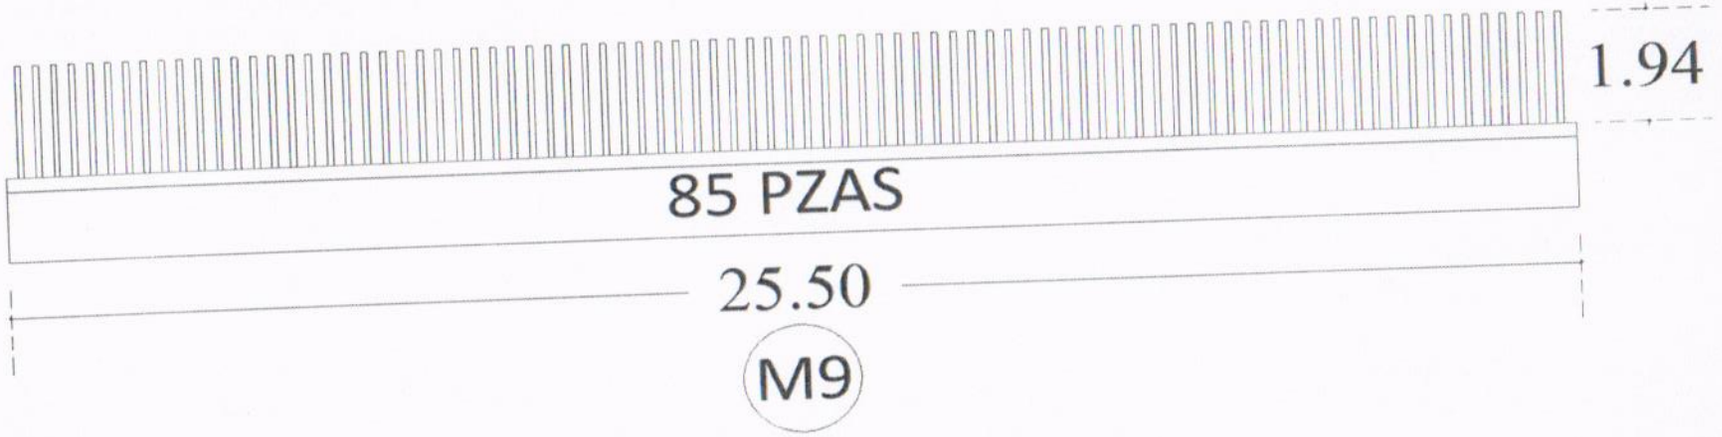

PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.



PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,


DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

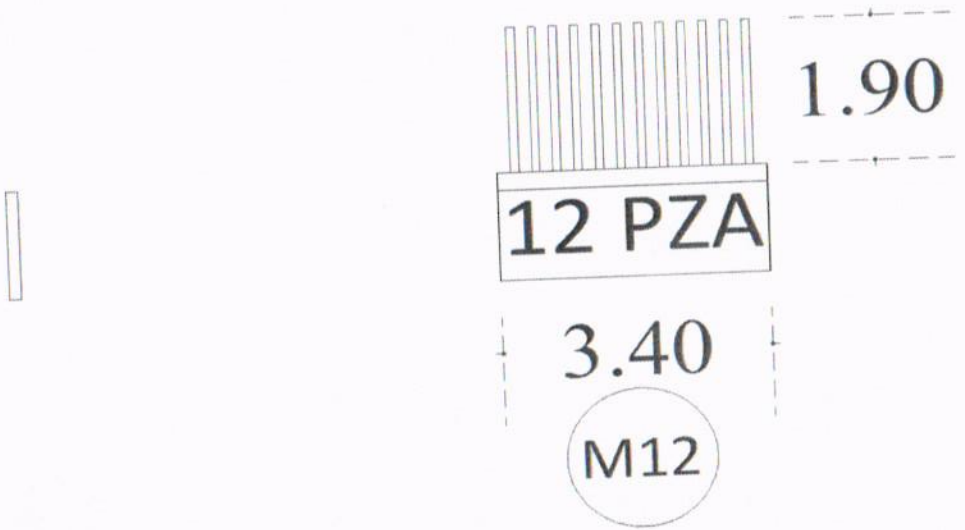

PINTURA EN TUBOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. NELTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
		ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
	CANCHA DE FUTBOL									
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		C1	1.00	20.54	11.48		M2	235.80	
							TOTAL	**M2**	**235.8000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

PIN-CAN PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

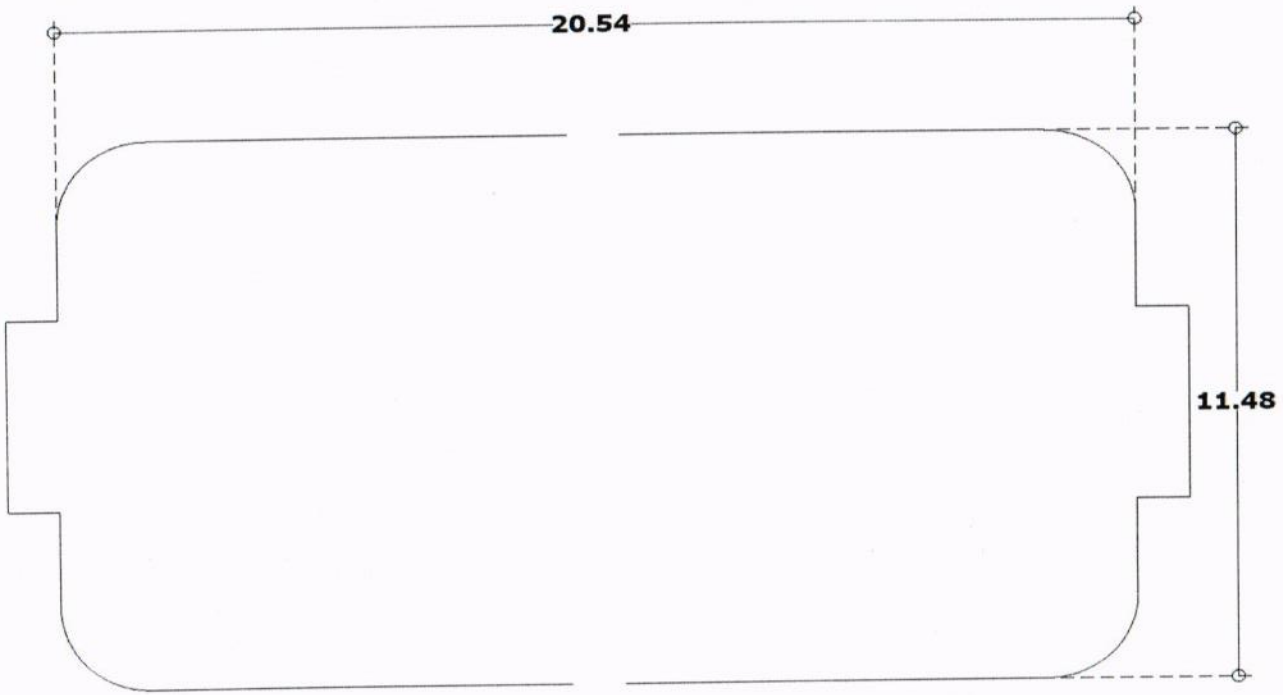

PINTURA TOP DEPORTIVA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



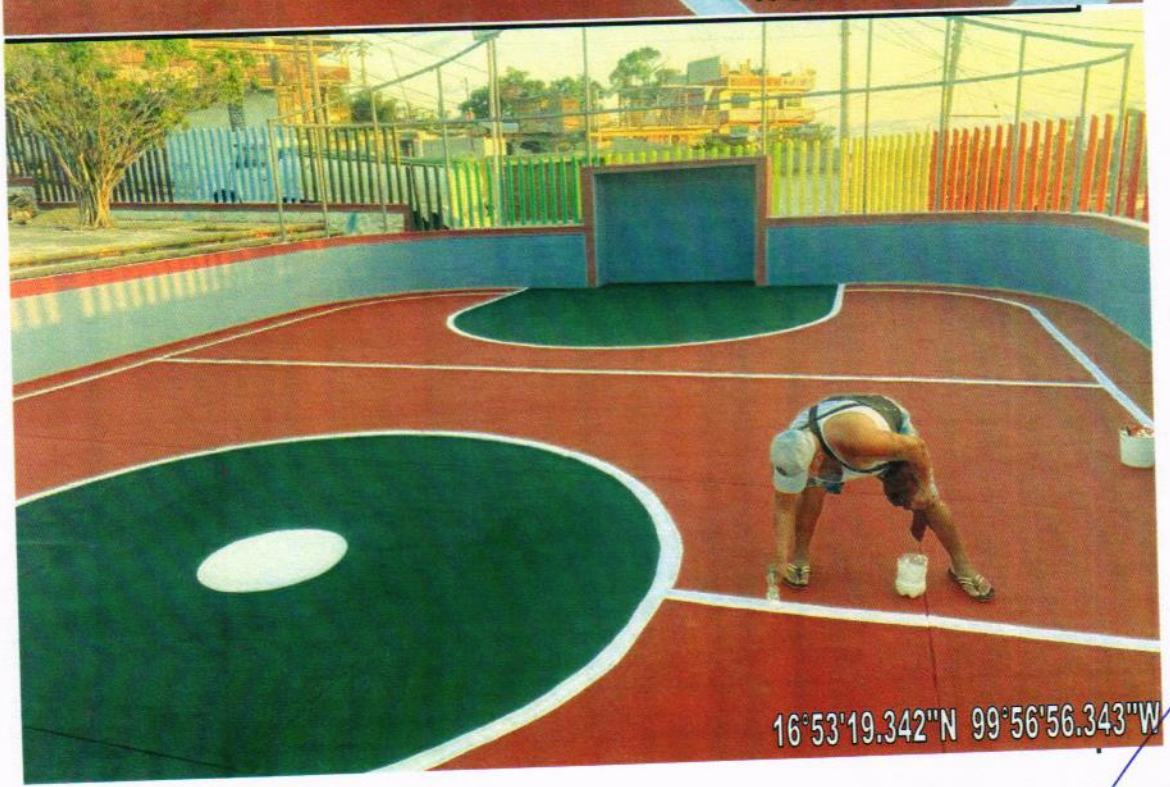

PIN-CAN PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023





PIN-CAN PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A06	**JARDINERIA**		**JARDINERIA**							
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..		J1	1.00	100.00	1.00	0.10	M3	10.00	
							TOTAL	**M3**	**10.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

34-0546 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..

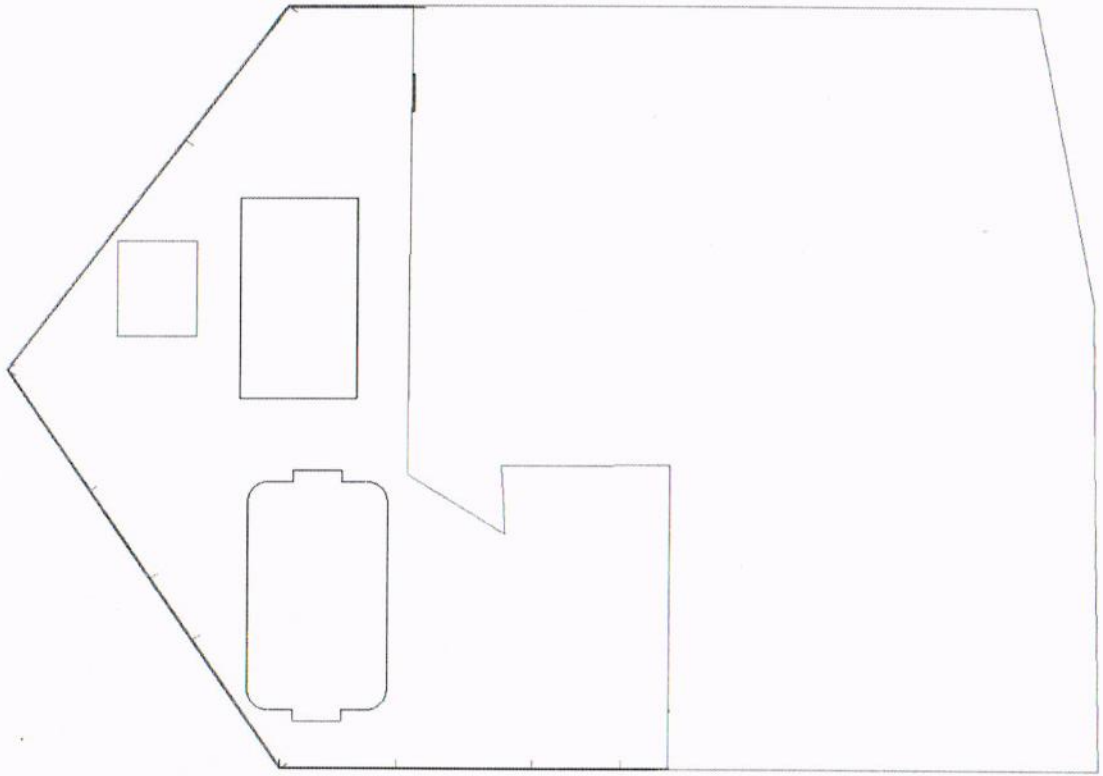

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS (JARDINERIA 100M2)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023



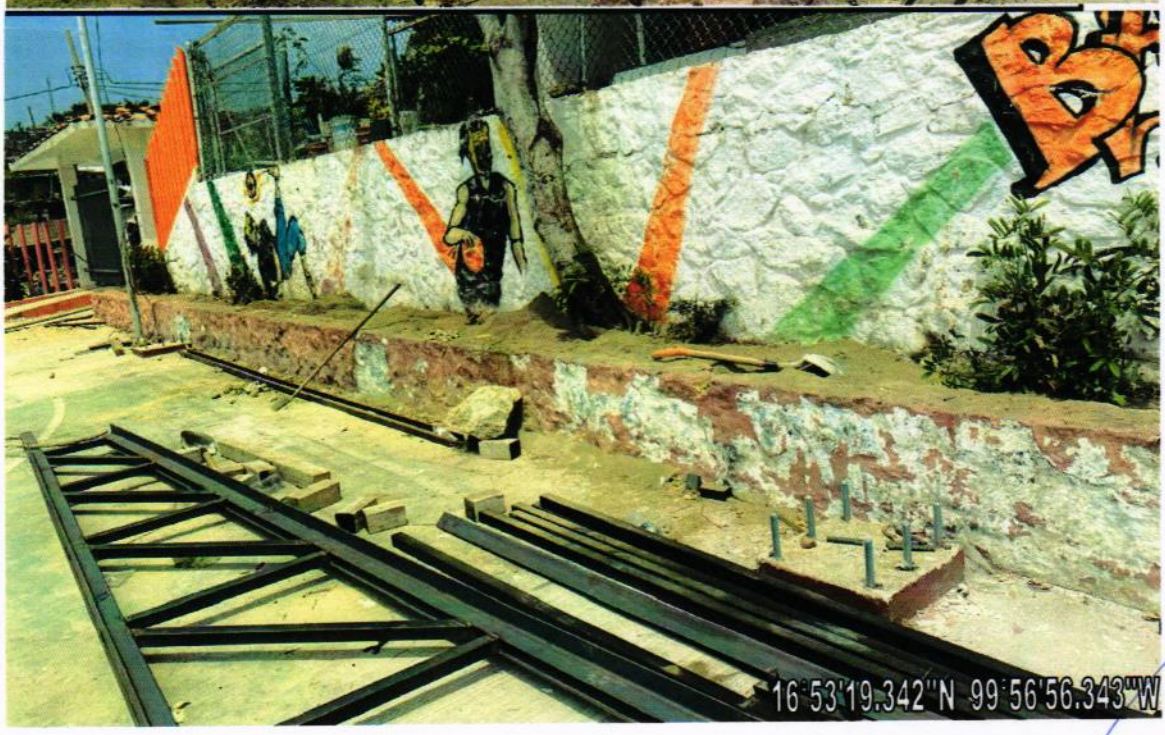

34-0546 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023

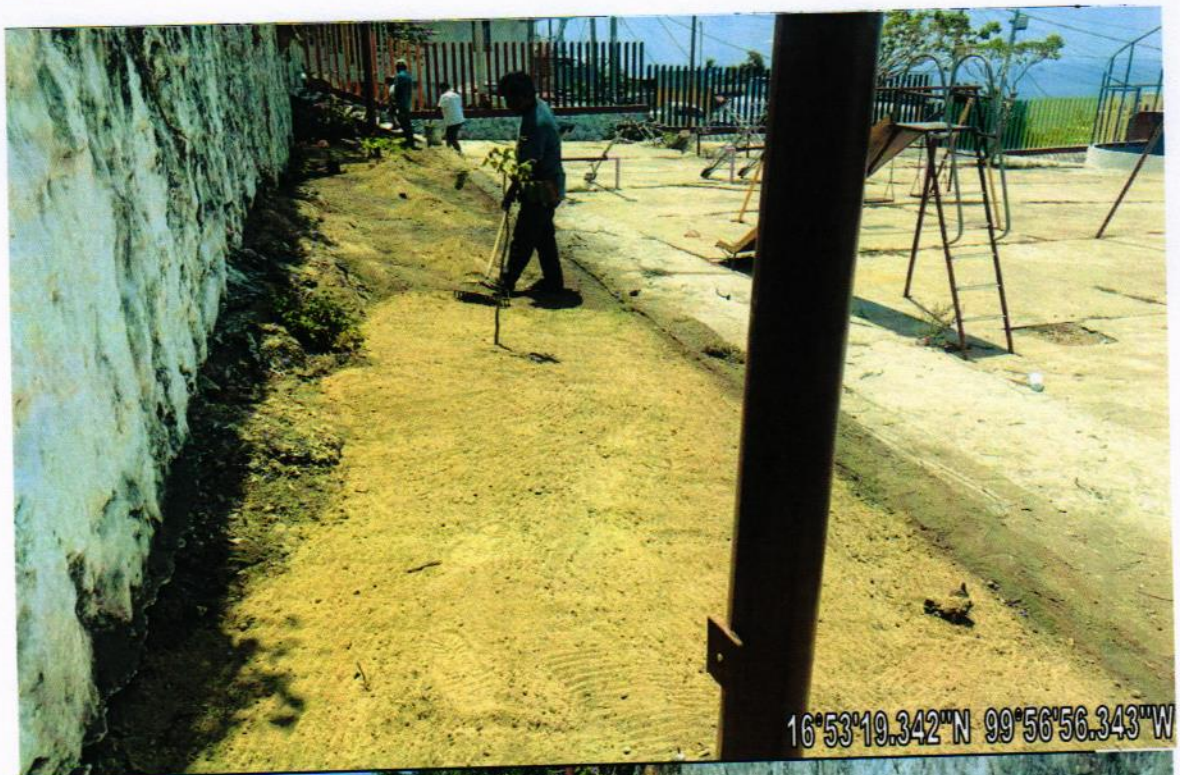



34-0546 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

No. DE OBRA: MAJ/539

ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
	JARDINERIA									
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.		J1	1.00	100.00	1.00		M2	100.00	
							TOTAL	**M2**	**100.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

34-0547 PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

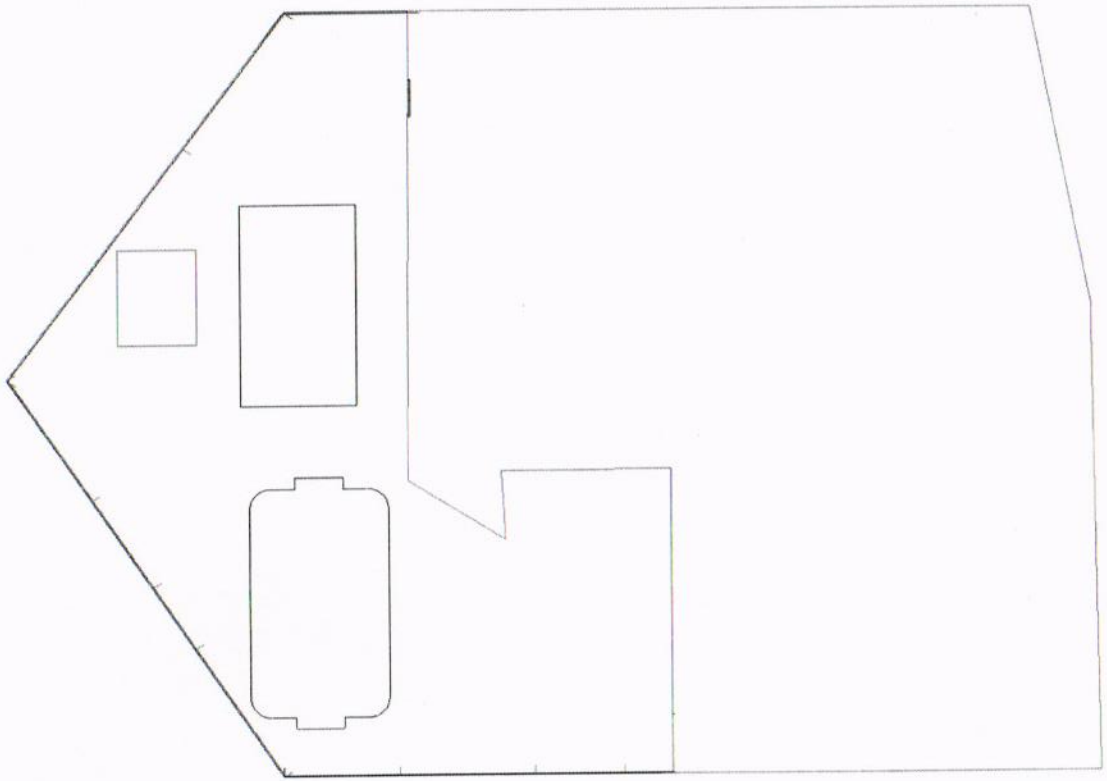

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS (JARDINERIA 100M2)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023

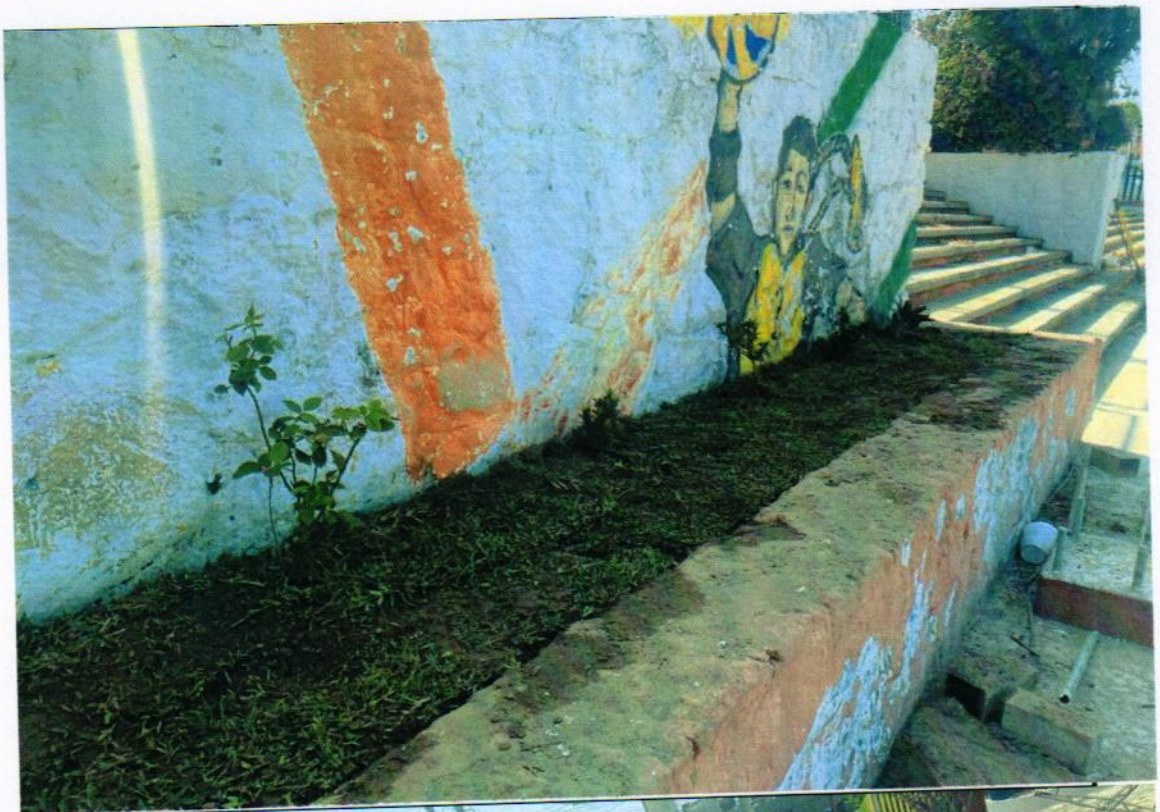



34-0547 PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de Diciembre de 2023



34-0547 PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
RESIDENTE DE OBRA

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

No. DE OBRA: MAJ/539

ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			SANITARIOS							
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.		J1	50.00				PZA	50.00	-
							TOTAL	PZA	50.0000	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

34-0549 PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

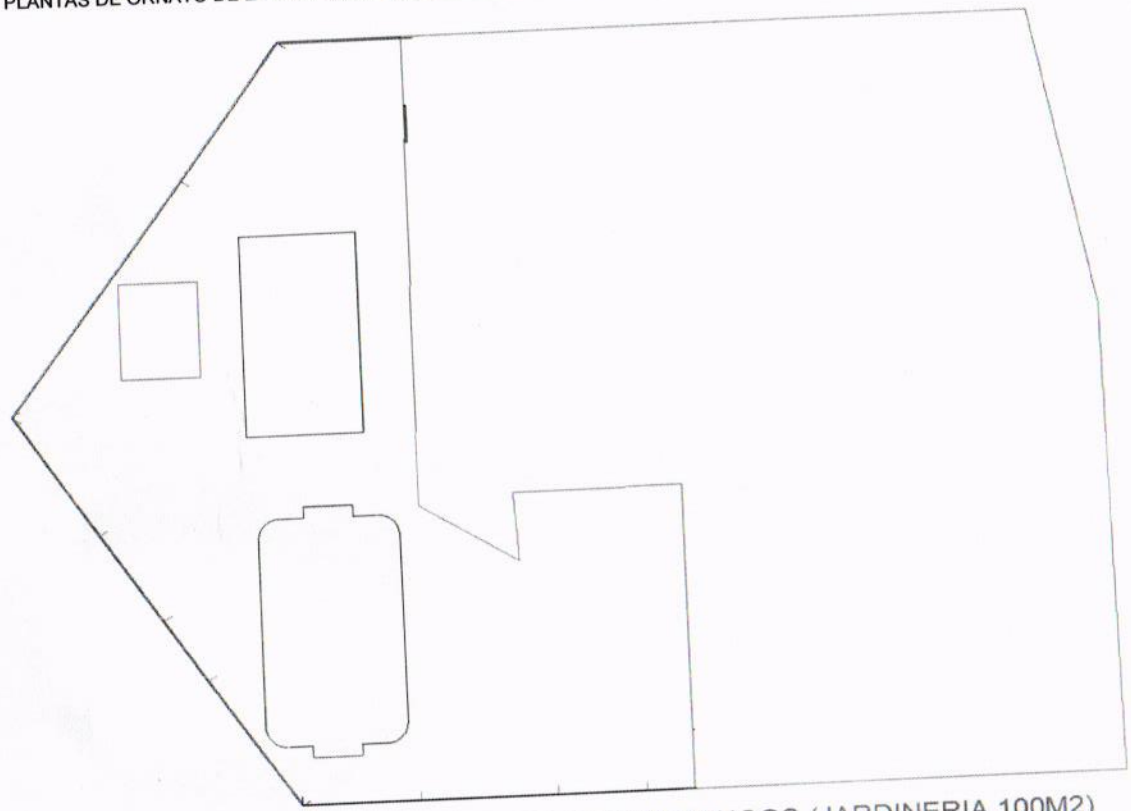

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS (JARDINERIA 100M2)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023

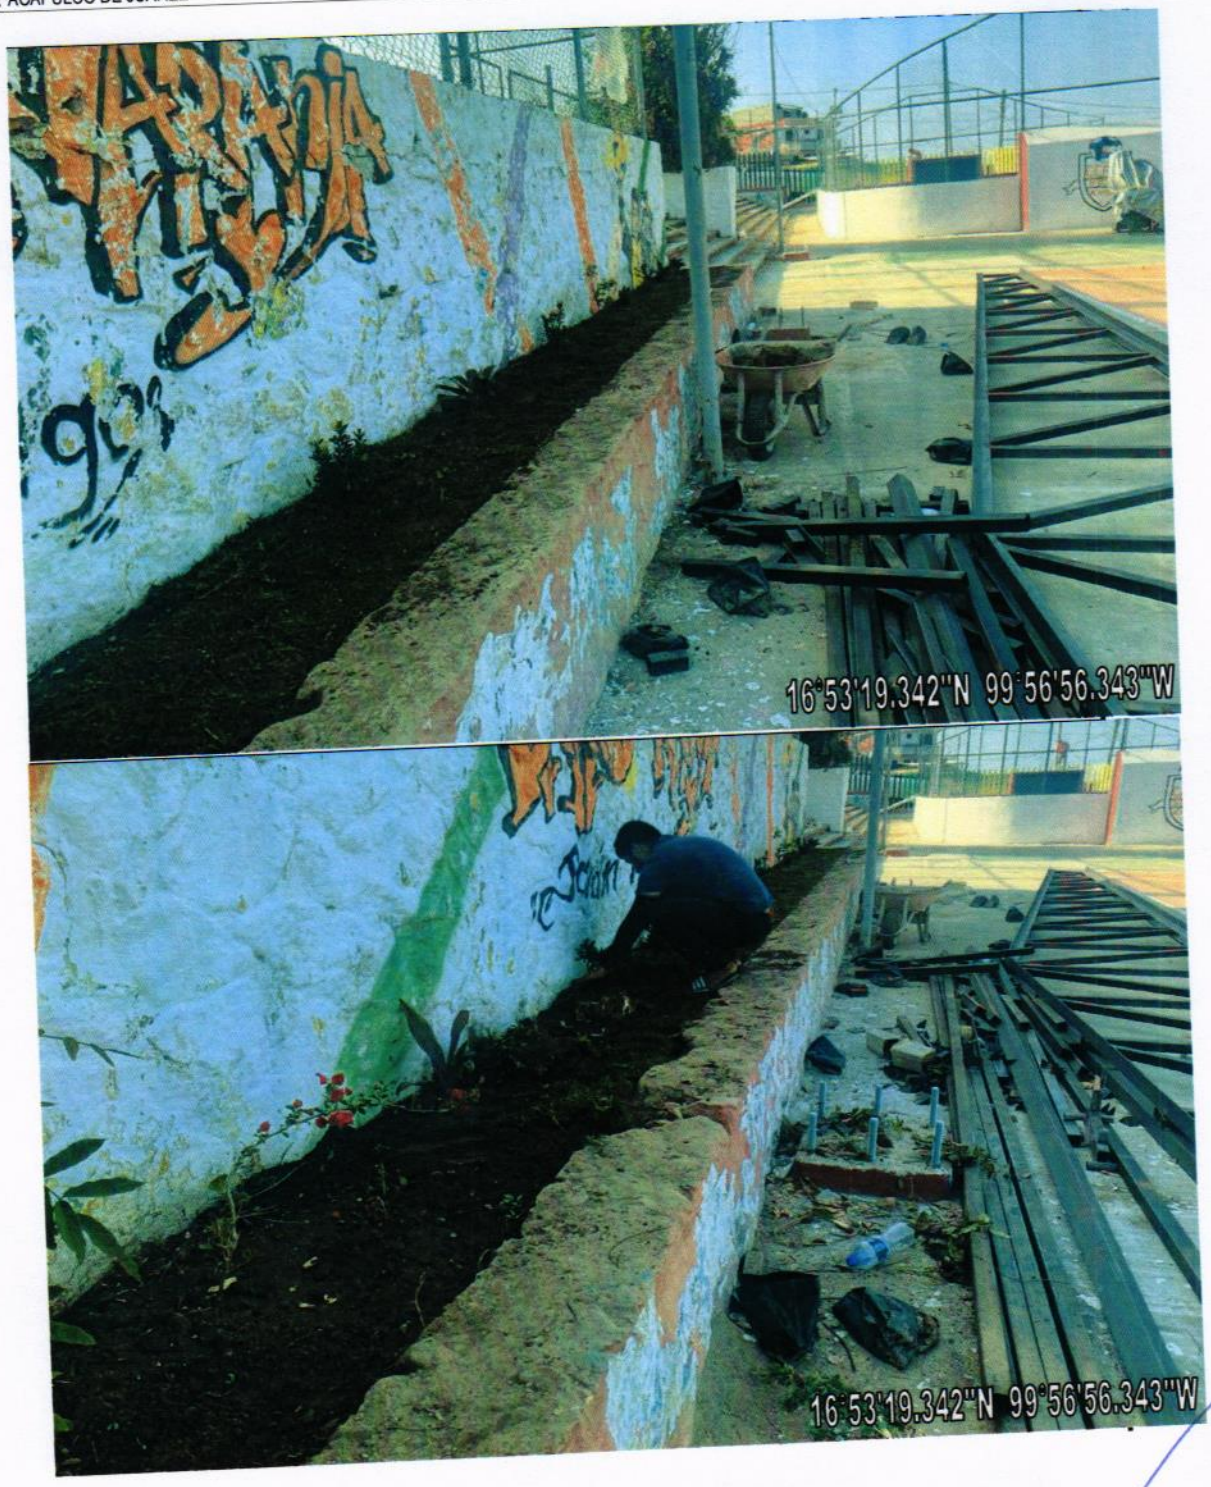

34-0549 PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



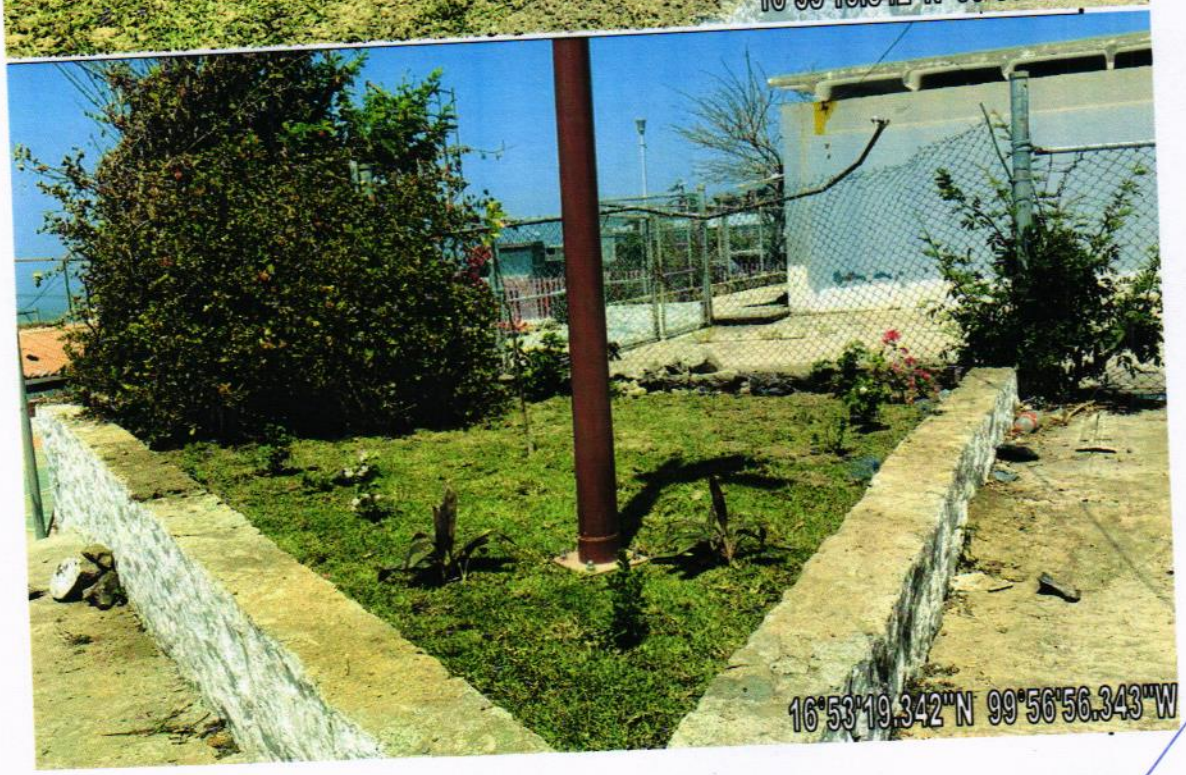

34-0549 PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
		ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		CANCHA DE FUTBOL								
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.		C1	1.00	20.54	11.48		M2	235.80	
		JARDINERIA								
			J1	1.00	100.00	1.00		M2	100.00	
							SUBTOTAL	M2	335.80	
							POR AJUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA:	M2	315.38	
							TOTAL	**M2**	**315.3800**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

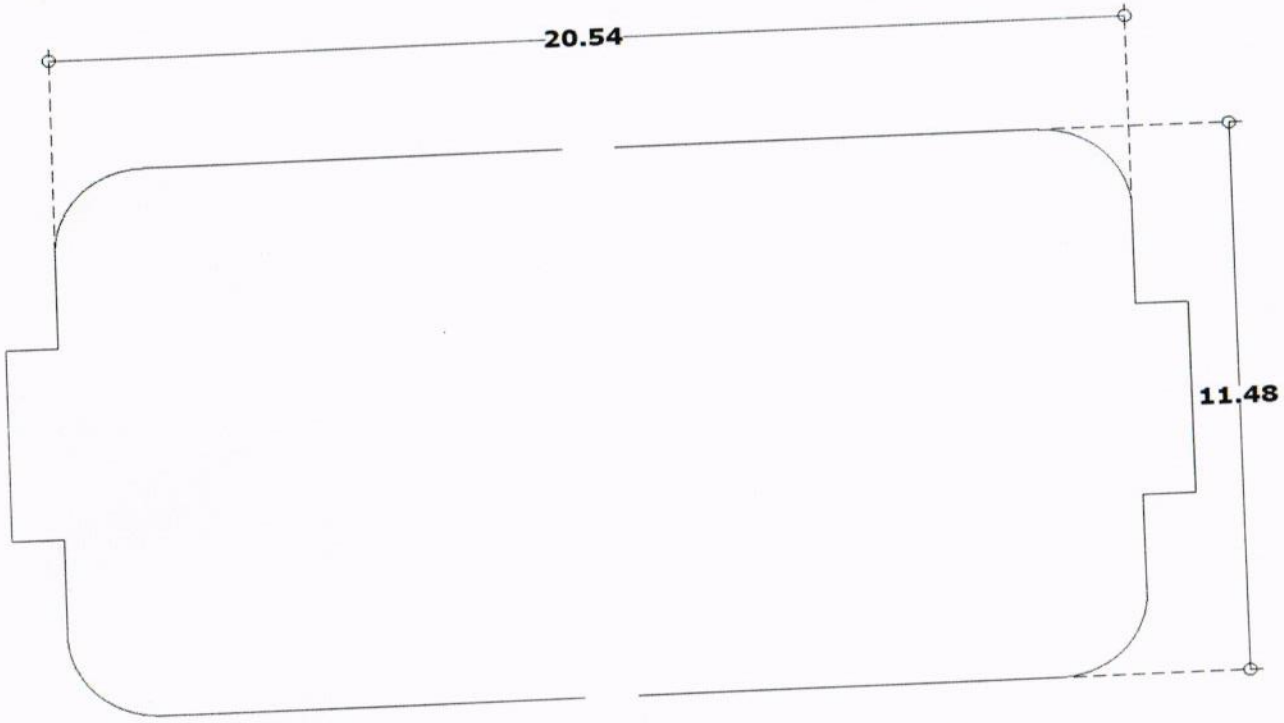

PINTURA TOP DEPORTIVA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 2 (DOS Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de nov de 2023 AL: 18 de dic de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 18 de diciembre de 2023

C R O Q U I S

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

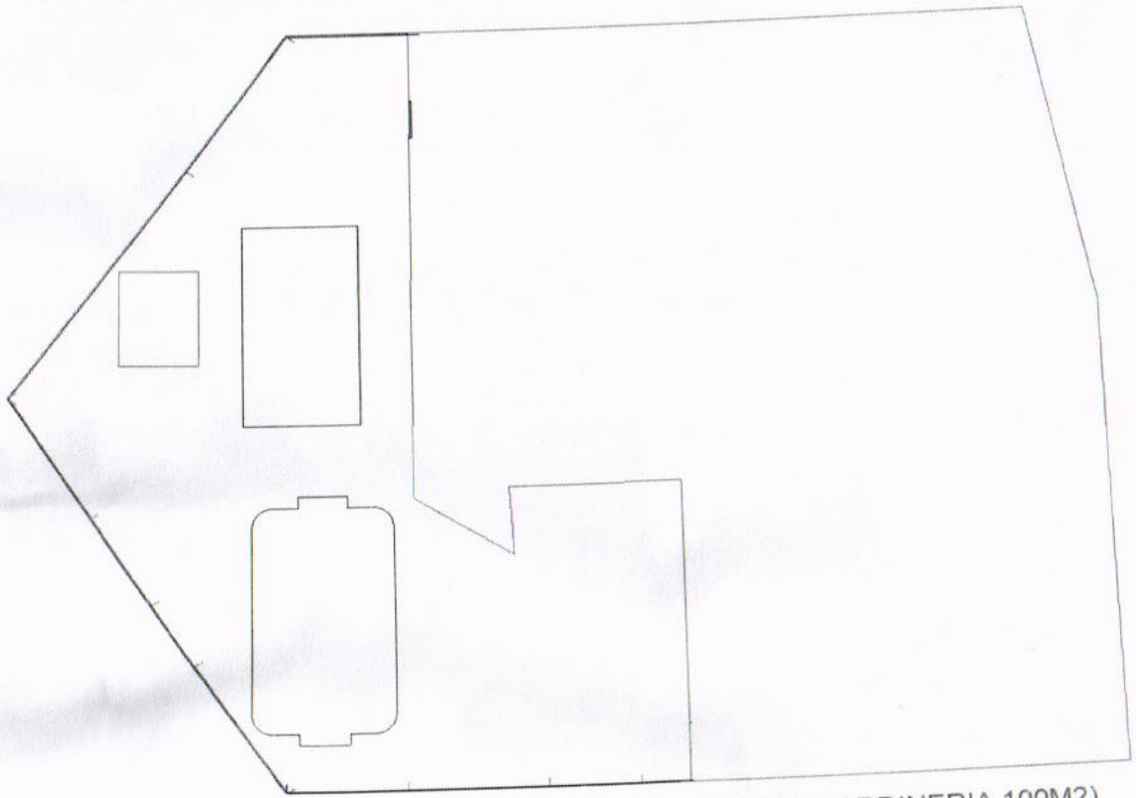

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS (JARDINERIA 100M2)

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	18 de diciembre de 2023



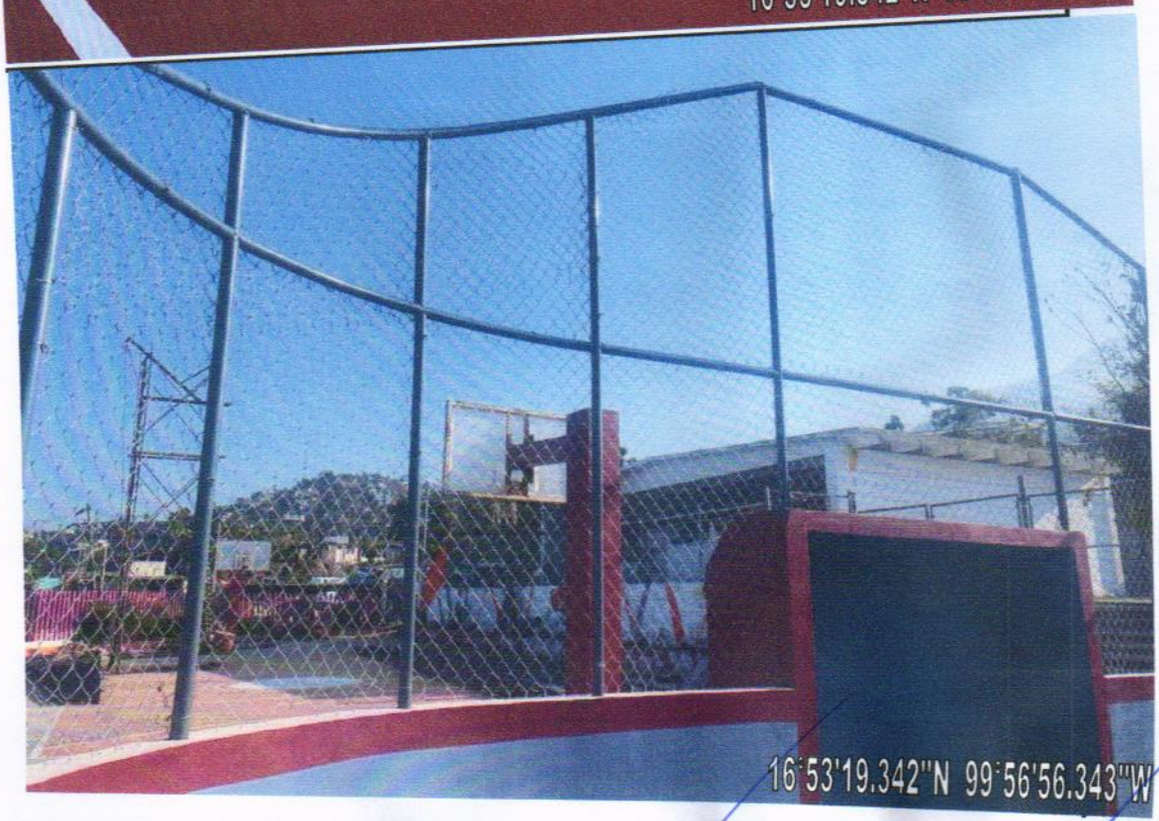

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-noviembre-2023 AL: 18-diciembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 2 (DOS Y FINIQUITO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 18 de diciembre de 2023



33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARL

FOLIO № 312849

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS COL. JARDIN MANGOS
FECHA: 20/NOV/2023

NOTA 13

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADO CON MEZCLA ASI MISMO SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO

Arq. Hilton Medina R.

Ing. Benjamin Geronimo S.

NOTA 14

27/NOV/2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADO CON MEZCLA ASI MISMO CONCLUYE LA PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO ASI MISMO SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Hilton Medina R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
Ing. Benjamin Geronimo S.

FOLIO Nº 312850

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS COL. JARDIN MANGOS
FECHA: 04/DIC/2023

NOTA 15

:.CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO ASI MISMO FINALIZAN LA PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN P/20 DE CANCHA Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA.

Arq. Victor Medina R.

ING. VLADIMIR GERONIMO S.

NOTA 16 08/DIC/2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PASTO ALFOMBRA ASI MISMO SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PUNTAS DE ORNATO DE LA REGION DE 0.20 A 1.10 MTS DE ALTURA.

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

Arq. Victor Medina R.

ING. VLADIMIR GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 312851

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 11/DIC/2023
COL. JARDIN MANGOS

NOTA 17

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE PASTO ALFOMBRA Y PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION Y SE DA INICIO A LA COLOCACION DE PORTON DE 3.00 MTS. DE ALTURA CON SOLERA DE 6" X 3/8 COMO REFUERZO HORIZONTAL ABAJO Y ARRIBA TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40 A CADA 1.5 CM. ASI MISMO SE DA INICIO A LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA (55 X 55 MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE. ASI MISMO SE PIDE LA AUTORIZACION DE LOS VOLUMENES EXCEDENTES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN:

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	EXCEDENTE
POR-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 3.00 MTS. DE ALTURA CON SOLERA DE 6" X 3/8	M/L	5.38
PLANEER	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"X1" CAL. 14 LAMINA ZINTRO CAL. 20	M/C	1.76
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS TRABAJO TERMINADO	M2	8.00
PINT-04	PINTURA ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO	M/L	51.24
33-0328	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL	M2	198.05

RESIDENTE DE OBRA
ANA MILENA TEJEDA R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ING. BLADIMIR GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 312852

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 12/DIC/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 18

:: Con esta fecha y numero de nota esta residencia en conjunto con la empresa contratista realiza recorrido al sitio de los trabajos y se observa que estan colocando el porton de 3.00 mts de altura tambien se da por enterada de la solicitud en la nota anterior por lo tanto se autorizan los volumenes excedentes que fueron realizados por ejecucion son necesarios por el proceso constructivo.

Arq. Hector Medina R.

ING. BLADIMIR GERONIMO S.

NOTA 19 13/DICIEMBRE/23

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 3.00 MTS. DE ALTURA ASI TAMBIEN LA COLOCACION DE MALLA CICLONICA Y SE DA INICIO A LA LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20 MTS. ASI MISMO SE LE PIDE AL RESIDENTE DE OBRA VISITAR LA OBRA CON LA FINALIDAD DE HACER UN ULTIMO RECORRIDO AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y VERIFICAR QUE ESTOS ESTEN TERMINADOS AL 100 % CONCILIAR VOLUMENES Y HACER EL CIERRE DE ESTA BITACORA DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Hector Medina R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ING. BLADIMIR GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 312853

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 18/DIC/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 20

CIERRE DE BITACORA

Con esta fecha la residencia de obras publicas conjuntamente con la contratista realizan recorrido y revision de los trabajos ejecutados en la obra Rehabilitacion de parque publico jardin mangos col. jardin mangos con numero de contrato MAJ-FAISMUN/339-2023/AD verificando que se encuentran terminados al 100% y funcionando por lo que se procede al cierre de la presente bitacora de obra, recordandole a la empresa contratista que el H. Ayuntamiento constitucional de Acapulco se reserva el derecho de realizar cualquier reclamacion posterior en caso de existir vicios ocultos o deficiencias tecnicas en trabajos ejecutados como lo establece el marco juridico.

ING. BERNABE GERONIMO S.

RESIDENTE DE OBRA | SUPERVISOR | SUPERINTENDENTE

Arq. Hugo Medina R.

ESCR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ESTIMACION 1 (UNO)

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FODO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS.**

UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS.**

CONTRATISTA: **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**

NUMERO DE: **ZONA DE ATENCION PRIORITARIA (ZAP) 1672**

CLAVE DE LA LOCALIDAD:**12001 001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 1672**

ORIGINAL

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPTO. DE PROYECTOS, PROGRAMACION Y PLANEACION DE OBRAS

REVISION Y REGISTRO DE EXPEDIENTES TECNICOS

FOLIO No. 493

OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS		
UBICACIÓN:	COL. JARDIN MANGOS	MONTO:	$ 1,080,000.0
EMPRESA:	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	FONDO:	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
OBSERVACIONES:	SE RECIBIO EXPEDIENTE TECNICO Y COMITÉ DE OBRA COMUNITARIO PARA SU ELABORACION Y REVISION CORRESPONDIENTE. SUJETO A CAMBIO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN QUE RIGEN EL PROGRAMA		

REVISO: DEPTO. PROYECTOS, PROGRAMACION Y PLANEACION

REVISADO

LIBERACIÓN PARA CONCESIÓN

META PROGRAMADA: 117.33 M2

FECHA: martes, 13 de febrero de 2024

EETR-02
REV-02

2023 Francisco VILLA

2023 ESCUDERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS. COL. JARDIN MANGOS

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	21-dic.-23	MARCELINO LUNA ALEJANDRO FACTURA 121	648,000.00	199,986.20	448,013.80
		SUBTOTAL $	648,000.00	**199,986.20**	448,013.80
		TOTAL $	**648,000.00**	**199,986.20**	**448,013.80**

jueves 21 de diciembre de 2023

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO

TRANSFERENCIA: 1135

19 DE MARZO DE 2024

Paguese vía transferencia a: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

La cantidad de: 448,013.80

(** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS 80/100 M.N. **)

PÓLIZA TRANSFERENCIA

Beneficiario MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Banco a transferir	CLABE	Banco pagador	Cuenta
		FIII FAISM 2023 STDER 9395	65509609395
		19/03/2024 1135	448,013.80
	Cuenta		

Concepto

Pago de solicitudes : 1501-1265, PAGO FACTURA NO.121 EST. 01 (UNO) MEJORAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, COL. JARDÍN MANGOS, CON CARGO AL RAMO 33 FONDO III 2023 (DPCP/861-FIII/2023) Con facturas : 4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A,

Facturas: 4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A,

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
21130-00000-10004-00365	Generado por cuenta por pagar	448,013.80	
11120-00000-02005-00005	MARCELINO LUNA ALEJANDRO		448,013.80
		448,013.80	448,013.80

Solicitud de pago 504 1083

Póliza 11 3 110

OPERADO
FISM 2023

Elaboró JCM

Revisó LFMO

Autorizó CAMR

1135

Santander

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ 080122053040

Usuario: 53420142 - MONTSERRAT MONTES MANRRIQUEZ

Referencia: 3P749

Referencias del Movimiento: 563123P749

Estado: EJECUTADO

Divisa: MXN

Cuenta Cargo: 65509609395 - R33 FIII FAISM 2023

Cuenta Abono: 65508744941 - MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Importe: $ 448,013.80 MXN

Concepto: R33FIII F121 EST1 MEJORAMIENTO PARQUE

Fecha aplicación: 19/03/2024

RFC Beneficiario:

Importe IVA:

Email del Beneficiario:

Operación realizada por internet

OPERADO
FAISMUN - 2023

Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó **55 5169 4303**

SuperLínea Empresarial SuperLínea PyME

Servicios en ingeniería civil

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

LUAM920218FK4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AYUNTAMIENTO, 24, La Villa, 39200, Ayutla de los Libres, Ayutla de los Libres, Guerrero, México
Tel. 7451070859

CLIENTE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
MAJ010101NA3
USO CFDI: I01 - Construcciones.
DOMICILIO FISCAL: 39350
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura 121

FOLIO FISCAL (UUID)
4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700199165
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-12-21T10:16:51
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-12-21T10:02:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
39200

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.50%	5 al millar C.M.I.C	$ 2,793.10
0.50%	5 AL MILLAR INSP.DE OBRA	$ 2,793.10
	Total	$ 5,586.20

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	ESTIMACION No.01 (UNO) DE LA OBRA :REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION:COL. JARDIN MANGOS , CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023 /AD DE FECHA:10 DE OCTUBRE DE 2023 PERIODO DE CONTRATO:20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023 Clave Prod. Serv. - 70151805 Servicios de conservación de parques o reservas forestales Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 391034.48 Tasa - 0.160000 Importe - $ 62,565.52	$ 391,034.48	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 391,034.48

OPERADO
FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DIRECCION DE PROGRAMACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

REVISADO:
DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IMPORTE CON LETRA	CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS, 80/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 391,034.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 62,565.52
RETENCIÓN LOCAL 5 al millar C.M.I.C 0.50%	$ 2,793.10
RETENCIÓN LOCAL 5 AL MILLAR INSP.DE OBRA 0.50%	$ 2,793.10
TOTAL	$ 448,013.80

REVISADO:
C. P. MIGUEL JAIMES RAMOS
SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

lrpd3NXEzIlUFEgR4Jjx2WN0hHcTMrNsHkdZmD1clJJh7EmcrzIk1PjTDdK/U9zIX4G/OmYaDIXnpRVDAxheOzWK9WsZFxYJmVxN6BQZqmj2d0Pm5kYDuBF3FPW/YIh XkFy74flPnywG77Ha8Jr+u3VB0dFG4HcJVOEd+gJXo/zfSC2RpSVGAH7OzacG77fmq3mCq9ls25ScxGkFfvgMwA59rR7ZsxzbIHz6DtcrdrSumzdELLrTlTmVGU8b4MPL GvUPfBx6J92h5zz8g89nflh9dfMs3NqKV3gk5lDjZpS73P4uLnlFcAF0BnOC++yTd1rWxzeDIOR4dcAzbS31CA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

tYJ4DUXDjXGaHD/sVk4ZilB5cAFxSoEMOU/g4MpcaMGOiavDewn3aMCe8NEJa5OlmDMr3ltV7y6jPX8QRN10mlHGIJJ53zc6bGFxojFZ+tzQgkl2ivtuVSa8gnxYdoape57 TlZygLJ+ObTee0Mi2hlBxVFJhcremgiC7PAu3HVgpL9qstW5cEs9ipvJdb3p9gt082ZE4mVesfNb+wEjh8gOS2y5ACMb+TTbria0MKwmEb4Whz2LuJ5Yx3S5vsz71jwqEMk uvT7M37Q4HlMlgqcFcR7M5Q1SN3ZiZwWpnMp+AlzOs1k1J/mbySED9meaHddojgbgybTemm9hgIYdTBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A|2023-12-21T10:16:51|STA0903206B9|lrpd3NXEzIlUFEgR4Jjx2WN0hHcTMrNsHkdZmD1clJJh7EmcrzIk1PjTDdK/U9zIX4G/OmYaDIXnpRVDAxheOzWK9WsZFxYJmVxN6BQZqmj2d0Pm5kYDuBF3FPW/YIhXkFy74flPnywG77Ha8Jr+u3VB0dFG4HcJVOEd+gJXo/zfSC2RpSVGAH7OzacG77fmq3mCq9ls25ScxGkFfvgMwA59rR7ZsxzbIHz6DtcrdrSumzdELLrTlTmVGU8b4MPLGvUPfBx6J92h5zz8g89nflh9dfMs3NqKV3gk5lDjZpS73P4uLnlFcAF0BnOC++yTd1rWxzeDIOR4dcAzbS31CA==|00001000000506204896||

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: *foliosdigitales.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *foliosdigitales.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

RFC EMISOR: **LUAM920218FK4**

DOMICILIO: **CALLE EMILIANO ZAPATA, NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEXICO**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS**
NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **10 DE OCTUBRE DE 2023**
PERIODO DE CONTRATO: **20 DE OCTUBRE DE 2023** **AL** **18 DE DICIEMBRE DE 2023**
PERIODO ESTIMADO: **20 DE OCTUBRE DE 2023** **AL** **19 DE NOVIEMBRE DE 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$1,080,000.00**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$324,000.00**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **117.33 M2** **M2**
METAS ALCANZADAS **60** **%**
No. DE OBRA: **MAJ/539**

OPERADO
FAISMUN - 2023

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE $ 448,013.80 (* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS 80/100 M.N.*) POR CONCEPTO DE PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 (UNO) , DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN LA COL. JARDIN MANGOS , DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

DEDUCCIONES:	
Amort. Anticipo	**$194,400.00**
5 AL MILLAR C.M.I.C.	**$2,793.10**
5 al Millar INSP. DE OBRAS	**$2,793.10**
TOTAL DE DEDUCCIONES:	**$199,986.20**

CALCULO DE LA ESTIMACION		
Estimación C/IVA:	**$**	**648,000.00**
TOTAL DEDUCCIONES:	**$**	**199,986.20**
SALDO A PAGAR:	**$**	**448,013.80**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15/NOV/2023

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUBTOTAL:	**$**	**391,034.48**
IVA 16%	**$**	**62,565.52**
5 AL MILLAR C.M.I.C.		**$2,793.10**
5 al Millar INSP. DE OBRAS		**$2,793.10**
TOTAL:	**$**	**448,013.80**

(* CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS 80/100 M.N.*)

HACIENDA SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUAM920218FK4	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A	2023-12-21T10:02:13	2023-12-21T10:16:51	STA0903206B9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$448,013.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="448013.80" Moneda="MXN" SubTotal="391034.48"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDAxOTkxNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
NoCertificado="00001000000700199165" FormaPago="99"
Sello="lrpd3NXEzIlUFEgR4Jjx2WN0hHcTMrNsHkdZmD1cIJJh7EmcrzIk1PjTDdK/U9zIX4G/OmYaDIXnpRVDAxheOzWK9WsZFxYJmVxN6BQZqmj2d0Pm5
Fecha="2023-12-21T10:02:13" Folio="121" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARCELINO LUNA ALEJANDRO" Rfc="LUAM920218FK4"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="391034.48" ValorUnitario="391034.48" Descripcion="ESTIMACION No.01 (UNO) DE LA
      OBRA :REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION:COL. JARDIN MANGOS , CON CARGO AL FONDO III
      RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023 /AD DE FECHA:10 DE OCTUBRE DE 2023
      PERIODO DE CONTRATO:20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
      ClaveProdServ="70151805">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="62565.516800" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="391034.48"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="62565.52">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="62565.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="391034.48"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="5586.20" version="1.0">
        <implocal:RetencionesLocales Importe="2793.10" TasadeRetencion="0.50" ImpLocRetenido="5 al millar C.M.I.C"/>
        <implocal:RetencionesLocales Importe="2793.10" TasadeRetencion="0.50" ImpLocRetenido="5 AL MILLAR INSP.DE OBRA"/>
      </implocal:ImpuestosLocales>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
        SelloSAT="tYJ4DUXDjXGaHD/sVk4ZilB5cAFxSoEMOU/g4MpcaMGOiavDewn3aMCe8NEJa5OlmDMr3itV7y6jPX8QRN10mIHGiJJ53zc6bGFxojl
        NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
        SelloCFD="lrpd3NXEzIlUFEgR4Jjx2WN0hHcTMrNsHkdZmD1cIJJh7EmcrzIk1PjTDdK/U9zIX4G/OmYaDIXnpRVDAxheOzWK9WsZFxYJmVxN
        FechaTimbrado="2023-12-21T10:16:51" UUID="4D6F1848-1AA5-4901-B9E1-40C37286E17A" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 19 de noviembre de 2023	DEL: 20-oct-23
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	AL: 19-nov-23
TIPO DE OBRA: URBANIZACION		

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO		IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$1,080,000.00	**DEL: 20 de oct de 2023**	**AL: 18 de dic de 2023**	**$324,000.00**	**8 de noviembre de 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C.	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
1 (UNO)	DEL: 20-oct-23 AL: 19-nov-23	$558,620.69	$89,379.31	$2,793.10	$2,793.10	$194,400.00	$199,986.20	$448,013.80
	TOTAL	**$558,620.69**	**$89,379.31**	**$2,793.10**	**$2,793.10**	**$194,400.00**	**$199,986.20**	**$448,013.80**
	SALDO	**$432,000.00**			**SALDO POR AMORTIZAR**	**$129,600.00**		

CONTRATISTA
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I O N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-oct-23
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 19 de Noviembre de 2023	AL: 19-nov-23
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	ESTIMACION No. 1 (UNO)

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**	
A01	**PRELIMINARES**	**$20,078.72**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**	**$72,852.29**
A03	**ALUMBRADO**	**$325,006.70**
A04	**HERRERIA**	**$140,682.98**
A05	**ACABADOS**	**$0.00**
A06	**JARDINERIA**	**$0.00**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**	**$0.00**
	TOTAL DE PARTIDAS $	**558,620.69**
	SUBTOTAL $	**558,620.69**
	16% I.V.A. $	**89,379.31**
	TOTAL $	**648,000.00**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ 648,000.00 (* SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.*)

AVANCE FISICO 60.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR	0.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL	60.00%
AVANCE FINANCIERO TOTAL	60.00%

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

	E S T I M A C I O N		ESTIMACION No. 1 (UNO)
	MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-oct-23
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 19 de Noviembre de 2023	AL: 19-nov-23
		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
	CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 1 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**								
A01	**PRELIMINARES**								
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	$38.01	505.3600	0.0000	332.0200	332.0200	0.0000	$12,620.08
DESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.	M2	$11.56	280.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	$509.39	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.	M2	$28.91	102.7100	0.0000	98.0000	98.0000	0.0000	$2,833.18
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	$256.97	14.0000	0.0000	18.0000	18.0000	4.0000	$4,625.46
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$382.04	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total PRELIMINARES								**$20,078.72**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**								
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$84.63	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	$122.87	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	$3,762.42	10.0000	0.0000	8.0000	8.0000	0.0000	$30,099.36
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	$1,744.72	2.0000	0.0000	4.0000	4.0000	2.0000	$6,978.88
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$57,156.96**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

	E S T I M A C I O N		ESTIMACION No. 1 (UNO)
	MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-oct-23
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 19 de Noviembre de 2023	AL: 19-nov-23
		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
	CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 2 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$10,091.35	2.0000	0.0000	3.0000	3.0000	1.0000	$30,274.05
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	PZA	$5,500.00	1.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	$5,500.00
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA								**$72,852.29**
A03	**ALUMBRADO**								
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$2,500.67	8.0000	0.0000	10.0000	10.0000	2.0000	$25,006.70
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	$30,000.00	8.0000	0.0000	10.0000	10.0000	2.0000	$300,000.00
	Total ALUMBRADO								**$325,006.70**
A04	**HERRERIA**								
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	$23,249.44	6.0000	0.0000	5.0000	5.0000	0.0000	$116,247.20
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.	M2	$310.02	102.7100	0.0000	78.8200	78.8200	0.0000	$24,435.78
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	$3,304.19	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$501,463.73**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

	E S T I M A C I O N		ESTIMACION No. 1 (UNO)
	MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ	UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	DEL: 20-oct-23
	NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	FECHA: 19 de Noviembre de 2023	AL: 19-nov-23
		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	
	CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	TIPO DE OBRA: URBANIZACION	HOJA: 3 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.	PZA	$130,930.00	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total HERRERIA								**$140,682.98**
A05	**ACABADOS**								
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	$122.00	505.3600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	$128.59	25.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$61.29	780.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	$154.44	241.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	$37.66	142.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total ACABADOS								**$0.00**
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$0.00**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

E S T I M A C I O N

ESTIMACION No. 1 (UNO)

MUNICIPIO ACAPULCO DE JUAREZ

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

DEL: 20-oct-23

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

FECHA: 19 de Noviembre de 2023

AL: 19-nov-23

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

TIPO DE OBRA: URBANIZACION

HOJA: 4 DE: 4.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A06	**JARDINERIA**								
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..	M3	$529.56	56.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	M2	$172.19	280.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	PZA	$121.66	140.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total JARDINERIA								**$0.00**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**								
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	$331.00	26.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	$8.80	117.3300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	$0.00
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA								**$0.00**
	SUBTOTAL ESTA HOJA								**$0.00**
	TOTAL DE ESTA ESTIMACION								**$558,620.69**

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

ACAPULCO, GRO. A 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

POR MEDIO DE LA PRESENTE EL QUE SUSCRIBE MARCELINO LUNA ALEJANDRO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MARCELINO LUNA ALEJANDRO ME DIRIJO A USTED DE LA MANERA MAS ATENTA PARA SOLICITAR AUTORIZACION DE VOLUMENES EXCEDENTES DE ACUERDO CON LA OBRA DENOMINADA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO. CABE MENCIONAR QUE ESTOS VOLUMENES ESTAN AVALADOS EN LA ESTIMACION 1 (UNO), Y NO EXCEDE EL IMPORTE DEL MONTO CONTRATADO, POR LO QUE ENLISTO LOS SIGUENTES CONCEPTOS.

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	$256.97	14.00	18.00	4.00	$1,027.88
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	$1,744.72	2.00	4.00	2.00	$3,489.44
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$10,091.35	2.00	3.00	1.00	$10,091.35
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$2,500.67	8.00	10.00	2.00	$5,001.34
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	$30,000.00	8.00	10.00	2.00	$60,000.00

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

OFICIO: DOP/1458/2023
Asunto: Autorización de Excedentes
Acapulco, Gro., a 13 DE NOVIEMBRE DE 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
Representante legal de la Empresa:
MARCELINO LUNA ALEJANDRO
P R E S E N T E.

En relación al escrito, de fecha **10 DE NOVIEMBRE DE 2023** , mediante el cual solicita la autorización para las cantidades adicionales a **5 (cinco) conceptos de obra** , referentes al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** , formalizado a favor de su representada con fecha **10 DE OCTUBRE DE 2023** Por medio del presente y en total apego a lo establecido en los Art. 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios Relacionados con las Mismas, Art. 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los cuales señalan:

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la Dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la Dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

En cumplimiento a mis funciones estipuladas en el **Artículo 113, 114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,** en mi carácter de **Residente de Obra,** una vez realizado el dictamen técnico que fundamenta y sustenta la solicitud presentada, se considera procedente autorizar la ejecución de cantidades adicionales a los **5 (cinco) conceptos de obra** asimismo se especifica que son totalmente necesarios durante el proceso constructivo del contrato de obra pública en cuestión y que no existe la necesidad de modificar el importe contratado y el tiempo de ejecución originalmente pactado.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
C.c.p. Archivo.

DICTAMEN DE JUSTIFICACIÓN PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES NO PREVISTAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL

1.- ANTECEDENTES

De acuerdo al oficio de autorización de recursos por parte de la **Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico**, No. SEPLADE/321/2023 de fecha 08 de Mayo de 2023, correspondiente al **Ramo 33, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), ejercicio 2023,** mediante el cual fue autorizada la obra denominada, **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS** , UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS** , **EN ACAPULCO DE JUÁREZ**, por un importe de Contrato de **$1,080,000.00** **UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.**

Con fecha 10 DE OCTUBRE DE 2023 , fue formalizado el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** , entre la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas y la empresa contratista **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** para la ejecución de la obra **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS** , UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS** , **EN ACAPULCO DE JUÁREZ.** con un plazo de ejecución 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023

Con fecha 10 DE NOVIEMBRE DE 2023 , fue realizada la solicitud por parte de la empresa contratista **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** , para la ejecución de cantidades adicionales en 5 (cinco) conceptos de obra incluidos en el catálogo de conceptos del contrato de obra pública de No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD** , solicitud que se anexa al presente como anexo 1.

2.- JUSTIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE CANTIDADES ADICIONALES

2.1.- CONSIDERACIONES TECNICAS

A. Fundamento No. 1

Estos trabajos son derivados por las diferencias de volúmenes de proyecto con los volúmenes del catálogo autorizado, de acuerdo a catálogo de conceptos y cantidades de obra autorizado de contrato; durante el desarrollo constructivo de la obra se han generado conceptos con volúmenes excedentes en virtud de que se han realizado los cuales técnicamente se requieren su ejecución para alcanzar las metas del proyecto autorizado, que corresponden principalmente a los siguientes aspectos:

1. En referencia a los trabajos de desmontaje de muebles sanitarios, suministro y colocación de portón de 3.00 mts. de altura, con solera de 6" x 3/8" como refuerzo horizontal, abajo y arriba, tubo de acero de 4" de diam. cedula 40, a cada 15 cms. libre entre tubo, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento de los baños en el parque publico, estas son las causas fundamentales.

2. En el área de baños y area exterior los trabajos de desmontaje de muebles sanitarios, lavabo veracruz blanco ideal st, y suministro y colocacion de mingitorio, base piramidal de 40x20x50 cms. concreto f'c=250 kg/cm2, armado con 8 varillas del #3, estribos del #2 @ 15 cms. y suministro y colocación de luminaria solar todo en uno 80 watss, led smd-cree, tipo de luz 6,500k, estos no fueron considerados en su momento en el catalogo de conceptos por tal motivo se solicitan como volumen excedente.

• Con fecha 10 de noviembre del 2023 a través de la nota de bitácora No. 9, la contratista informó a la Residencia de obras que presenta volúmenes excedentes de los programados en el presupuesto, por lo que se le solicita la autorización de la ejecución de estos volúmenes ya que son necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, para poder realizar el cierre al monto de contrato.

• A través de la nota de bitácora No. 10 con fecha 13 de noviembre del 2023, la Residencia y Supervisión de obras, le informa que los conceptos con volúmenes excedentes serán autorizados, para la conclusión de obra, mismo que fue revisado directamente en el sitio de los trabajos durante la conciliación.

2.2.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 59, Párrafo 11.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto

autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Fundamento. - Artículo 105 y 106 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana.

Una vez realizada la revisión y procedencia de las cantidades adicionales en los 5 (cinco) conceptos de obra, se determina que se cuenta con la suficiencia presupuestal total para su ejecución, por lo que no será necesario realizar una modificación al contrato de obra pública de No.MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

3.- DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Derivado del proceso constructivo de la obra en cuestión y una vez analizada la necesidad de la ejecución de las cantidades adicionales (excedentes) en los 5 (cinco) conceptos de obra. Se determina que son totalmente necesarios para la terminación y continuación del proceso de ejecución de los trabajos al amparo del contrato de obra pública de No.MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

Las cantidades adicionales necesarias por ejecutarse, dentro de los 5 (cinco) conceptos de obra, se anexan al presente como anexo 2.

4.- DICTAMEN

Una vez expuestas las motivaciones anteriores y en total apego a lo dispuesto en el artículo 59, párrafo onceavo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y los artículos 105 y 106 de su Reglamento, se dictamina procedente la ejecución de cantidades adicionales para los 5 (cinco) conceptos de obra mencionados en el anexo 2.

Así lo dictaminó el Residente de la Obra, con base a sus funciones, establecidas en los Artículos 112 y 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se anexa Bitácora fotográfica de cada concepto con cantidades excedentes como anexo 3.

ATENTAMENTE
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
C.c.p. Archivo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CANTIDADES ADICIONALES ANEXO No. 2

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

EXCEDENTES

Código	Concepto	Unidad	P.U.	Cantidad Original	Cantidad por Estimar	Excedente	Importe del Volumen
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	$256.97	14.00	18.00	4.00	$1,027.88
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	$1,744.72	2.00	4.00	2.00	$3,489.44
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	$10,091.35	2.00	3.00	1.00	$10,091.35
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	$2,500.67	8.00	10.00	2.00	$5,001.34
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	$30,000.00	8.00	10.00	2.00	$60,000.00

REVISÓ Y APROBÓ

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

2023 AÑO DE Francisco VILLA

BITACORA FOTOGRAFICA DE EXCEDENTES DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

PERIODO DE CONTRATO: 20-oct-23 — 18-dic-23

IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,080,000.00

PERIODO DE EJECUCION: 20-oct-23 — 19-nov-23






2-0070.- DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION. **2.00 PZA**

25-0381.- LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. **2.00 PZA**



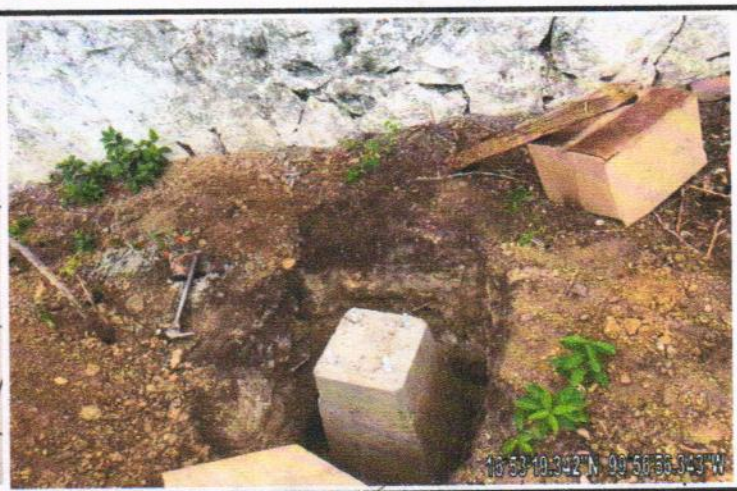

37-0622.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. **1.00 PZA**

40X20X50.- BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. **2.00 PZA**



LAM80W.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA. **2.00 PZA**

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 20 DE OCTUBRE DE 2023

CARTA DE RECEPCION DE SITIO DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS, EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. CON No. DE OBRA: MAJ/539, SE INICIA CON ESTA FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2023 POR LO QUE HACEMOS LA RECEPCION. DE LA MISMA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. MAJ-FMUN/539-20AD/AD

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA LA PRESENTE. NOS DESPEDIMOS DE USTED.

CONTRATISTA
MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2023


M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
PRESENTE:


POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA FORMAL DE LA ESTIMACION: 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS, CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

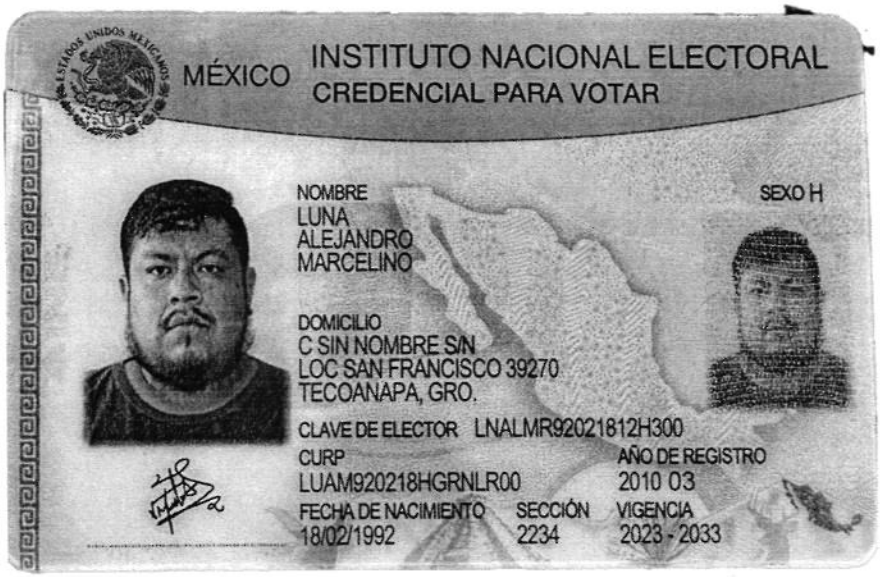
MÉXICO
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR
NOMBRE
LUNA
ALEJANDRO
MARCELINO
SEXO H
DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.
CLAVE DE ELECTOR LNALMR92021812H300
CURP
LUAM920218HGRNLR00
AÑO DE REGISTRO
2010 03
FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1992
SECCIÓN
2234
VIGENCIA
2023 - 2033

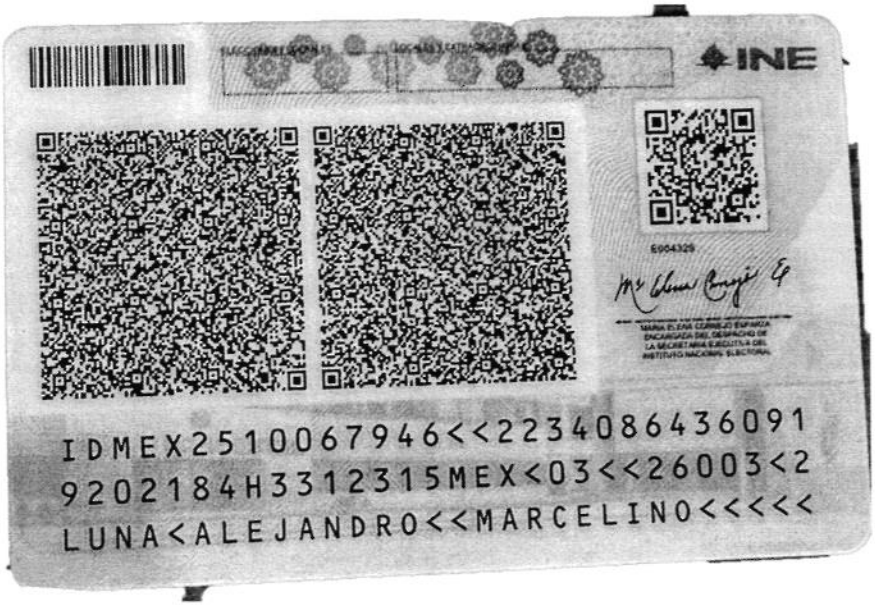
INE
IDMEX2510067946<<2234086436091
9202184H3312315MEX<03<<26003<2
LUNA<ALEJANDRO<<MARCELINO<<<<<

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

ACAPULCO, GRO. A 19 DE NOVIEMBRE DE 2023

M.I VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESENTE:

POR ESTE MEDIO HAGO ENTREGA FORMAL DE LA ESTIMACION: 1 (UNO) DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS, UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS, CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2023 Y PERIODO DE EJECUCION DEL 20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO. ASI MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
REPRESENTANTE TECNICO
CED. PROF. 12957362

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
12957362

Clave Única de Registro de Población
GESB960409HGRRLL03

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1295	410	1	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido
BLADIMIR	GERONIMO	SALVADOR

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

Nombre del programa	Clave
LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	511301

Datos de la institución educativa

Nombre o denominación	Clave
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	120001

Datos de expedición y firma electrónica

Fecha	Hora
02/08/2022	12:46:08

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original
||12957362|1295|410|1|C1|01/08/2022 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|GESB960409HGRRLL03|BLADIMIR|GERONIMO|SALVADOR|11890|120001|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO|5647|511301|LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL||

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado
guRXBNcMCaMLQjU7GWfYb4VRR3tKbsIC23AlcKwCF+5AEUWGFtZ+/md3C6GCoyGTKMxZOR0oVJsldSGCYg9Y7zfI3gCGeg7UDVtelyVdnmDxqboUSSe+1FlsmHhm7iDC/3XD/Au2ructBMrBhYlNVX4lcLBeYieD9lxOCAUxvmH6Z/p8SFawXF+KAlSlbkHI8uqcbNJDHua+MXrdwDfzcolhR8VVHAGCqqL63j7mSLB14WVWpah6+nA6B/UgTLfWDMPjwwirMM9SSjg8NxmN52qzGHl6VgoSvfiza2fE9B2EpiqhjNuCr0JGKZ4pzcv/79dK277VYkJcCQcasz4jf6w==

LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES.

Sello digital de tiempo SEP
5A+45Q5R2WxzO5yjc7o8i6AxqpnozlmRhlUOwHXmcSPU2t4ouz0v7tODqVKfUOcEab1mE4eNa5UqAMbNT/n7l0lqqEz3ODI9MHREDWt0VMxuUMZWTmQfsSkgJuDL9rKl2TcBS26JOZ5W2OiobuhFlBPtMC13mWHa3WPPkDJM0YG4kpwTgHofL0kEdMn6rCgW8jHODRuel8hr5Stb4Db2x6RY5JGVyKLvyCgeQcQqwmKstXNlgKE2xuOqsWfxKHcc3/ER/SFilhuC5f5clmX6dyQXBNloRP1BE0bccrA3QirzzOrykqkBxyCPmisQANW3fKLlgc3n+J8WqBv9aRc4HA==

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**

Identificador electrónico - cédula
12957362

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GERONIMO
SALVADOR
BLADIMIR

FECHA DE NACIMIENTO
09/04/1996

SEXO H



DOMICILIO
C SIN NOMBRE SN
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GRSLBL96040912H500

CURP GESB960409HGRRLL03 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 12 MUNICIPIO 057 SECCIÓN 2234

LOCALIDAD 0034 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

Escaneado con CamScanner

ELECCIONES FEDERALES 21 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL


IDMEX1803796956<<2234098412563
9604098H2812313MEX<01<<30952<5
GERONIMO<SALVADOR<<BLADIMIR<<<

Escaneado con CamScanner

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



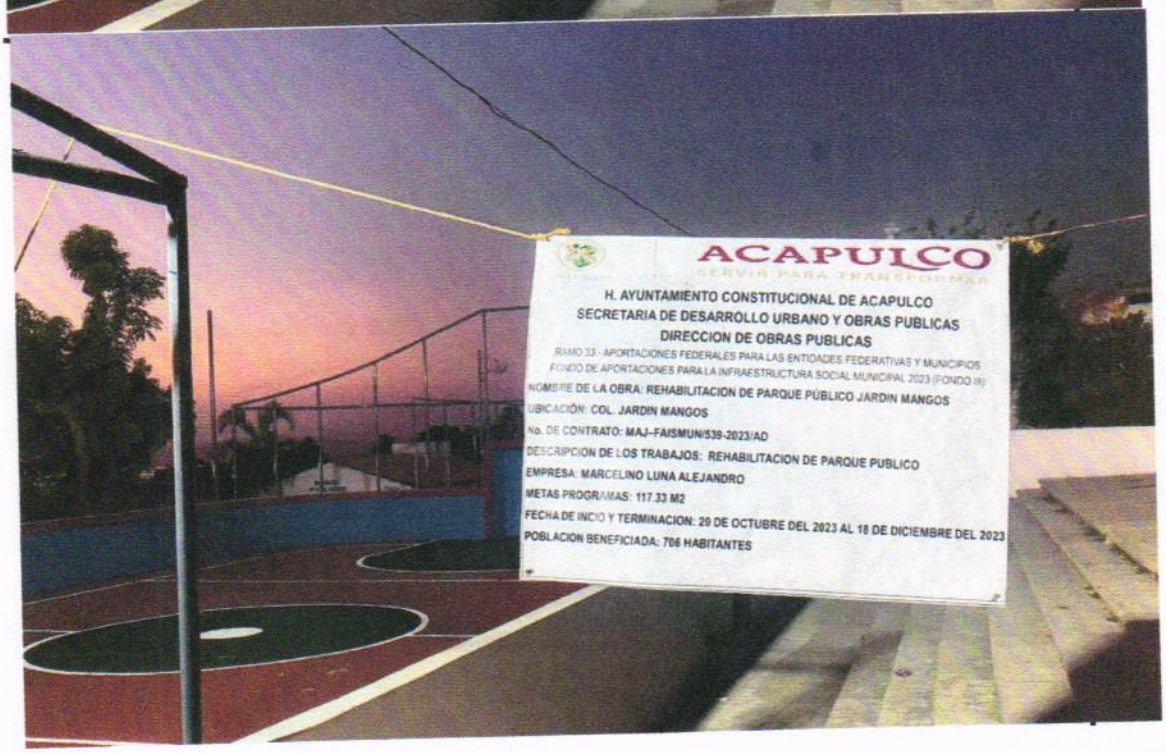

BITACORA SOCIAL

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,080,000.00**
PERIODO: **DEL** 20-oct-23 **AL** 18-dic-23

AVANCES POR PARTIDAS: **PERIODO DE REPORTE:** DEL 20-oct-23 AL 27-oct-23

1	PRELIMINARES		50%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		50%
3	ALUMBRADO		
4	HERRERIA		

5	ACABADOS	
6	JARDINERIA	

AVANCE TOTAL
17%



PREPARACION DE SUPERFICIE



PREPARACION DE SUPERFICIE



DESMANTELAMIENTO DE MALLA



DESMANTELAMIENTO DE MALLA

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,080,000.00**
PERIODO: DEL 20-oct-23 AL 18-dic-23
PERIODO DE REPORTE: DEL 28-oct-23 AL 04-nov-23


AVANCES POR PARTIDAS:

1	PRELIMINARES		80%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		80%
3	ALUMBRADO		30%
4	HERRERIA		
5	ACABADOS		
6	JARDINERIA		

AVANCE TOTAL
32%




DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS

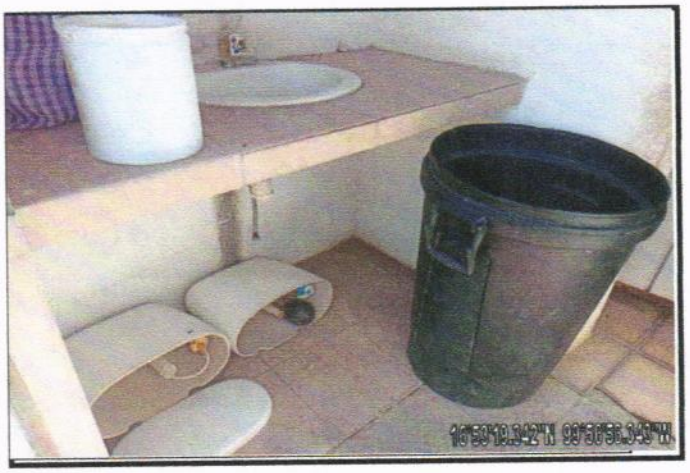

DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS



INODORO

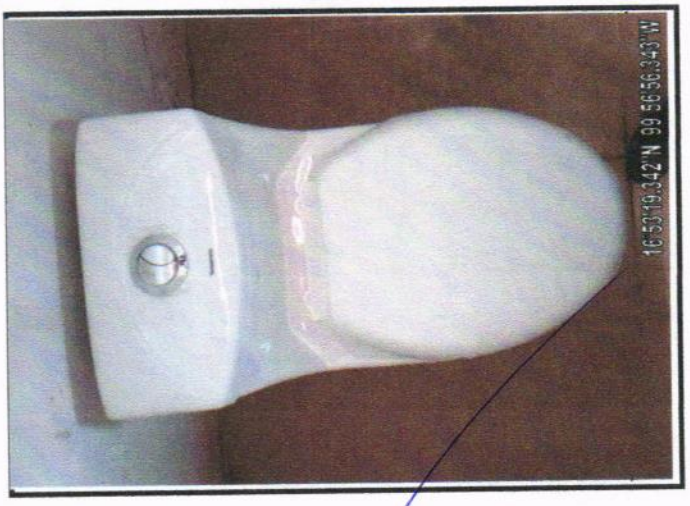

INODORO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 1,080,000.00**
PERIODO: **DEL** 20-oct-23 **AL** 18-dic-23
PERIODO DE REPORTE: **DEL** 05-nov-23 **AL** 12-nov-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	PRELIMINARES		90%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		90%
3	ALUMBRADO		60%
4	HERRERIA		
5	ACABADOS		
6	JARDINERIA		

AVANCE TOTAL
40%



LAVABO



LAVABO



MINGITORIO



MINGITORIO

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO — PERIODO DE ESTIMACION DEL 21-ago-21 AL 18-dic-23

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/539-2023/AD — IMPORTE DE CONTRATO: $ 1,080,000.00

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — PERIODO: DEL 20-oct-23 AL 18-dic-23


AVANCES POR PARTIDAS: — PERIODO DE REPORTE: DEL 13-nov-23 AL 19-nov-23

1	PRELIMINARES		100%
2	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA		100%
3	ALUMBRADO		100%
4	HERRERIA		58%

5	ACABADOS	
6	JARDINERIA	

AVANCE TOTAL

60%

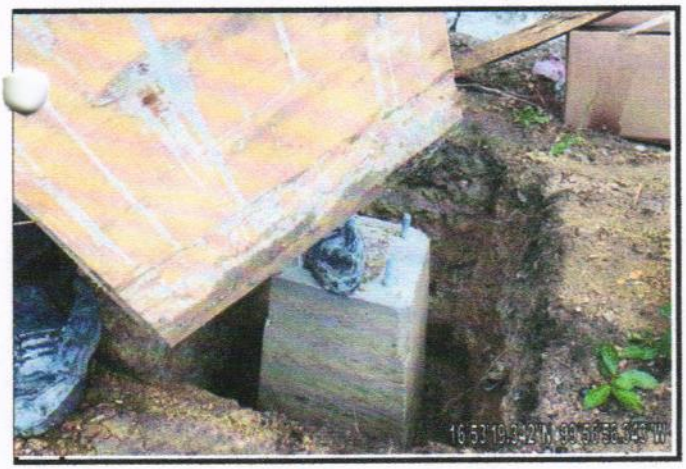


BASE PIRAMIDAL



BASE PIRAMIDAL



BASE PIRAMIDAL

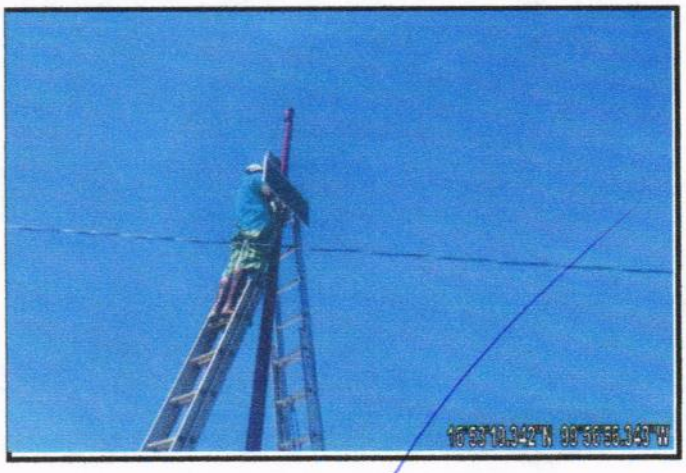

BASE PIRAMIDAL

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**									
A01	**PRELIMINARES**		**SANITARIOS**							
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE	1 Y 5	A-C	2.00	8.40		2.28	M2	38.30	MURO EXTERIOR
		A Y C	1-5	2.00	6.08		2.91	M2	35.39	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		1	A-C	1.00	8.10		2.28	M2	18.47	MURO INTERIOR
		3	A-C	2.00	6.50		3.53	M2	45.89	MURO INTERIOR
		5	A-C	1.00	8.10		2.28	M2	18.47	MURO INTERIOR
		A	A-C	2.00	2.82		2.91	M2	16.41	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		B	A-C	2.00	1.52		2.28	M2	6.93	MURO INTERIOR
		C	A-C	2.00	2.82		2.91	M2	16.41	H=(2.28+3.53)/2=2.91
		1	A-C	-6.00	2.51		0.25	M2	-3.77	VENTANAS
		5	A-C	-6.00	2.51		0.25	M2	-3.77	VENTANAS
		C	3-4	-2.00	1.05		1.15	M2	-2.42	VENTANAS
		C	1-2	-2.00	1.00		1.98	M2	-3.96	PUERTAS
		C	2-3	-2.00	0.89		1.98	M2	-3.52	PUERTAS
		C	4-5	-2.00	1.00		1.98	M2	-3.96	PUERTAS
			CANCHA							
			M1	2.00	12.45		1.50	M2	37.35	
			M2	2.00	12.45		1.50	M2	37.35	
			M3	2.00	13.90		1.50	M2	41.70	
			M4	2.00	13.94		1.50	M2	41.82	
							SUBTOTAL	M2	333.09	
						POR AJUSTE DE ESTIMACION SOLO SE COBRARA:		M2	332.02	
							TOTAL	**M2**	**332.0200**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

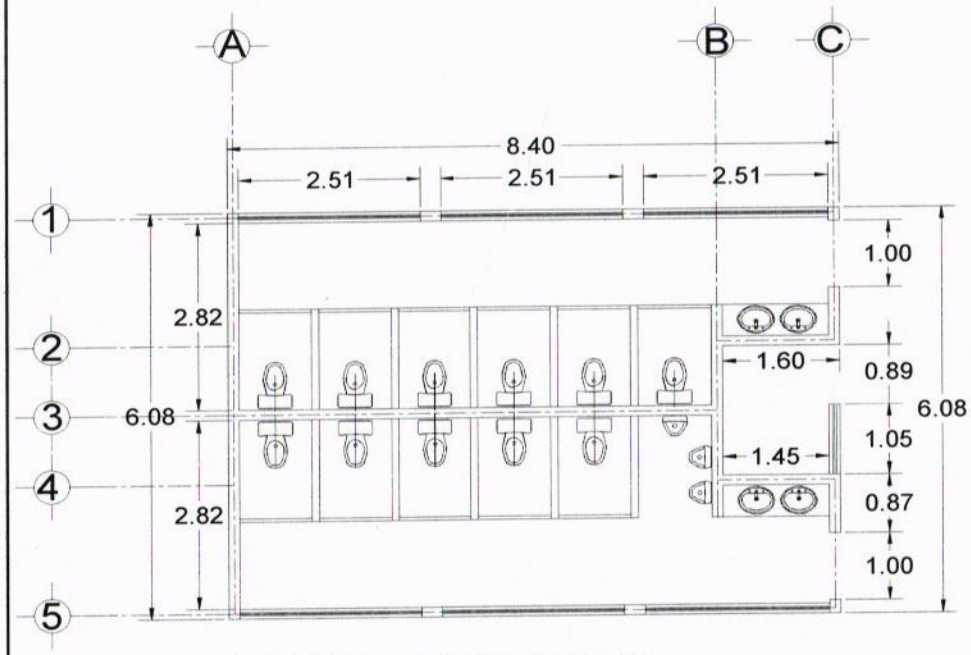

PLANTA SANITARIOS

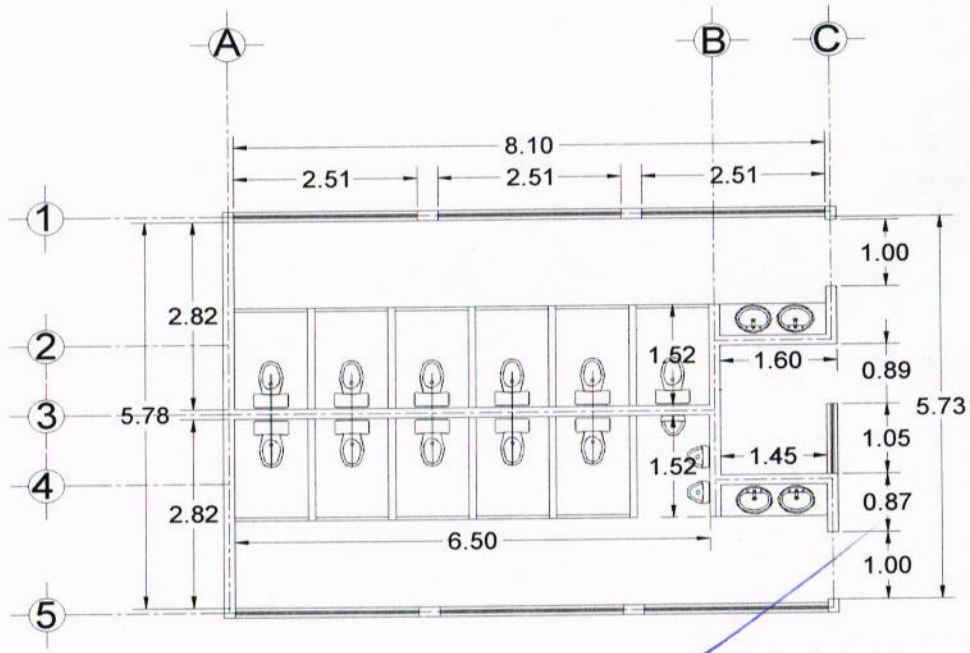

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S


MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

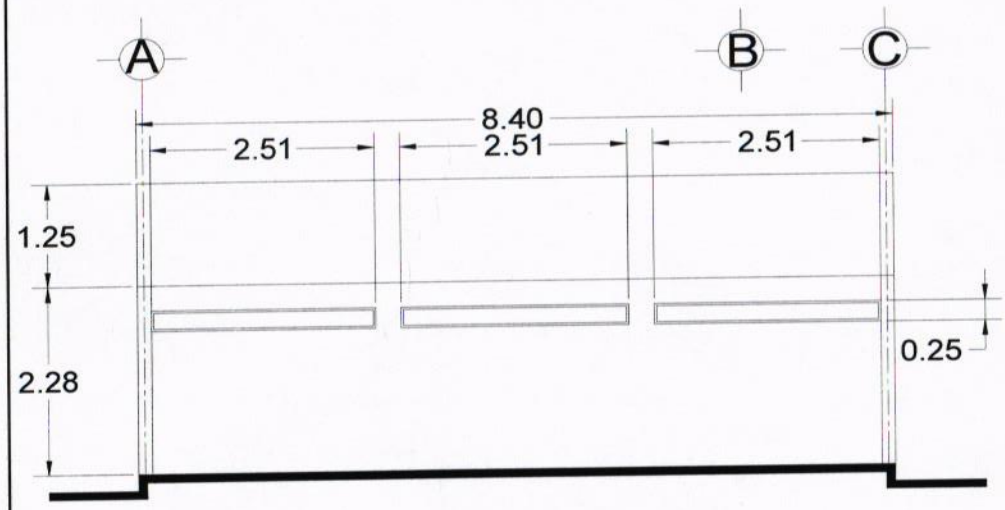

FACHADA SANITARIOS

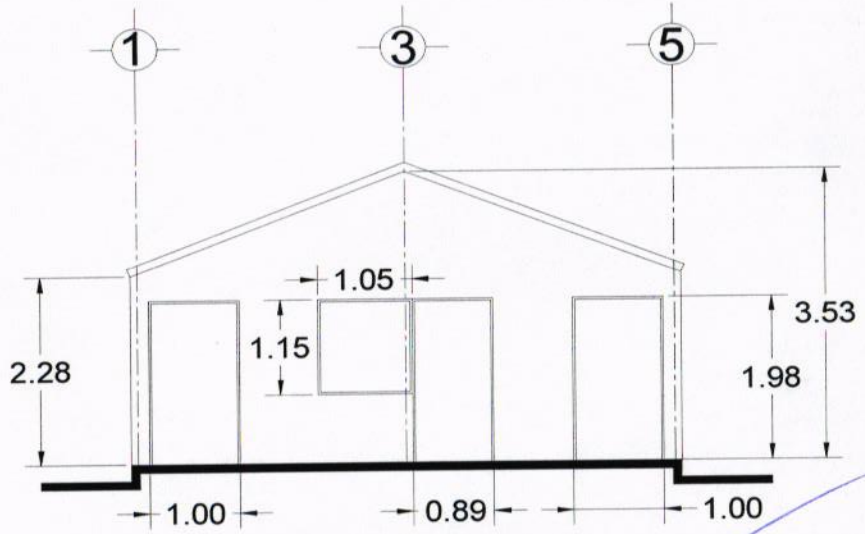

FACHADA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

ALTURA DE MURO 1.50 MTS.

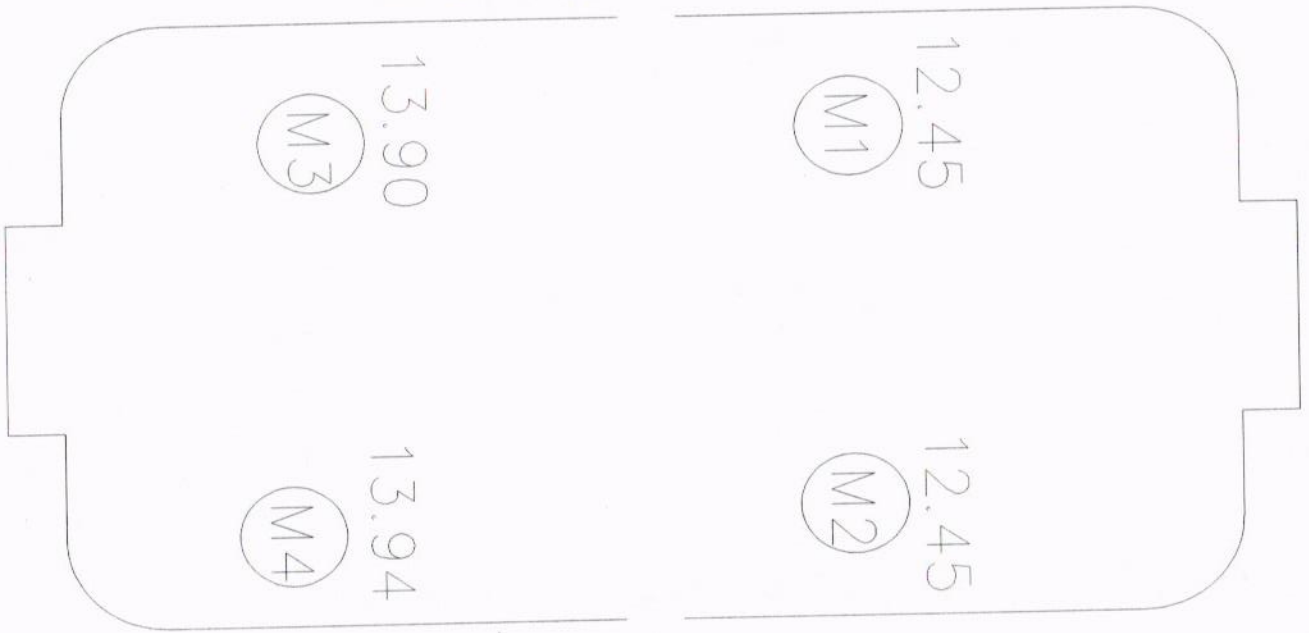

PLANTA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
			FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		PORTERIA NORTE								
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.		M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	H=(2.00+4.00)/2=3.00
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	H=(2.00+4.00)/2=3.00
		PORTERIA SUR								
			M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	H=(2.00+4.00)/2=3.00
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	H=(2.00+4.00)/2=3.00
							TOTAL	**M2**	**98.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MIETON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

2-0065 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.



PLANTA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
			ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

2-0065 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

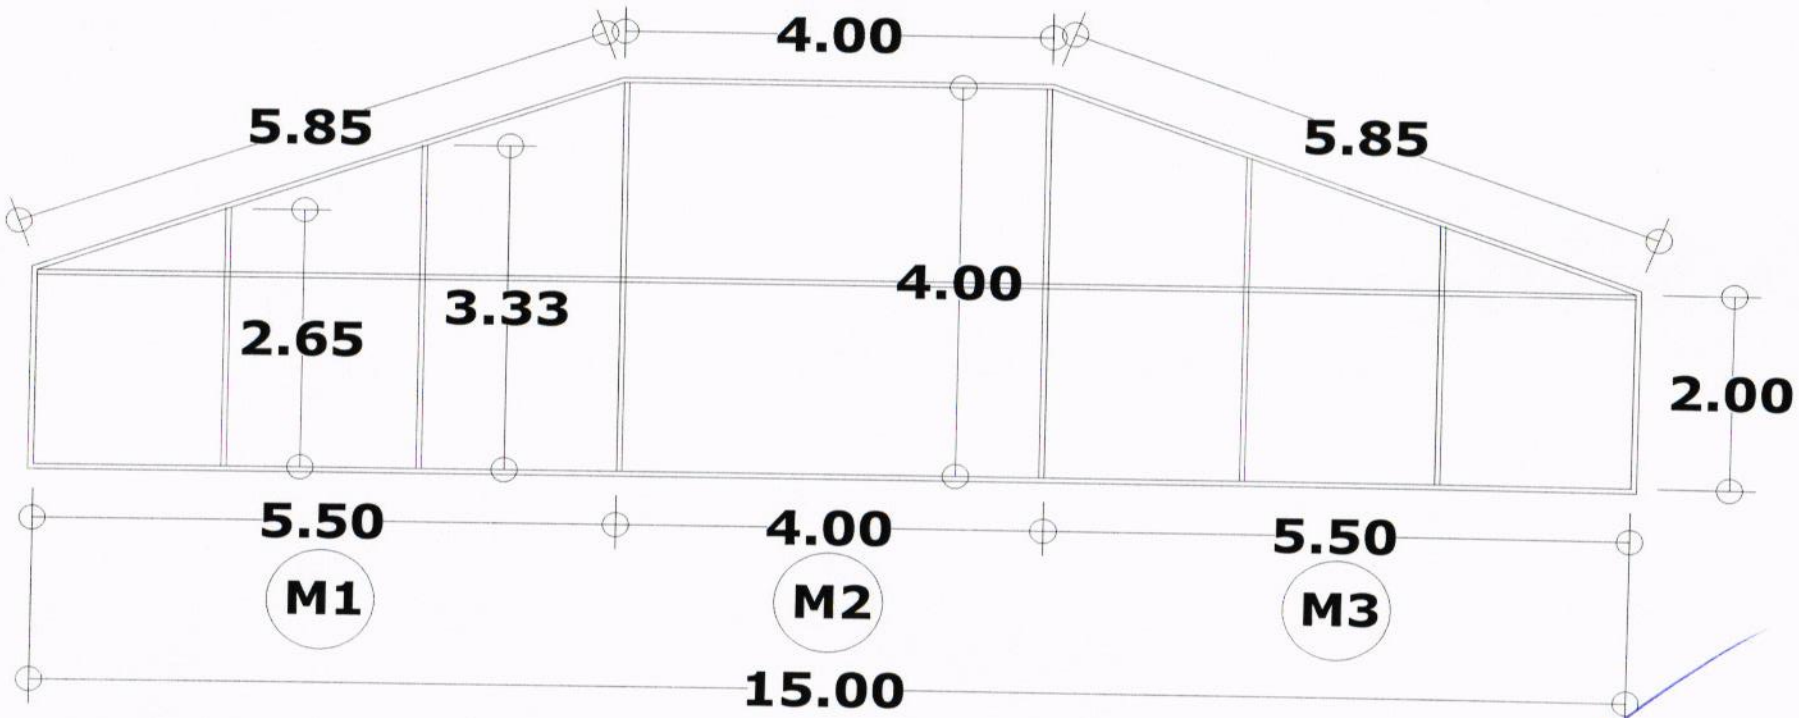

ALZADO CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

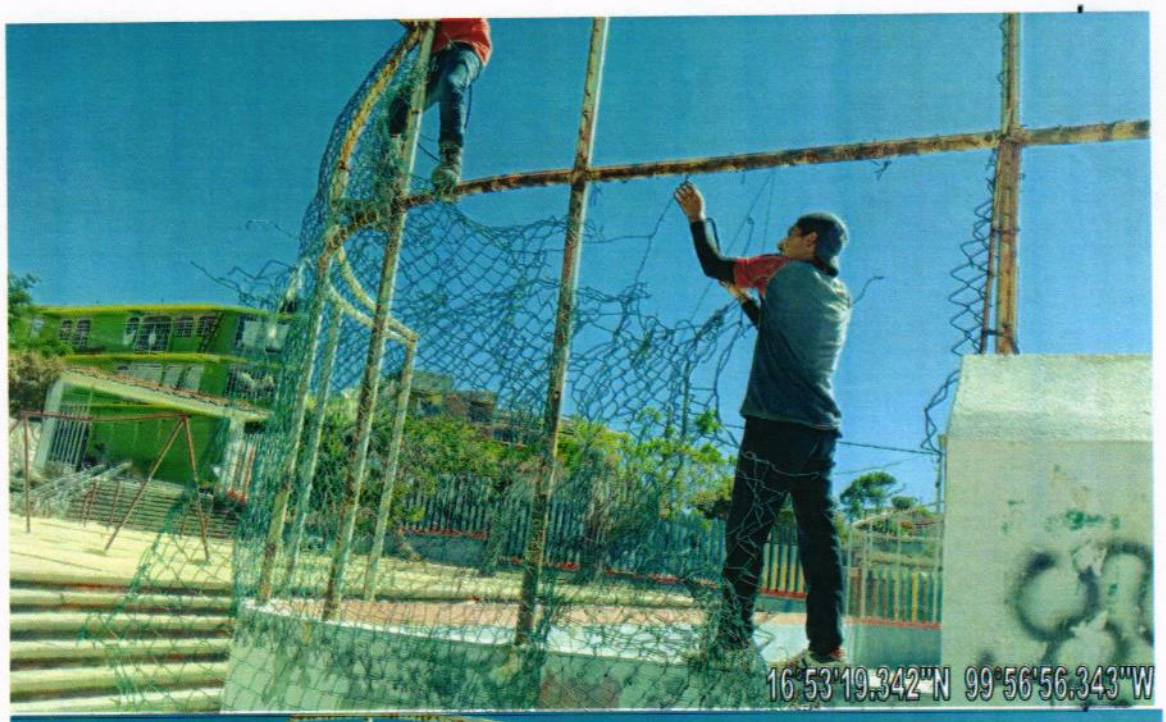



2-0065 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

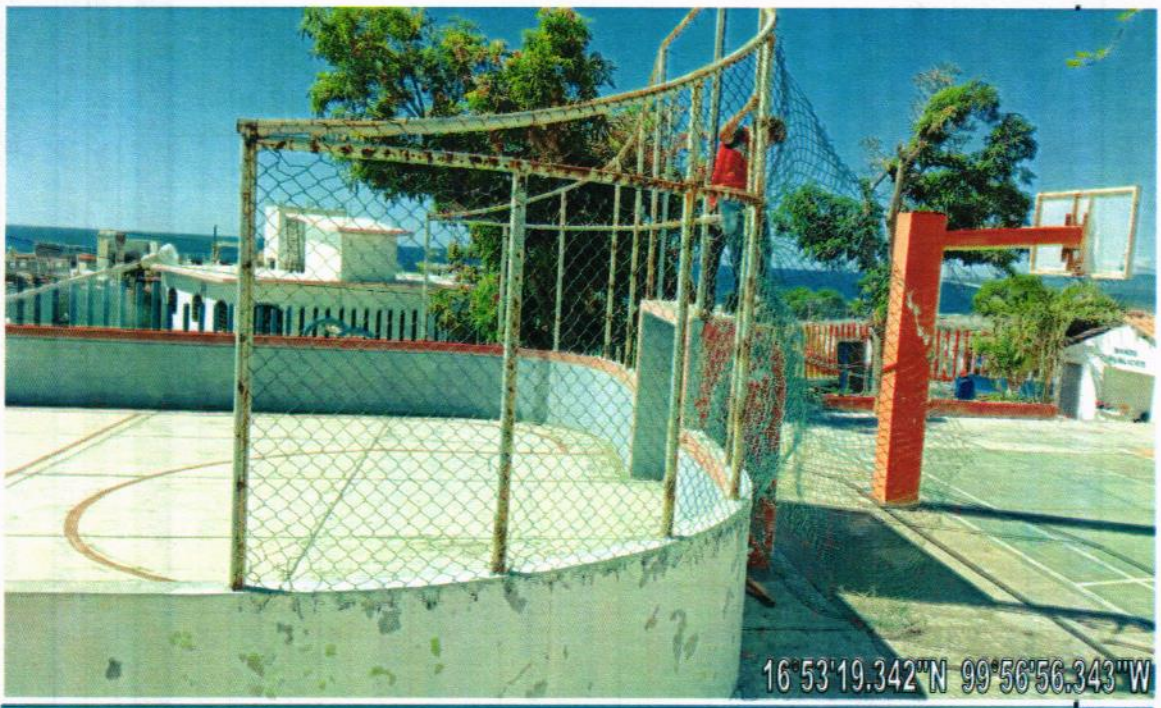

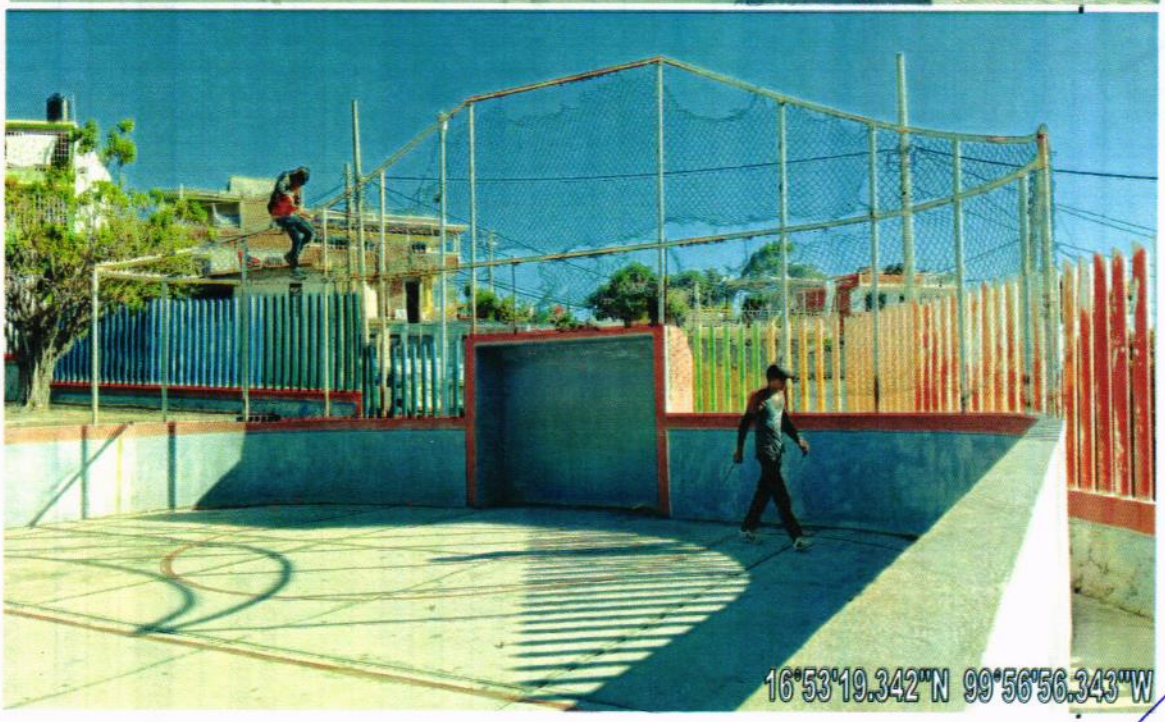

2-0065 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





2-0070 DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

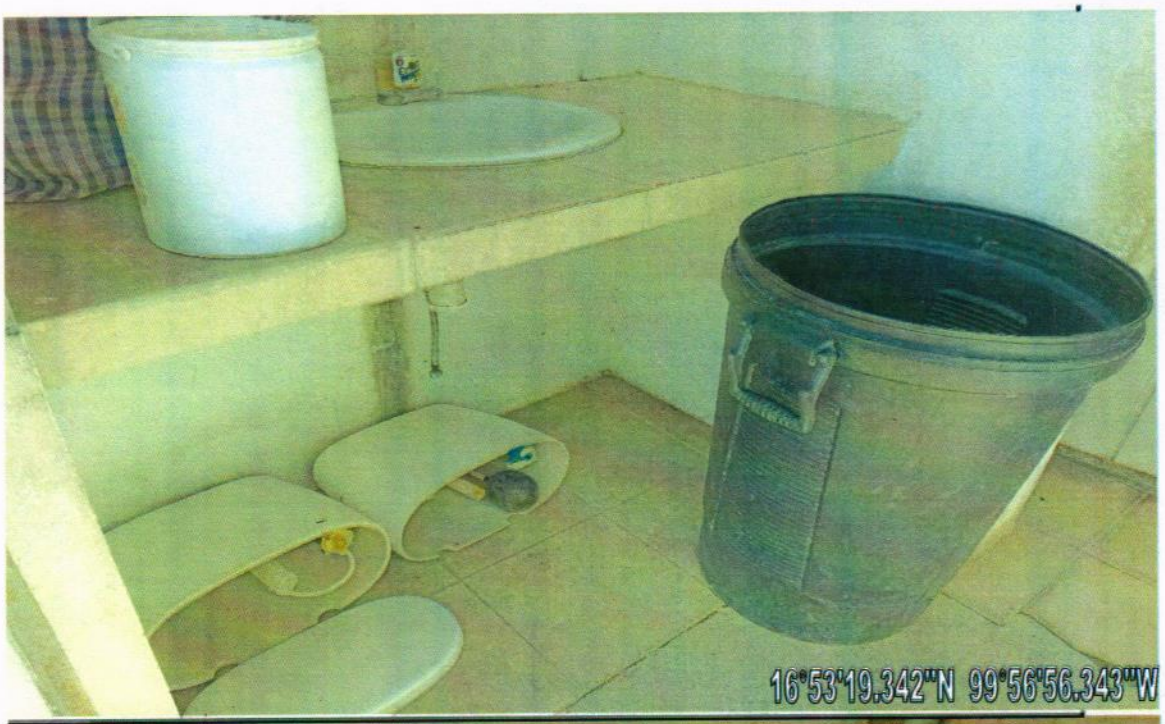

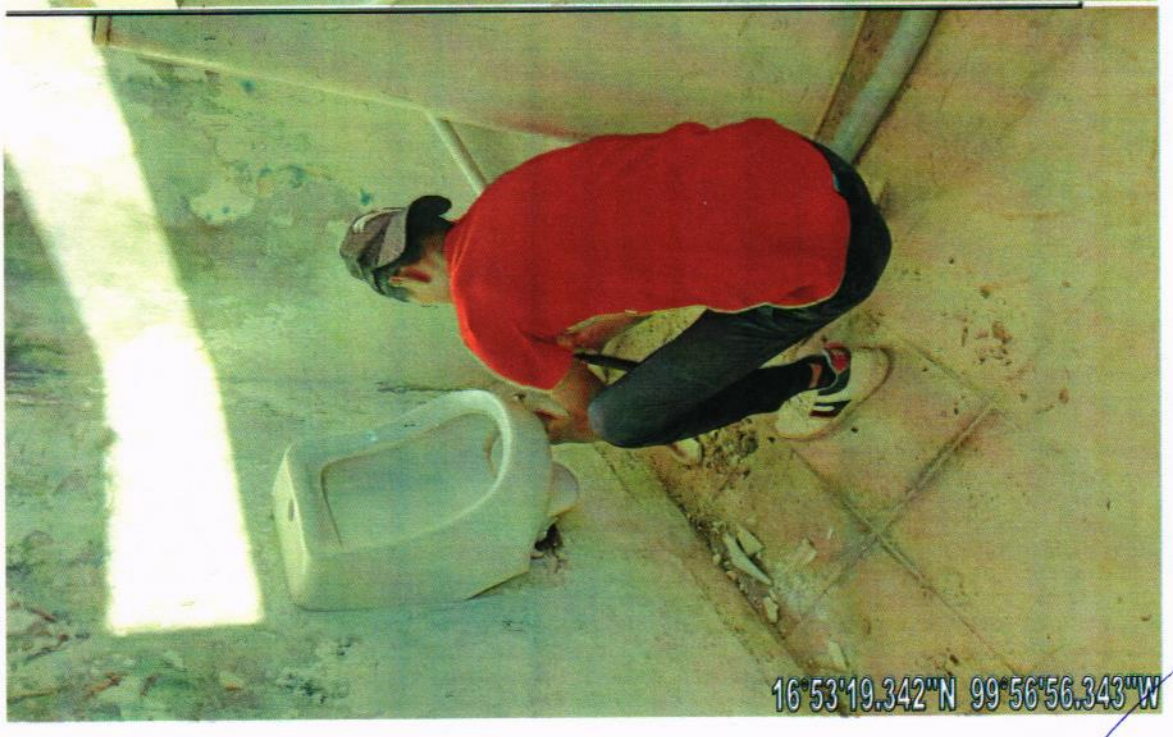

2-0070 DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			SANITARIOS							
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	A-B	1-3	6.00				PZA	6.00	W.C.
		B-C	3-4	2.00				PZA	2.00	LAVABOS
							TOTAL	**PZA**	**8.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

25-0382 INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

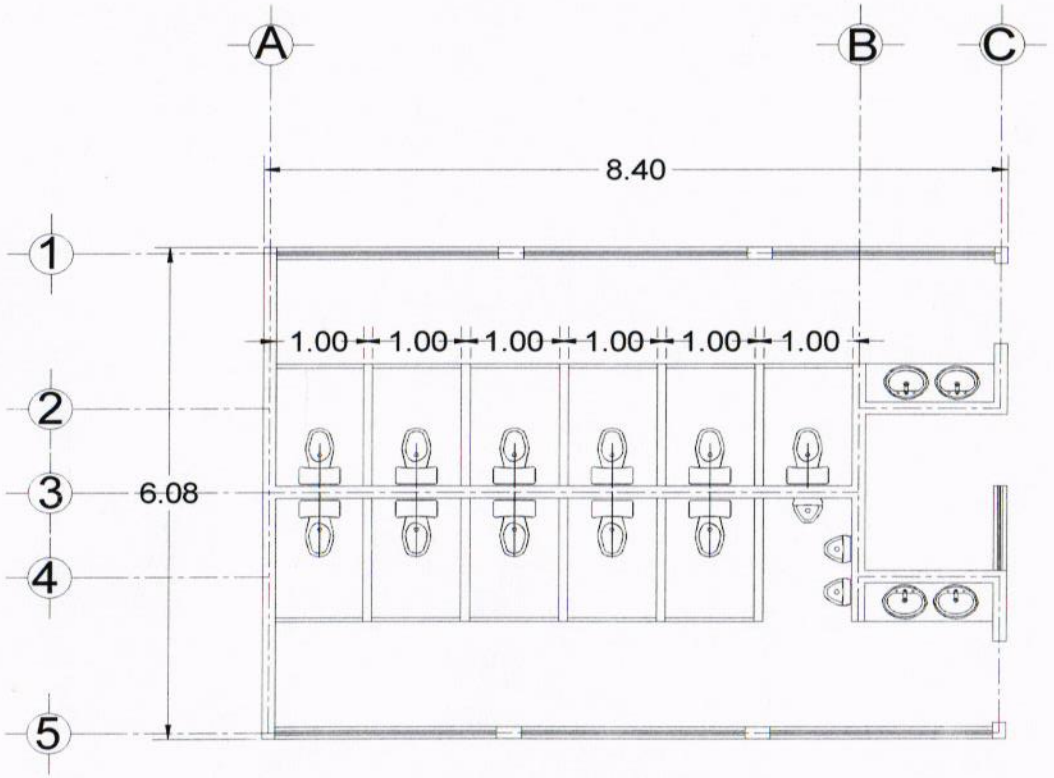

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE


RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



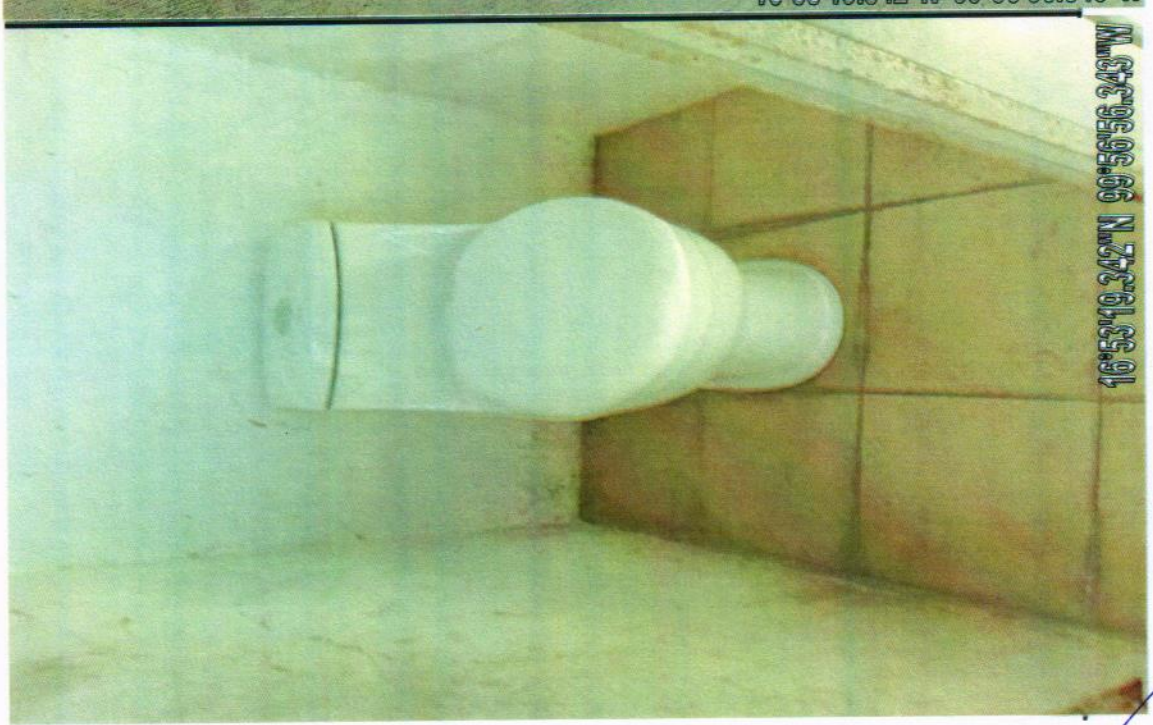

25-0382 INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

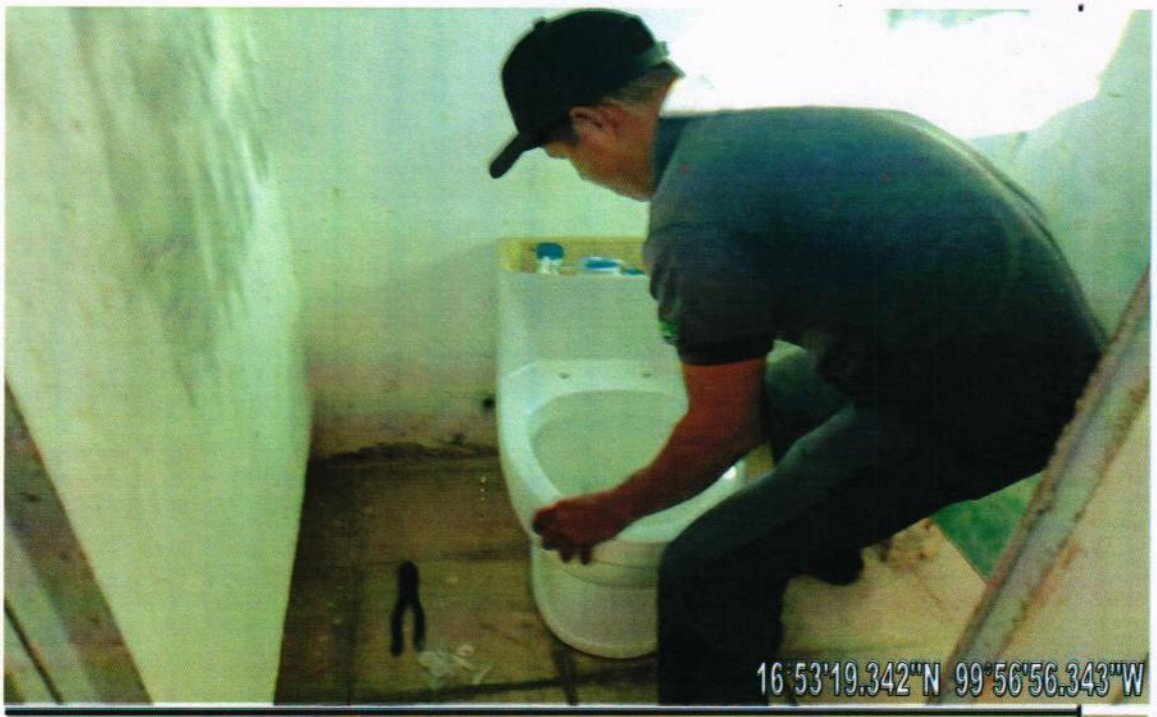

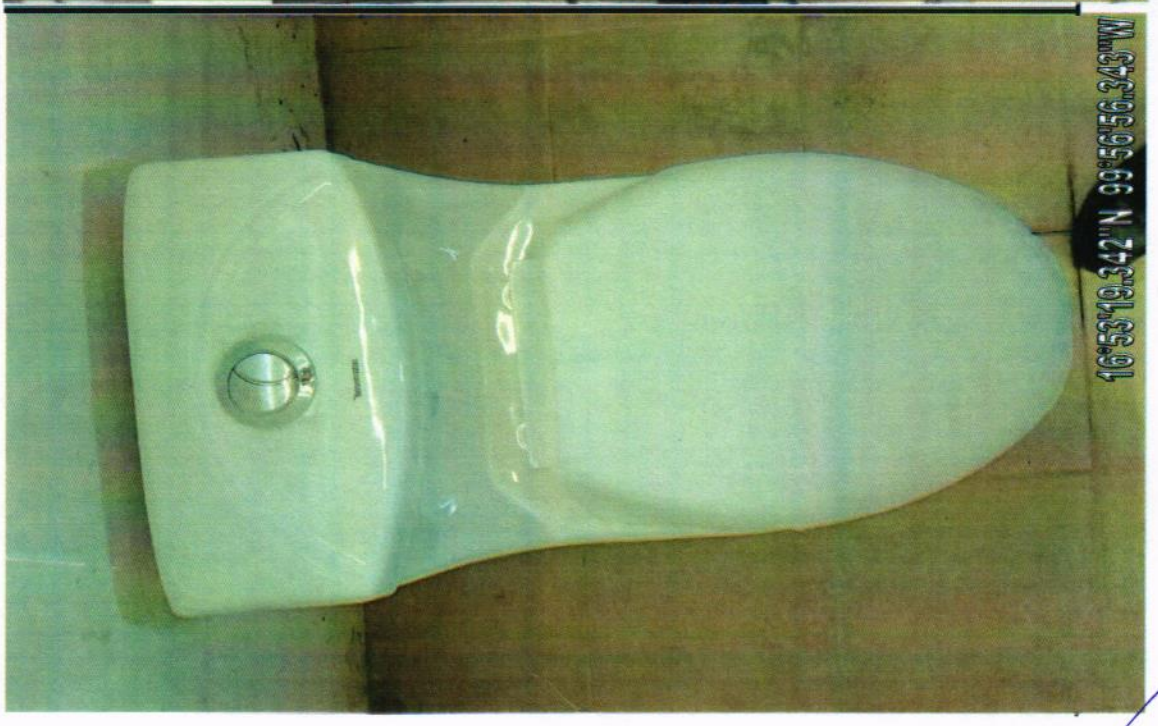

25-0382 INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		SANITARIOS								
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	B-C	1-2	2.00				PZA	2.00	LAVABOS
		B-C	3-4	2.00				PZA	2.00	LAVABOS
							TOTAL	**PZA**	**4.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA


ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

25-0381 LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

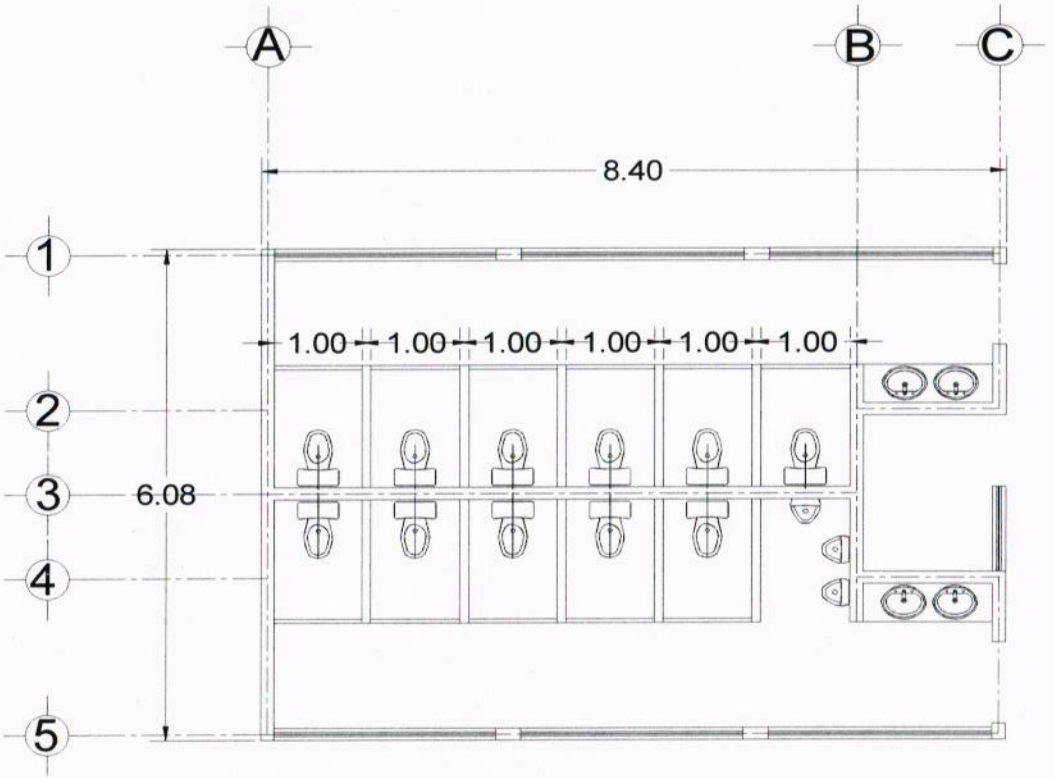

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

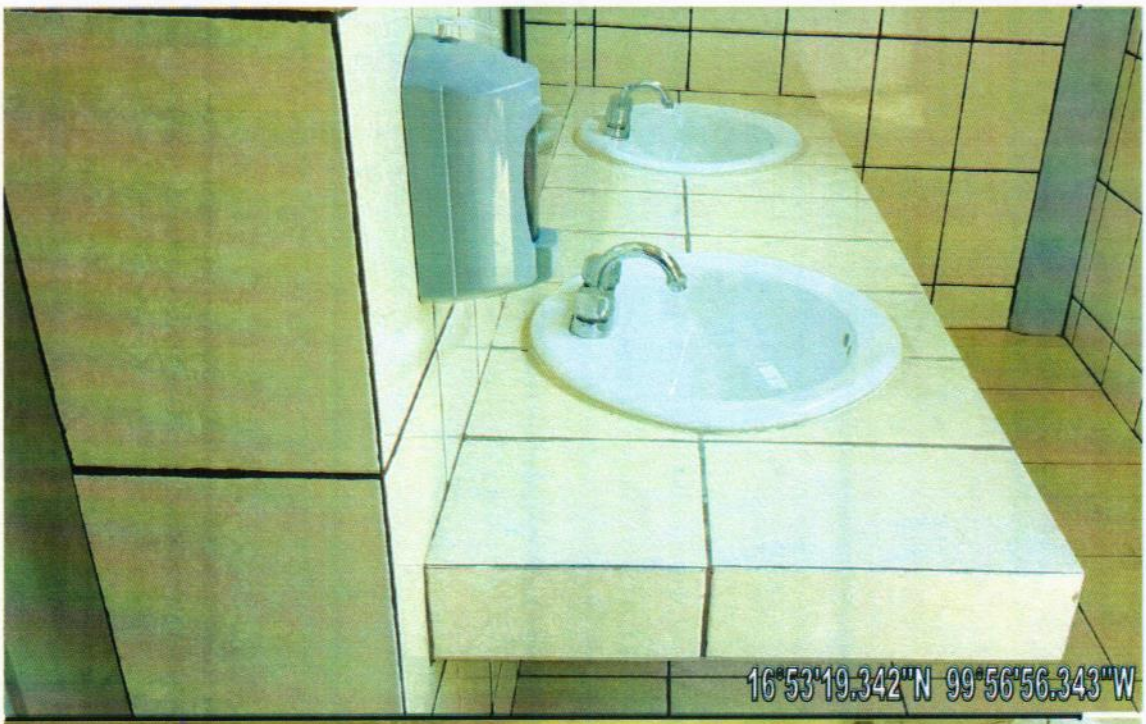



25-0381 LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

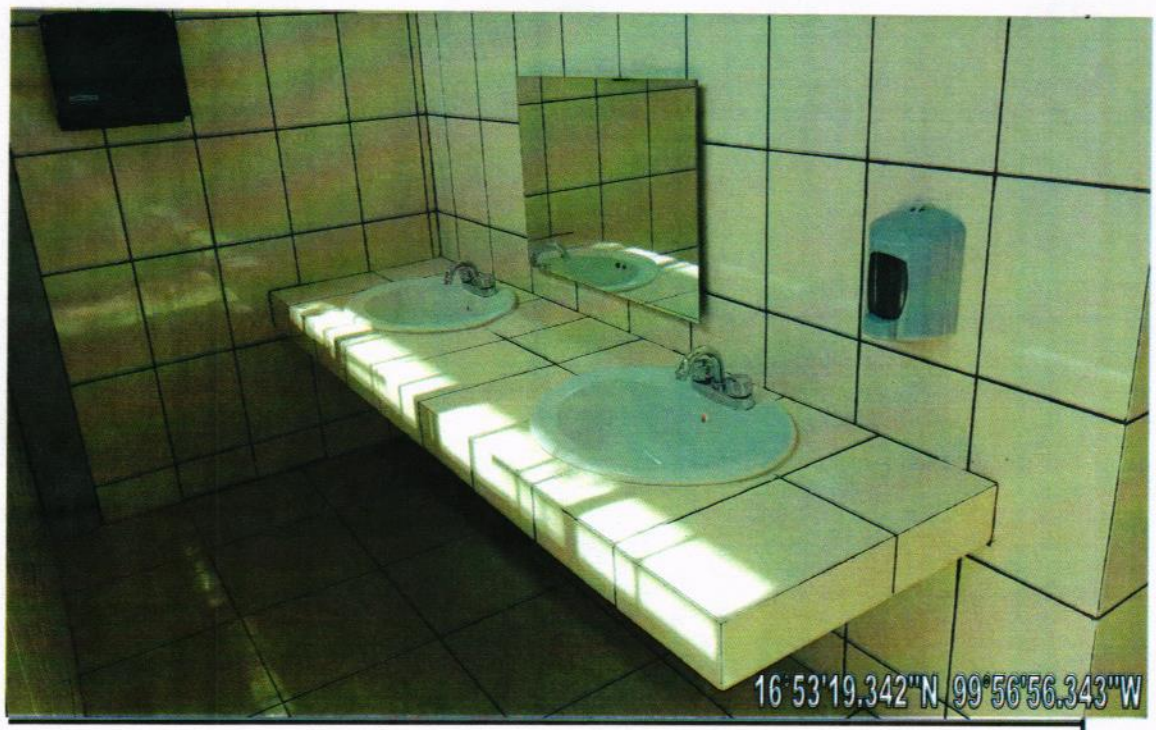

25-0381 LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			SANITARIOS							
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	A-B	3-4	3.00				PZA	3.00	MINGITORIOS
							TOTAL	PZA	3.0000	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
			ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

37-0622 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

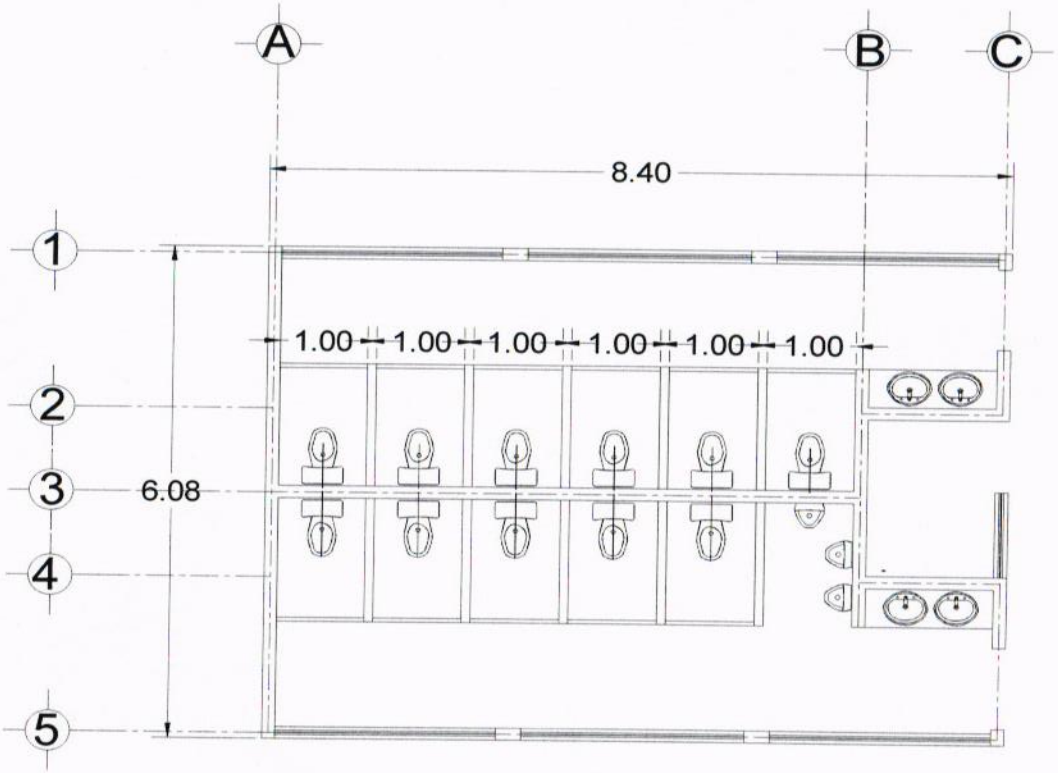

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





37-0622 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



37-0622 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
		SANITARIOS								
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	A-B	2-4	1.00				PZA	1.00	TINACO
							TOTAL	**PZA**	**1.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR


SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

SYC-T1100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.

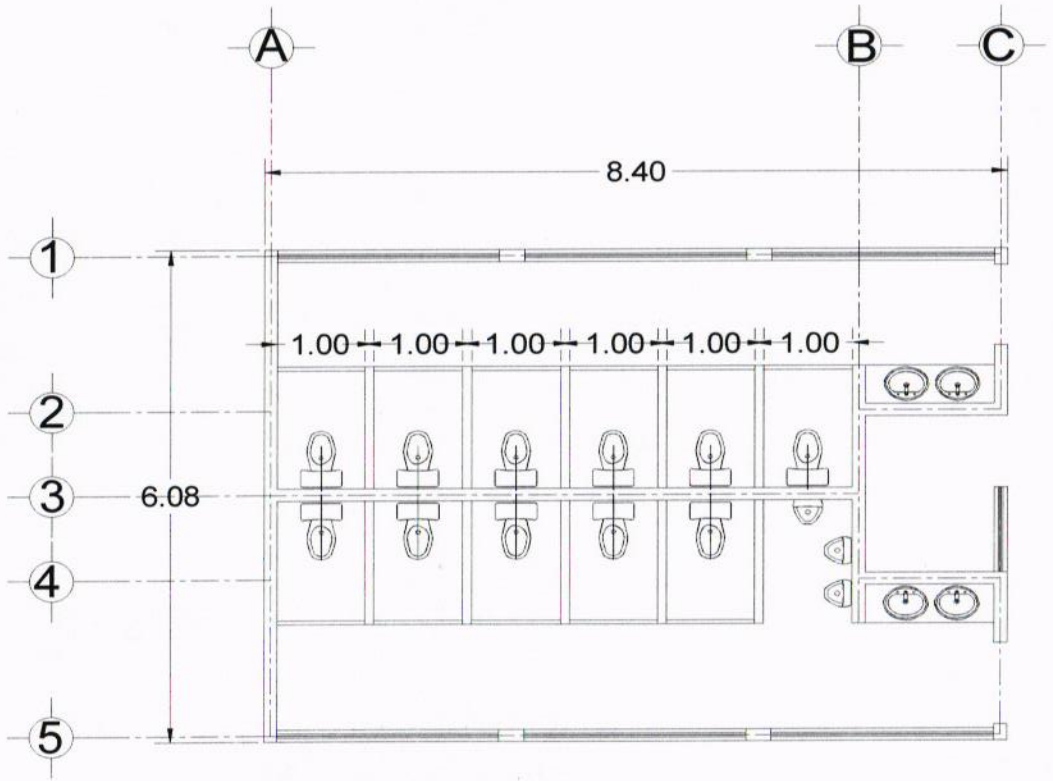

PLANTA SANITARIOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

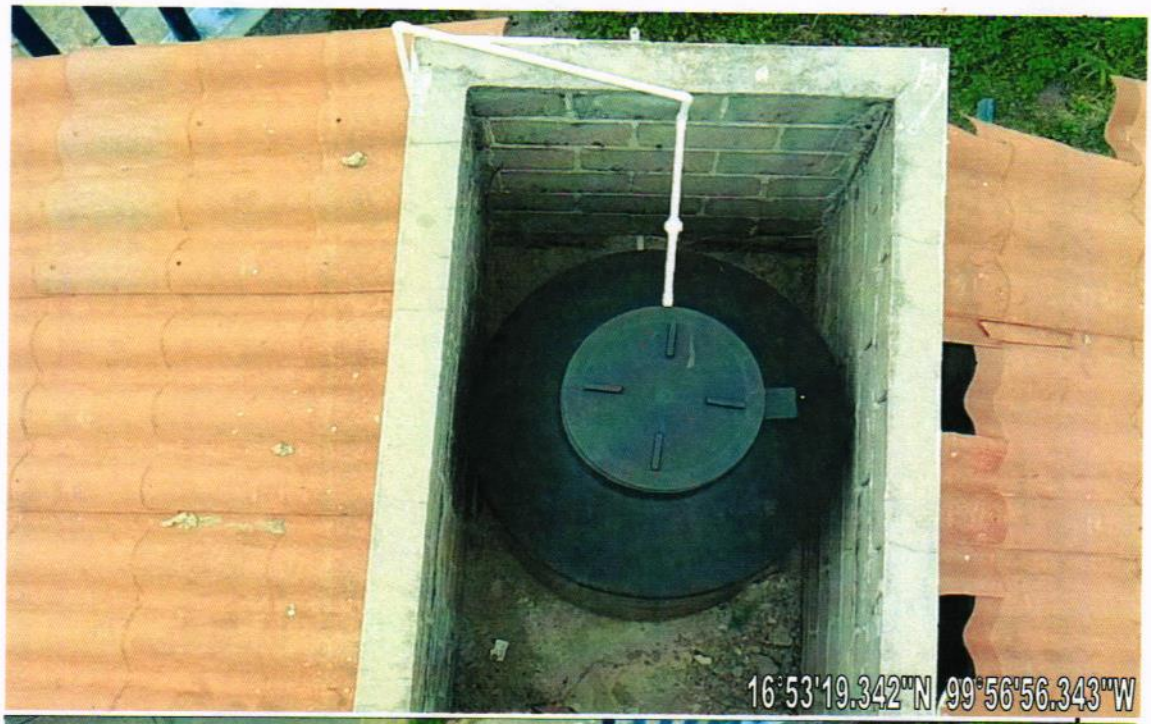



SYC-T1100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023

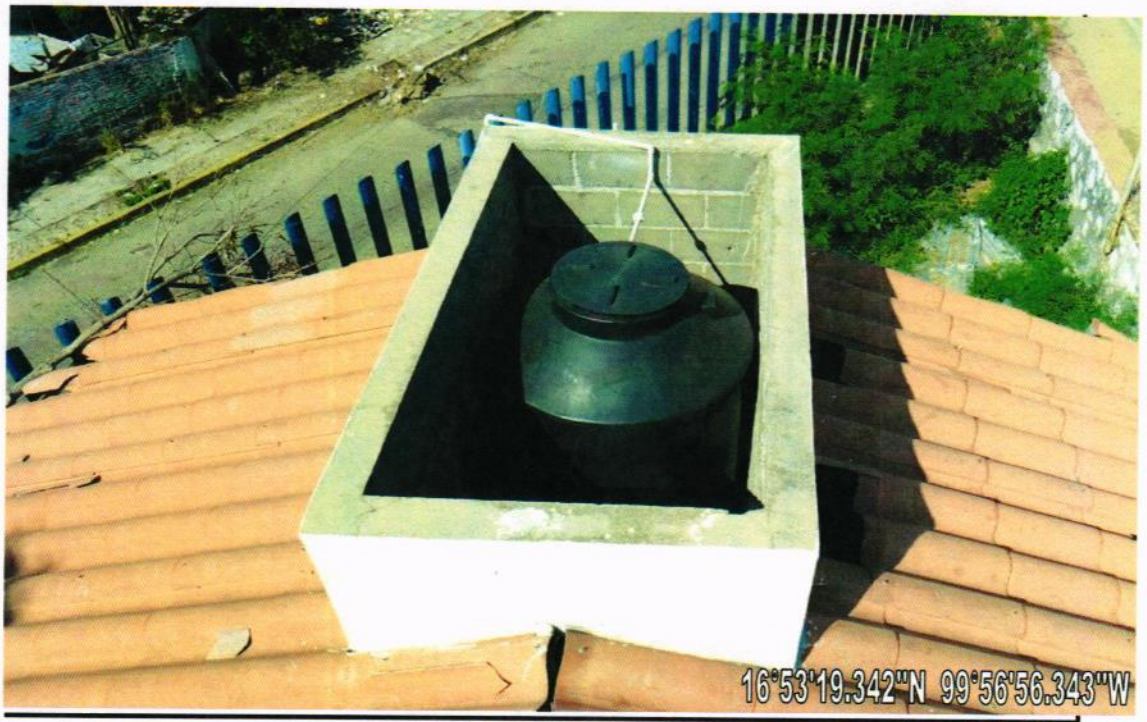

SYC-T1100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A03	**ALUMBRADO**		**LUMINARIAS**							
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		L1	1.00				PZA	1.00	
			L2	1.00				PZA	1.00	
			L3	1.00				PZA	1.00	
			L4	1.00				PZA	1.00	
			L5	1.00				PZA	1.00	
			L6	1.00				PZA	1.00	
			L7	1.00				PZA	1.00	
			L8	1.00				PZA	1.00	
			L9	1.00				PZA	1.00	
			L10	1.00				PZA	1.00	
							TOTAL	**PZA**	**10.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

40X20X50 BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

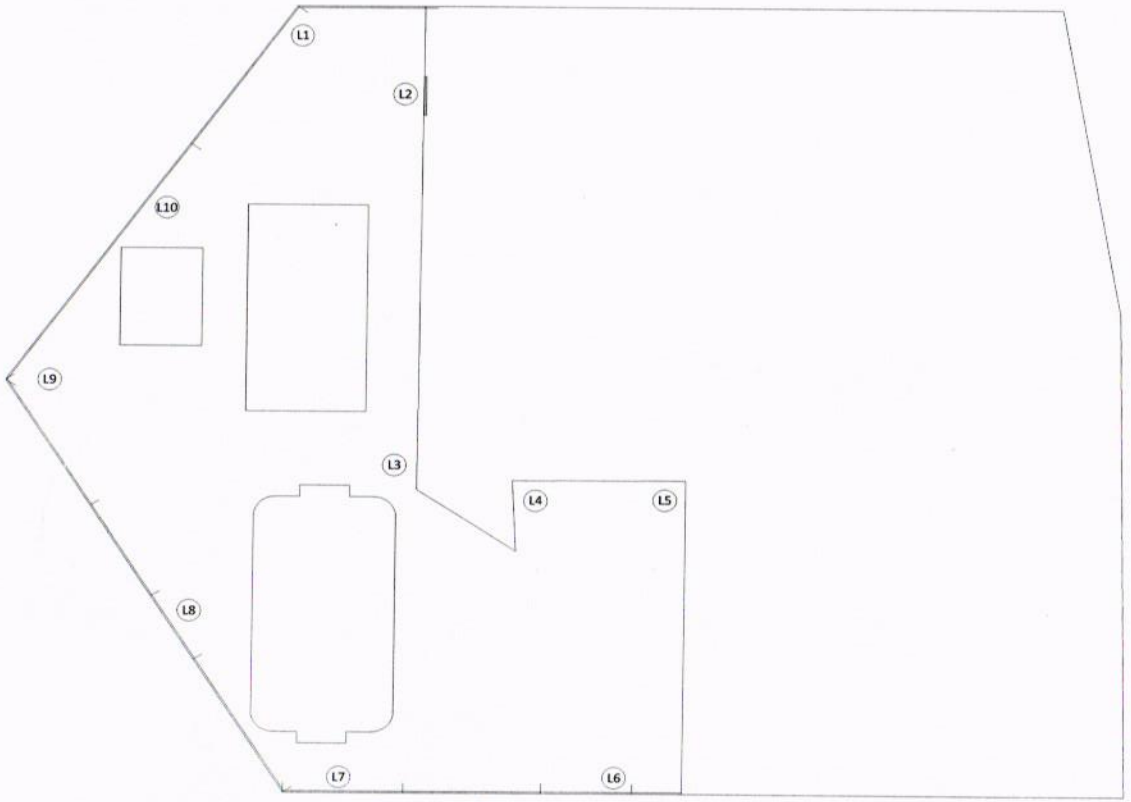

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



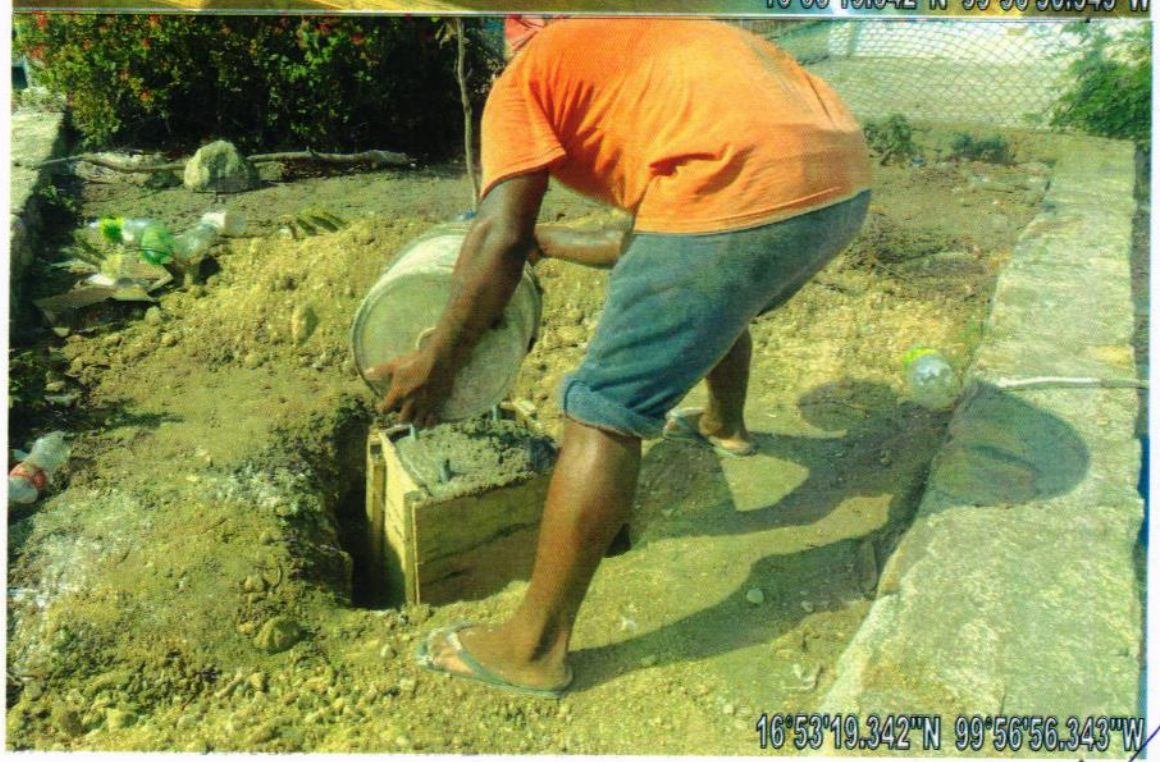

40X20X50 BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. AMILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





40X20X50 BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
RESIDENTE DE OBRA

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ — ESTADO: GUERRERO

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS — TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			LUMINARIAS							
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.		L1	1.00				PZA	1.00	
			L2	1.00				PZA	1.00	
			L3	1.00				PZA	1.00	
			L4	1.00				PZA	1.00	
			L5	1.00				PZA	1.00	
			L6	1.00				PZA	1.00	
			L7	1.00				PZA	1.00	
			L8	1.00				PZA	1.00	
			L9	1.00				PZA	1.00	
			L10	1.00				PZA	1.00	
							TOTAL	**PZA**	**10.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
			ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

LAM80W SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.

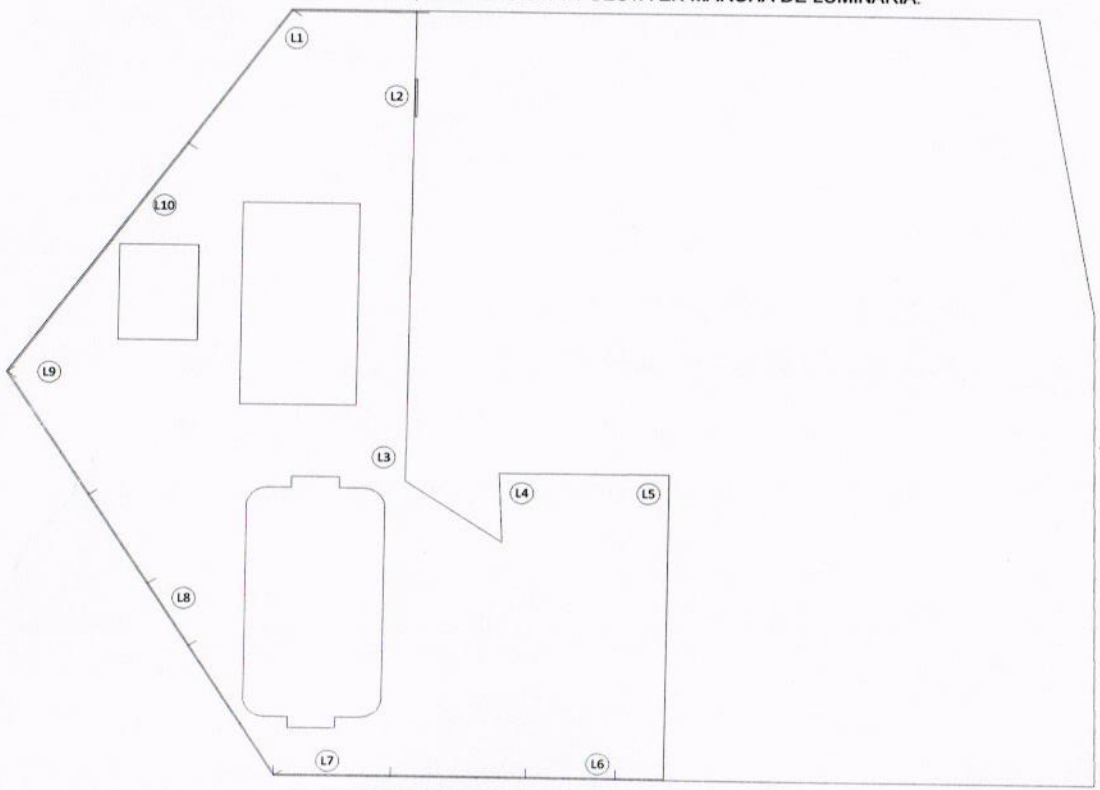

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





LAM80W SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS. INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
RESIDENTE DE OBRA

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE


ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA
ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:**	MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
		PERIODO ESTIMADO:	DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN:	COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:**	1 (UNO)
MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:**	19 de noviembre de 2023



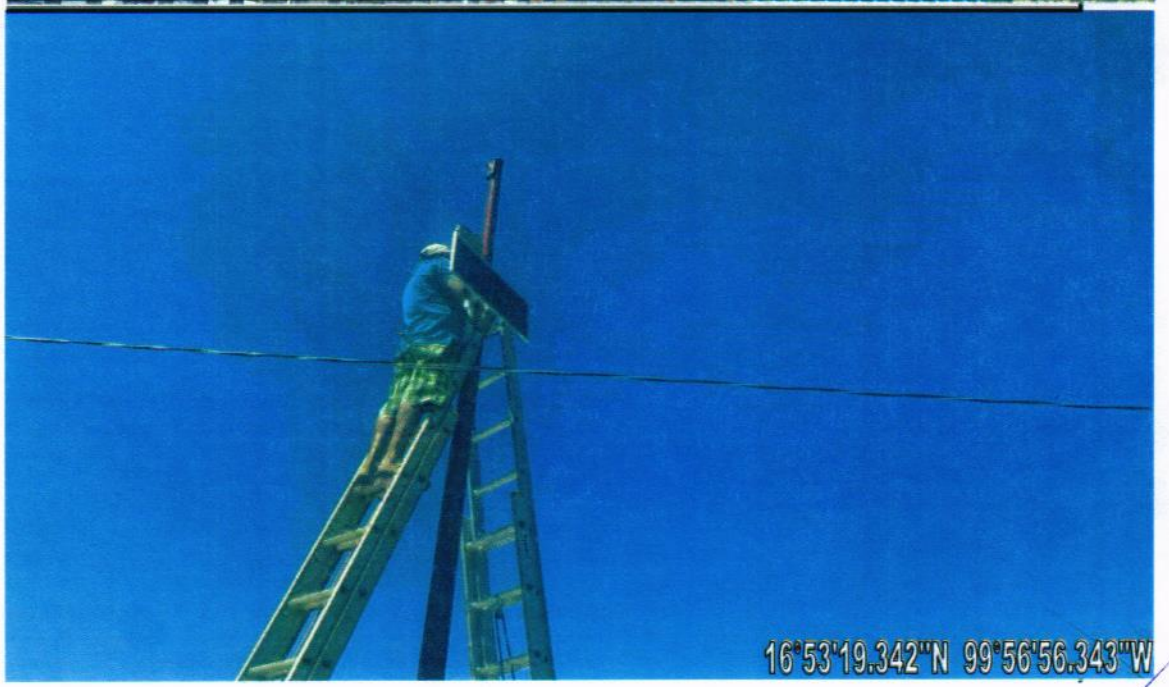

LAM80W SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS. INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NUMEROS GENERADORES

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
			ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A04	**HERRERIA**		**PORTON**							
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		P1	1.00	5.20			ML	5.20	
			P2	1.00	6.18			ML	6.18	
							SUBTOTAL	ML	11.38	
							EN ESTA ESTIMACION SOLO SE COBRARA:	ML	5.00	
							TOTAL	**ML**	**5.0000**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

C R O Q U I S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTADO: GUERRERO
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
			FECHA: 19 de Noviembre de 2023

POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

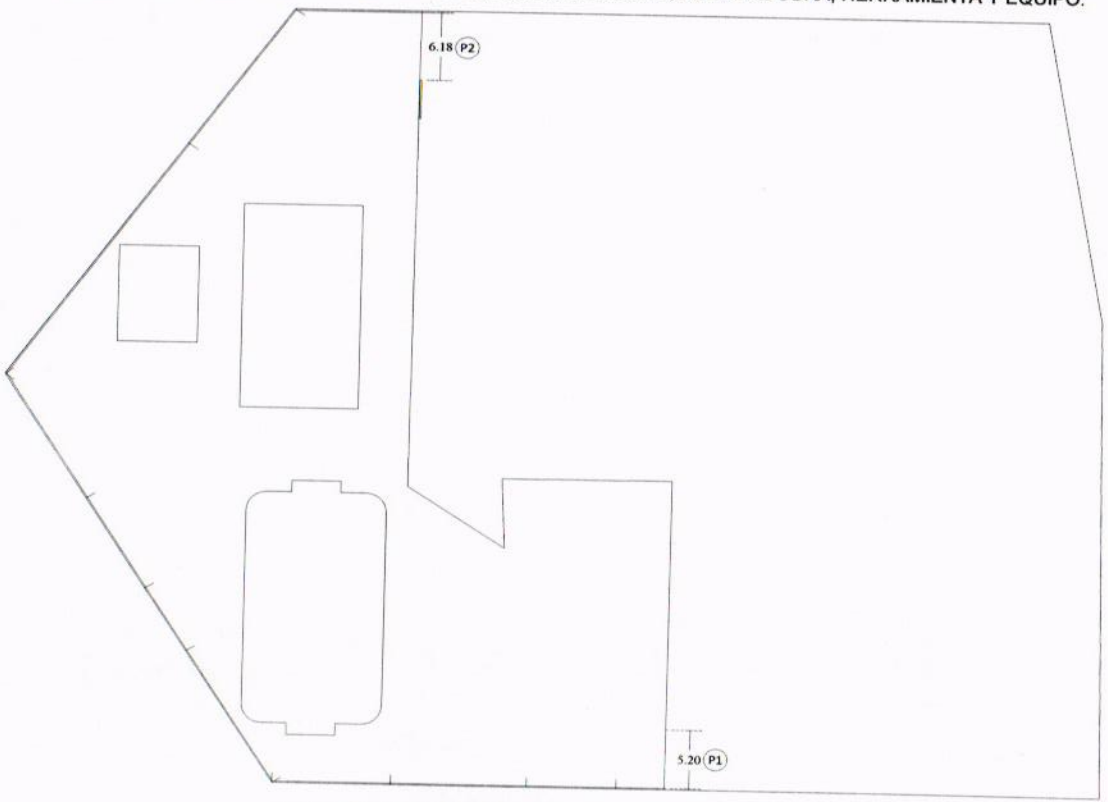

PLANTA PARQUE JARDIN MANGOS

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

N U M E R O S G E N E R A D O R E S

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS / TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO	CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
			PORTERIA NORTE							
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.		M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			PORTERIA SUR							
			M1	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
			M2	1.00	4.00		4.00	M2	16.00	
			M3	1.00	5.50		3.00	M2	16.50	
							SUBTOTAL	M2	98.00	
						EN ESTA ESTIMACION SOLO SE COBRARA:		M2	78.82	
							TOTAL	**M2**	**78.8200**	

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

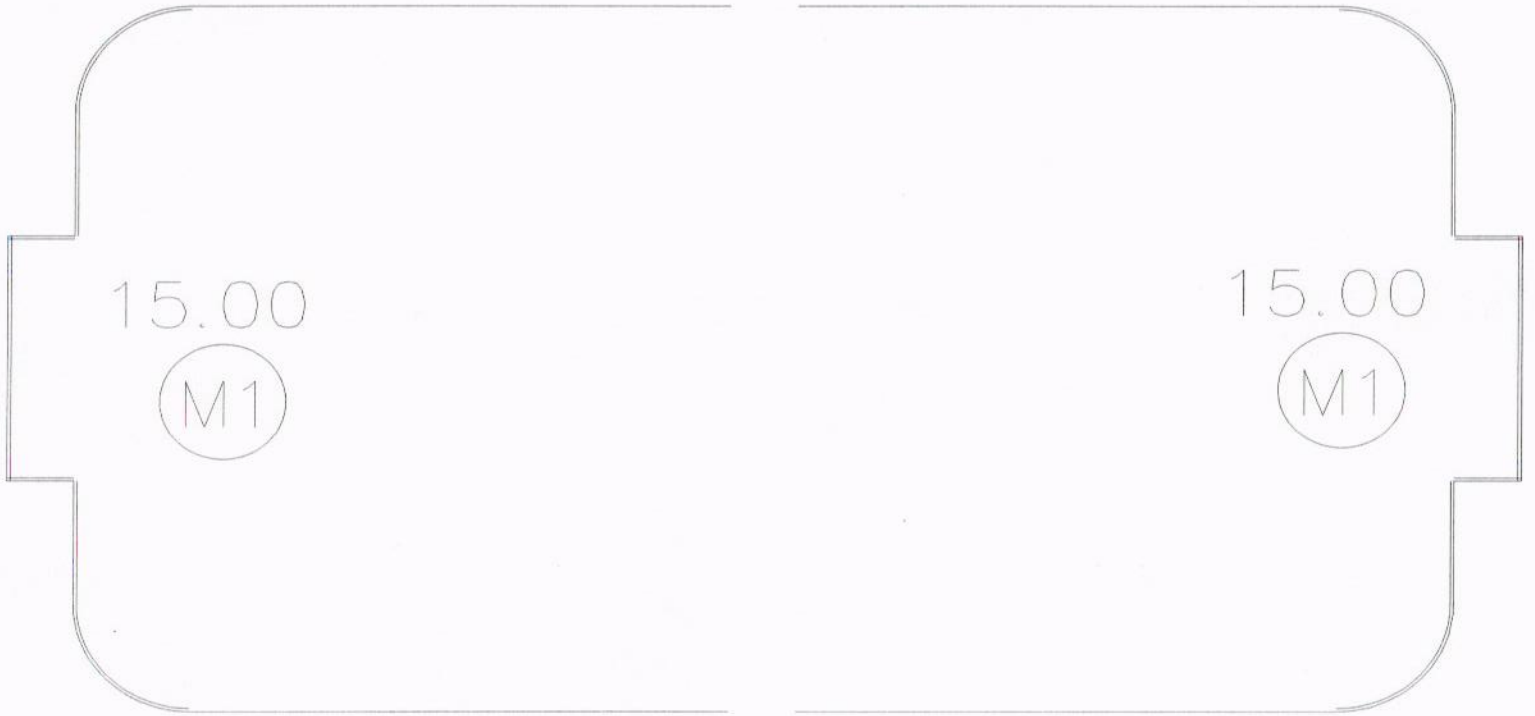

PLANTA CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ			ESTADO: GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS		No. DE OBRA: MAJ/539	ESTIMACION No.: 1 (UNO)
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	TIPO DE OBRA:	URBANIZACION	DEL: 20 de oct de 2023 AL: 19 de nov de 2023
CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO		CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD	FECHA: 19 de Noviembre de 2023

C R O Q U I S

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

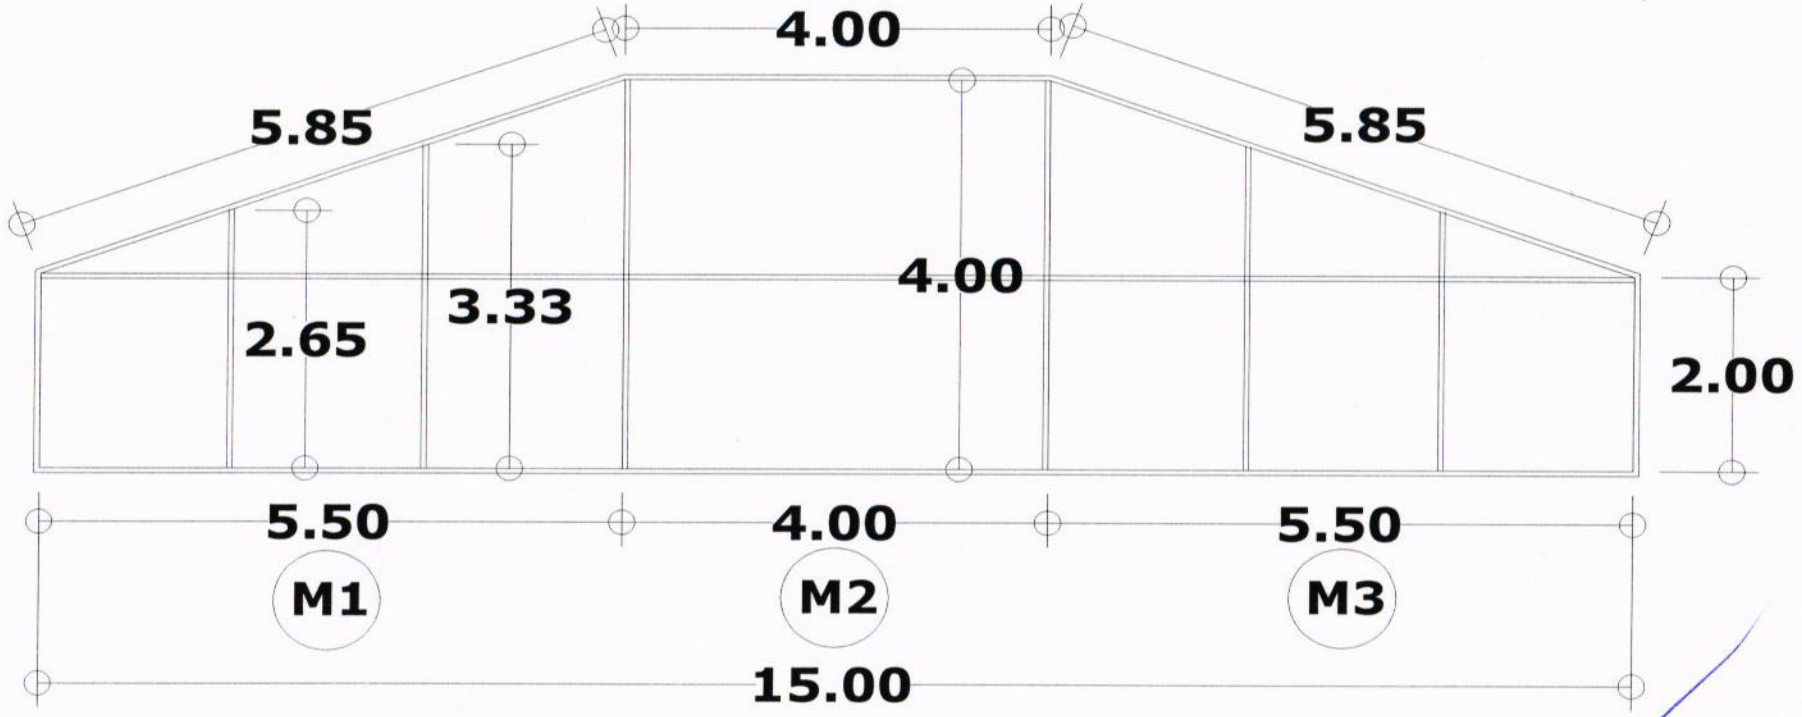

ALZADO CANCHA

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023





MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ


JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**No. DE CONTRATO:** MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
	PERIODO ESTIMADO: DEL: 20-octubre-2023 AL: 19-noviembre-2023
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS	**No. ESTIMACIÓN:** 1 (UNO)
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ	**FECHA:** 19 de noviembre de 2023



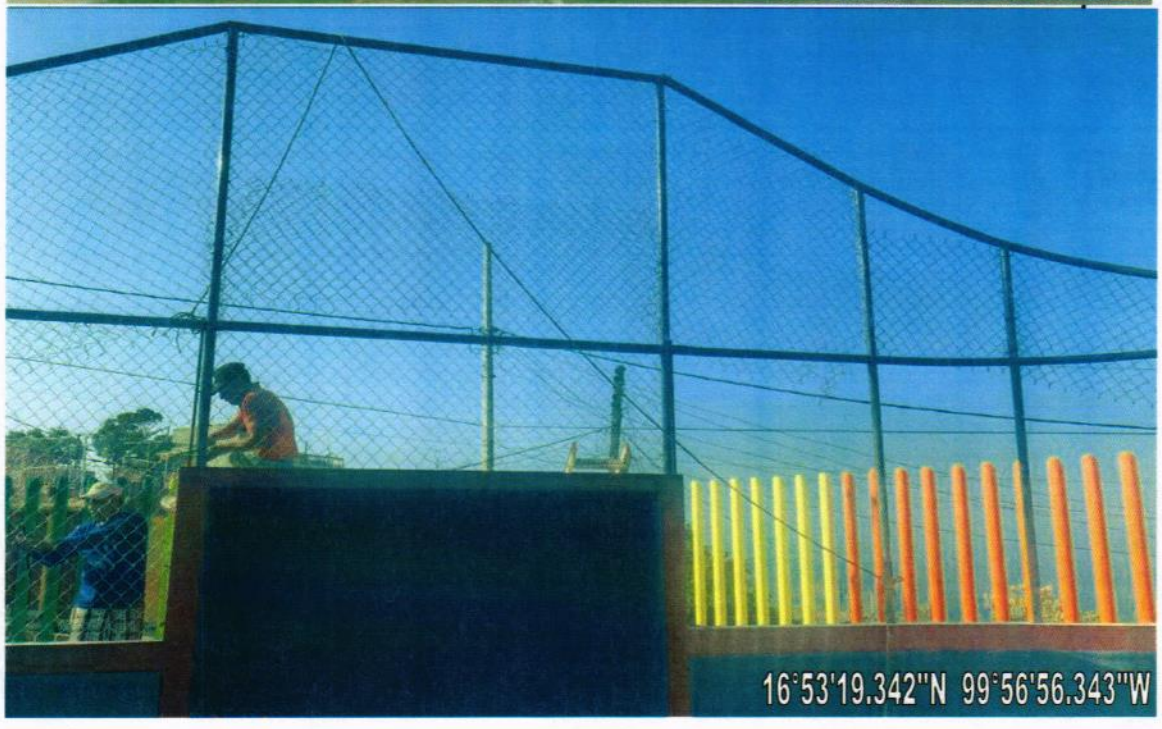

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
SUPERINTENDENTE

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

ING. VLADIMIR GERONIMO SALVADOR

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

Arq. HUGO MEDINA R.

FOLIO: Nº 312841

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

FECHA: 20/OCT/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 1:

Con esta fecha y números de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

La cual se encuentra ubicada en COL. JARDIN MANGOS

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAJ-FAISMUN/534-2023/AD
- Nombre y Teléfono del ó la Contratista MARCELINO LUNA ALEJANDRO
- Nombre del Representante legal MARCELINO LUNA ALEJANDRO
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 20/OCT/2023 AL 18/DIC/2023
- Fecha de inicio. 20/OCT/2023
- Monto del contrato. $1,080,000.00
- Fecha del anticipo. 08/DIC/2023
- Monto del anticipo. $324,000.00

RESIDENTE DE OBRA

ARQ. HECTOR MEDINA R.

SUPERVISOR

ING. BLADIMIR GERONIMO S.

SUPERINTENDENTE

Nº 312842

FOLIO:

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

FECHA: 20/OCT/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 2:

En cumplimiento a los artículos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266. Y los artículos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ

El supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres dias hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta Bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una anticipación no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los croquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de conjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

RESIDENTE DE OBRA	SUPERVISOR	SUPERINTENDENTE
ARQ. MILTON MEDINA R.		ING. BLADIMIR GERONIMO S.

FOLIO: Nº 312843

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

FECHA: 30/OCT/2023 COL. JARDIN MANGOS

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos. En casos necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceptos así como sus especificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse así se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el derecho de inconformidad o a la aceptación bajo protesta

NOTA 3

Con esta misma fecha y número de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra así como el avance físico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obrá deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son responsabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

RESIDENTE DE OBRA

Arq. Hector Mendoza R.

SUPERVISOR

ING. BLADIMIR GERONIMO S.

SUPERINTENDENTE

FOLIO No 312944

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
Col. JARDIN MANGOS

FECHA: 20/OCT/2023

NOTA 4

Con esta fecha y numero de nota nos encontramos reunidos en el sitio de los trabajos la residencia por parte del H. Ayuntamiento el Arq. Milton Medina Ramirez la empresa contratista representada por el Ing Bladimir Geronimo Salvador como superintendente de obra y el comite de vecinos haciendo entrega del sitio de los trabajos a la contratista denominada "Rehabilitacion de parque publico jardin mangos" ubicada en col. jardin mangos con numero de contrato MAS-FAISMUN/539-2023/mn tambien con esta fecha y numero de nota se da apertura a la bitacora convencional misma que servira como medio de comunicacion entre la empresa contratista y residencia de obra, se dan por iniciados los trabajos.

RESIDENTE DE OBRA
Arq. Milton Medina R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ING. BLADIMIR GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 312345

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 20/OCT/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 5

: CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA NOS ENCONTRAMOS REUNIDOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS, COMITE DE OBRA Y CONTRATISTA PARA DEFINIR EL TRAZO Y ALCANCES DE LA MISMA ASI MISMO SE INFORMA A LOS PRESENTES QUE SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE PARA APLICACION DE PINTURA NUEVA

ARQ. VICTOR MEDINA R.

ING. BLADIMIR GERONIMO S.

NOTA 6 24/OCT/2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRAS QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE. Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ASI MISMO SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS.

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. VICTOR MEDINA R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ING. BLADIMIR GERONIMO S.

FOLIO Nº 312846

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 30/OCT/2023 COL. JARDIN MANGOS

NOTA 7

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRAS QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA ASI MISMO CONCLUYEN LOS TRABAJOS DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS Y SE DA INICIO A LA COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS (INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. (NAVAO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. MINGITORIO)

ING. BLANCA GERONIMO S.

Arch. Alfredo Medina R.

NOTA 8 06/NOV/2023

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MUEBLES SANITARIOS Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE BASE PIRAMIDAL DE 40 X 20 X 50 CONCRETO FC=250 KG/CM2 ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3 ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS.

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR SUPERINTENDENTE

Arch. Alfredo Medina R. ING. BLANCA GERONIMO S.

ESQR-02
REV.02

FOLIO Nº 312847

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
COL. JARDIN MANGOS

FECHA: 10/NOV/2023

NOTA 9

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS Y SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATTS ASI MISMO SE LE SOLICITA AL RESIDENTE DE OBRA AUTORIZAR LOS SIGUIENTES VOLUMENES EXCEDENTES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN

CODIGO	CONCEPTO	UNIDAD	EXCEDENTE
E-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE MANO DE OBRA Y RETIRO DE MUEBLES	PZA	4.00
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL STANDARD INCLUYE LLAVE MEZCLADORA TAPON Y TAZA	PZA	2.00
37-0602	SUMINISTRO Y COLOCACION REGADERA INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA	PZA	1.00
40X20X50	BASE PIRAMIDAL 40X20X50 CMS CONCRETO F'C=250 KG/CM2	PZA	2.00
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATTS	PZA	2.00

ING. BRANDON GERONIMO S.

Arq. Hilario Medina R.

NOTA 10

13/NOV/2023

Con esta fecha y numero de nota esta residencia visita la obra y se da por enterada de la solicitud por lo tanto se autorizan los volumenes de los conceptos excedentes que fueron realizados por ejecucion son necesarios por el proceso constructivo.

RESIDENTE DE OBRA — SUPERVISOR — SUPERINTENDENTE

Arq. Hilario Medina R.

ING. BRANDON GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 312848

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
FECHA: 17/NOV/2023 COL JARDIN MANGOS

NOTA 11

CON ESTA FECHA Y NUMERO DE NOTA SE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRAS QUE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80WATTS ASI MISMO SE LE PIDE AL RESIDENTE DE OBRAS VISITAR LA OBRA CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR LOS TRABAJOS Y CONCILIAR VOLUMENES PARA INGRESAR LA ESTIMACION NO. 1 (UNO) QUE COMPRENDE DEL PERIODO DEL 20/OCT/2023 AL 19/NOV/2023

ARQ. MIGUEL MEDINA R.

ING. BLADIMIR GERONIMO S.

NOTA 12 19/NOV/2023

Con esta fecha y numero de nota esta residencia conviene con la empresa contratista hacer recorrido al sitio de los trabajos y se realiza la conciliacion de volumenes en obra y al no existir ningun inconveniente se recibe la primera estimacion para dar proceso al tramite administrativo

RESIDENTE DE OBRA
ARQ. MIGUEL MEDINA R.

SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE
ING. BLADIMIR GERONIMO S.

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FODO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS.**

UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS.**

CONTRATISTA: **MARCELINO LUNA ALEJANDRO**

NUMERO DE: **ZONA DE ATENCION PRIORITARIA (ZAP) 1672**

CLAVE DE LA LOCALIDAD:**12001 001**

NUMERO DE (AGEB): **12001 0001 1672**

ORIGINAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**
No. DE OBRA:

ESTADO: **12 GUERRERO**
MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**
AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO:

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
COL. JARDÍN MANGOS	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	1,080,000.00	324,000.00	324,000.00	756,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023

SUBMODALIDAD: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS. COL. JARDIN MANGOS

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DEPENDENCIA EJECUTORA: 12M01 H. A. ACAPULCO

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	1-dic.-23	MARCELINO LUNA ALEJANDRO FACTURA 112	324,000.00		324,000.00
		SUBTOTAL $	324,000.00	-	324,000.00
		TOTAL $	**324,000.00**	-	**324,000.00**

viernes 1 de diciembre de 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

RFC EMISOR: **LUAM920218FK4**
DOMICILIO: **CALLE EMILIANO ZAPATA, NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.**

RECEPTOR: **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**
RFC: **MAJ010101NA3**
DOMICILIO: **AV. CUAUHTEMOC S/N, INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES, C.P. 39350, ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEXICO**

NOMBRE DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS**
NÚMERO DE CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**
FECHA DE CONTRATO: **10 DE OCTUBRE DE 2023**
PERIODO DE CONTRATO: **20 DE OCTUBRE DE 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023**
IMPORTE DE CONTRATO C/IVA: **$1,080,000.00**
IMPORTE DE ANTICIPO C/IVA: **$324,000.00**
TIPO DE OBRA: **DOMINIO PUBLICO**
METAS PROGRAMADAS: **117.33 M2**
No. DE OBRA: **MAJ/539**
GEORREFERENCIAS: **LATITUD 16°53'20.355"N ,-LONGITUD 99°56'57.449"O**
POBLACIÓN BENEFICIADA **706 HABITANTES**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

RECIBI DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS LA CANTIDAD DE $ 324,000.00 (* TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.*) POR CONCEPTO DEL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 30% EL CUAL SERA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 10% PARA INICIO DE OBRA Y 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN LA COL. JARDIN MANGOS , DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
POR ACUERDO DELEGATORIO DE FECHA 15/NOV/2023

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLON RAMIREZ

SUTOTAL:	$	279,310.34
IVA:	$	44,689.66
TOTAL:	$	324,000.00

(* TRESCIENTOS VEINTI CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.*)

Servicios en ingeniería civil

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

LUAM920218FK4

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

AYUNTAMIENTO, 24, La Villa, 39200, Ayutla de los Libres, Ayutla de los Libres, Guerrero, México
Tel. 7451070859

CLIENTE

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ

MAJ010101NA3

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 39350

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

AV. CUAUHTEMOC, S/N, INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, 39350, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, MEXICO

Factura 112

FOLIO FISCAL (UUID)
0A11697E-4819-450A-AE20-2C7027B6E032
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000700199165
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-12-01T09:39:47
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-12-01T09:07:31
LUGAR DE EXPEDICIÓN
39200

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	ANTICIPO DE OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION: COL. JARDIN MANGOS, CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII.- EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: 20 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023. Clave Prod. Serv. - 70151805 Servicios de conservación de parques o reservas forestales Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 279310.34 Tasa - 0.160000 Importe - $ 44,689.66	$ 279,310.34	02 - Sí objeto de impuesto.	$ 279,310.34

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

OPERADO FAISMUN - 2023

IMPORTE CON LETRA	TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE	I - Ingreso
FORMA DE PAGO	99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO	PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA	MXN - Peso Mexicano
VERSION	4.0
EXPORTACION	01 - No aplica

SUBTOTAL	$ 279,310.34
TRASLADO IVA TASA 0.160000	$ 44,689.66
TOTAL	$ 324,000.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XlkLTrrxBsC6Bt+NpUijMRish19Gqu+OZh75gwKlxl1PT5zOv1kPZ4Vox9HjdHik/jHDMFo1Ao4LtX4rHjoVpd8/KsTG+R0L+V5jIO78JmWFANr3dLMbVPPMjJ8IWsj87aOB5
X0yQMIIGA/mDX9zeJ5zAdCtFZlw6sDG+9d99rlJlSUei+Sr+SdZJeqwhFP0YruZqDMs8E+pegkQMyq39rkMOzNBWyvlvLRQbrJU/+zI1k4daX+aNHWw+F1UE8ARETUD8
LeDOTxJAdB2nGv1TvzaoN+5QVokWv+BN8M8mFHWp74IIK2vOPUWj5vPnF6x5pqebKifxNQ96Xbgo0zS+w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SklbuoCEkTTo0pC7gC/3DdtGHZVrT8yl/EPwwfrM/xiHeWxSPyOjHf4bIm6Z/qjAsqEjeltlwWKxCX2vh1iqmiaFs1miCke4dkRu0FnpFFKHHoANKt5NY0muc8AiKevbtz37lMp
13czLW2FpxizVyLkYM3rtjxTvt66C4hobvaS1VAz866DmmO+OnRpTiLrV5RVPF1Gqezyk6luHFtWdHD6xX29wVN+QxylPanqcz54Bu2ElcAavVx1sjBuKweRLnolFkk+0JF
aTqt3QGlvK15O7dFhh7v3N5jS+4329cc66LeNSeJXrKJhUE9dcEKBRyRLnq5OLIYq+QrNRNyTKaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A11697E-4819-450A-AE20-2C7027B6E032|2023-12-
01T09:39:47|STA0903206B9|XlkLTrrxBsC6Bt+NpUijMRish19Gqu+OZh75gwKlxl1PT5zOv1kPZ4Vox9HjdHik/jHDMFo1Ao4LtX4rHjoVpd8/KsTG+R0L+V5jIO78JmWFANr
3dLMbVPPMjJ8IWsj87aOB5X0yQMIIGA/mDX9zeJ5zAdCtFZlw6sDG+9d99rlJlSUei+Sr+SdZJeqwhFP0YruZqDMs8E+pegkQMyq39rkMOzNBWyvlvLRQbrJU/+zI1k4daX
+aNHWw+F1UE8ARETUD8LeDOTxJAdB2nGv1TvzaoN+5QVokWv+BN8M8mFHWp74IIK2vOPUWj5vPnF6x5pqebKifxNQ96Xbgo0zS+w==|00001000000506204896||

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: *foliosdigitales.blikon.com/xml*

Para facturar en línea ingresa a: *foliosdigitales.blikon.com*

Este documento es una representación impresa de un CFDI

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="39200" MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I"
Total="324000.00" Moneda="MXN" SubTotal="279310.34"
Certificado="MIIGBDCCA+ygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDAxOTkxNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUw
NoCertificado="00001000000700199165" FormaPago="99"
Sello="XlkLTrrxBsC6Bt+NpUijMRish19Gqu+OZh75gwKlxl1PT5zOv1kPZ4Vox9HjdHik/jHDMFo1Ao4LtX4rHjoVpd8/KsTG+R0L+V5jlO78JmWFANr3dLMbVl
Fecha="2023-12-01T09:07:31" Folio="112" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="MARCELINO LUNA ALEJANDRO" Rfc="LUAM920218FK4"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I01" RegimenFiscalReceptor="603"
DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="279310.34" ValorUnitario="279310.34" Descripcion="ANTICIPO DE OBRA: REHABILITACION DE PARQUE
PUBLICO JARDIN MANGOS, UBICACION: COL. JARDIN MANGOS, CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII.- EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/539-2023/AD DE FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO: 20
DE OCTUBRE DEL 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023." ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="70151805">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="44689.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="279310.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="44689.66">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="44689.66" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="279310.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
SelloSAT="SklbuoCEkTTo0pC7gC/3DdtGHZVrT8yl/EPwwfrM/xiHeWxSPyOjHf4bIm6Z/qjAsqEjeltlwWKxCX2vh1iqmiaFs1miCke4dkRu0FnpFFk
NoCertificadoSAT="00001000000506204896"
SelloCFD="XlkLTrrxBsC6Bt+NpUijMRish19Gqu+OZh75gwKlxl1PT5zOv1kPZ4Vox9HjdHik/jHDMFo1Ao4LtX4rHjoVpd8/KsTG+R0L+V5jlO78Jm
FechaTimbrado="2023-12-01T09:39:47" UUID="0A11697E-4819-450A-AE20-2C7027B6E032" RfcProvCertif="STA0903206B9"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LUAM920218FK4	MARCELINO LUNA ALEJANDRO	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
0A11697E-4819-450A-AE20-2C7027B6E032	2023-12-01T09:07:31	2023-12-01T09:39:47	STA0903206B9
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$324,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
FAISMUN - 2023

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

FOLIO: RF2023137939266

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO, a 25 de Julio de 2023

Ha sido procesado el aviso de actualización al registro federal de contribuyentes exitosamente, con la siguiente información:

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	LUAM920218FK4
CURP:	LUAM920218HGRNLR00
Nombre (s):	MARCELINO
Primer Apellido:	LUNA
Segundo Apellido:	ALEJANDRO

Tipo de Movimiento:

Identificación del aviso: Apertura de establecimiento o sucursal	**Fecha del Aviso:** 01/07/2023

Datos de Ubicación:

Tipo de Domicilio: ESTABLECIMIENTO	**Código Postal:** 39650
Tipo de Vialidad: CALLE	**Nombre de Vialidad:** EMILIANO ZAPATA
Número Exterior: 37	**Número Interior:**
Nombre de la Colonia: LA GARITA	**Nombre de la Localidad:** ACAPULCO DE JUAREZ
Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: ACAPULCO DE JUAREZ	**Nombre de la Entidad Federativa:** GUERRERO
Entre Calle: FCO I.MADERO	**Y Calle:** RANCHO ACAPULCO
Características del Domicilio: BLANCO	**Referencias Adicionales:** PORTON NEGRO CERCA DE LA CFE GARITA

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER
de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728
denuncias@sat.gob.mx

[redacted]

FOLIO: RF2023137939266

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACUSE DE MOVIMIENTOS DE ACTUALIZACIÓN DE SITUACIÓN FISCAL

Declaro bajo protesta de decir verdad y conocedor de las penas en que incurren las personas que declaran con falsedad en los términos de lo dispuesto por el artículo 247, fracción I del Código Penal Federal, en relación con el artículo 110 fracción II del Código Fiscal de la Federación, manifiesto que todos los datos asentados en esta forma oficial son verídicos y exactos.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||25/07/2023|RF2023137939266|Autoservicio|AESTA|LUAM920218FK4|20000108888880000031||

Sello Digital:
YIKW5sCV7CUFdtKa42MN0kVquApQB0fhwxZPHKiq8+Vaoap2uij2HoHdUYrVIHNUzIuZMxgyN/Hf/f+dkITkIPL2lt
kKnIcvmgCHQJwOY32B4P9ItfDGjIk5ajL8bRp1GFRSqiaoRhlGm+j/hv/qOa9BchTnZWTHCbSIxce1yPc=

GOBIERNO DE MÉXICO

COFEMER
Comisión Federal de Mejora Regulatoria

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México,
o 01 (55) 627 22 728 del resto del país.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 44 88 728.
denuncias@sat.gob.mx

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

LUAM920218FK4
Registro Federal de Contribuyentes

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 14101227471
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
AYUTLA DE LOS LIBRES , GUERRERO A 23 DE OCTUBRE DE 2023

LUAM920218FK4

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	LUAM920218FK4
CURP:	LUAM920218HGRNLR00
Nombre (s):	MARCELINO
Primer Apellido:	LUNA
Segundo Apellido:	ALEJANDRO
Fecha inicio de operaciones:	01 DE ENERO DE 2014
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	01 DE ENERO DE 2014
Nombre Comercial:	MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Datos del domicilio registrado

Código Postal:39200	**Tipo de Vialidad:** CALLE
Nombre de Vialidad: AYUNTAMIENTO	**Número Exterior:** 24
Número Interior:	**Nombre de la Colonia:** LA VILLA
Nombre de la Localidad: AYUTLA DE LOS LIBRES	**Nombre del Municipio o Demarcación Territorial:** AYUTLA DE LOS LIBRES
Nombre de la Entidad Federativa: GUERRERO	**Entre Calle:** FLORENCIO VILLAREAL

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:
(+52) 55 627 22 728

Y Calle: CRISTO REY

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de obras de urbanización	50	25/02/2019	
2	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	20	25/02/2019	
4	Preparación de terrenos para la construcción	10	25/02/2019	
3	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	10	25/02/2019	
6	Alquiler de maquinaria para construcción, minería y actividades forestales	5	25/02/2019	
5	Construcción de carreteras, autopistas, terracerías, puentes, pasos a desnivel y aeropistas	5	25/02/2019	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	01/11/2019	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Declaración anual de ISR. Personas Físicas.	A más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente.	01/11/2019	
Pago definitivo mensual de IVA.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2019	
Declaración de proveedores de IVA	A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2019	
Pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales. Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2019	
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	01/11/2019	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección http://sat.gob.mx

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúncialo! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello: ||2023/10/23|LUAM920218FK4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|20000108888888000000031||

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

Sello Digital:

jpk0BOFQ2b/DhyEXACTtFor/UUmU3P4ER467qOLs3pjqsp8juj2l9/vX6DBHjFCMhIDwDaSrb7NK6rGsPivewpceZ
c2ga0L5LQnPFlxGlOyt/sbAKvYa5IUBHf7xXf47vN2iO7ks1VJ8/vGa3CqTbiA6QienSDyTb3JsIFhXrTQ=

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Contacto
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS** EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

F U N D A M E N T O J U R Í D I C O

VISTO PARA EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 29: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. POR CONTRATO; O

II. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ASÍ MISMO EL ARTÍCULO 39 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, NOS MENCIONA, QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. LICITACIÓN PÚBLICA;

II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

POR OTRO LADO, EN SU ARTÍCULO 54 FRACCION I, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y TRATÁNDOSE DE OBRAS PÚBLICAS, SIEMPRE QUE EL MONTO DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, NO EXCEDA DE **VEINTE MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**;

ASIMISMO, ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PUBLICARÁ **EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN** EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO.

CONCORDANTE CON LO ANTERIOR EL **10 DE ENERO DEL 2023**, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA DA A CONOCER

QUE EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ES DE: $103.74 PESOS MEXICANOS LOS CUALES ESTARAN VIGENTES APARTIR DEL 1ro. DE FEBRERO DEL AÑO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5, DE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, QUE SIRVE DE BASE PARA CALCULAR EL MONTO MÁXIMO PARA QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PUEDAN CONTRATAR BAJO SU RESPONSABILIDAD OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

R E S U L T A N D O S

PRIMERO.- QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO.- QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DICTAMEN TIENEN LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III Y V, INCISO G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTÍCULO 27 FRACCIONES XVI, XX, XIV, XXI, XXII, XXV, XIX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL RELACIONADOS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIOS DE FACULTADES DEL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

TERCERO.-QUE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

CUARTO.- PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA DE QUE SE TRATA, SE TOMO EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY EN COMENTO, SIENDO SELECCIONADO EL CONTRATISTA, **C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO,** QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, EL EQUIPO MAYOR Y MENOR ES EL ADECUADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y EL PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO, YA QUE EN SU CURRICULUM CUENTA LA EXPERIENCIA EN CUANTO A OBRAS SIMILARES Y OBRAS DE MAYOR MAGNITUD.

QUINTO.-QUE LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS,** ASCIENDE A UN MONTO DE: **$931,034.48 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTO.- QUE EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 266, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA

A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O **DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION DE: $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.), RESULTANDO EL SIGUIENTE MONTO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN:

103.74*20,000= 2,074,800.00

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ES DE: **$103.74** QUE MULTIPLICADO POR VEINTE MIL, NOS DA COMO RESULTADO EL IMPORTE DE: **$2,074,800.00 (DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N.),** POR LO QUE DICHO IMPORTE ES TOMADO COMO BASE PARA CUMPLIR CON LO PRECEPTUADO EN EL REFERIDO ARTÍCULO, Y ASÍ OTORGAR LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS,** QUE ASCIENDE A UN MONTO DE: **$931,034.48 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NI EL CARGO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS PROPIO DEL AYUNTAMIENTO, CONCLUYENDO CON ESTO QUE EL COSTO DE LA OBRA NO REBASA EL MONTO SEÑALADO EN EL CITADO ARTÍCULO.

LA PRESENTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

A).- DE ECONOMIA: POR TRATARSE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTOS DE ACTUACIÓN, ESTA SE REALIZA CON LOS PRECIOS DE TABULADOR DETERMINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LO QUE REPRESENTA EL INDICADOR MÁS ADECUADO DE LA PROPORCIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE INVERSIÓN, COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL, Y EN ESTE MISMO SENTIDO LOS MEJORES PRECIOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

B).- DE EFICACIA: SE INVITO A LA EMPRESA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE RESPUESTA INMEDIATA NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO. CON EL HECHO DE RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE ATIENDE CON MAYOR RAPIDEZ LA DEMANDA DE LAS INSTALACIONES QUE REQUIERE UNA REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO ADEMAS, AL ASEGURARNOS QUE LA EMPRESA SELECCIONADA PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS Y NOS FACILITA EL PROCESO DE CONTRATACION, EFICIENTANDO CON ELLO LA EJECUCION DE LA OBRA. CON ESTO SE CUMPLE CON EL PROPOSITO PERSEGUIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE ES EN ESTE CASO, EL ADJUDICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL OBJETO DE UN CONTRATO.

C).- DE EFICIENCIA:CON LA MODALIDAD ELEGIDA SE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL COSTO ACEPTABLE ASIGNANDO EL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS EN LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO COMBATIR LOS ÍNDICES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO, POR LO QUE SON COBERTURA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS,

DRENAJE, SEGURIDAD PÚBLICA, SALUD Y ELECTRICIDAD, LOGRANDO CON ELLO INCREMENTAR LA COBERTURA DE CARÁCTER SOCIAL.

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SE RESUELVE

PRIMERO. – QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y EN COORDINACION CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y HABIÉNDOSE SATISFECHO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DETERMINA ADJUDICAR AL CONTRATISTA**, C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO,** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS UBICADA EN COL. JARDIN MANGOS**, QUE CONSTA DE UN MONTO TOTAL DE: **$931,034.48 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.),** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE: **$148,965.52 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.),** DANDO UN TOTAL DE: **$1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),** POR LO QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERÁ DEL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.**

SEGUNDO.-NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

ASÍ LO DICTAMINÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EL DÍA DIEZ DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

A T E N T A M E N T E

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

LMMR/LAAT/FCHO/aaha.

ACAPULCO

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 4653
FOLIO ANUAL: 490

ESPECIALIDADES:
* Edificación y Urbanización

REGISTRO: PERSONA FISICA

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**MARCELINO LUNA ALEJANDRO**
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARCELINO LUNA ALEJANDRO**
DOMICILIO:	CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
TELÉFONO:	246 332 5241, 745 107 0859
CORREO ELECTRÓNICO:	marcelinola58@gmail.com
RFC:	LUAM920218FK4
IMSS:	B61 76990 10 3
INFONAVIT:	B61 76990 10 3
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR**
CÉDULA PROFESIONAL:	12957362
FECHA DE CÉDULA:	02 DE AGOSTO DEL 2022
RFC:	GESB960409I75
TELÉFONO:	747 176 1481
CORREO ELECTRONICO:	bladimirgeronimo@gmail.com
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023**
AFILIACIÓN:	**CAMARA MEX. DE LA INDUSTRIA DE LA CONST.**

ACTA DE NACIMIENTO

No. ACTA:	386	LIBRO: 2
FECHA DE REGISTRO:	18 DE JULIO DEL 1992	OFICIALIA: 6
CIUDAD:	TECOANAPA, GRO.	

VIGENCIA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MARCELINO LUNA ALEJANDRO REPRESENTANTE LEGAL	**M. I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

AOBR-01
REV. 02



MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
LUNA
ALEJANDRO
MARCELINO

SEXO H

DOMICILIO
C SIN NOMBRE S/N
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.

CLAVE DE ELECTOR LNALMR92021812H300


CURP
LUAM920218HGRNLR00

AÑO DE REGISTRO
2010 03

FECHA DE NACIMIENTO
18/02/1992

SECCIÓN
2234

VIGENCIA
2023 - 2033

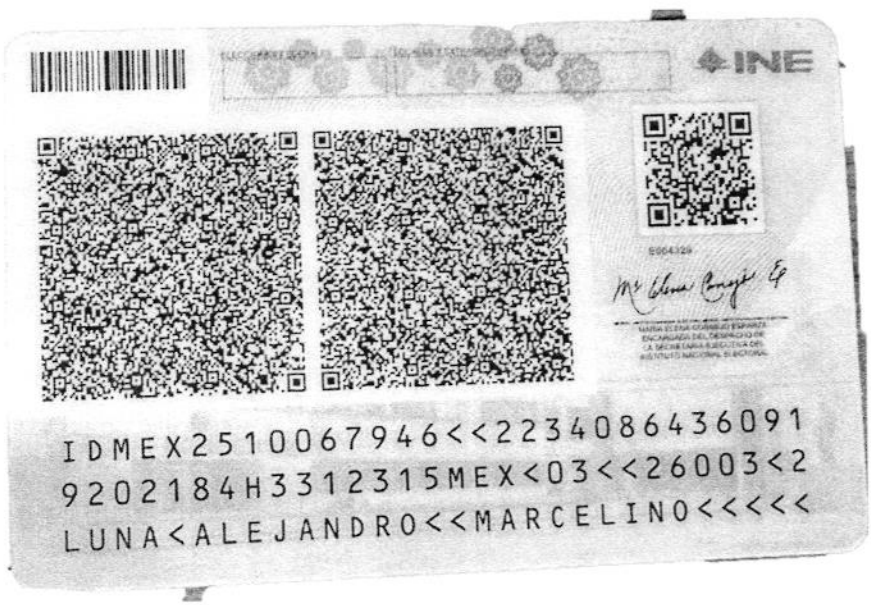

INE

IDMEX2510067946<<2234086436091
9202184H3312315MEX<03<<26003<2
LUNA<ALEJANDRO<<MARCELINO<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
4653 **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** Registro Nombre o razón social **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** Representante legal **CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.** Dirección social R.F.C. **LUAM920218FK4** IMSS **B61 76990 10 3** TEL. **246 332 5241, 745 107 0859**	**REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS** Nombre de la Obra **COL. JARDIN MANGOS** Ubicación **ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/539** Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)** Fecha: **08 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/539

$ 931,034.48

REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
Nombre de la Obra

COL. JARDIN MANGOS
Ubicación

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DESCRIPCION DE LA OBRA:
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.

SUBTOTAL	$ 931,034.48
16% IVA	$ 148,965.52
TOTAL	**$ 1,080,000.00**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 20 de Octubre del 2023	Fecha de terminación: 18 de Diciembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaria de Desarrollo Urbano
y Obras Publicas

Acapulco, Gro., 10 de Octubre del 2023

PCOR-01
REV. 02

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

Roberto Posada y Comonfort S/N Col. Centro , Acapulco , Gro., C.P. 39300
Tel (744)440 70 00 Ext. 4223 y 4227

CONTRATO N°. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS,** UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS,** EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, **LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO,** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, Y POR LA OTRA EL C. **MARCELINO LUNA ALEJANDRO, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 4653,** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

OPERADO
FAISMUN - 2023

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, II Y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV), B) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULO 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y ARTÍCULO 3RO. DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS A LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA**, Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS, A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N° **LUAM920218FK4**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **4653.**

- REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES No. **B61 76990 10 3**

2.7.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.8.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.9.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

OPERADO FAISMUN - 2023

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL **RAMO XXXIII.**

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN **LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y EL CONTENIDO

DE LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS,** UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: PRELIMINARES, PREPARACION DE SUPERFICIE, DESMONTAJES, INSTALACION HIDROSANITARIA, SANITARIOS, ALUMBRADO, HERRERIA, ACABADOS, JARDINERIA, ACARREOS Y LIMPIEZA.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA"**, COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$931,034.48 (NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$148,965.52 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **60 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **20 DE OCTUBRE DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **18 DE DICIEMBRE DEL 2023**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS **LA RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE ELLA DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA** Y **LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL **CAPÍTULO IV**, **SECCIÓN II**, ARTÍCULOS **122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA"**, PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"LA SECRETARIA"**, DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **30% (TREINTA POR CIENTO)**DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$279,310.34 (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 34/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR "EL CONTRATISTA" QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE "LA SECRETARÍA", POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A "EL CONTRATISTA" EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

OPERADO FAISMUN - 2023

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE **10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES**, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS **ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS** EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN **EL ARTÍCULO 179** DEL CITADO ORDENAMIENTO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A LA **RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 66** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA DEPENDENCIA".**

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA"** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL "**RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**",, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE "**EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

OPERADO FAISMUN - 2023

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266**.**

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE **10 DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL **ARTÍCULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A **"EL CONTRATISTA"** DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA **"SECRETARÍA"**.

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"** O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"** EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS.

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO **"EL CONTRATISTA"**, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE EL **ARTÍCULO 77** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"** LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"**, PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS **ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282** DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL **ARTÍCULO 179** DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL **"CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

I.LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL **"PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO"** EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y "**LA SECRETARÍA**" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO "**LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"** A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE **"LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO **POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS, A **EL C. C. ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ**, QUIEN DESIGNARÁ POR ESCRITO AL RESIDENTE RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL **ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE **"LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERÁ EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR** CON CEDULA PROFESIONAL **No. 12957362** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, EL **02 DE AGOSTO DEL 2022**, REGISTRADO COMO **SUPERINTENDENTE**, EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE ESTE MUNICIPIO. EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA",** QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PERSONAL TÉCNICO DE "**LA SECRETARÍA**" PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"; ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A "**LA SECRETARÍA**", O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "**LA SECRETARÍA**".

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE "**LA SECRETARÍA**" **(CATALOGO DE CONCEPTOS)** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE "**LA SECRETARÍA**" TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A "**LA SECRETARÍA**" O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A "**LA SECRETARÍA**", SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL).

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA. LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**, LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

OPERADO FAISMUN - 2023

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR "**LA SECRETARÍA**" NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL **ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266**, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

OPERADO FAISMUN - 2023

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, "**LA SECRETARÍA**" PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA",** QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS(DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS (CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL **ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL **ARTÍCULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,** QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

OPERADO FAISMUN - 2023

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **"LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO AL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR "**LA SECRETARÍA**" Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO.

EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL **ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS POR LA **" SECRETARIA"** EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON "**LA SECRETARÍA**" PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

OPERADO FAISMUN - 2023

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**, EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.**

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DEL 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON "LA SECRETARÍA", CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

OPERADO FAISMUN - 2023

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"**

RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO, EL DÍA **10 DE OCTUBRE DEL 2023.**

POR "LA SECRETARÍA".

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021-2024

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA".

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

OPERADO FAISMUN - 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA
FIADO

EXPEDICION: 10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

ANZA OTORGADA ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, R.F.C. MAJ-010101-NA3.

PARA GARANTIZAR POR MARCELINO LUNA ALEJANDRO, CON DOMICILIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA No. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO., Y CON R.F.C. LUAM920218FK4, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD, DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR, ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, EN SU CARACTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO DE JUAREZ, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,080,000.00 (UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ESTA FIANZA SE SUSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

D) EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO AUTORIZADAS O SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE.

E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

F) ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA CONVOCANTE, HASTA QUE SE

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

Firma Digital:

hGHULsKfkPpeMeGmkTh/7Vd9ngTFE6TaDatdCLEBePbOSRdvpkvmZXYB2DGjEZEaI/bc0/gJdPApTmSlaXEIJgGK1LUh6WMg3DAzwYngLkHNQ8ZQWKUovJdaBCFBNcqsJ/UOpECsrNRLvfjx1fKmzTluUfc8498qExo4s
h9DrSpKc6+oTEmSZkJb7gWgiA0eXcpdiDSpyyA7s0Z0hPXtDCEobaly+F0euAtYvMPmAPnGEUa57WBzLmMmxVUAANMkuXXkYS9FvwaulCl3/ujAHezVHmerOYcTGCJ0T1f5m82oxoqSGnB4n1Tkjdqn27e6bYFnWj3wipTBA==

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

POLIZA DE FIANZA
FIADO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

G) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;

H) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ESTA CONTINUARA VIGENTE.

I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TERMINOS AQUI ESTIPULADOS;

J) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TERMINOS SENALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCION FISICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACION ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, LA FIANZA QUEDARA CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACION CORRESPONDIENTE.

K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARA DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ESTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ESTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN

Expedido en: OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital: hGHULsKkPpeMsGmkThi7Vtd9ngTFE6TaDatdCLEBePhvO5RdVqkvmZXYB2DGjE2Ealbo0/gJdPAp7mSlaXEfJgGK1LUh5WWMg3DAzwYrgLkHNQ8ZQWKUovddaBCFBNcqsJUOpECsrNRLvfjx1fKmzTtuUfo6848qExo4s
h9D/9gNc6+oTEmSZKJb7gWgJA0eXcpxMDSpyyA7s0ZtPXtDCEobe9y+F0euAtYvMPmAPnGEUs5TWBzLmMmxVUAAMMuXXkYS9FvwaulCGtJujAHezVHmerOYcTGCU0T1f5im8ZoooqSGnB4nTNjdqn27e6bYfFnWj9wjpTBA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION
0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB

Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

Para verificar los datos del presente documento, usted puede consultar nuestro sitio web www.chubbfianzasmonterrey.com, enviar un correo a autentificacion@chubb.com o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 VALIDA

POLIZA DE FIANZA FIADO

EXPEDICION
10-10-2023

MONTO DE FIANZA	MONEDA	NO. DE FIANZA	INCLUSION	ENDOSO
108,000.00	PESOS	2245033	0	0002

CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A., con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma No. 250 Torre Niza Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11o. y 42o. de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 108,000.00 CIENTO OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.

Por: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Ante: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Se judi afia

AZO MAXIMO DE 30 (TREINTA) DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERA A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCION O REPOSICION REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRAN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA POLIZA DE FIANZA;

L) LA FIANZA SE HARA EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

M) LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS No. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO No. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

---------- FIN DE TEXTO ----------

Ino Obl Ov

Expedido en: *OFICINA: 00402; CHILPANCINGO, GUERRERO*

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS .

ANA LILIA VAZQUEZ MORALES
VAMA811020BK8

FIRMA DIGITAL

CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVÉS DE SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. CUALQUIER PAGO QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION.

Firma Digital:

hGHULsKkPpeMsGmkTni7Vd9xgTFE6TaDaidCLEBePtxO5RdfvgkvmZXYB2DGjE2Ealhc0gLqPApTmSlaXEtJgGK1LJh6WMqp3DAzwYngLkHNO8ZQWKLovJdaBCFBNcqsJUOqECsxNRLvfjx1fKmzTuUfc846qExo4s
h9/Dr9pNc6+vOTEm5ZKJb7gWgjAl0eXcpblDSpyyA7s0ZlrPXIDCEobaY+F0euAIYvMPmAPnGEUs57WBzLmMmxVUAAMkuX7kYSBFvwaulCGl3ujAHezVHmeOYcTGCU0T1f5m8ZoxoqSGnB4n1Tkjdqn2Te6bYfFnWj3wipTBA==

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.

Consulte nuestro aviso de privacidad en: www.chubbfianzasmonterrey.com

LINEA DE VALIDACION

0927 3A71 A3

R.F.C. FMO930803PB1 CHUBB FIANZAS MONTERREY ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0789-2015 y se vincula a la documentación contractual que Chubb Fianzas Monterrey Aseguradora de Caución, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientemente del producto específico de que se trate.

CHUBB Chubb Fianzas Monterrey
Aseguradora de Caución

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantizan la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS (S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. (LISF).

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante la Institución. Art. 279 de la LISF.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), SOLICITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LISF y en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 LISF.

4. *El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se establezcan.*

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o préstamos en dinero.

6. La Institución está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su contra. Art. 178 de la LISF.

7. La obligación de la Institución contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de la Institución. Art. 179 de la LISF.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Institución no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación novada. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Institución tratándose de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el beneficiario a la Institución, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente.

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC).

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Institución requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para solicitar documentación adicional.

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por reproducidas como si a la letra se insertase.

15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF.

16. Si la Institución no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al respecto, la Institución pagará un interés moratorio sobre la obligación denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los intereses moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que persista el incumplimiento.

17. La Institución podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, la Institución será llamada a dicho proceso o juicio para que éste a sus resultas. Art. 287 de la LISF.

18. *Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios*, deberán informar, a solicitud de la Institución, sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF.

19. La Institución se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art. 16 de la LISF.

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF.

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Institución en todos los derechos acciones y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) acreedor(es) la Institución no puede subrogarse en esos derechos acciones y privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 del C.C.F.

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII).

24. Las obligaciones de esta póliza cesarán si el (los) beneficiario(s) en los términos del artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones de carácter general a que se refiere dicho artículo, fuere(n) condenado(s) mediante sentencia ejecutoriada, por cualquier delito vinculado Contra la Salud (Narcotráfico), Encubrimiento y/u Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y/u Delincuencia Organizada en Territorio Nacional, o si el nombre del (los) beneficiario(s) o su(s) nacionalidad(es) es (son) publicado(s) en alguna lista oficial relativa a los delitos citados, sea de carácter nacional o extranjera proveniente de un Gobierno con el cual el Gobierno Mexicano tenga celebrado algún tratado internacional en la materia antes mencionada. En su caso, las obligaciones de la póliza serán restauradas una vez que la Compañía tenga conocimiento de que el nombre del (de los) beneficiario(s) deje(n) de encontrarse en las listas antes mencionadas.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 21 de diciembre de 2015, con el número CNSF-F0009-0790-2015 y a partir del día 9 de agosto de 2021 con el número CGEN-S0804-0020-2021.

Valida...

Validación de fianza/certificado

Validación por línea de validación

09273A6EE7 Validar fianza/certificado Limpiar

Sí su fianza/certificado no tiene línea de validación, oprima aquí | Sí cuenta con un xml de su fianza/certificado, oprima aquí

Datos de la fianza/certificado

Fianza/certificado /endoso: 2245231/0

Producto: 3312 - OBRA - ANTICIPO DE OBRA

Fecha de Expedición: 10/10/2023

Ver fianza /certificado

Fiado/ Contratante: MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Beneficiario/ Asegurado: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

Monto/ Suma Asegurada:
$324,000.00

Monto/ Suma Asegurada del Movimiento:
$324,000.00

Moneda:
PESOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

La presente validación fue realizada obteniendo el siguiente Folio de Validación: 097664359914

Ver carta validación

Endosos

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
10/10/2023	0002	REPOSICION DE TEXTO	$324,000.00	
10/10/2023	0001	REPOSICION DE TEXTO	$324,000.00	

Fecha Expedición	Endoso	Movimiento	Monto/Suma Asegurada	
10/10/2023	0000	EXPEDICION	$324,000.00	

En caso de que la información registrada no coincida con la fianza/certificado que se está validando, envía un mail a la siguiente dirección **autentificacion@chubb.com**
Call center 01-800-01-VALIDA (825432)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD
ASUNTO: ADJUDICACION DE OBRA
ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DEL 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
Nombre O Razón Social
MARCELINO LUNA ALEJANDRO
Representante legal

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BASE A LOS ARTÍCULOS 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIENDO VERIFICADO LOS DATOS QUE CONSTAN EN NUESTRO ARCHIVO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, TIENE A BIEN SELECCIONAR A LA EMPRESA **MARCELINO LUNA ALEJANDRO** PARA ADJUDICARLE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS** UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS, ACAPULCO GRO.**, SE AUTORIZO LA INVERSION MEDIANTE EL FONDO **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

EN CASO DE ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN REMITIDA, DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN **CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 DE ACAPULCO, GRO.** (ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL) EN IDIOMA ESPAÑOL, EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA SER OBJETO DE SU REVISIÓN Y CONTRATACIÓN.

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
CALLE EMILIANO ZAPATA NO. 37, COL. LA GARITA, C.P. 39650,
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

CARTA DE ACEPTACION DE DEDUCCIONES

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DEL 2023

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

CON RELACION A LA OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS** UBICADA EN **COL. JARDIN MANGOS**, ACAPULCO, GRO. CON NUMERO DE CONTRATO. **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD.**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, MANIFIESTO, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, QUE ACEPTAMOS SE NOS APLIQUE LA DEDUCTIVA DEL EL **0.005 (CINCO AL MILLAR)** PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA 02 DE MAYO DE 2022, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARIA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACION.

A T E N T A M E N T E

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

CARTA DE ACEPTACION

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE AGRADEZCO SE ME HAYA ASIGNADO LA OBRA QUE LLEVA POR NOMBRE: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS , DE ESTE MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD, LA CUAL ACEPTO PARA SU EJECUCION, RESPETANDO LAS NORMAS Y LINEAMIENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA LEY DE OBRA PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

CARTA BAJO PROTESTA

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.
P R E S E N T E.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARME EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DE ESTADO DE GUERRERO No. 266

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS**

No. de Contrato : **MAJ-FAISMUN/539-2023/AD**

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

CARTA DE SOLVENCIA ECONOMICA

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.
P R E S E N T E.

COMO REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO MANIFIESTO Y PROTESTO LO NECESARIO QUE MI REPRESENTADA TIENE SOLVENCIA ECONOMICA PARA RESPONDER A LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS, EN RELACION A LA OBRA PUBLICA CON EL NOMBRE: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS , EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO., CON CONTRATO No. MAJ-FAISMUN/539-2023/AD

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

CARTA DE VISITA DE OBRA

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO HAGO CONSTAR QUE SE VISITO LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CON NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD Y A SU VEZ SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE CONTIENE TODOS LOS CONCEPTOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DE DICHA OBRA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIOS EN INGENIERIA CIVIL, CONSTRUCCIONES, SUPERVICION
Y CONTROL DE CALIDAD RED RIBBON.
ING. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
R.F.C.: LUAM920218FK4

CARTA DE INICIO DE OBRA

ACAPULCO, GRO. A 10 DE OCTUBRE DE 2023

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO.
P R E S E N T E.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE CON FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2023 ESTA EMPRESA DARA INICIO CON RECURSOS PROPIOS A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS , UBICADA EN: COL. JARDIN MANGOS CON NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/539-2023/AD RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS**					
A01	**PRELIMINARES**					
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	505.36	38.01	19,208.73	2.06%
DESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.	M2	280.00	11.56	3,236.80	0.35%
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	4.00	509.39	2,037.56	0.22%
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.	M2	102.71	28.91	2,969.35	0.32%
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	14.00	256.97	3,597.58	0.39%
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANITILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	382.04	2,292.24	0.25%
	Total PRELIMINARES				**33,342.26**	**3.58%**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**					
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	84.63	846.30	0.09%
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15.00	122.87	1,843.05	0.20%
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	3,762.42	37,624.20	4.04%
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	1,744.72	3,489.44	0.37%

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO URREA MODELO CAIRO, INCLUYE: LLAVE DE PASO PARA MINGITORIO, URREA 17MG, ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	10,091.35	20,182.70	2.17%
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,500.00	5,500.00	0.59%
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				**69,485.69**	**7.46%**
A03	**ALUMBRADO**					
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	2,500.67	20,005.36	2.15%
LAM60W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 60 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 7 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	8.00	30,000.00	240,000.00	25.78%
	Total ALUMBRADO				**260,005.36**	**27.93%**
04	**HERRERIA**					
OR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.00	23,249.44	139,496.64	14.98%
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.	M2	102.71	310.02	31,842.15	3.42%
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	1.80	3,304.19	5,947.54	0.64%

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.	PZA	1.00	130,930.00	130,930.00	14.06%
	Total HERRERIA				**308,216.33**	**33.10%**
A05	**ACABADOS**					
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	505.36	122.00	61,653.92	6.62%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	25.00	128.59	3,214.75	0.35%
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	780.00	61.29	47,806.20	5.13%
-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	241.96	154.44	37,368.30	4.01%
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	142.48	37.66	5,365.80	0.58%
	Total ACABADOS				**155,408.97**	**16.69%**
A06	**JARDINERIA**					
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..	M3	56.00	529.56	29,655.36	3.19%
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	M2	280.00	172.19	48,213.20	5.18%

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	PZA	140.00	121.66	17,032.40	1.83%
	Total JARDINERIA				**94,900.96**	**10.19%**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	26.11	331.00	8,642.41	0.93%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	117.33	8.80	1,032.50	0.11%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**9,674.91**	**1.04%**
	Total REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS				**931,034.48**	**100.00%**
	SUBTOTAL				**931,034.48**	
	I.V.A. 16.00%				**148,965.52**	
	Total del presupuesto				**1,080,000.00**	

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	Importe
A	**REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS**	
A01	PRELIMINARES	33,342.26
A02	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	69,485.69
A03	ALUMBRADO	260,005.36
A04	HERRERIA	308,216.33
A05	ACABADOS	155,408.97
A06	JARDINERIA	94,900.96
A07	ACARREOS Y LIMPIEZA	9,674.91
	Total REHABILITACION DEL PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**931,034.48**
	IMPORTE PRESUPUESTO	931,034.48
	16% I.V.A.	148,965.52
	TOTAL	1,080,000.00

(* UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

. **ESTATAL:**

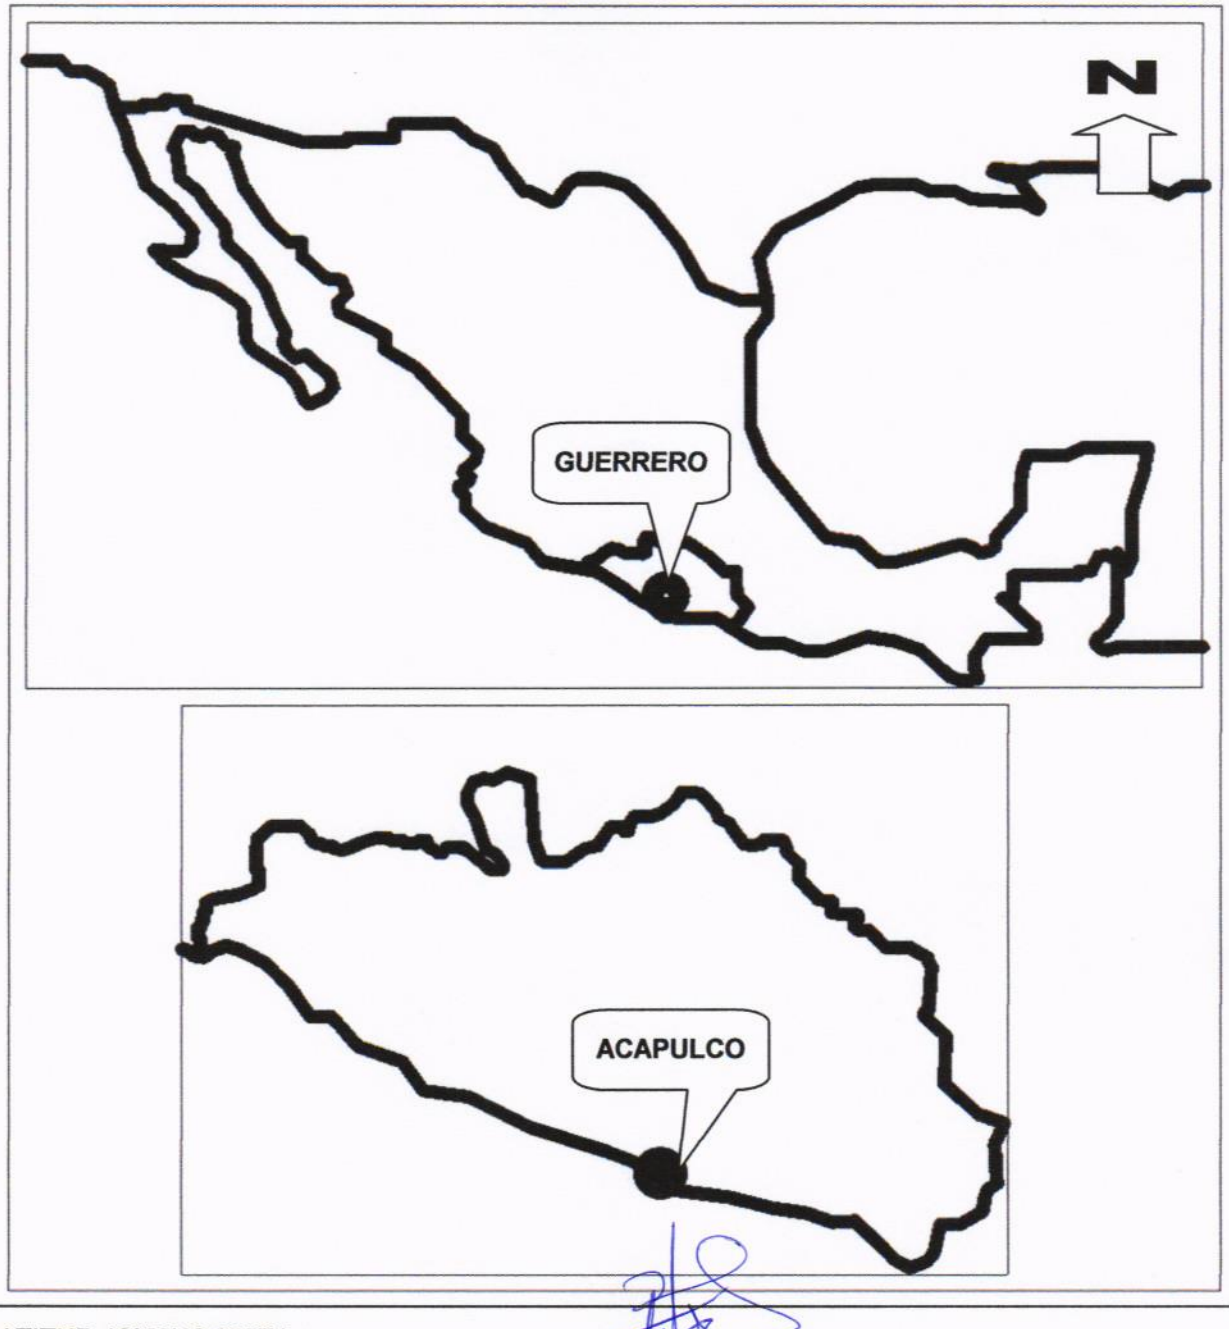

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

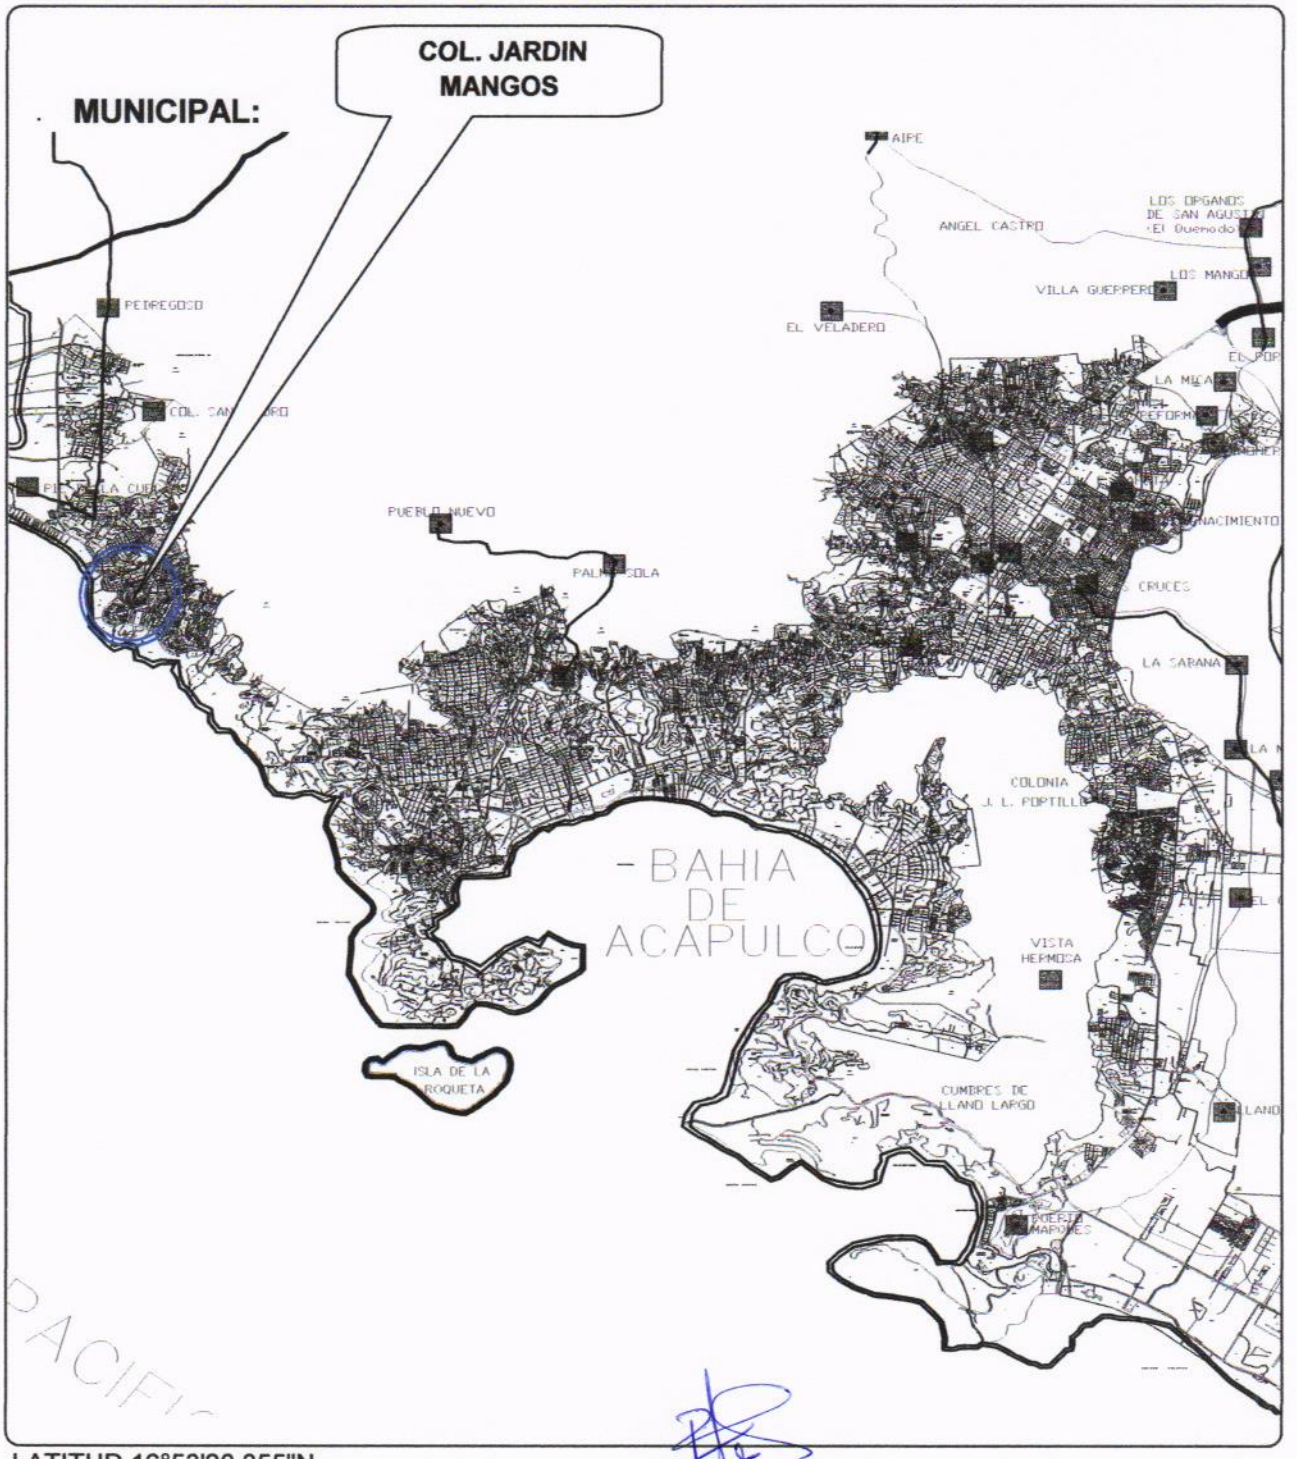

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

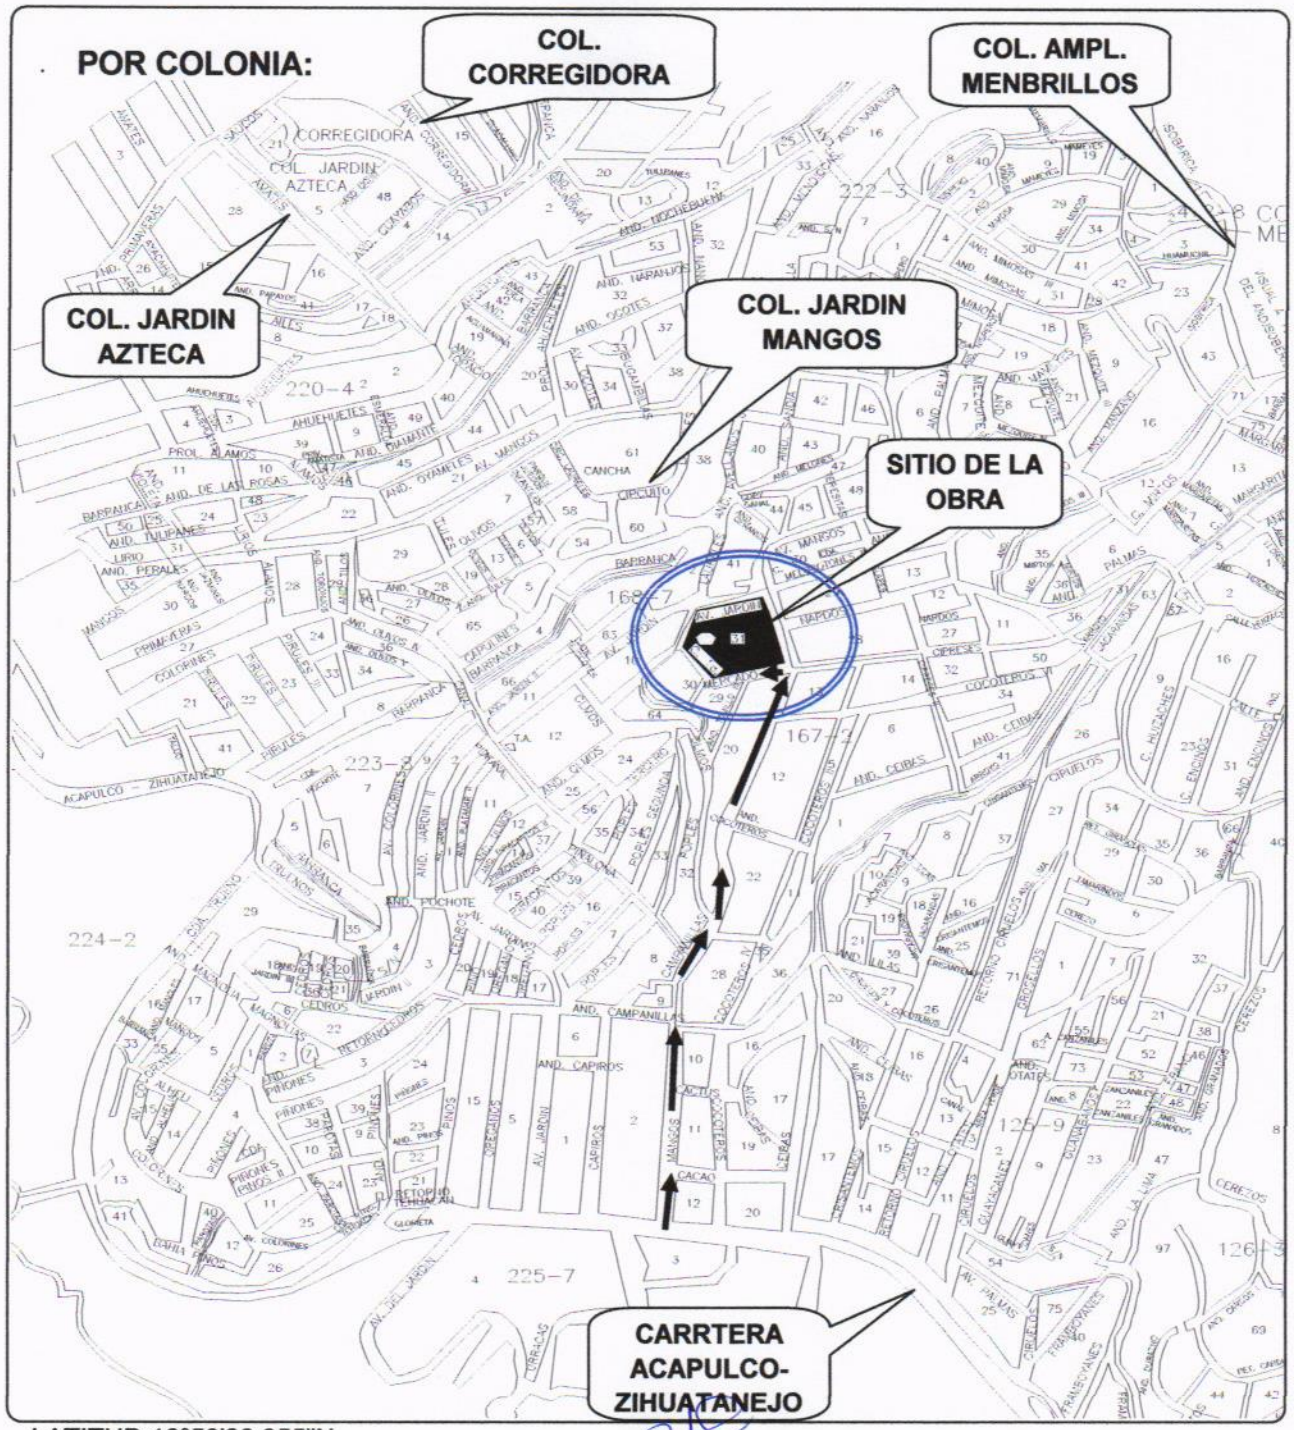

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

POR REFERENCIA:

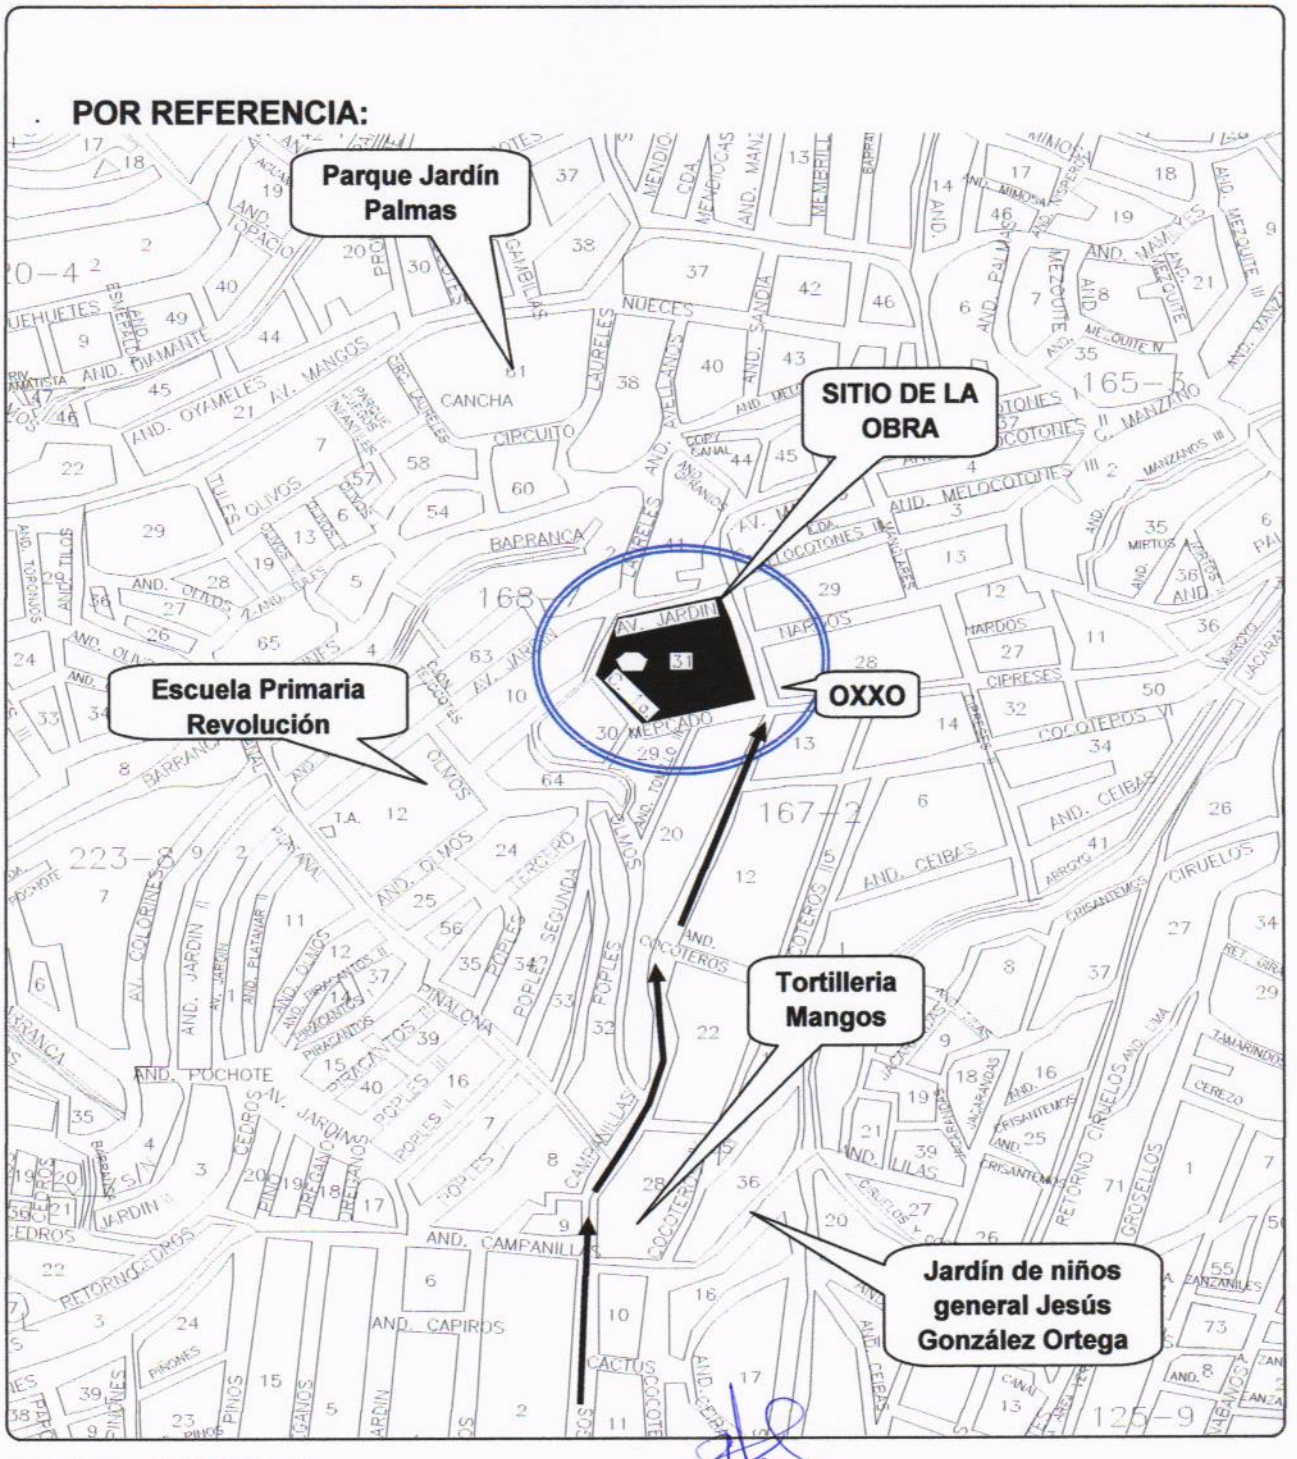

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

POR CALLES Y AVENIDAS:

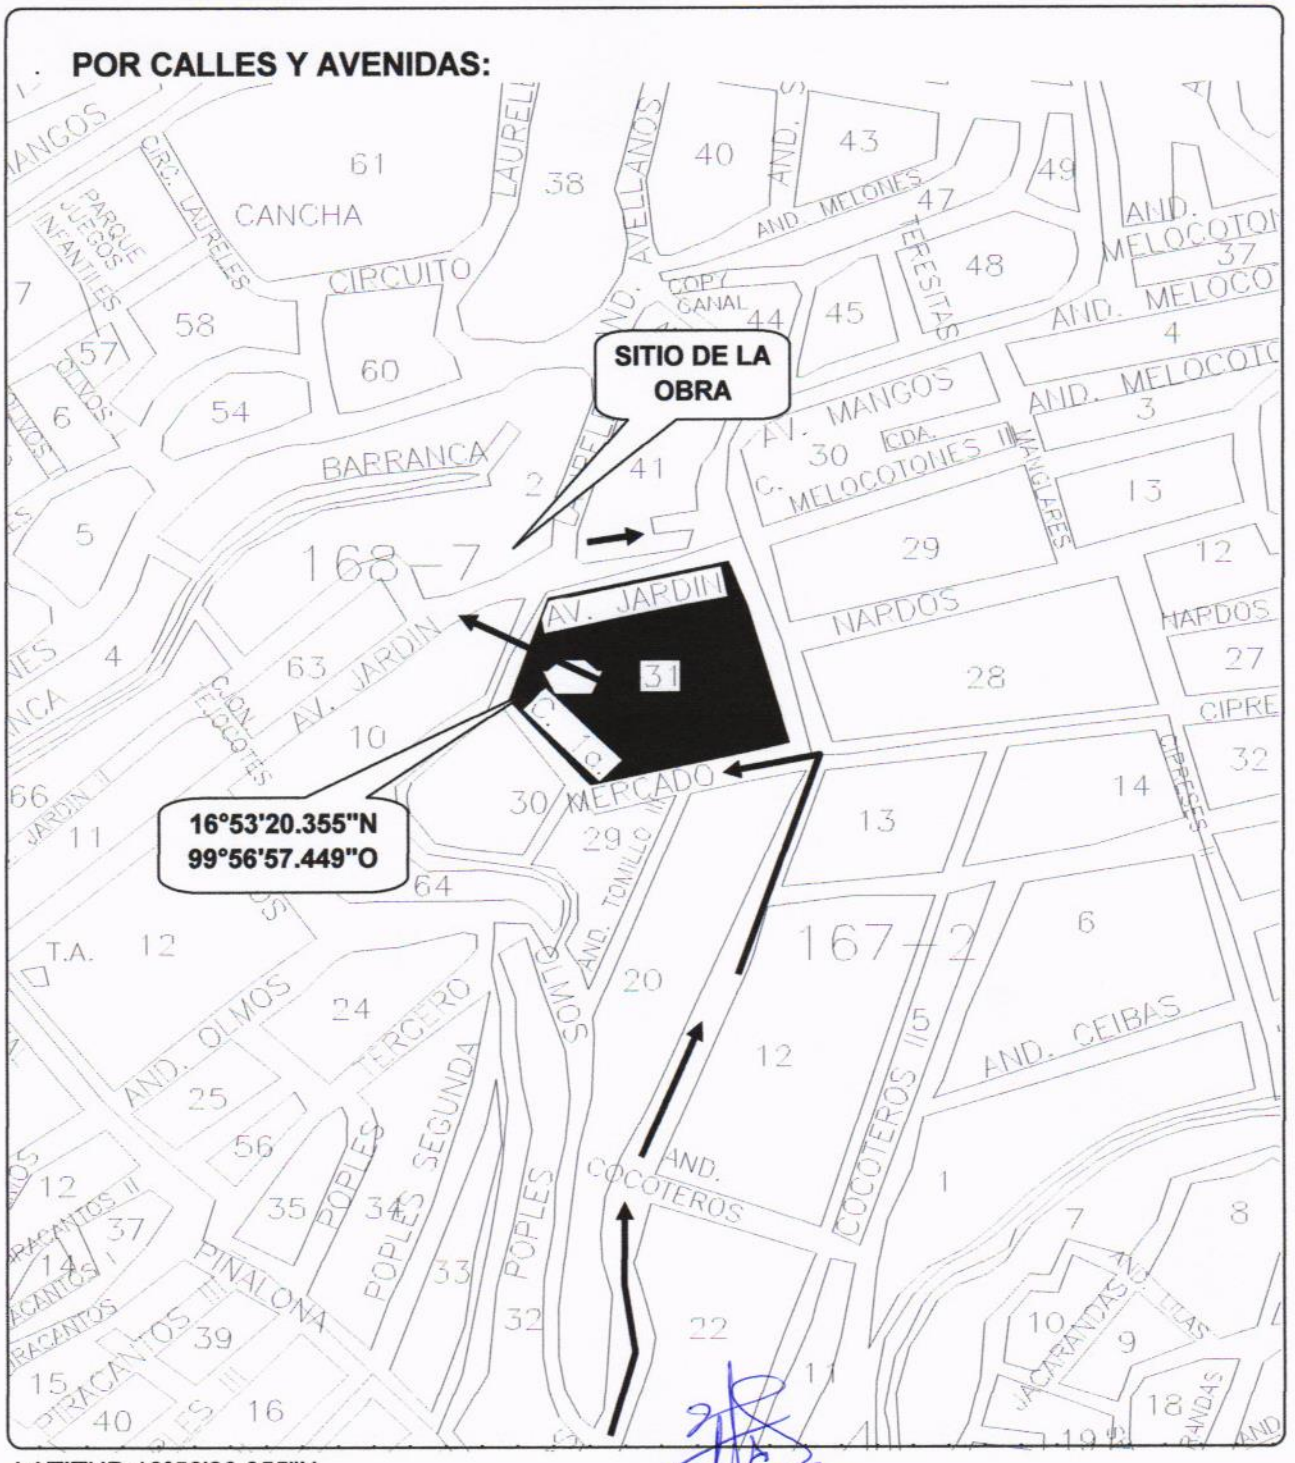

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

REPRESENTANTE LEGAL: C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO

gob.mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23ND4399033	LUAM920218FK4

Nombre, Denominación o Razón social

MARCELINO LUNA ALEJANDRO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 20 de octubre de 2023, a las 15:05 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||LUAM920218FK4|23ND4399033|20-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

eG1faoC+R6FzhPZj+hUnLiX+02q3CY/MvpGDa6t5PulJy7tek0ppuSFsroB5RePfGv3TxuUcA2q9oSPlWFU2R/BF8
n+YreCGCgS74YdJRijlETrE6egUrmEcDadgJoEIV+WM3SS8X/phO6C7UMGuBWtvWK0HLBS2P/N6mktBHsr4E8A0ye
5IgIXGdFOQoE8qZ8mJ3+Sm1sAFKwnhOYzqf+dgQHy3TzY8LWn0ZMamTBukyxibA+5KlPlMqrpgf7vHFD1xFkZUrcw
jqK/8cSEkHlBGbb1PbD0l++s4Xcv9eZVimadv7jvL8AXXHGzpl9QiRu7UCGNr2cEdY1KeO2g==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||LUAM920218FK4|23ND4399033|20-10-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

eG1faoC+R6FzhPZj+hUnLiX+02q3CY/MvpGDa6t5PulJy7tek0ppuSFsroB5RePfGv3TxuUcA2q9oSPlWFU2R/BF8
n+YreCGCgS74YdJRijlETrE6egUrmEcDadgJoEIV+WM3SS8X/phO6C7UMGuBWtvWK0HLBS2P/N6mktBHsr4E8A0ye
5IgIXGdFOQoE8qZ8mJ3+Sm1sAFKwnhOYzqf+dgQHy3TzY8LWn0ZMamTBukyxibA+5KlPlMqrpgf7vHFD1xFkZUrcw
jqK/8cSEkHlBGbb1PbD0l++s4Xcv9eZVimadv7jvL8AXXHGzpl9QiRu7UCGNr2cEdY1KeO2g==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

CALLE EMILIANO ZAPATA N° 37 COL. LA GARITA, C.P. 39650, ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
CEL. 246 332 5241, OFICINA 745 107. 0859.

MÉXICO

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
GERONIMO
SALVADOR
BLADIMIR

FECHA DE NACIMIENTO
09/04/1996

SEXO H



DOMICILIO
C SIN NOMBRE SN
LOC SAN FRANCISCO 39270
TECOANAPA, GRO.

CLAVE DE ELECTOR GRSLBL96040912H500

CURP GESB960409HGRRLL03 AÑO DE REGISTRO 2014 01

ESTADO 12 MUNICIPIO 057 SECCIÓN 2234

LOCALIDAD 0034 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028

Escaneado con CamScanner

ELECCIONES FEDERALES 21 LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

INE

EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1803796956<<2234098412563
9604098H2812313MEX<01<<30952<5
GERONIMO<SALVADOR<<BLADIMIR<<<

Escaneado con CamScanner

Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
12957362

Clave Única de Registro de Población
GESB960409HGRRLL03

Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
1295	410	1	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

BLADIMIR	GERONIMO	SALVADOR
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL	511301
Nombre del programa	Clave

Datos de la institución educativa

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO	120001
Nombre o denominación	Clave

Datos de expedición y firma electrónica

02/08/2022	12:46:08
Fecha	Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original
||12957362|1295|410|1|C1|01/08/2022 00:00:00|9|CIUDAD DE MÉXICO|GESB960409HGRRLL03|BLADIMIR|GERONIMO|SALVADOR|11890|120001|UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO|5647|511301|LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL||

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado
guRXBNcMCaMLQjU7GWfYb4VRR3tKbsIC23AlcKwCF+5AEUWGFtZ+/md3C6GCoyGTKMxZOR0oVJsldSGCYg9Y7zfi3gCGeg7UDVtelyVdnmDxqboUSSe+1FlsmHhm7iDC/3XD/
Au2ructBMrBhYlNVX4lcLBeYieD9lxOCAUxvmH6Z/p8SFawXF+KAlSlbkHI8uqcbNJDHua+MXrdwDfzcolhR8VVHAGCqqL63j7mSLB14WVWpah6+nA6B/UgTLfWDMPjwwirMM9SSj
g8NxmN52qzGHI6VgoSvfiza2fE9B2EpiqhjNuCr0JGKZ4pzcv/79dK277VYkJcCQcasz4j6w==

LIC. RUBÉN NÚÑEZ MERCADO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES.

Sello digital de tiempo SEP
5A+45Q5R2WxzO5yjc7o8i6AxqpnozlmRhlUOwHXmcSPU2t4ouz0v7tODqVKfUOcEab1mE4eNa5UqAMbNT/n7l0lqqEz3ODI9MHREDWt0VMxuUMZWTmQfsSkgJuDL9rKl2TcBS26
JOZ5W2OiobuhFlBPtMC13mWHa3WPPkDJM0YG4kpwTgHofL0kEdMn6rCgW8jHODRuel8hr5Stb4Db2x6RY5JGVyKLvyCgeQcQqwmKstXNIgKE2xuOqsWfxKHcc3/ER/SFilhuC5f
5clmX6dyQXBNIoRP1BE0bccrA3QirzzOrykqkBxyCPmisQANW3fKLlgc3n+J8WqBv9aRc4HA==

QR para validar la información

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en **www.gob.mx/cedulaprofesional**

Identificador electrónico - cédula
12957362

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/2320 /2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**
Acapulco, Gro., a 10 de octubre del 2023

MARCELINO LUNA ALEJANDRO
C. MARCELINO LUNA ALEJANDRO
REPRESENTANTE LEGAL
P R E S E N T E.

Por este medio informo a usted que la Residencia asignada a la obra REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS, ubicada en COL. JARDIN MANGOS, con número de contrato MAJ-FAISMUN/539-2023/AD, estará a cargo del ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ; así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico** (con su no. de cédula) y del **Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. MILTON MEDINA RAMIREZ
RESIDENTE DE OBRA

C.c.p. Archivo
VHA/CARR/*mgc

2023 AÑO DE Francisco VILLA

194

493

ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

2023 Francisco VILLA

2023 AÑO DE JUAN RANULFO ESCUDERO

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: REHABILITACION

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

2023 Año de Francisco VILLA

2023 AÑO DE JUAN RANULFO ESCUDERO
100° ANIVERSARIO LUCTUOSO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA
RUBRO DEL GASTO	URB.- URBANIZACION
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	PARQUE PUBLICO
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	REHABILITACION
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	COMPLEMENTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA	URBANIZACION
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	CONSTRUCCION EN PLAZA CIVICA

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD DE **MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIA, BARRIOS Y ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **REHABILITACION**

LOCALIZACION: **COL. JARDIN MANGOS**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **COL. JARDIN MANGOS**

TIPO DE OBRA : REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

NUEVA (X) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

505.36 M2 PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON I

102.71 M2 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

10.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORI

15.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORI

10.00 PZA INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CON CAPACIDAD DE 1100 LT. TIPO COMERCIAL, INCLUYE: ACCESORIOS (VALVULA, TUBO DE VENTILACION Y PRUEBAS), ACARREO DE M

8.00 ML BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO FC=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HE

8.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MA

6.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. C

1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO

505.36 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y I

356.00 M2 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBI

1197.36 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **500** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

BIENESTAR

FAIS

ACAPULCO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

OBJETIVO : DE MEJORAR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LAS COLONIA, BARRIOS Y ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

PROGRAMA : URBANIZACION

SUBPROGRAMA : CONSTRUCCION EN PLAZA CIVICA

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

REGION : 07.- ACAPULCO

MUNICIPIO : 01.- ACAPULCO

LOCALIDAD : ACAPULCO

COL. JARDIN MANGOS

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : $ 1,080,000.00

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 1,080,000.00	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	$ 1,080,000.00

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
117.33	M2	117.33	M2	500	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 500 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
PRELIMINARES	octubre , 2023	octubre , 2023
INSTALACION HIDROSANITARIA	octubre , 2023	noviembre , 2023
ALUMBRADO	noviembre , 2023	noviembre , 2023
HERRERIA	noviembre , 2023	noviembre , 2023
ACABADOS	diciembre , 2023	diciembre , 2023
JARDINERIA	diciembre , 2023	diciembre , 2023
ACARREOS Y LIMPIEZA	diciembre , 2023	diciembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA :
CONTRATO

FECHA DE INICIO : octubre-2023

FECHA DE TERMINACION : diciembre-2023

JORNALES A GENERAR : 538

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO

EJERCICIO: 2023

II.- UBICACION

	CLAVE:	FONDO:
FONDO:	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO:	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA:		
REGION:	007	ACAPULCO
MUNICIPIO:	001	ACAPULCO
LOCALIDAD:		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC.:		COL. JARDIN MANGOS
CABECERA MUNICIPAL:	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD:	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

	CLAVE	NOMBRE
Nº DE OBRA		
PROGRAMA:	URBANIZACION	
SUBPROGRAMA:	CONSTRUCCION EN PLAZA CIVICA	
MODALIDAD DEL PROYECTO:	REHABILITACION	
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	
	COL. JARDIN MANGOS	
TIPO DE OBRA	NUEVA(X) AMPLIACION( ) REHABILITACION( ) PROCESO( ) EQUIPAMIENTO( )	
MODALIDAD DE EJECUCION	C (X) AM ( ) AD ( ) AC ( ) M ( ) EQ ( )	
INSTANCIA EJECUTORA:	IH. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO	

III.- INVERSIONES

	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CREDITO	OTROS
INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	CREDITO	OTROS
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	$ 1,000,000.00	0.00	$ 1,000,000.00	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO							
TERCERO	$ 1,000,000.00		$ 1,000,000.00				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
117.33	M2	500	HABITANTES	117.33	M2	500	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR: 538

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	0	0
TERCERO	100	100

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	octubre-2023	FECHA DE TERMINACION:	diciembre-2023	
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:		
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:	

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:			
NO INICIADA:		EN PROCESO:		SUSPENDIDA:	

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

COL. JARDIN MANGOS

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUIZ MARIA MERAZA RADILLA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO

FECHA: octubre-2023

INFORMACION ADICIONAL :

LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: octubre-2023

La comunidad de: **COL. JARDIN MANGOS** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

el cual consta de las siguientes caracteristicas:

585.36 M2 PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON I
102.71 M2 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.
110.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORI
15.00 ML SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORI
10.00 PZA MOBORO ACAPULCO MOD. 2 ARO BLANCO DEAL S/T INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.
1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO CON CAPACIDAD DE 1100 LT TIPO COMERCIAL, INCLUYE: ACCESORIOS (VALVULA, TUBO DE VENTILACION Y PRUEBAS), ACARREO DE M
8.00 ML BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HE
8.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 60 WATTS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MA
6.00 ML SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. C
1.00 PZA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU MXPMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO
585.36 M2 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUME UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y F
56.00 M2 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBI
117.33 M2 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o **aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un** _____ % del costo total de la obra como a **continuación se desglosa:**

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 año de Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 10 DE OCTUBRE DEL 2023

LA COMUNIDAD DE: COL. JARDIN MANGOS

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: _____; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

NANCY MONTAÑA CISNEROS FLORES

PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 10 del mes de OCTUBRE del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Col. JARDIN MANGOS, localizado en el municipio ACAPULCO DE JUAREZ, de la entidad federativa GUERRERO, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado: 10 de Octubre del 2023			
Nombre de la obra: Rehabilitacion de parque publico Jardin Mangos			
Folio asignado en la MIDS: 374909		Monto total planeado: $1,080,000.00	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 20/10/2023	Fecha de conclusión: 18/12/2023	
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco	Localidad: Col. Jardin Mangos	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación: Parque Público		Monto: $ 801,600.00	
Subclasificación: Alumbrado Público		Monto: 278,400.00	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

NANCY MINERVA CISNEROS FLORES
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

SEÑORA LUZ ESPIRITU BALDERRAMA
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

INES YIDEL ESPIRITU BALDERRAMA
Vocal
Nombre completo y firma

PEDRO JULIAN BELLO CRUZ
Vocal
Nombre completo y firma

JOSE GERARDO PEREZ BATAZ
Vocal
Nombre completo y firma

M.C. Alejandro Díaz Lopez
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

ROSA ELDA DAMIAN MEDINA
Testigo
Nombre completo y firma

SILVIA AGUIRRE CABRERA
Testigo
Nombre completo y firma

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 10 de octubre del 2023		
Lugar de la capacitación: Cd. Jardín Mangos		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 5	Hombres: 2

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]

b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]

c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]

d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]

e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [ ] No [ ]

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS
NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS



BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: NANCY MINERVA CISNEROS FLORES Domicilio y número telefónico: AND. POPLES II M2 86 TZ 20 COL. JARDIN MANGOS 39912 ¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [X] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: SANDRA LUZ ESPIRITU BALDERRAMA Domicilio y número telefónico: C ISOBARICA MZ 175 LT 1 COL. JARDIN MANGOS 39912 ¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [X] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: INES YISEL ESPIRITU BALDERRAMA Domicilio y número telefónico: C ISOBARICA MZ 175 LT 1 COL JARDIN MANGOS 39912 ¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [X] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: PEDRO JULIAN BELLO CRUZ Domicilio y número telefónico: AND ISOBARICA MZ 285 LT 10 COL. JARDIN MANGOS 39912 ¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [X] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: JOSE LEOPOLDO PEREZ BATAS Domicilio y número telefónico: C MELONES MZ 26 LT6 COL. JARDIN MANGOS 39912 ¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [X] NO En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de Bienestar utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DESARROLLO

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

COL. JARDIN MANGOS

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : **COL. JARDIN MANGOS**

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 500 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE : 117.33** M2

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: REHABILITACION

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: M2 **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA **117.33** M2

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

REHABILITACION

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

COL. JARDIN MANGOS

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **117.33** **M2**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: _____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

Fecha: 23/NOV/2023

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS
UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS
RESIDENTE DE OBRA: ARQ. MIGUEL MEDINA RAMIREZ.
SUPERINTENDENTE DE OBRA: ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR
EMPRESA CONTRATISTA: MARCELINO LUNA ALEJANDRO.

REQUISITOS:

A. CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA A REALIZAR
B. VISUALIZACION Y PUNTUALIZACION DE LOS CONCEPTOS A EJECUTARSE EN EL LUGAR DE VISITA.
C. ALINEAMIENTO: CHECAR LOS LINEAMIENTOS EN PLANO REGULADOR , ASI COMO CONFIRMAR SI ES ZONA REGULAR O NO, PARA EVITAR POSIBLES INVASIONES EN VIA PUBLICA, O BIEN PARA EVITAR CONSTRUIR EN ZONA FEDERAL PROTEGIDA.

EN VIALIDADES:

C.1. CONFIRMAR LA MEDIDA REAL DEL ANCHO DE L CALLE EN LA VISITA DE OBRA
C.2. VERIFICAR EL ANCHO DE LA CALLE EN LOS PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR

EN ESCUELAS:

C.3. ALINEAMIENTO EN PLANO REGULADOR (ZONA URBANA)
C.4. PLANO AUTORIZADO POR EL COMISARIO EJIDAL (ZONA RURAL)

D. RECOLECTAR LAS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR SOLO DE LAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA VERIFICAR LA DIRECCION CORRECTA DE LA MISMA.
E. VERIFICAR QUE EL COMITÉ CORRESPONDA A LA OBRA SOLICITADA, EN SU DEFECTO, FORMAR EL COMITÉ EN ESE MOMENTO Y VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA QUE ES GESTOR DE LA OBRA CITADA.
F. APOYARSE CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA DETERMINAR QUE ARBOLES SE PUEDEN TALAR.
G. APOYARSE CON LA DIRECCION DE CAPAMA PARA CUESTIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
H. MOVER LOS POSTES ELECTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA C.F.E.

NOTA (1): LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS REQUERIDO SE ANEXARAN A LA PRESENTE ACTA, ASI COMO **LA HOJA DE ASIGNACION** ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.

NOTA (2): EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS VERIDICOS, ASI COMO ACREDITAR A SU SUPERINTENDENTE DE OBRA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE DEBERA ESTAR DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, PARA CUALQUIER ACLARACION. BAJO NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA COMO REPRESENTANTE TECNICO Y/O SUPERINTENDENTE A CUALQUIER PERSONA AJENA A LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES: SE REALIZO UN RECORRIDO ENTRE CONTRATISTA Y EL COMITE DE VECINOS DEL LUGAR PARA VERIFICAR EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y AL NO EXISTIR NINGUN INCONVENIENTE POR NINGUNA DE LAS PARTES SE PROCEDE A HACER ENTREGA DEL SITIO DE OBRA A LA CONTRATISTA PARA DAR INICIO CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE OBRA.

FIRMA DEL RESIDENTE

ARQ. MIGUEL MEDINA R.

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE

ING. BLADIMIR GERONIMO SALVADOR

IX.- PRESUPUESTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	IMPORTE	
PRELIMINARES	$	33,342.26
INSTALACION HIDROSANITARIA	$	69,485.69
ALUMBRADO	$	260,005.36
HERRERIA	$	308,216.33
ACABADOS	$	155,408.97
JARDINERIA	$	94,900.96
ACARREOS Y LIMPIEZA	$	9,674.91

TOTAL:	$	931,034.48
D E S G L O S E		
SUBTOTAL	$	931,034.48
IVA 16%	$	148,965.51
TOTAL	$	**1,080,000.00**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**					
A01	**PRELIMINARES**					
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.	M2	505.36	38.01	19,208.73	2.06%
ESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.	M2	280.00	11.56	3,236.80	0.35%
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION	PZA	4.00	509.39	2,037.56	0.22%
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.	M2	102.71	28.91	2,969.35	0.32%
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.	PZA	14.00	256.97	3,597.58	0.39%
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00	382.04	2,292.24	0.25%
	Total PRELIMINARES				**33,342.26**	**3.58%**
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**					
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	10.00	84.63	846.30	0.09%
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	15.00	122.87	1,843.05	0.20%
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10.00	3,762.42	37,624.20	4.04%
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	1,744.72	3,489.44	0.37%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00	10,091.35	20,182.70	2.17%
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	5,500.00	5,500.00	0.59%
	Total INSTALACIÓN HIDROSANITARIA				**69,485.69**	**7.46%**
A03	**ALUMBRADO**					
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	2,500.67	20,005.36	2.15%
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.	PZA	8.00	30,000.00	240,000.00	25.78%
	Total ALUMBRADO				**260,005.36**	**27.93%**
A04	**HERRERIA**					
)R-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.00	23,249.44	139,496.64	14.98%
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.	M2	102.71	310.02	31,842.15	3.42%
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .	M2	1.80	3,304.19	5,947.54	0.64%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.	PZA	1.00	130,930.00	130,930.00	14.06%
	Total HERRERIA				**308,216.33**	**33.10%**
A05	**ACABADOS**					
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.	M2	505.36	122.00	61,653.92	6.62%
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.	M2	25.00	128.59	3,214.75	0.35%
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	780.00	61.29	47,806.20	5.13%
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	241.96	154.44	37,368.30	4.01%
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.	ML	142.48	37.66	5,365.80	0.58%
	Total ACABADOS				**155,408.97**	**16.69%**
A06	**JARDINERIA**					
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..	M3	56.00	529.56	29,655.36	3.19%
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	M2	280.00	172.19	48,213.20	5.18%

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.	PZA	140.00	121.66	17,032.40	1.83%
	Total JARDINERIA				**94,900.96**	**10.19%**
A07	**ACARREOS Y LIMPIEZA**					
3-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)	M3	26.11	331.00	8,642.41	0.93%
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.	M2	117.33	8.80	1,032.50	0.11%
	Total ACARREOS Y LIMPIEZA				**9,674.91**	**1.04%**
	Total REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS				**931,034.48**	**100.00%**
	SUBTOTAL				**931,034.48**	
	I.V.A. 16.00%				**148,965.52**	
	Total del presupuesto				**1,080,000.00**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

10-oct-2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	Importe
A	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS	33,342.26
A01	PRELIMINARES	69,485.69
A02	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA	260,005.36
A03	ALUMBRADO	308,216.33
A04	HERRERIA	155,408.97
A05	ACABADOS	94,900.96
A06	JARDINERIA	9,674.91
A07	ACARREOS Y LIMPIEZA	
	Total REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS	**931,034.48**

IMPORTE PRESUPUESTO		931,034.48
	16% I.V.A.	148,965.52
	TOTAL	1,080,000.00

(* UN MILLON OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

REGION: 07.- ACAPULCO

LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	555,897.38
MANO DE OBRA		$	168,179.83
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	11,918.42
SUB-TOTAL		**$**	**735,995.63**
INDIRECTOS	**15.0000%**	$	110,399.34
SUMA		$	846,394.97
FINANCIAMIENTO	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	846,394.97
UTILIDAD	**10.0000%**	$	84,639.50
SUMA		$	931,034.47
CARGOS ADICIONALES	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	931,034.48
I . V. A	**16.00%**	$	148,965.52
TOTAL		**$**	**1,080,000.00**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
AGUA	AGUA	M3	32.967244	165.00	5,439.60	0.74%
ALAMBRON	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	9.453664	26.93	254.59	0.03%
ALAREC	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	1.316832	50.00	65.84	0.01%
ANDTUB	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TUERAS)	RHR	28.218	57.75	1,629.59	0.22%
ARENARIO	ARENA DE RIO	M3	0.721432	500.00	360.72	0.05%
BARROTE	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	2.88	150.00	432.00	0.06%
BRAZO	BRAZO DE 1 DE DIAMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS	PZA	8.00	756.25	6,050.00	0.82%
CEMENGRS	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	0.544018	4,750.00	2,584.09	0.35%
CESPLO	CESPOL DE PLOMO PARA VERTEDERO	PZA	2.00	200.69	401.38	0.05%
CLAVO"2	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	1.44	50.00	72.00	0.01%
CLIP2"	CLIP PARA CONDUIT 2 DE PULGADA PLATA	PZA	410.84	17.50	7,189.70	0.98%
CODC1/2	CODO D/COBRE DE 1/2"	PZA	4.00	7.80	31.20	0.00%
CODC3/4X90	CODO D/COBRE 3/4X90	PZA	2.00	18.23	36.46	0.00%
DIESEL	DIESEL	LTO	3.84	22.96	88.17	0.01%
DUELA3RA	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	1.44	104.18	150.02	0.02%
GRAVA3/4	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	0.856113	660.00	565.03	0.08%
HERWC	HERRAJES DE BRONCE PARA W.C. TANQUE BAJO.	JGO	10.00	180.00	1,800.00	0.24%
INOZAF	INODORO ZAFIRO	PZA	10.00	2,460.00	24,600.00	3.34%
JUNPROHEL	JUNTA PROHEL	PZA	10.00	23.55	235.50	0.03%
LAVABO	LAVABO VERACRUZ	PZA	2.00	545.93	1,091.86	0.15%
LLAVEMEZ3	LLAVE MEZCLADORA URREA	PZA	2.00	315.00	630.00	0.09%
LLAVEMING	LLAVE DE MINGUITORIO CROMADA	PZA	2.00	2,600.00	5,200.00	0.71%
LUMSOLAR	LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS	PZA	8.00	10,312.50	82,500.00	11.21%
MALLA10.5	MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5	M2	112.981	104.25	11,778.27	1.60%
MINGNIAGARA	MINGITORIO NIAGARA	PZA	2.00	4,928.00	9,856.00	1.34%
MODULO01	MODULO INFANTIL	PZA	1.00	100,050.00	100,050.00	13.59%
PASTO A	PASTO ALFOMBRA	M2	308.00	70.00	21,560.00	2.93%
PIJA4	PIJAS/TAQUETE PLOMO	PZA	20.00	4.34	86.80	0.01%
PINESM100	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	74.914297	127.05	9,517.86	1.29%
PINTOP	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX	LTO	161.306747	60.21	9,712.28	1.32%
PINVINMEX	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	111.764407	144.74	16,176.78	2.20%
PLA1/2"	PLACA DE ACERO DE 1/2"	KG	30.00	47.41	1,422.30	0.19%
PLANTASORN	PLANTAS DE ORNATO (IXORA, HELECHOS, COPA DE ORO, FICUS)	PZA	140.00	31.50	4,410.00	0.60%
POLIN	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	0.48	300.00	144.00	0.02%
POSTE	POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA	PZA	8.00	10,981.71	87,853.68	11.94%
PRIMER	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	39.837989	165.88	6,608.33	0.90%
PUEH3	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14	M2	1.98	2,100.00	4,158.00	0.56%
SELLVIN	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	131.189253	64.13	8,413.17	1.14%
SOL6X3/8	SOLERA DE ACERO DE 6" X 3/8"	KG	150.48	30.00	4,514.40	0.61%
SOLD50X50	SOLDADURA DE 50 X 50 PARA COBRE	PZA	0.60	156.00	93.60	0.01%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
SOLD6013	SOLDADURA 6013 (1/8") PARA ACERO	KG	23.744886	100.33	2,382.32	0.32%
TBOCOB3/4"	TUBO D/COBRE 19MM TIPO M	ML	1.00	164.62	164.62	0.02%
TBOCPVC13	TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	11.00	16.49	181.39	0.02%
TBOGAL4	TUBO DE ACERO DE 4" CEDULA 40	ML	79.20	1,140.33	90,314.14	12.27%
TBOCPVC19	TUBO DE CPVC DE 19 MM DE DIAM	ML	16.50	24.10	397.65	0.05%
TINACO1100	TINACO VERTICAL CON PATAS DE 1100 LTOS.	PZA	1.00	3,139.79	3,139.79	0.43%
THINER	THINER	LTS	37.830206	40.68	1,538.93	0.21%
TIENEGRA	TIERRA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	73.50	250.00	18,375.00	2.50%
TRIPLAY16	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	0.384	832.94	319.85	0.04%
VARILLA3	VARILLA NO 3	KG	37.513344	35.20	1,320.47	0.18%
	Total MATERIALES				**555,897.38**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MANO DE OBRA					
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO			15,293.03	2.08%
MO001	PEON	JOR	49.609846	404.35	20,059.74	2.73%
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	112.813944	451.52	50,937.75	6.92%
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	0.06615	451.52	29.87	0.00%
MO010	OF. ALBANIL	JOR	19.743373	617.54	12,192.32	1.66%
MO011	OF. FIERRERO	JOR	0.399704	617.54	246.83	0.03%
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	0.48	617.54	296.42	0.04%
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	8.00	617.54	4,940.32	0.67%
MO014	OF. PLOMERO	JOR	8.13483	617.54	5,023.58	0.68%
MO017	OF. HERRERO	JOR	13.0855	617.54	8,080.82	1.10%
MO020	OF. JARDINERO	JOR	19.402993	617.54	11,982.12	1.63%
MO021	OF. PINTOR	JOR	60.453421	617.54	37,332.41	5.07%
MO025	OF. COLOCADOR	JOR	2.857496	617.54	1,764.62	0.24%
	Total MANO DE OBRA				**168,179.83**	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO02	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO			4,591.71	0.62%
EQCAMION	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	11.374192	590.30	6,714.19	0.91%
[illegible]PLAN	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	3.00	163.39	490.17	0.07%
[illegible]REV	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP	HOR	0.6615	106.46	70.42	0.01%
EQVIB	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	0.63	82.43	51.93	0.01%
	Total EQUIPO Y HERRAMIENTA				**11,918.42**	

TOTALES DE INSUMOS

	Importe	%
Materiales	555,897.38	75.53%
Mano de obra	168,179.83	22.85%
Equipo	11,918.42	01.62%
Total	735,991.83	100.00%

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**

UBICACIÓN: **COL. JARDIN MANGOS**

FECHA DE INICIO: **octubre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 7	8	9	10	11	12
PRELIMINARES	$ 33,342.26	13.04%	3.58%						
INSTALACION HIDROSANITARIA	$ 69,485.69	26.09%	7.46%						
ALUMBRADO	$ 260,005.36	8.70%	27.93%						
HERRERIA	$ 308,216.33	8.70%	33.10%						
ACABADOS	$ 155,408.97	13.04%	16.69%						
JARDINERIA	$ 94,900.96	13.04%	10.19%						
ACARREOS Y LIMPIEZA	$ 9,674.91	17.39%	1.04%						
SUBTOTAL	$ 931,034.48	100%	100%						
16 % IVA	$ 148,965.52								
TOTAL	**$ 1,080,000.00**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **URBANIZACION**
MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**
FECHA DE INICIO: **octubre-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS															
COL. JARDIN MANGOS	$ 931,034.48	100%	100%												
SUBTOTAL	$ 931,034.48														
IVA	$ 148,965.52														
TOTAL	**$ 1,080,000.00**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A	**REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**										
A01	**PRELIMINARES**										
PR-SUP	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.				M2	505.36	1.00		1.00	505.36	
										505.36	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

PR-SUP PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.

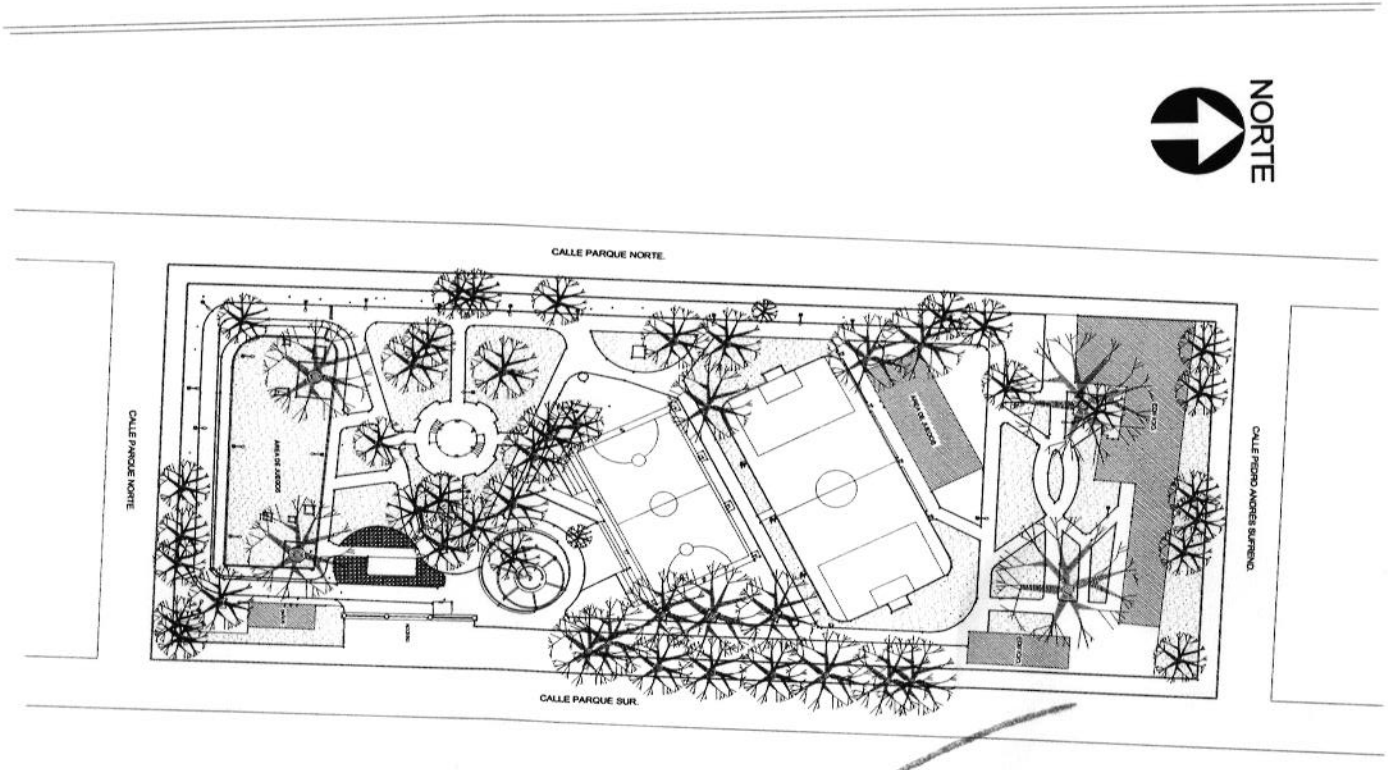

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
DESH*	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.				M2	280.00	1.00		1.00	280.00	
										280.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

DESH* DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.

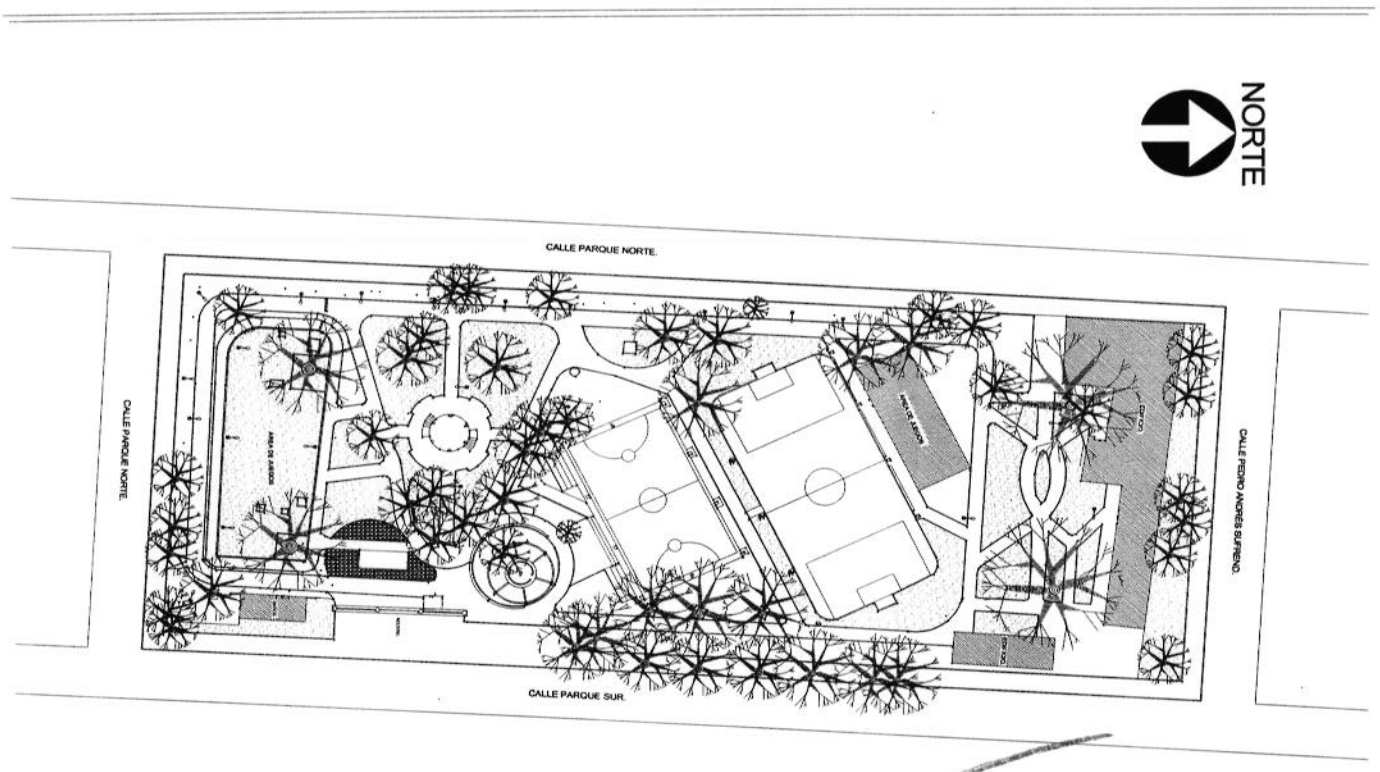

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023
Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
34-0551	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION				PZA				4.00	4.00	
										4.00	PZA

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s

HOJA: 6 DE: 56

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

34-0551 PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION

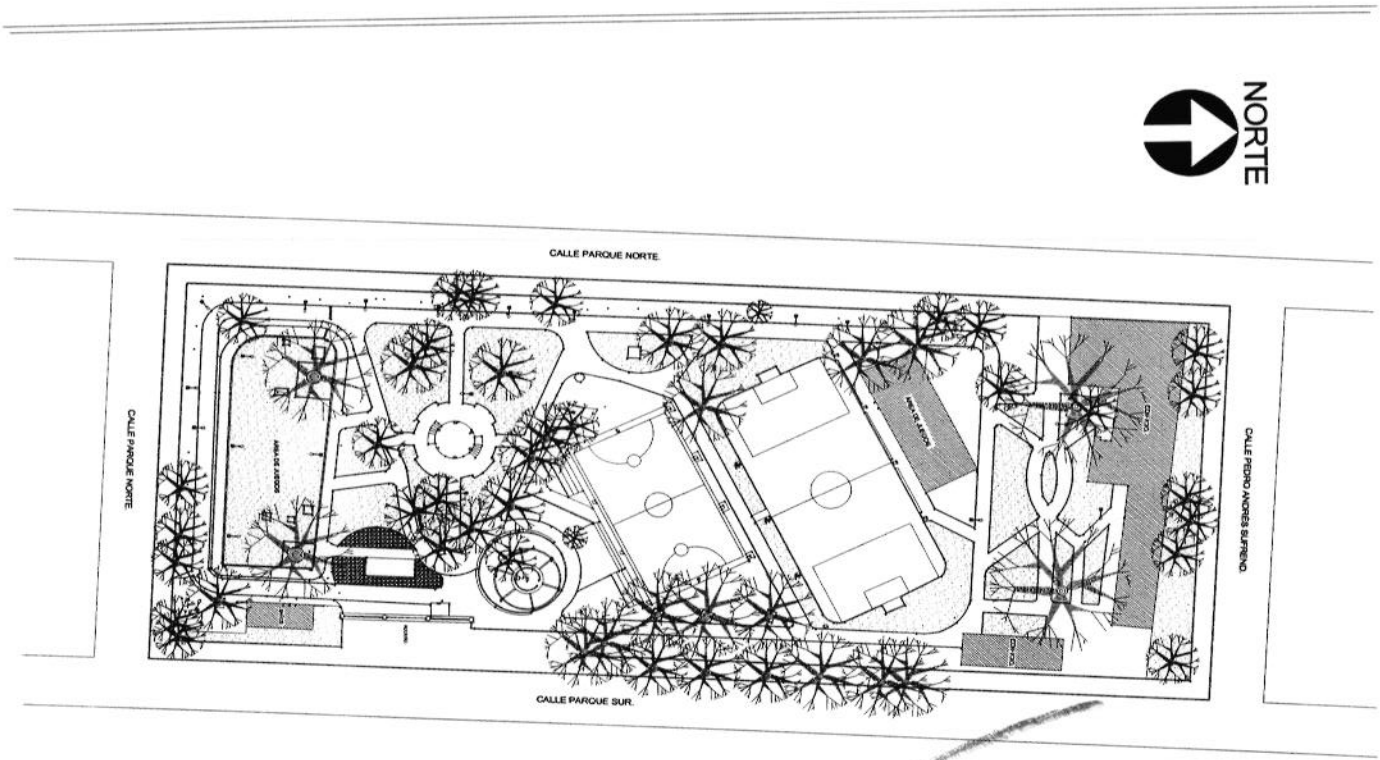

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
2-0065	DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.				M2	102.71		1.00	1.00	102.71	
										102.71	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s

HOJA: 8 DE: 56

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

2-0065 DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

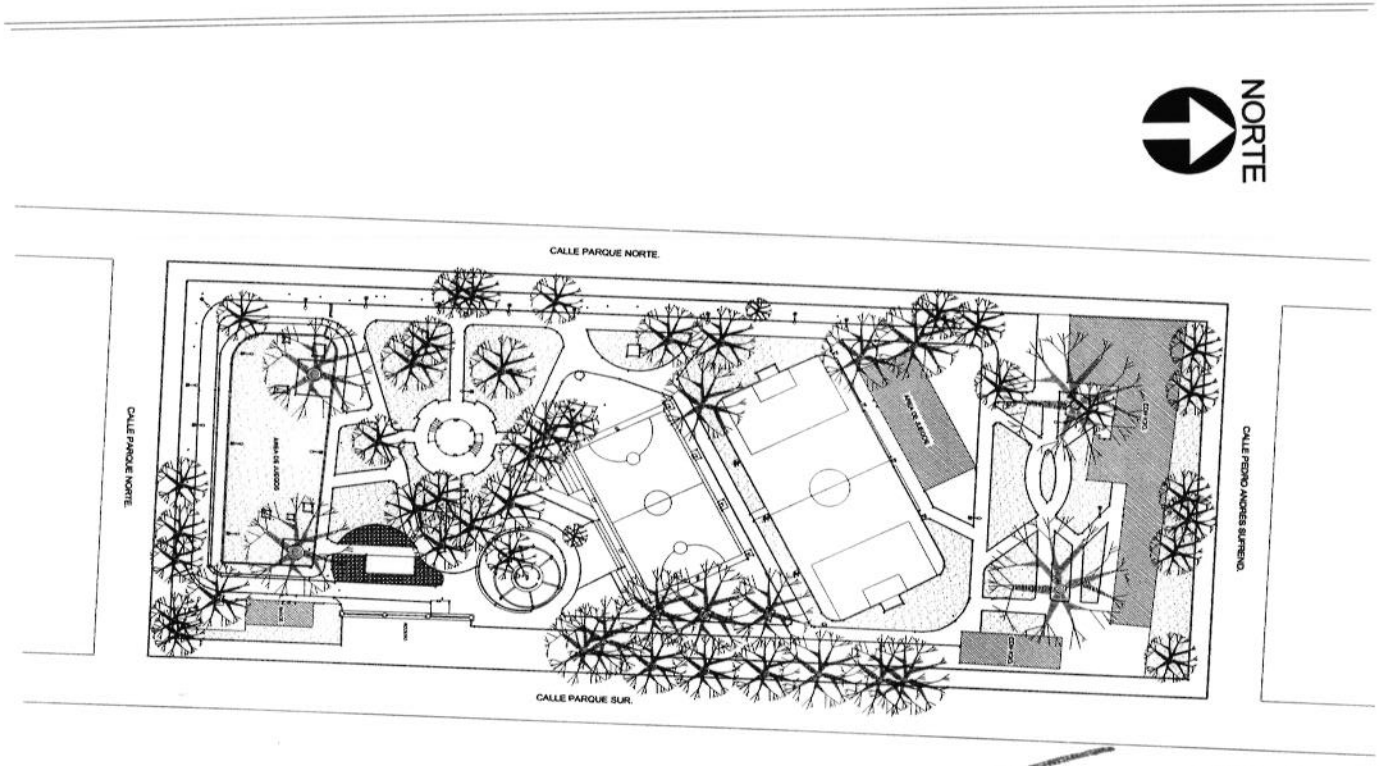

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
2-0070	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.				PZA				14.00	14.00	
										14.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

2-0070 DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.

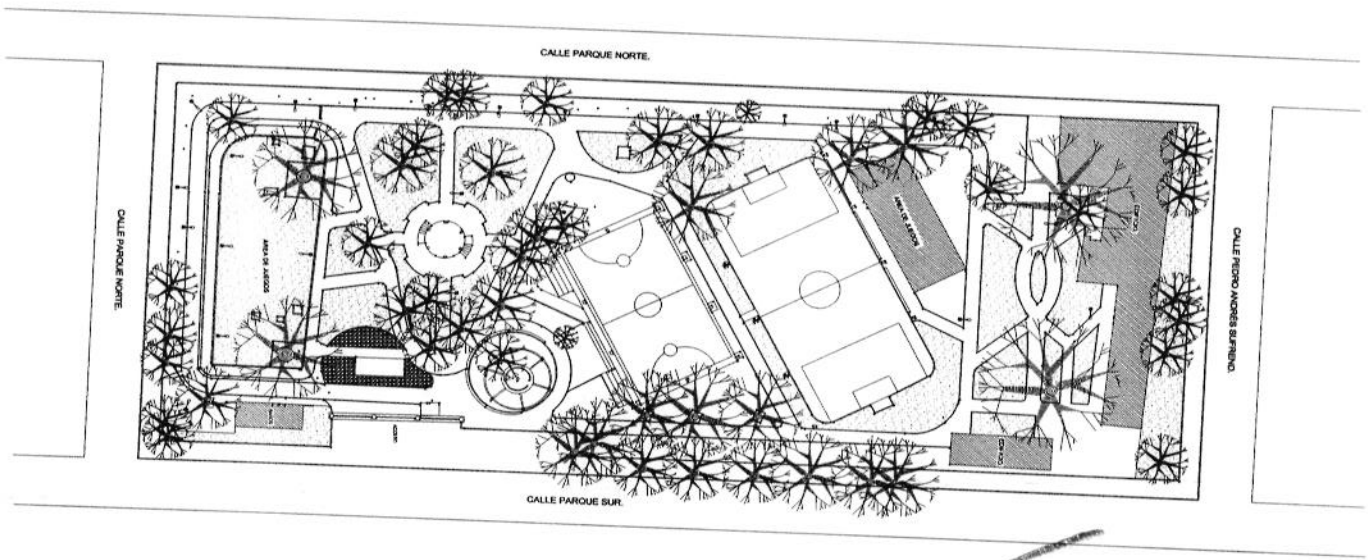

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
DESJINF	DESMONTAJE DE JUEGOS INFANITILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				PZA				6.00	6.00	
										6.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

DESJINF DESMONTAJE DE JUEGOS INFANITILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

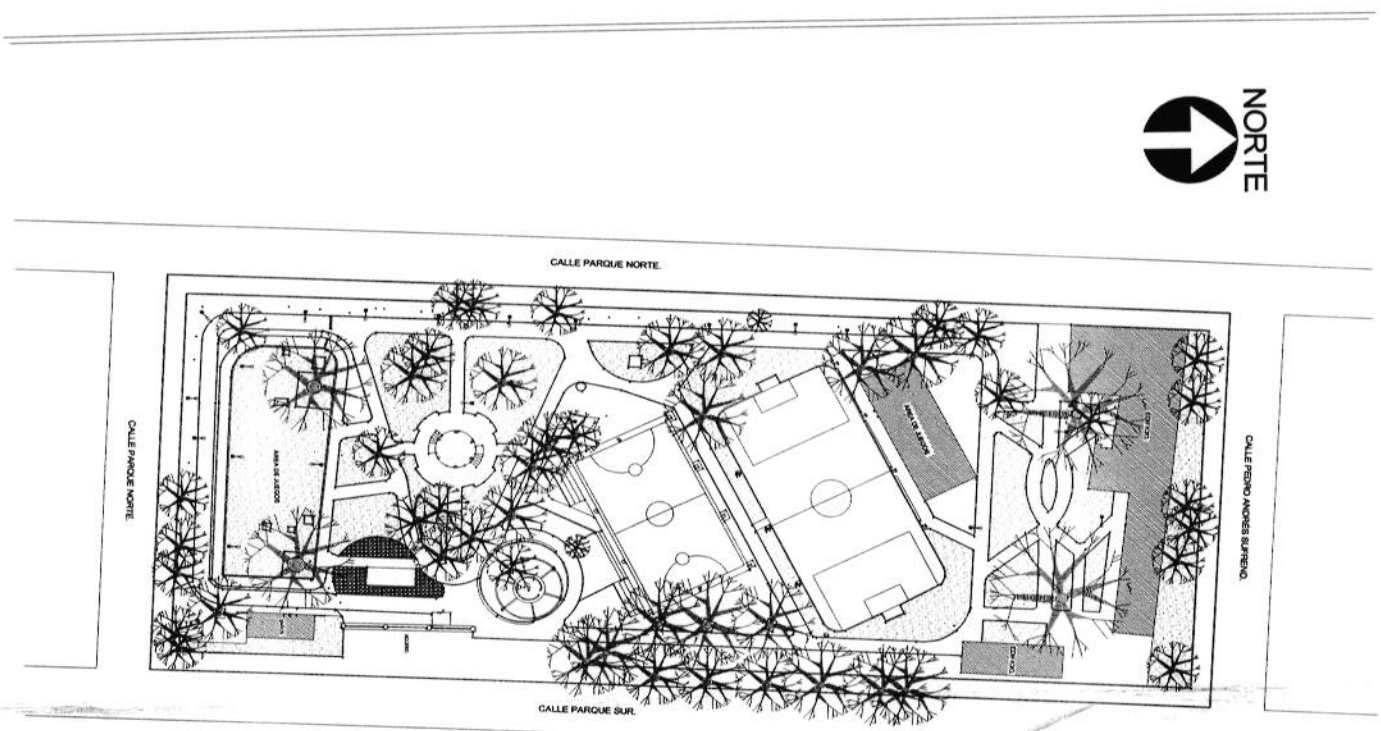

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A02	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA**										
SUM-T1/2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				ML	10.00			1.00	10.00	
										10.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

SUM-T1/2 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

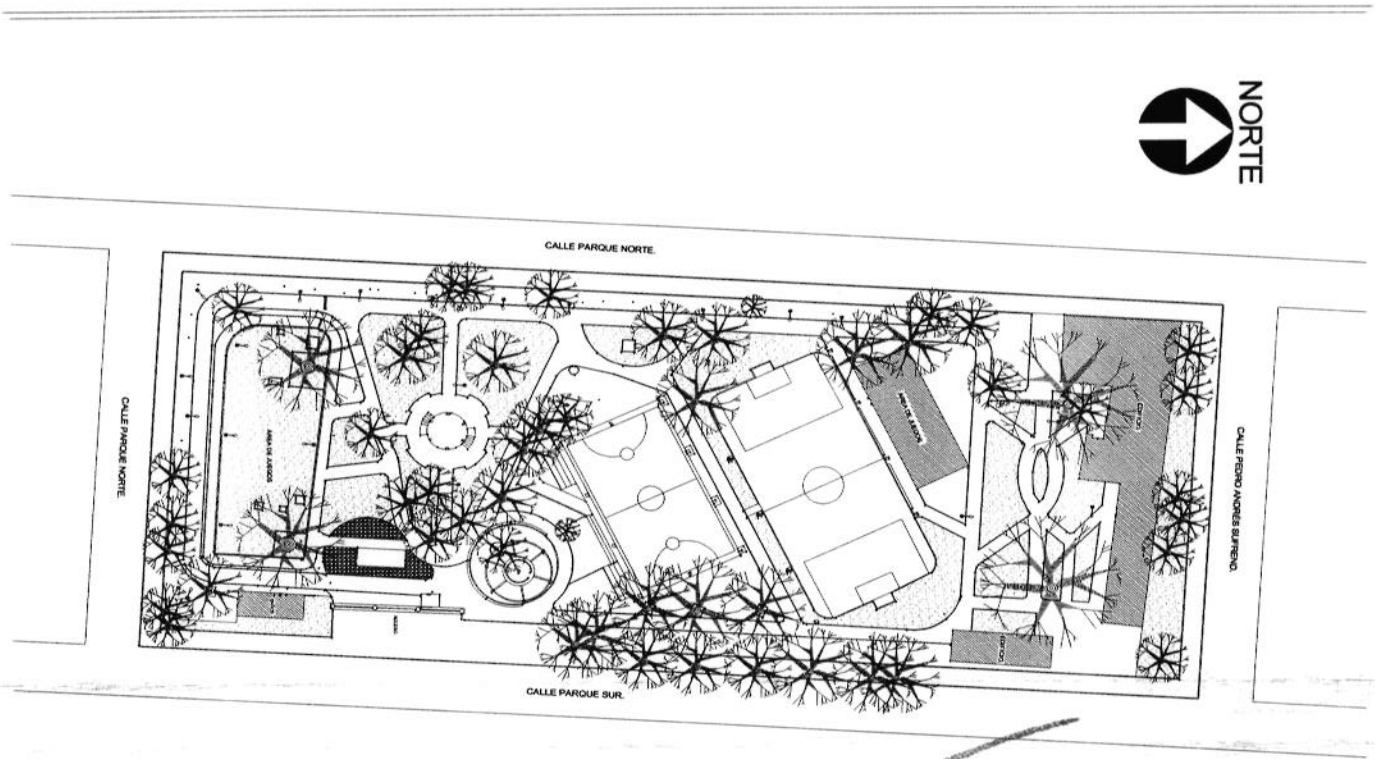

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
SUM-T3/4	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				ML	15.00			1.00	15.00	
										15.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

SUM-T3/4 SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

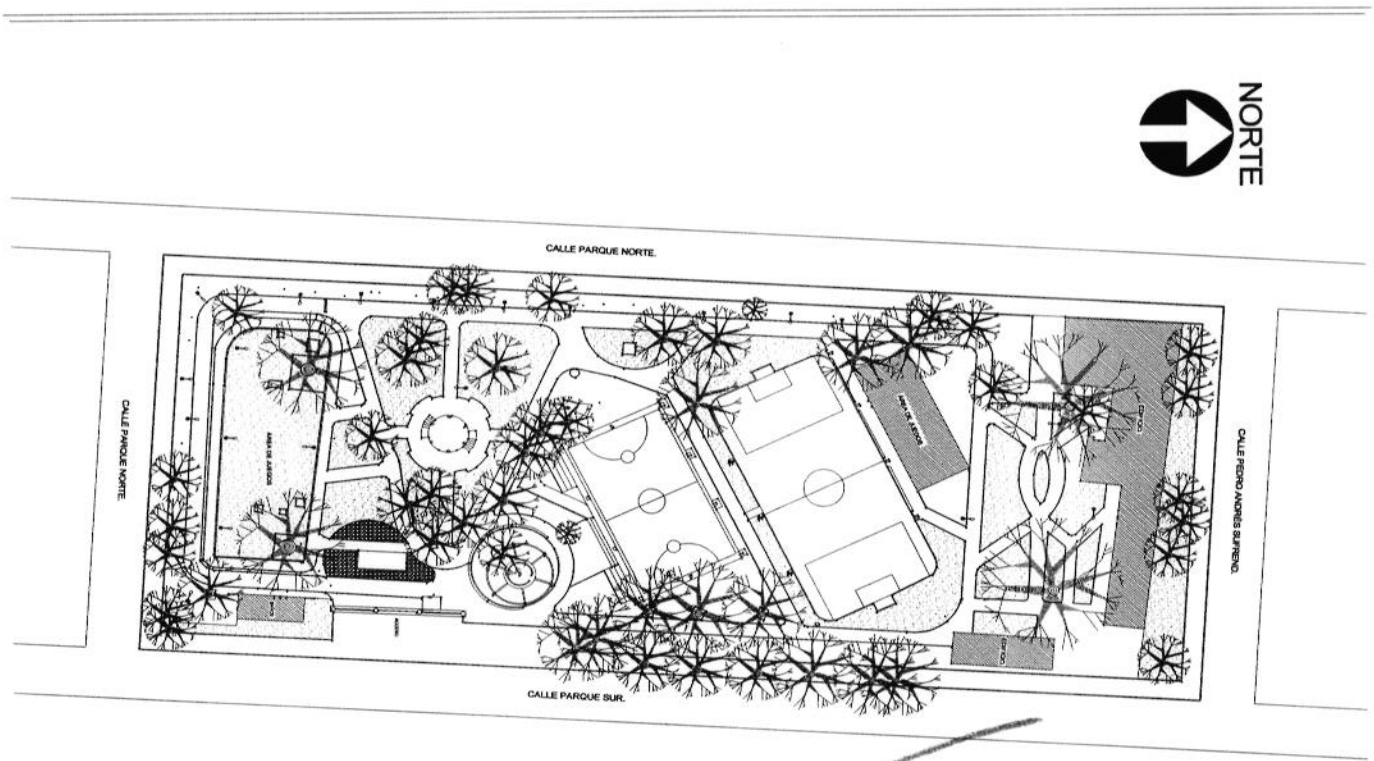

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
25-0382	INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.				PZA				10.00	10.00	
										10.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

25-0382 INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.

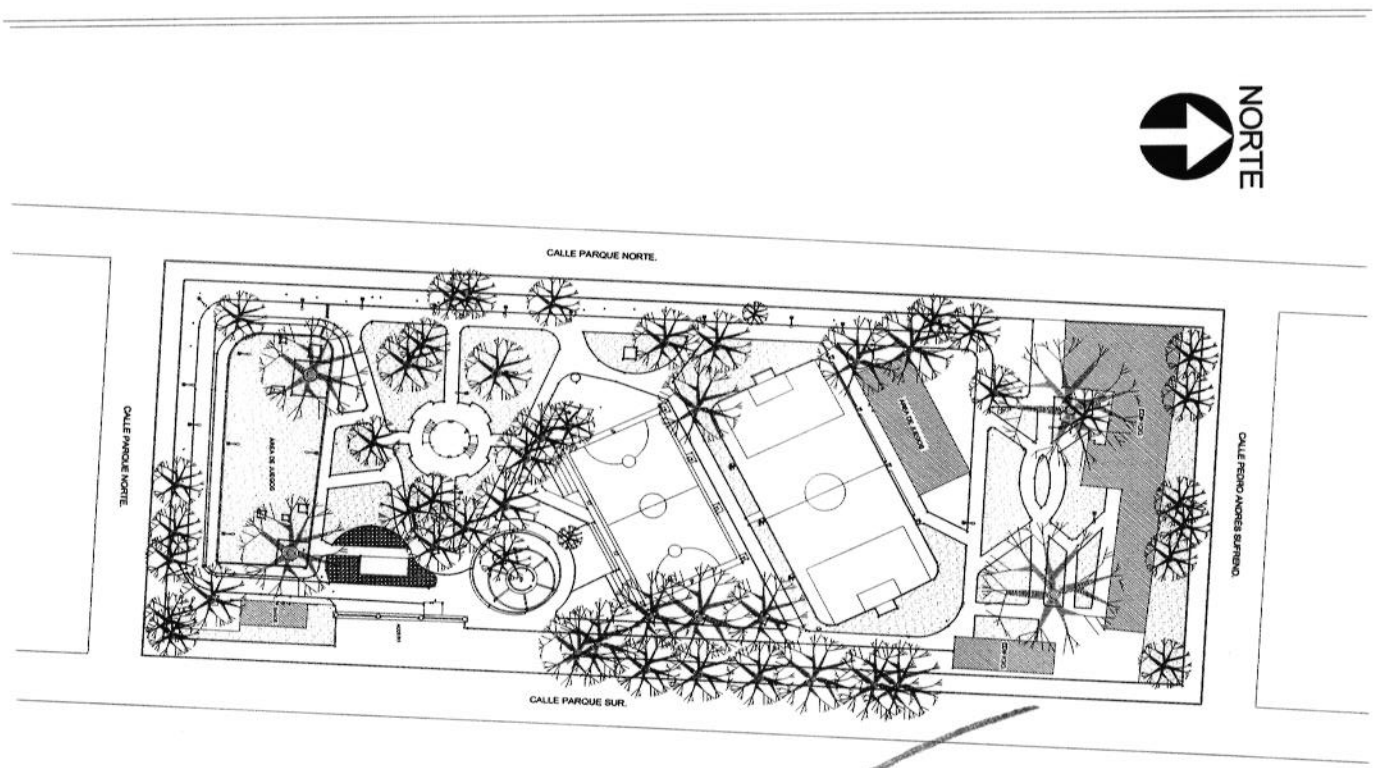

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
25-0381	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.				PZA				2.00	2.00	
										2.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

25-0381 LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

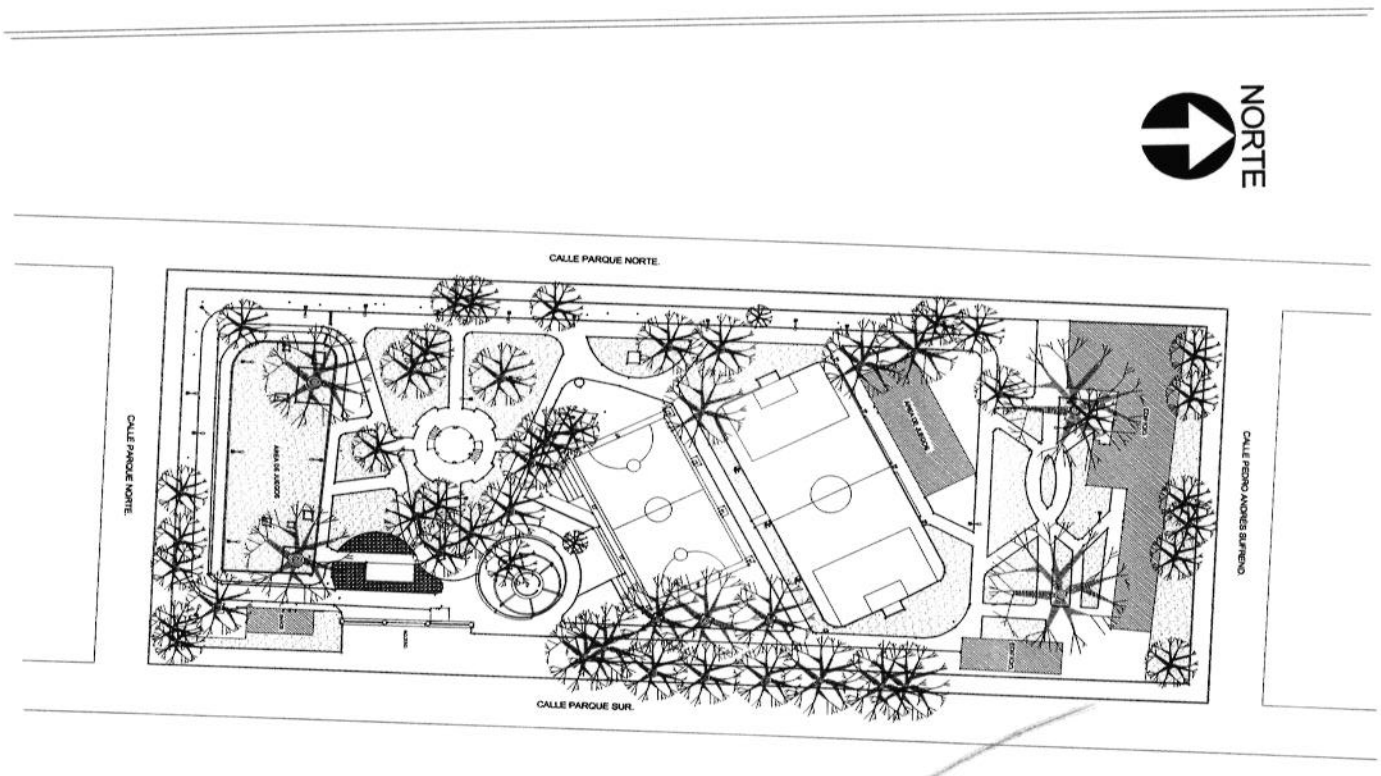

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
37-0622	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO URREA MODELO CAIRO, INCLUYE: LLAVE DE PASO PARA MINGITORIO, URREA 17MG, ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.				PZA				2.00	2.00	
										2.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

37-0622 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO URREA MODELO CAIRO, INCLUYE: LLAVE DE PASO PARA MINGITORIO, URREA 17MG, ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

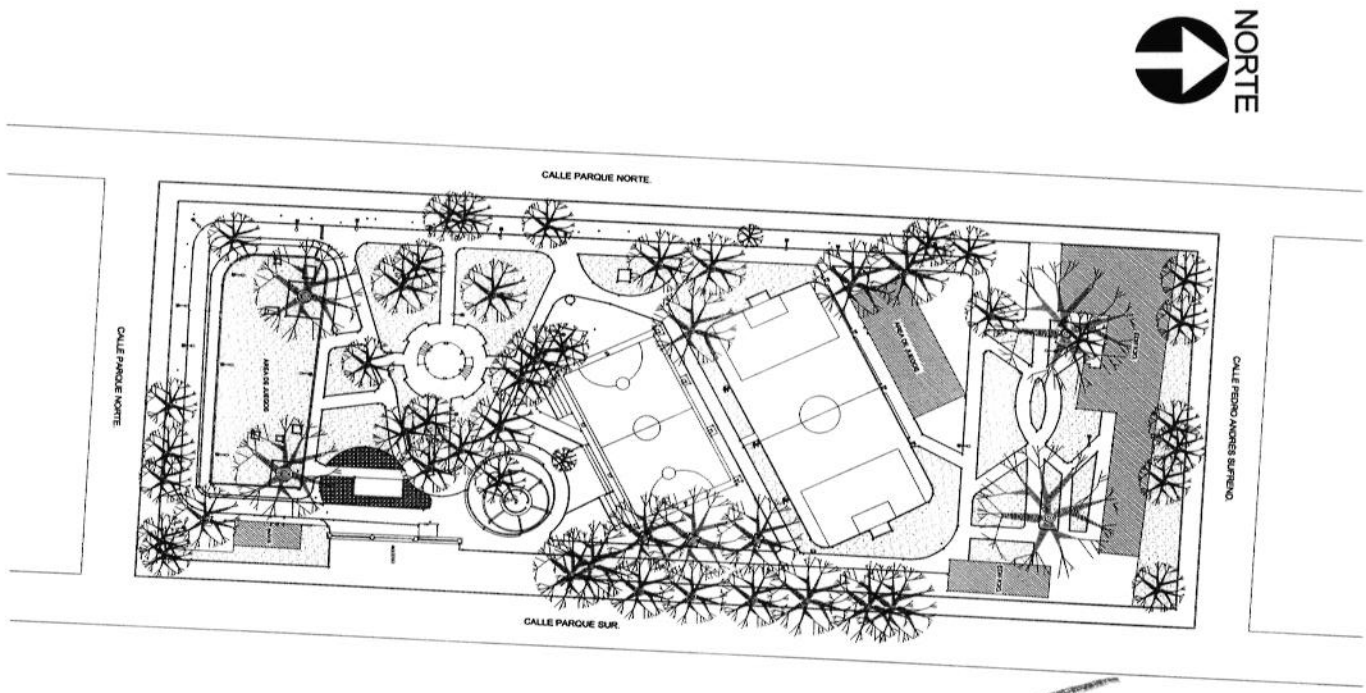

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
SYC-T1100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.				PZA				1.00	1.00	
										1.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s

HOJA: 24 DE: 56

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

SYC-T1100 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.

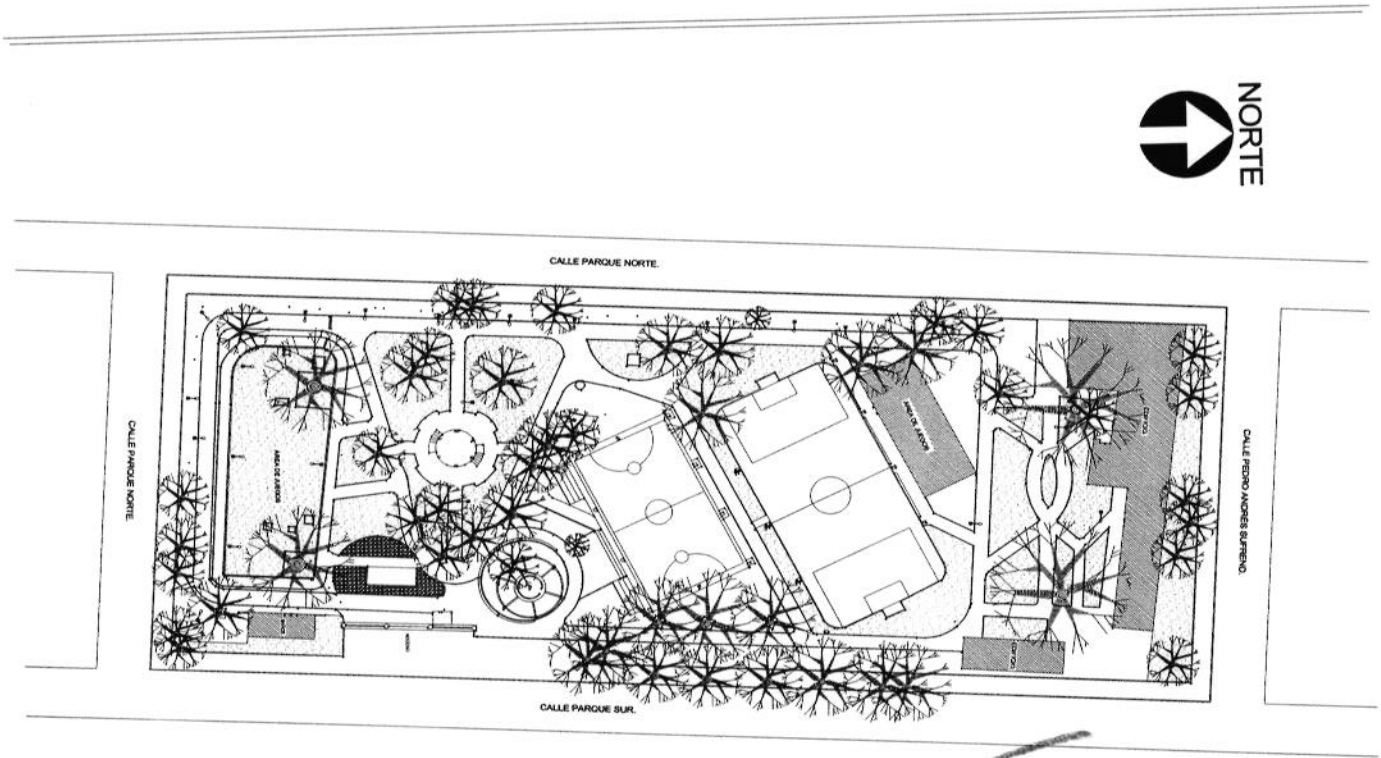

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A03	**ALUMBRADO**										
40X20X50	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				PZA				8.00	8.00	
										8.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

40X20X50 BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

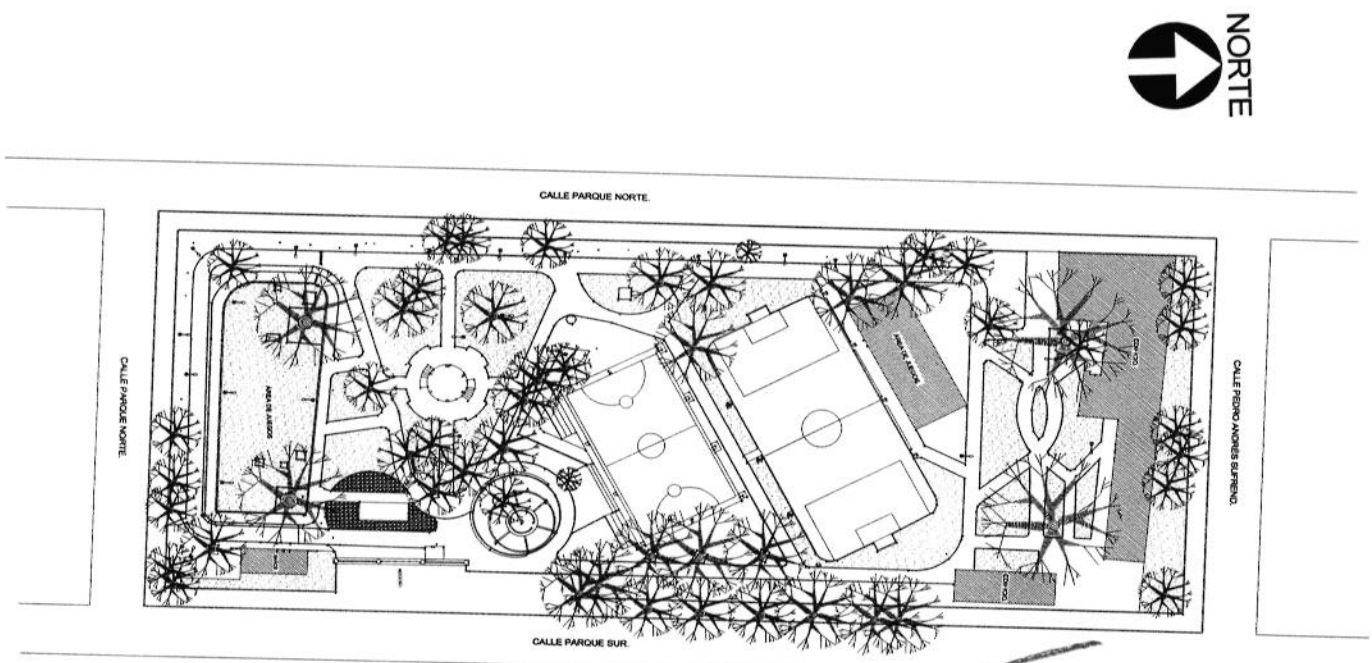

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
LAM80W	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.				PZA				8.00	8.00	
										8.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PÚBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

LAM80W SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.

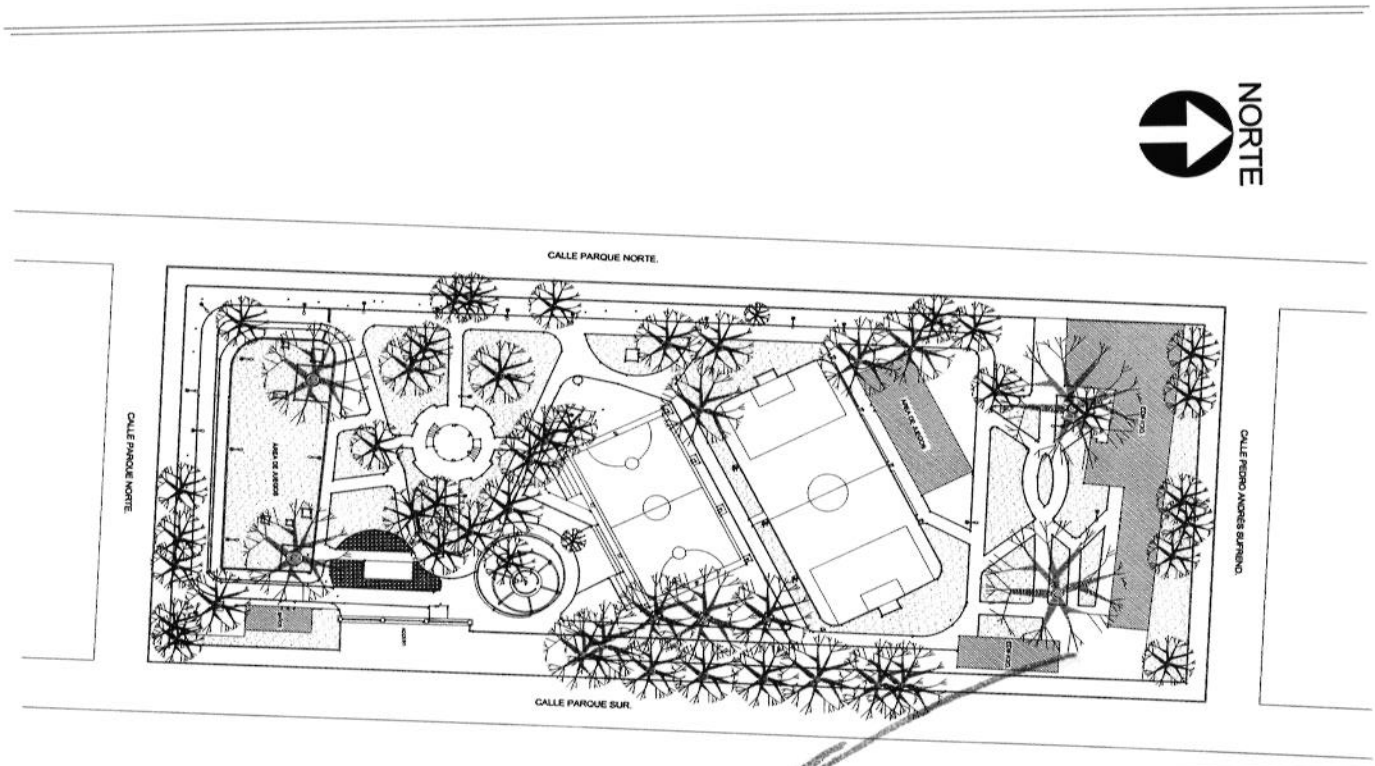

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A04	**HERRERIA**										
POR-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				ML	6.00			1.00	6.00	
										6.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

POR-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

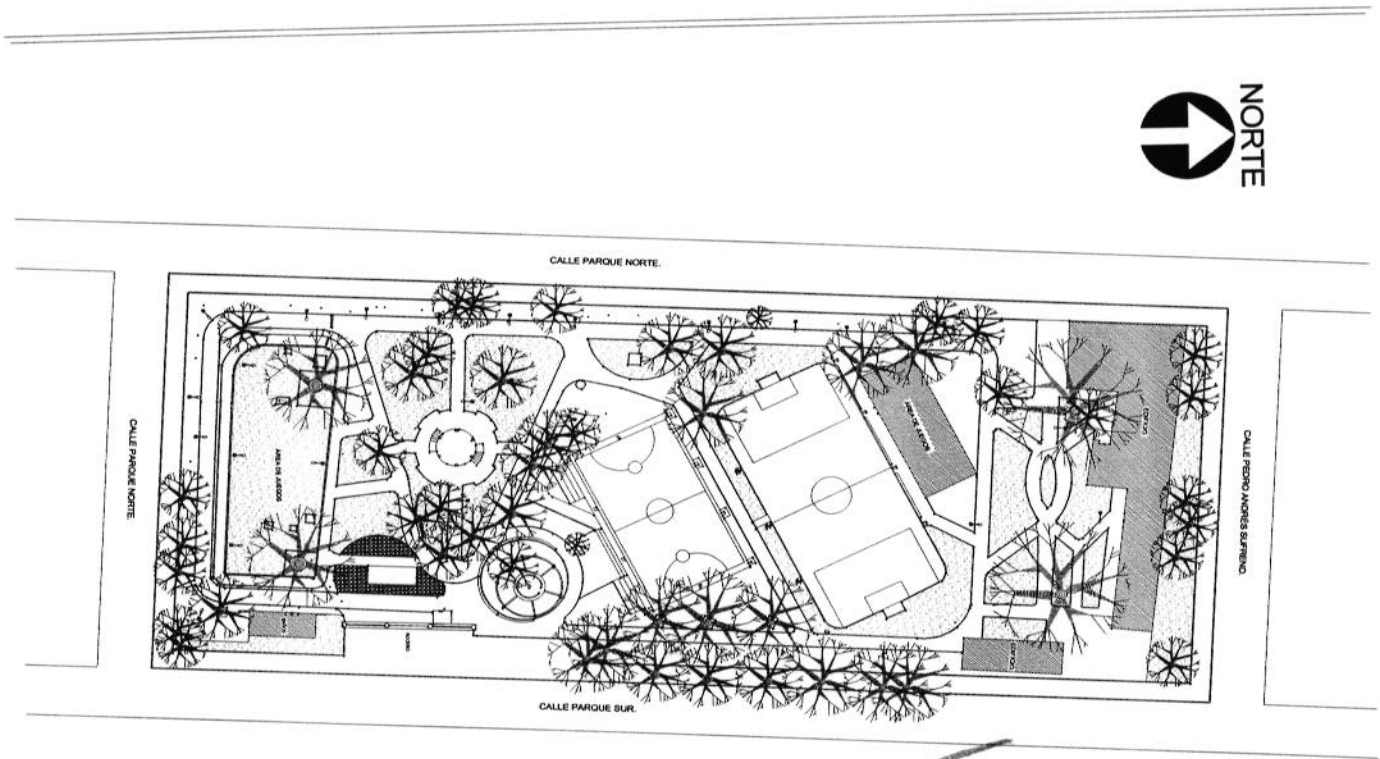

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
MAL-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.				M2	102.71	1.00		1.00	102.71	
										102.71	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

MAL-01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.

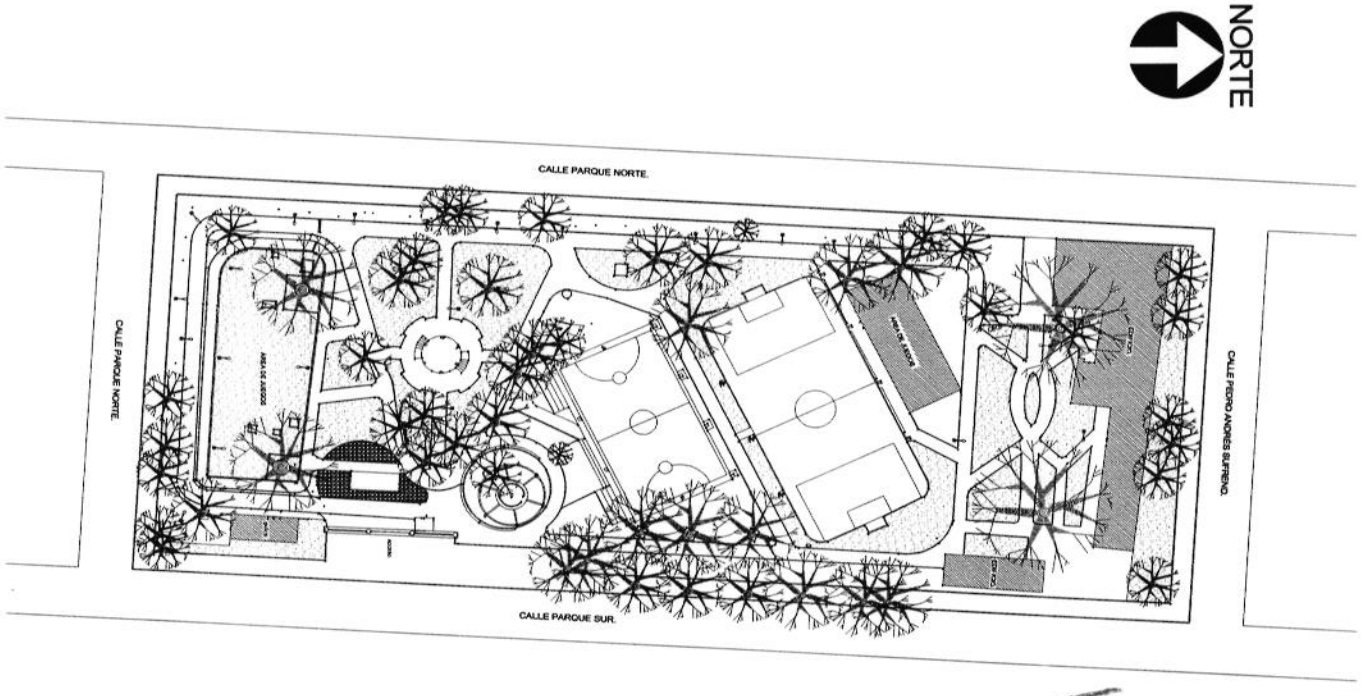

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023
Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
PTAHERR	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .				M2	1.00	1.00		1.00	1.80	
										1.80	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

PTAHERR PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION

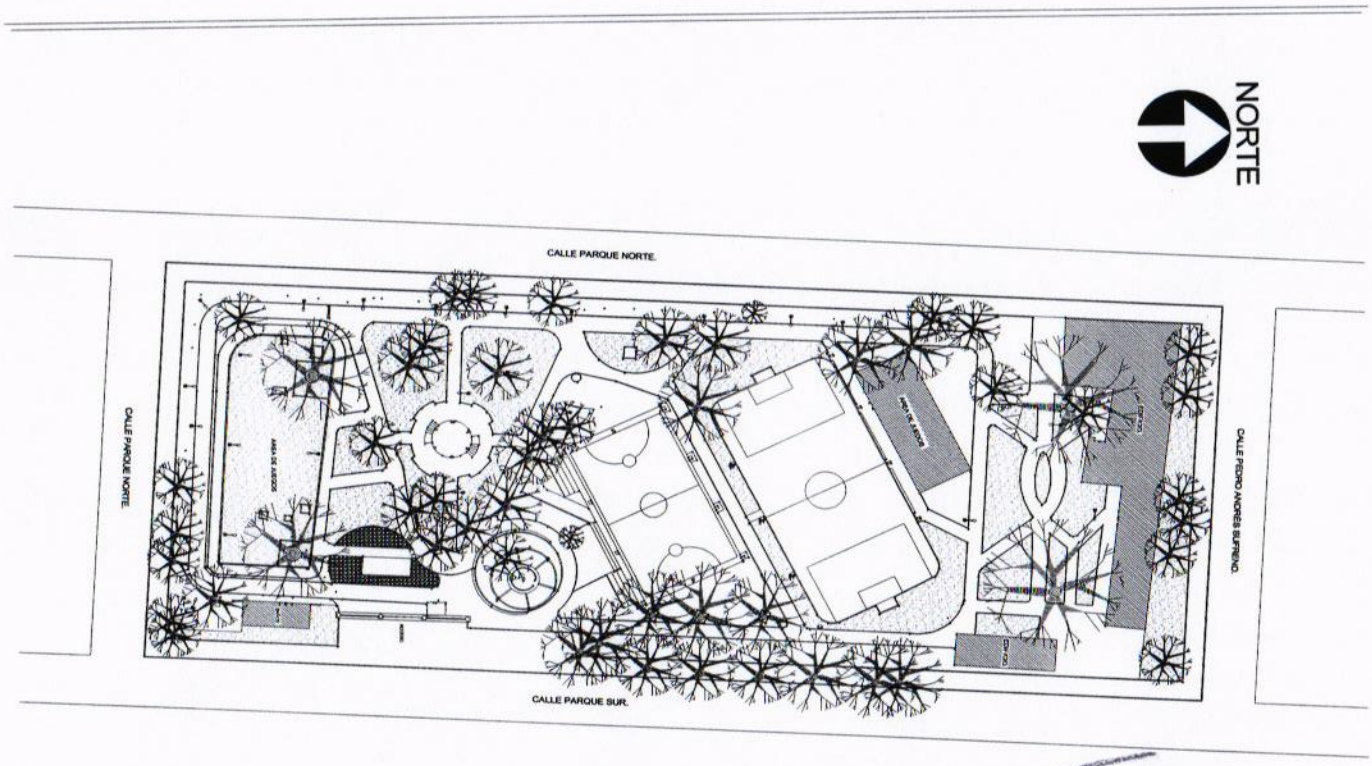

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
MOD-I01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.				PZA				1.00	1.00	
										1.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

MOD-I01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.

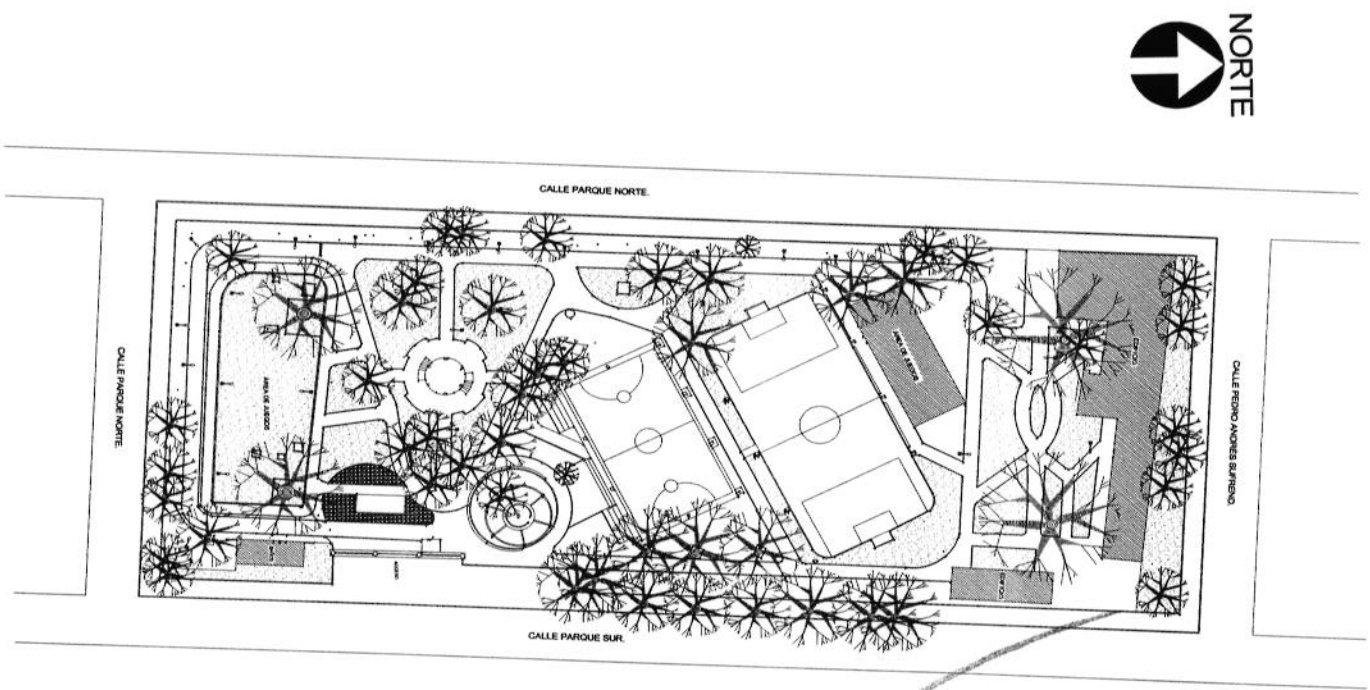

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A07	**ACABADOS**										
22-0327	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.				M2		505.36	1.00	1.00	505.36	
										505.36	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

22-0327 PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.

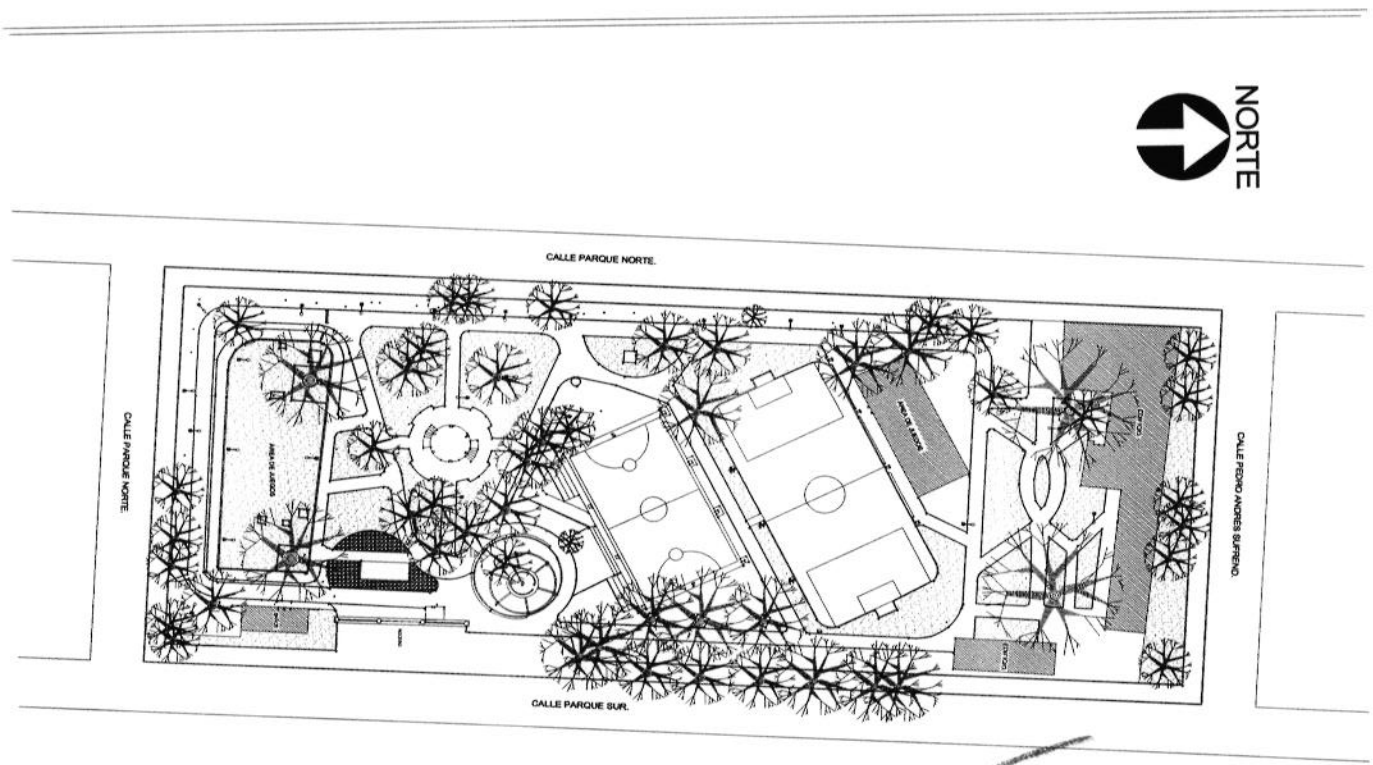

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
22-0335	PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.				M2	25.00		1.00	1.00	25.00	
										25.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

22-0335 PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.

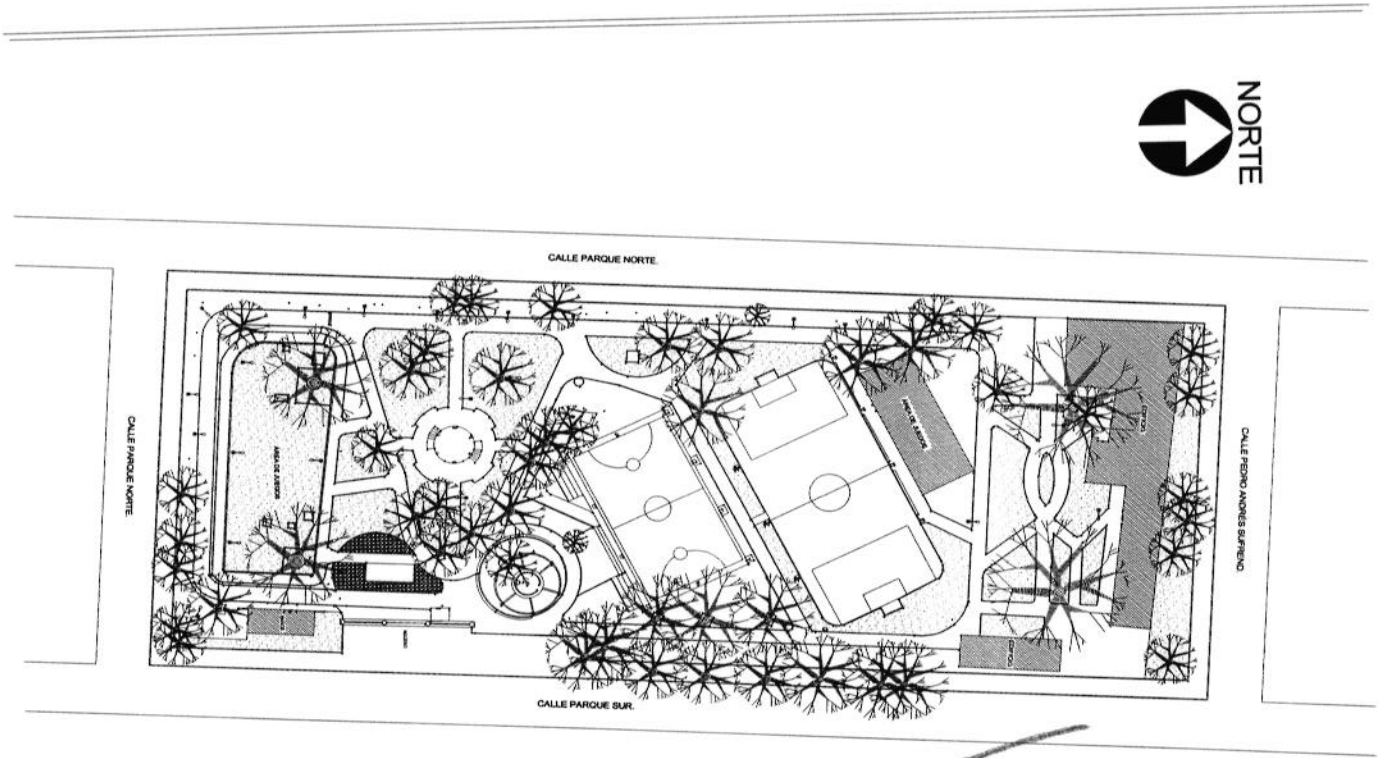

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
PINT-04	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.				ML	780.00			1.00	780.00	
										780.00	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

PINT-04 PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

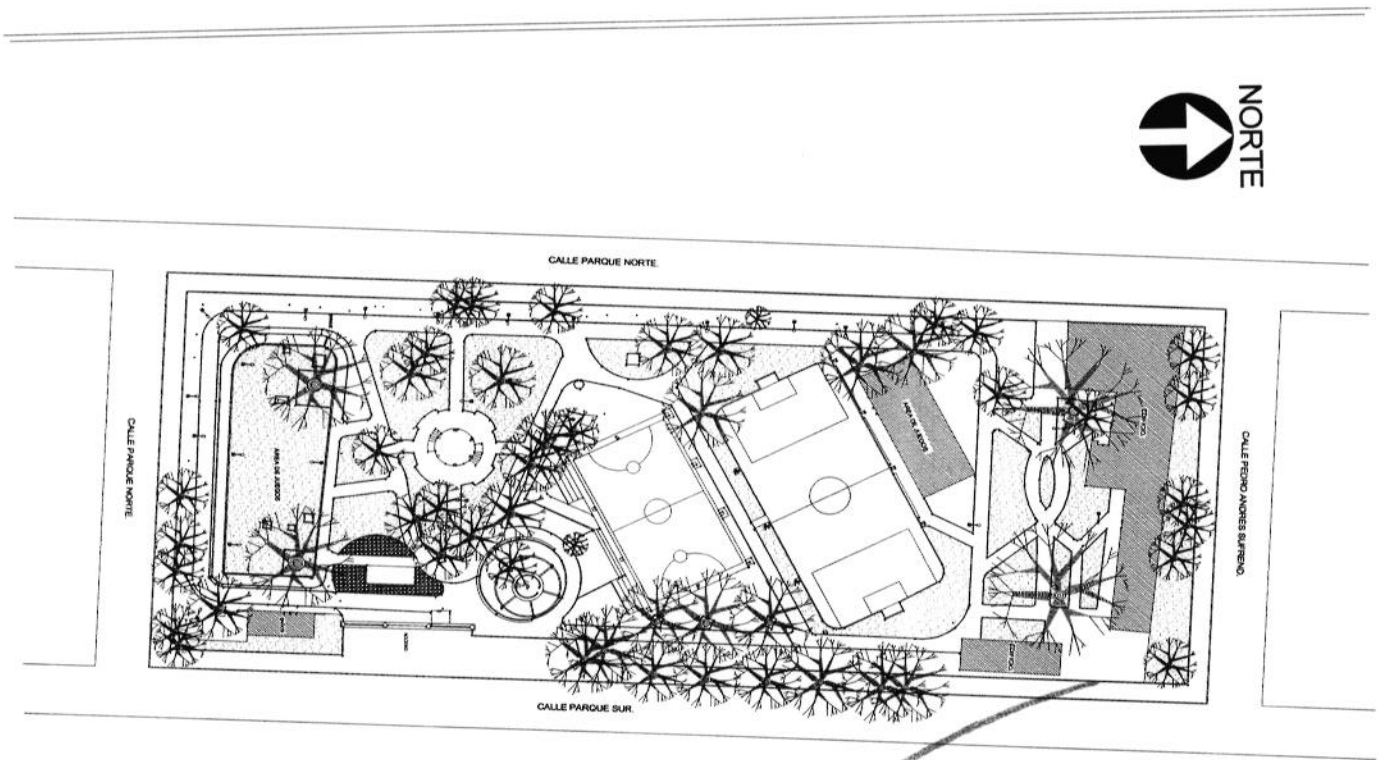

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
PIN-CAN	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				M2	241.96	1.000		1.00	241.96	
										241.96	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

PIN-CAN PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

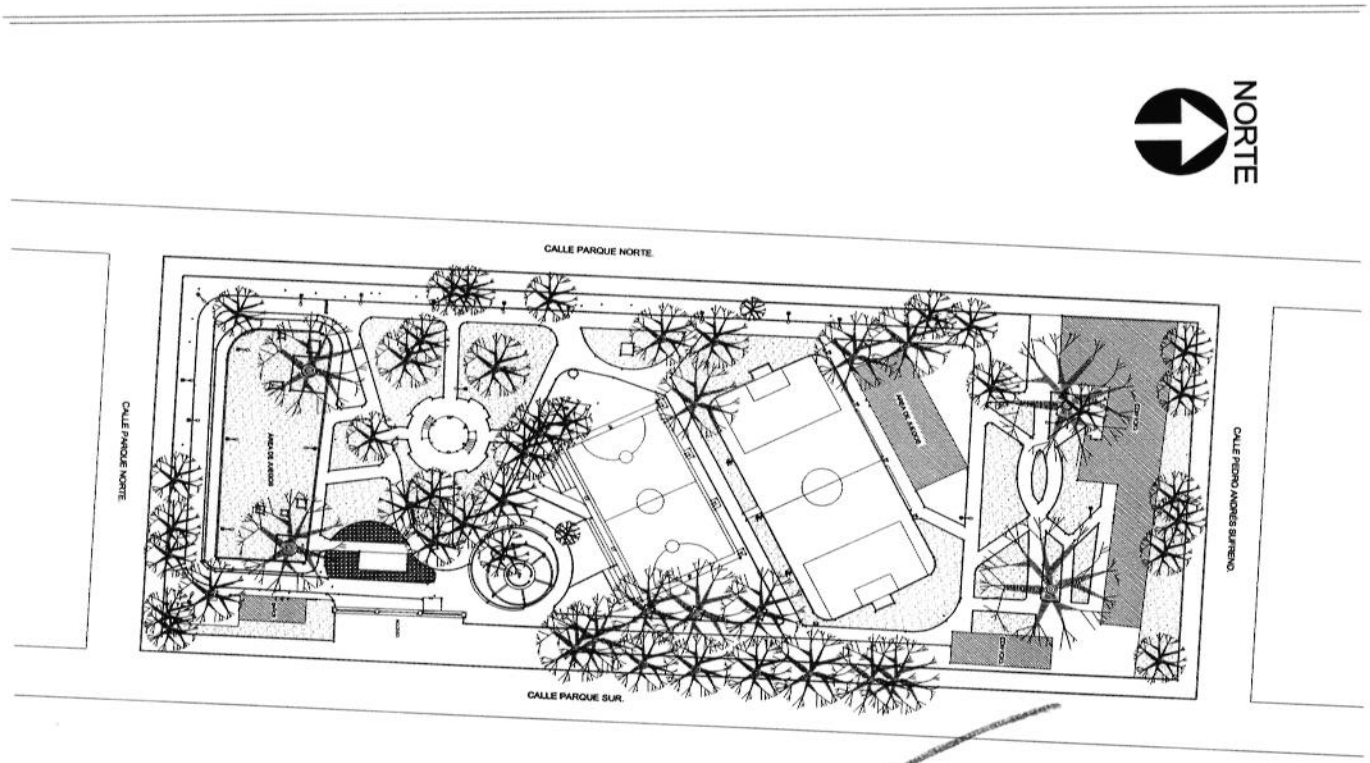

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
PINT-01	PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.				ML	142.48			1.00	142.48	
										142.48	**ML**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

PINT-01 PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.

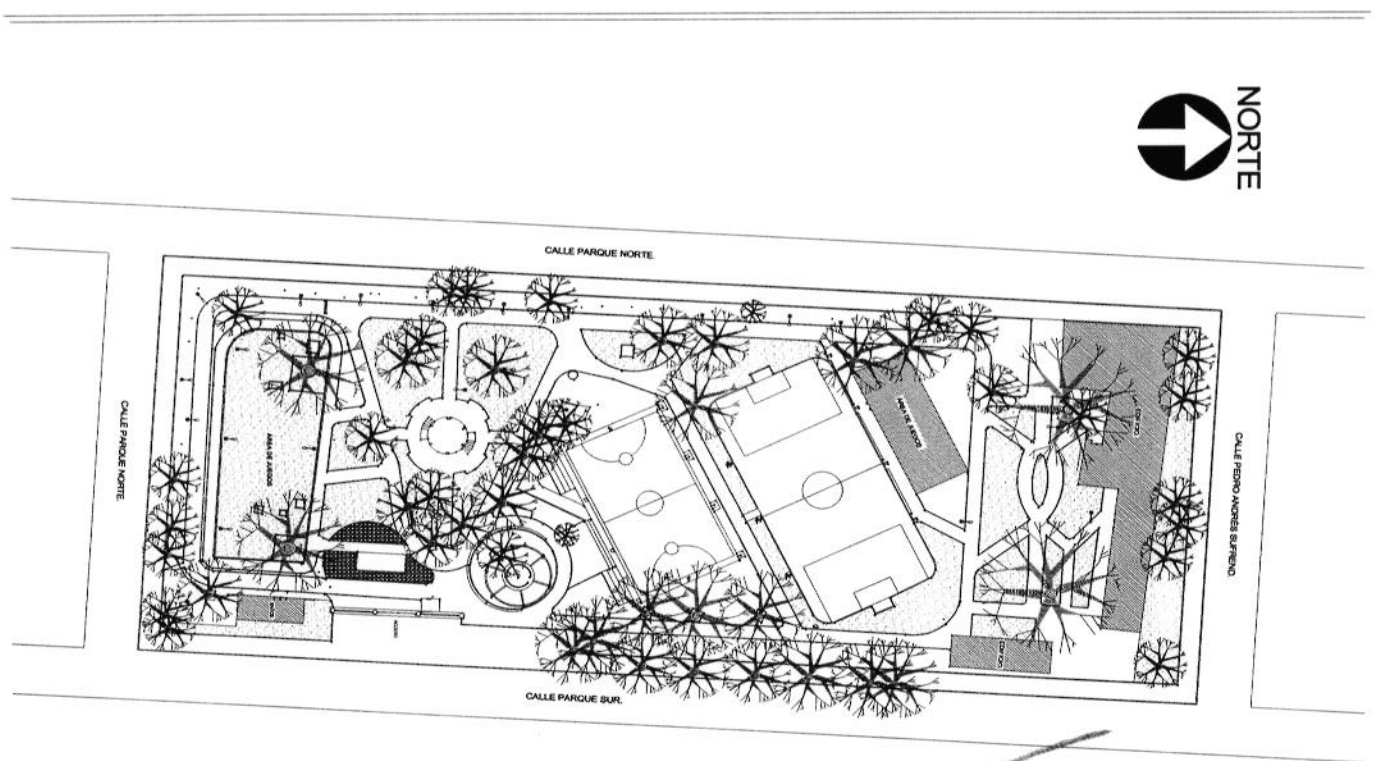

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,

DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A08	**JARDINERIA**										
34-0546	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..				M3	56.00	1.00	1.00	1.00	56.00	
										56.00	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

34-0546 MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..

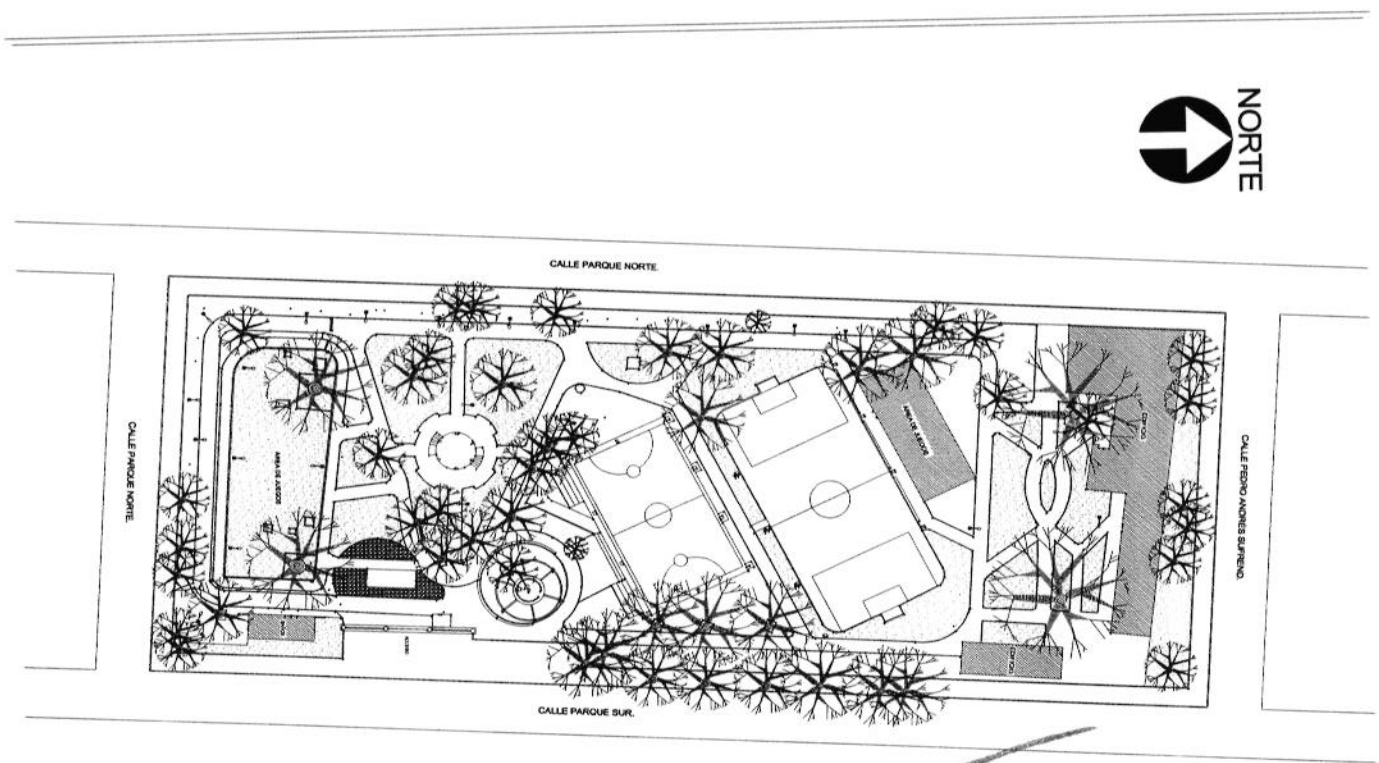

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
34-0547	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.				M2	280.00	1.00		1.00	280.00	
										280.00	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

34-0547 PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

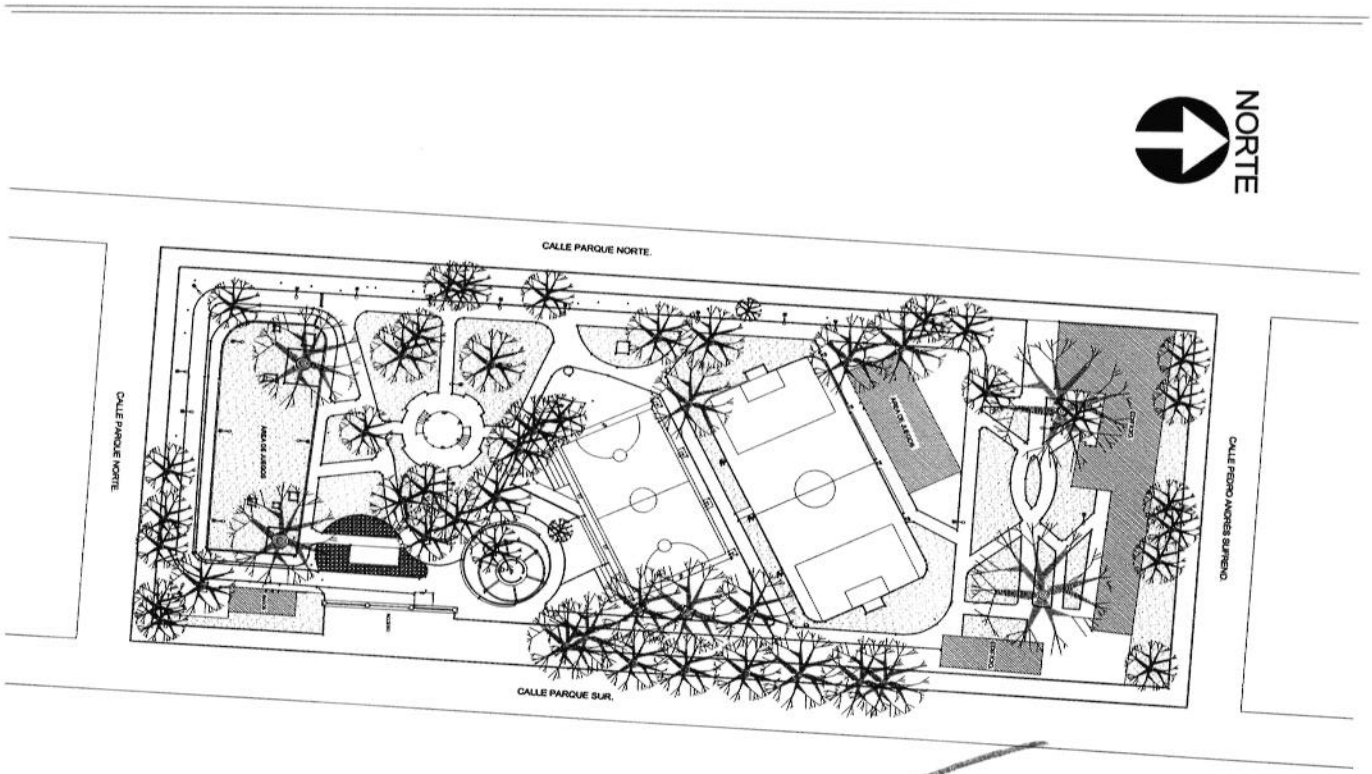

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
34-0549	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.				PZA				140.00	140.00	
										140.00	**PZA**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

34-0549 PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.

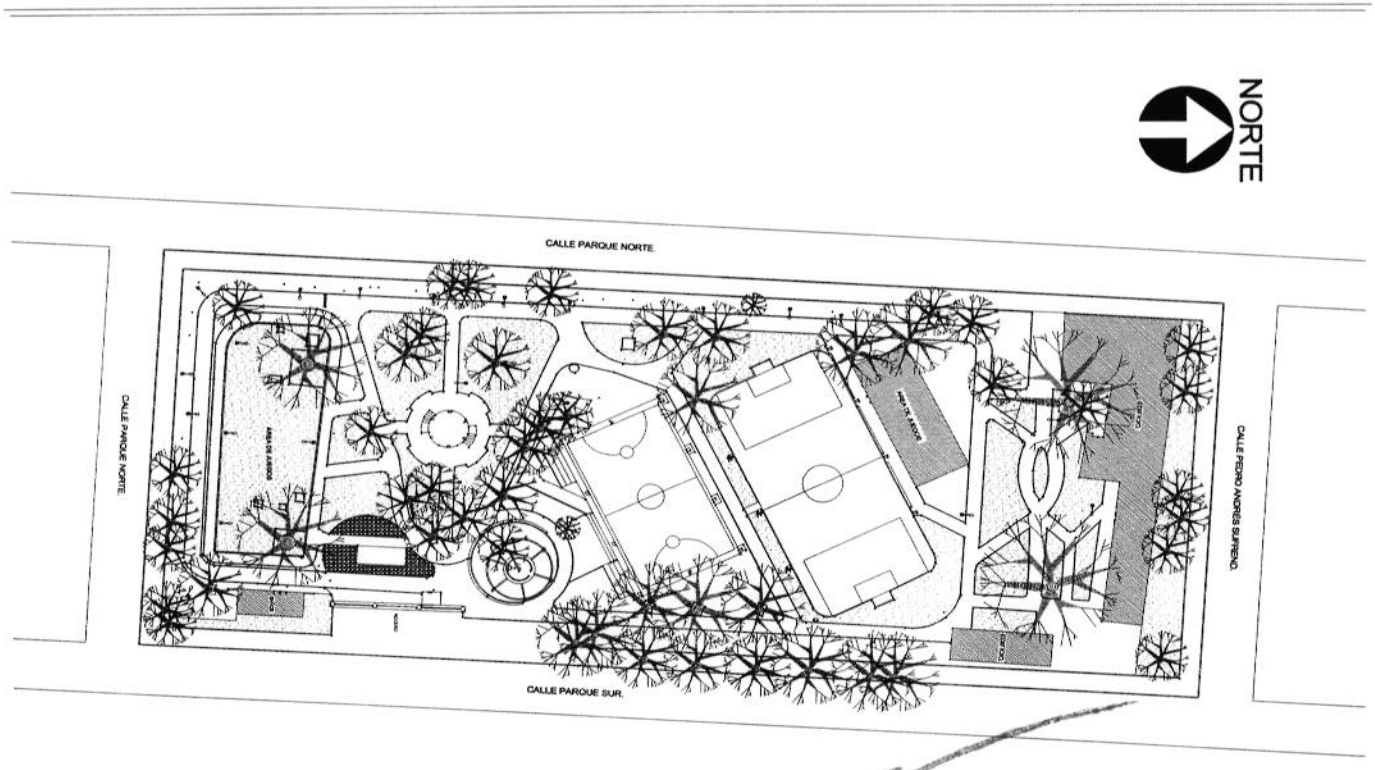

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
A09	**ACARREOS Y LIMPIEZA**										
33-0521	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)				M3	26.11	1.00	1.00	1.00	26.11	
										26.11	**M3**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023


C r o q u i s

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

33-0521 CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)

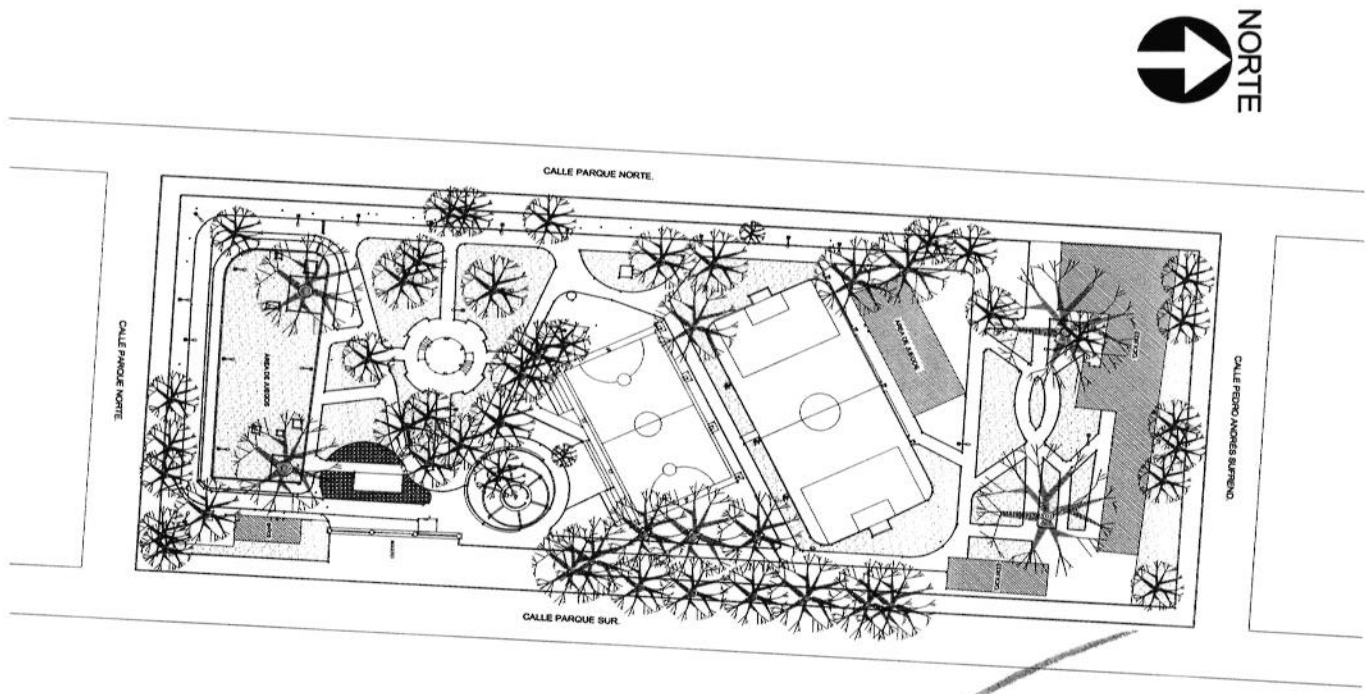

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023
Números Generadores

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	UNIDAD	LARGO	ANCHO / Ø	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD PRESUPUESTADA	CROQUIS
33-0528	LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.				M2	117.33	1.00		1.00	117.33	
										117.33	**M2**

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS,
DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** (FAISMUN) 2023

C r o q u i s

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
MUNICIPIO: O1 - ACAPULCO
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

33-0528 LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.

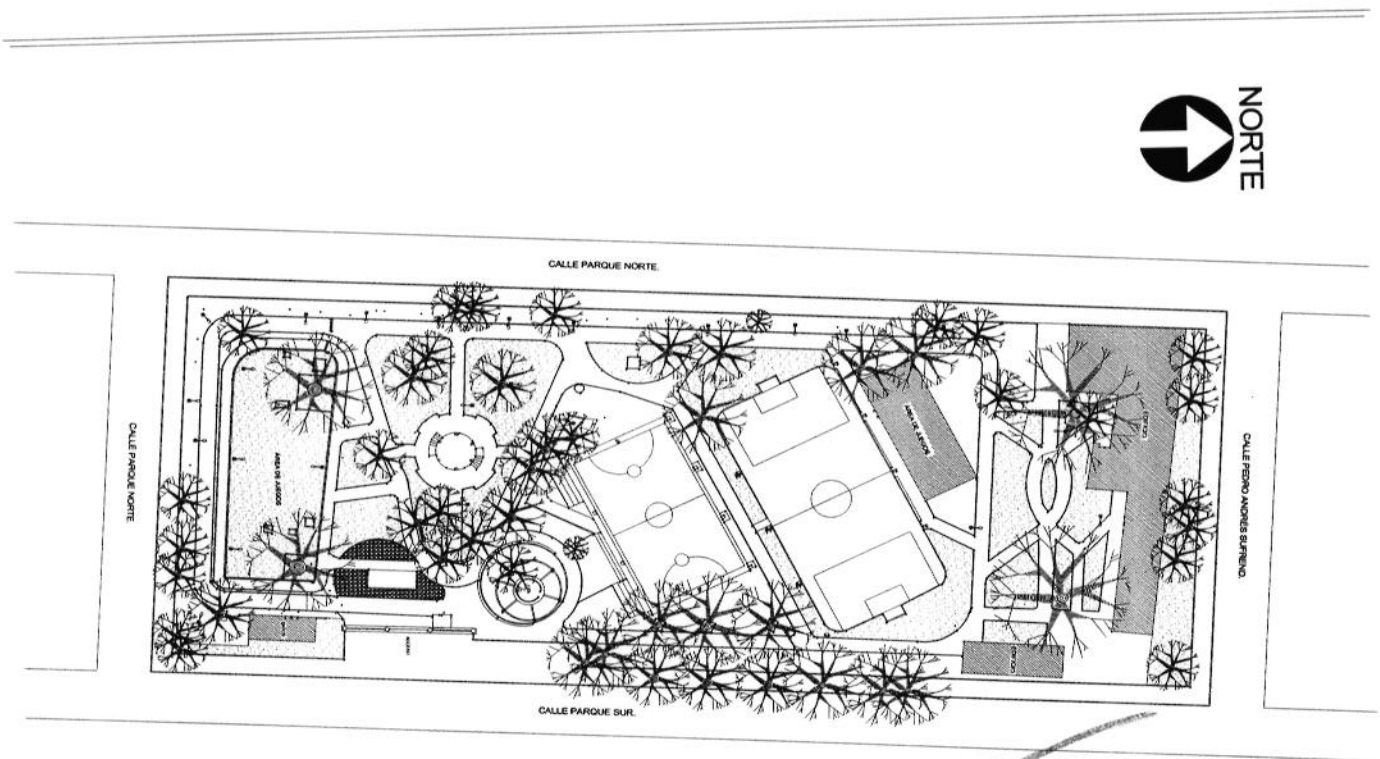

JEFE DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA

ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: PR-SUP **Unidad: M2**					
	PREPARACION DE SUPERFICIE EN MUROS Y PLAFONES PINTADOS CON PINTURA VINILICA Y/O ESMALTE ,PARA APLICACION DE NUEVA PINTURA INCLUYE: DESCARAPELADO CON ESPATULA Y CEPILLO DE ALAMBRE.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.026014	$30.04	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$30.04**	100.00%
	Costo directo				**$30.04**	
	INDIRECTOS	15%			$4.51	
	SUBTOTAL				$34.55	
	FINANCIAMIENTO	0%			$34.55	
	SUBTOTAL				$3.46	
	UTILIDAD	10%			**$38.01**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* TREINTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: DESH* **Unidad: M2**						
	DESHIERBE DE TERRENO A MANO INCLUYE:RETIRO Y QUEMA DEL MISMO.						
MANO DE OBRA							
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	/	50.000000	$9.14	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$9.14**	100.00%
	Costo directo					**$9.14**	
	INDIRECTOS	15%				$1.37	
	SUBTOTAL					$10.51	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$10.51	
	UTILIDAD	10%				$1.05	
	PRECIO UNITARIO					**$11.56**	
	(* ONCE PESOS 56/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%
	Análisis: 34-0551 **Unidad: PZA**						
	PODADO DE ARBOLES DE 1.50 A 4.00 MTS. DE ALTURA INCLUYE: ACARREO DE BASURA FUERA DE OBRA A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION						
MANO DE OBRA							
	CUADRILLA No 13 (1 OF. JARDINERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	/	3.000000	$402.68	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA					**$402.68**	100.00%
	Costo directo					**$402.68**	
	INDIRECTOS	15%				$60.40	
	SUBTOTAL					$463.08	
	FINANCIAMIENTO	0%					
	SUBTOTAL					$463.08	
	UTILIDAD	10%				$46.31	
	PRECIO UNITARIO					**$509.39**	
	(* QUINIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N. *)						

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 2-0065 **Unidad: M2**
DESMANTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO A 1a. ESTACION DEL MATERIAL PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO.

MANO DE OBRA

CUADRILLA No 21 (2 PEONES)	JOR	$913.83	0.025000	$22.85	100.00%
Subtotal: MANO DE OBRA				**$22.85**	100.00%
Costo directo				**$22.85**	
INDIRECTOS	15%			$3.43	
SUBTOTAL				$26.28	
FINANCIAMIENTO	0%				
SUBTOTAL				$26.28	
UTILIDAD	10%			$2.63	
PRECIO UNITARIO				**$28.91**	

(* VEINTIOCHO PESOS 91/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: 2-0070 **Unidad: PZA**
DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, INCLUYE: MANO DE OBRA Y RETIRO DE LOS MUEBLES A DONDE INDIQUE LA SUPERVISION.

MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.168160	$203.14	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$203.14**	100.00%
	Costo directo				**$203.14**	
	INDIRECTOS	15%			$30.47	
	SUBTOTAL				$233.61	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$233.61	
	UTILIDAD	10%			$23.36	
	PRECIO UNITARIO				**$256.97**	

(* DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 97/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: DESJINF **Unidad: PZA**
DESMONTAJE DE JUEGOS INFANITILES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	100.00%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	100.00%
	Costo directo				**$302.01**	
	INDIRECTOS	15%			$45.30	
	SUBTOTAL				$347.31	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$347.31	
	UTILIDAD	10%			$34.73	
	PRECIO UNITARIO				**$382.04**	

(* TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-T1/2 Unidad: ML					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 1/2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE,					
	INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
MATERIALES						
	TUBO DE CPVC DE 13 MM DE DIAM	ML	$16.49	1.100000	$18.14	27.12%
	Subtotal: MATERIALES				**$18.14**	27.12%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.040366	$48.76	72.88%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$48.76**	72.88%
	Costo directo				**$66.90**	
	INDIRECTOS	15%			$10.04	
	SUBTOTAL				$76.94	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$76.94	
	UTILIDAD	10%			$7.69	
	PRECIO UNITARIO				**$84.63**	
	(* OCHENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SUM-T3/4 **Unidad: ML**					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA DE CPVC DE 3/4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE AGUA POTABLE,					
	INCLUYE: SUMINISTRO, PRUEBAS Y MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.					
MATERIALES						
	TUBO DE CPVC DE 19 MM DE DIAM	ML	$24.10	1.100000	$26.51	27.29%
	Subtotal: MATERIALES				**$26.51**	27.29%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.058462	$70.62	72.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$70.62**	72.71%
	Costo directo				**$97.13**	
	INDIRECTOS	15%			$14.57	
	SUBTOTAL				$111.70	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$111.70	
	UTILIDAD	10%			$11.17	
	PRECIO UNITARIO				**$122.87**	
	(* CIENTO VEINTIDOS PESOS 87/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 25-0382 **Unidad: PZA** INODORO ACAPULCO MOD. ZAFIRO BLANCO IDEAL ST. INCL. MATERIALES NECESARIOS PARA SU COLOCACION, PRUEBAS Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	PIJAS/TAQUETE PLOMO	PZA	$4.34	2.000000	$8.68	0.29%
	HERRAJES DE BRONCE PARA W.C. TANQUE BAJO.	JGO	$180.00	1.000000	$180.00	6.05%
	INODORO ZAFIRO	PZA	$2,460.00	1.000000	$2,460.00	82.71%
	JUNTA PROHEL	PZA	$23.55	1.000000	$23.55	0.79%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,672.23**	89.85%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	10.15%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	10.15%
					$2,974.24	
	Costo directo				$446.14	
	INDIRECTOS	15%			$3,420.38	
	SUBTOTAL				$3,420.38	
	FINANCIAMIENTO	0%			$342.04	
	SUBTOTAL				**$3,762.42**	
	UTILIDAD	10%				
	PRECIO UNITARIO					
	(* TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 25-0381 **Unidad: PZA**					
	LAVABO VERACRUZ BLANCO IDEAL ST. INCL: LLAVE . MEZCLADORA, TAPON, TAPA BARRENOS, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	LAVABO VERACRUZ	PZA	$545.93	1.000000	$545.93	39.58%
	LLAVE MEZCLADORA URREA	PZA	$315.00	1.000000	$315.00	22.84%
	CESPOL DE PLOMO PARA VERTEDERO	PZA	$200.69	1.000000	$200.69	14.55%
	CODO D/COBRE DE 1/2"	PZA	$7.80	2.000000	$15.60	1.13%
	Subtotal: MATERIALES				**$1,077.22**	78.10%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	21.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	21.90%
	Costo directo				**$1,379.23**	
	INDIRECTOS	15%			$206.88	
	SUBTOTAL				$1,586.11	
	FINANCIAMIENTO	0%			$1,586.11	
	SUBTOTAL				$158.61	
	UTILIDAD	10%			**$1,744.72**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 37-0622 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA , ACARREOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	SOLDADURA DE 50 X 50 PARA COBRE	PZA	$156.00	0.300000	$46.80	0.59%
	TUBO D/COBRE 19MM TIPO M	ML	$164.62	0.500000	$82.31	1.03%
	LLAVE DE MINGUITORIO CROMADA	PZA	$2,600.00	1.000000	$2,600.00	32.59%
	MINGITORIO NIAGARA	PZA	$4,928.00	1.000000	$4,928.00	61.77%
	CODO D/COBRE 3/4X90	PZA	$18.23	1.000000	$18.23	0.23%
	Subtotal: MATERIALES				**$7,675.34**	96.21%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	3.79%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	3.79%
					$7,977.35	
	Costo directo				$1,196.60	
	INDIRECTOS	15%			$9,173.95	
	SUBTOTAL					
	FINANCIAMIENTO	0%			$9,173.95	
	SUBTOTAL				$917.40	
	UTILIDAD	10%			**$10,091.35**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* DIEZ MIL NOVENTA Y UN PESOS 35/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: SYC-T1100 **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO DE PLASTICO CAP. 1,100 LTS. CON TAPA, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIONES, Y MANO DE OBRA.					
MATERIALES						
	TINACO VERTICAL CON PATAS DE 1100 LTOS.	PZA	$3,139.79	1.000000	$3,139.79	72.22%
	Subtotal: MATERIALES				**$3,139.79**	72.22%
MANO DE OBRA						
02-0820	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	1.000000	$1,208.04	27.78%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,208.04**	27.78%
	Costo directo				**$4,347.83**	
	INDIRECTOS	15%			$652.17	
	SUBTOTAL				$5,000.00	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$5,000.00	
	UTILIDAD	10%			$500.00	
	PRECIO UNITARIO				**$5,500.00**	
	(* CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 40X20X50 **Unidad: PZA**					
	BASE PIRAMIDAL DE 40X20X50 CMS. CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARILLAS DEL #3, ESTRIBOS DEL #2 @ 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MANO DE OBRA						
02-0410	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)	JOR	$1,154.74	0.800000	$923.79	46.73%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$923.79**	46.73%
BASICOS						
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.	M2	$186.03	1.200000	$223.24	11.29%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION	KG	$49.02	4.382400	$214.83	10.87%
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRON #2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION.	KG	$45.87	1.104400	$50.66	2.56%
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	$3,582.83	0.157500	$564.30	28.55%
	Subtotal: BASICOS				**$1,053.03**	53.27%
	Costo directo				**$1,976.82**	
	INDIRECTOS	15%			$296.52	
	SUBTOTAL				$2,273.34	
	FINANCIAMIENTO	0%			$2,273.34	
	SUBTOTAL				$227.33	
	UTILIDAD	10%			**$2,500.67**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* DOS MIL QUINIENTOS PESOS 67/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: LAM80W **Unidad: PZA**					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS, LED SMD-CREE, TIPO DE LUZ 6,500K, INYECCIÓN EN ALUMINIO 1000,000 HORAS DE VIDA ÚTIL EN MATERIAL DE INYECCIÓN EN ALUMINIO, GARANTÍA DE 3 AÑOS, AUTONOMÍA DE 10 A 12 HRS, TIEMPO DE CARGA DE 5 HORAS, INCLUYE: BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS., POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LUMINARIA.					
MATERIALES						
	LUMINARIA SOLAR TODO EN UNO 80 WATSS	PZA	$10,312.50	1.000000	$10,312.50	43.48%
	BRAZO DE 1 DE DIÁMETRO CEDULA 30 DE 1.20 MTS	PZA	$756.25	1.000000	$756.25	3.19%
	POSTE METÁLICO DE ACERO DE SECCIÓN CIRCULAR DE 6 MTS DE ALTURA	PZA	$10,981.71	1.000000	$10,981.71	46.31%
	Subtotal: MATERIALES				**$22,050.46**	92.98%
MANO DE OBRA						
02-0840	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	1.000000	$1,208.04	5.09%
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	1.000000	$456.92	1.93%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,664.96**	7.02%
	Costo directo				**$23,715.42**	
	INDIRECTOS	15%			$3,557.31	
	SUBTOTAL				$27,272.73	
	FINANCIAMIENTO	0%			$27,272.73	
	SUBTOTAL				$2,727.27	
	UTILIDAD	10%			**$30,000.00**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: POR-01 **Unidad: ML** SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN DE 3.00 MTS. DE ALTURA, CON SOLERA DE 6" X 3/8" COMO REFUERZO HORIZONTAL, ABAJO Y ARRIBA, TUBO DE ACERO DE 4" DE DIAM. CEDULA 40, A CADA 15 CMS. LIBRE ENTRE TUBO, INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.					
MATERIALES						
	TUBO DE ACERO DE 4" CEDULA 40	ML	$1,140.33	13.200000	$15,052.36	81.90%
	SOLDADURA 6013 (1/8") PARA ACERO	KG	$100.33	3.957481	$397.05	2.16%
	PLACA DE ACERO DE 1/2"	KG	$47.41	5.000000	$237.05	1.29%
	SOLERA DE ACERO DE 6" X 3/8"	KG	$30.00	25.080000	$752.40	4.09%
	Subtotal: MATERIALES				**$16,438.86**	89.44%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	1.000000	$1,208.04	6.57%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,208.04**	6.57%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	PLANTA DE SOLDAR MILLER	HOR	$163.39	0.500000	$81.70	0.44%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$81.70**	0.44%
BASICOS						
	PINTURA DE ESMALTE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.	M2	$108.40	6.000000	$650.40	3.54%
	Subtotal: BASICOS				**$650.40**	3.54%
	Costo directo				**$18,379.00**	
	INDIRECTOS	15%			$2,756.85	
	SUBTOTAL				$21,135.85	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$21,135.85	
	UTILIDAD	10%			$2,113.59	
	PRECIO UNITARIO				**$23,249.44**	

(* VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: MAL-01 **Unidad: M2**					
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5 SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, CORTES, AMARRES.					
MATERIALES						
	MALLA CICLONICA (55 X 55MM) CAL. 10.5	M2	$104.25	1.100000	$114.68	46.79%
	CLIP PARA CONDUIT 2 DE PULGADA PLATA	PZA	$17.50	4.000000	$70.00	28.56%
	Subtotal: MATERIALES				**$184.68**	75.35%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	24.65%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	24.65%
	Costo directo				**$245.08**	
	INDIRECTOS	15%			$36.76	
	SUBTOTAL				$281.84	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$281.84	
	UTILIDAD	10%			$28.18	
	PRECIO UNITARIO				**$310.02**	
	(* TRESCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: PTAHERR **Unidad: M2**

PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14, LAMINA ZINTRO CAL.20, ANGULO 1 1/4"x 1/8, SOLERA DE 1/2" 1/8, CHAPA Y PINTURA ANTICORROSIVA.INCLUYE: COLOCACION .

MATERIALES						
	PUERTA DE HERRERIA A BASE DE PERFIL PTR 1"x1" CAL.14	M2	$2,100.00	1.100000	$2,310.00	88.44%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,310.00**	88.44%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + JOR 1 AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.250000	$302.01	11.56%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$302.01**	11.56%
	Costo directo				**$2,612.01**	
	INDIRECTOS	15%			$391.80	
	SUBTOTAL				$3,003.81	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$3,003.81	
	UTILIDAD	10%			$300.38	
	PRECIO UNITARIO				**$3,304.19**	

(* TRES MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 19/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: MOD-I01 **Unidad: PZA**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO 4P MUPA, JUEGO MODULAR (SKU M4PMUPA) LA CUAL INCLUYE: TORRE DE ACCESO Y RESBALADILLA DE POLIETILENO ROTOMOLDEADO DE PARED DOBLE H 1.52 L 3M Y COLUMPIO DE 3 PLAZAS CON ASIENTOS DE POLÍMERO INYECTADO CON OJILLOS. CON TREPADOR CURVO. ACABADO: PINTURA HORNEADA POLIÉSTER CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA. TRATAMIENTO ANTICORROSIVO A BASE DE TINAS DE FOSFATOS Y SELLOS ORGÁNICOS.

MATERIALES						
	MODULO INFANTIL	PZA	$100,050.00	1.000000	$100,050.00	96.66%
	Subtotal: MATERIALES				**$100,050.00**	96.66%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 16 (1 OF. COLOCADOR + 1 JOR AYUANTE GENERAL)		$1,208.04	2.857496	$3,451.97	3.34%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3,451.97**	3.34%
	Costo directo				**$103,501.97**	
	INDIRECTOS	15%			$15,525.30	
	SUBTOTAL				$119,027.27	
	FINANCIAMIENTO	0%			$119,027.27	
	SUBTOTAL				$11,902.73	
	UTILIDAD	10%			**$130,930.00**	
	PRECIO UNITARIO					

(* CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0327 **Unidad: M2** PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES APLANADOS CON MEZCLA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA COMEX VINIMEX Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE; ALTURA HASTA 3.00 MTS., ACARREO DE MATERIAL EN 1ra ESTACION.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.001000	$0.17	0.18%
	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	$64.13	0.100000	$6.41	6.65%
	PINTURA VINILICA COMEX-VINIMEX	LTO	$144.74	0.221158	$32.01	33.19%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 R/HR PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)		$57.75	0.050000	$2.89	3.00%
	Subtotal: MATERIALES				**$41.48**	43.01%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.045495	$54.96	56.99%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$54.96**	56.99%
	Costo directo				**$96.44**	
	INDIRECTOS	15%			$14.47	
	SUBTOTAL				$110.91	
	FINANCIAMIENTO	0%			$110.91	
	SUBTOTAL				$11.09	
	UTILIDAD	10%			**$122.00**	
	PRECIO UNITARIO (* CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0335 **Unidad: M2** PINTURA ESMALTE COMEX EN ELEMENTOS METALICOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, ALTURA MAXIMA 3.00 MTS. INCLUYE ACARREO EN 1RA. ESTACIÓN.					
MATERIALES						
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.220000	$27.95	27.50%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 R/HR PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)		$57.75	0.046000	$2.66	2.62%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.110000	$18.25	17.95%
	THINER	LTS	$40.68	0.110000	$4.47	4.40%
	Subtotal: MATERIALES				**$53.33**	52.46%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.040000	$48.32	47.54%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$48.32**	47.54%
	Costo directo				**$101.65**	
	INDIRECTOS	15%			$15.25	
	SUBTOTAL				$116.90	
	FINANCIAMIENTO	0%			$116.90	
	SUBTOTAL				$11.69	
	UTILIDAD	10%			**$128.59**	
	PRECIO UNITARIO (* CIENTO VEINTIOCHO PESOS 59/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: PINT-04 **Unidad: ML**					
	PINTURA DE ESMALTE EN TUBO DE 4" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.					
MATERIALES						
	THINER	LTS	$40.68	0.039270	$1.60	3.30%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.039270	$6.51	13.44%
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.078540	$9.98	20.60%
	Subtotal: MATERIALES				**$18.09**	37.34%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.025133	$30.36	62.66%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$30.36**	62.66%
	Costo directo				**$48.45**	
	INDIRECTOS	15%			$7.27	
	SUBTOTAL				$55.72	
	FINANCIAMIENTO	0%			$55.72	
	SUBTOTAL				$5.57	
	UTILIDAD	10%			**$61.29**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* SESENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%

Análisis: PIN-CAN **Unidad: M2**

PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX EN PISO DE CANCHA, INCLUYE: UNA MANO DE SELLADOR VINILICO COMEX, DOS MANOS DE PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX , INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.001000	$0.17	0.14%
	SELLADOR VINILICO COMEX	LTS	$64.13	0.333333	$21.38	17.51%
	PINTURA TOP DEPORTIVO COMEX	LTO	$60.21	0.666667	$40.14	32.88%
	Subtotal: MATERIALES				**$61.69**	50.53%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE JOR GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	49.47%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	49.47%
	Costo directo				**$122.09**	
	INDIRECTOS	15%			$18.31	
	SUBTOTAL				$140.40	
	FINANCIAMIENTO	0%			$140.40	
	SUBTOTAL				$14.04	
	UTILIDAD	10%			**$154.44**	
	PRECIO UNITARIO					

(* CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: PINT-01 **Unidad: ML** PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA EN PERFILES DE TUBO DE 2" DE DIÁMETRO., INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO.					
MATERIALES						
	THINER	LTS	$40.68	0.017333	$0.71	2.38%
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.017528	$2.91	9.77%
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.001636	$0.21	0.71%
	Subtotal: MATERIALES				**$3.83**	12.87%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)	JOR	$1,208.04	0.021474	$25.94	87.13%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$25.94**	87.13%
	Costo directo				**$29.77**	
	INDIRECTOS	15%			$4.47	
	SUBTOTAL				$34.24	
	FINANCIAMIENTO	0%			$34.24	
	SUBTOTAL				$3.42	
	UTILIDAD	10%			**$37.66**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* TREINTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 34-0546 **Unidad: M3**					
	MEJORAMIENTO DE TIERRA PARA PASTO ALFOMBRA, A BASE DE TIERRA NEGRA ORGANICA INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ACARREO DE MATERIALES,SUMINISTRO Y MANO DE OBRA..					
MATERIALES						
	TIERRA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	$250.00	1.300000	$325.00	77.63%
	AGUA	M3	$165.00	0.180000	$29.70	7.09%
	Subtotal: MATERIALES				**$354.70**	84.73%
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.139925	$63.93	15.27%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$63.93**	15.27%
	Costo directo				**$418.63**	
	INDIRECTOS	15%			$62.79	
	SUBTOTAL				$481.42	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$481.42	
	UTILIDAD	10%			$48.14	
	PRECIO UNITARIO				**$529.56**	
	(* QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 56/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 34-0547 **Unidad: M2**					
	PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y MANTENIMIENTO A BASE DE RIEGO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.018000	$2.97	2.18%
	PASTO ALFOMBRA	M2	$70.00	1.100000	$77.00	56.57%
	Subtotal: MATERIALES				**$79.97**	58.75%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 13 (1 OF. JARDINERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.046479	$56.15	41.25%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$56.15**	41.25%
	Costo directo				**$136.12**	
	INDIRECTOS	15%			$20.42	
	SUBTOTAL				$156.54	
	FINANCIAMIENTO	0%				
	SUBTOTAL				$156.54	
	UTILIDAD	10%			$15.65	
	PRECIO UNITARIO				**$172.19**	
	(* CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 34-0549 **Unidad: PZA**					
	PLANTAS DE ORNATO DE LA REGION, DE 0.20 a 1.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, TIERRA NEGRA PARA PLANTAS Y MANTENIMIENTO HASTA QUE SE ENTREGE LA OBRA.					
MATERIALES						
	AGUA	M3	$165.00	0.120000	$19.80	20.59%
	PLANTAS DE ORNATO (IXORA, HELECHOS, COPA DE ORO, FICUS)	PZA	$31.50	1.000000	$31.50	32.75%
	TIERRA NEGRA PARA JARDINERIA	M3	$250.00	0.005000	$1.25	1.30%
	Subtotal: MATERIALES				**$52.55**	54.64%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 13 (1 OF. JARDINERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.036111	$43.62	45.36%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$43.62**	45.36%
	Costo directo				**$96.17**	
	INDIRECTOS	15%			$14.43	
	SUBTOTAL				$110.60	
	FINANCIAMIENTO	0%			$110.60	
	SUBTOTAL				$11.06	
	UTILIDAD	10%			**$121.66**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* CIENTO VEINTIUN PESOS 66/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0521 **Unidad: M3**					
	CARGA MANUAL Y A TIRO LIBRE EN CAMION DE VOLTEO (6M3) DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DE MOLICION TIRO LIBRE. (12.00 KM)					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.055830	$25.51	9.75%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$25.51**	9.75%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.100000	$59.03	22.56%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$59.03**	22.56%
BASICOS						
	ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.	M3-KM	$14.76	12.000000	$177.12	67.69%
	Subtotal: BASICOS				**$177.12**	67.69%
	Costo directo				**$261.66**	
	INDIRECTOS	15%			$39.25	
	SUBTOTAL				$300.91	
	FINANCIAMIENTO	0%			$300.91	
	SUBTOTAL				$30.09	
	UTILIDAD	10%			**$331.00**	
	PRECIO UNITARIO					
	(* TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 33-0528 **Unidad: M2** LIMPIEZA ULTIMA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL A 20.00 MTS.					
MANO DE OBRA						
02-0010	CUADRILLA No 01 (1 PEON)	JOR	$456.92	0.005000	$2.28	32.76%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2.28**	32.76%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.007928	$4.68	67.24%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$4.68**	67.24%
	Costo directo				**$6.96**	
	INDIRECTOS	15%			$1.04	
	SUBTOTAL				$8.00	
	FINANCIAMIENTO	0%			$8.00	
	SUBTOTAL				$8.00	
	UTILIDAD	10%			$0.80	
	PRECIO UNITARIO				**$8.80**	
	(* OCHO PESOS 80/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 22-0331 **Unidad: M2**					
	PINTURA DE ESMALTE, PRIMARIO ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX, INCLUYE: DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION.					
MATERIALES						
	PRIMER ANTICORROSIVO MINIO GENUINO COMEX	LTO	$165.88	0.110000	$18.25	16.84%
	THINER	LTS	$40.68	0.055000	$2.24	2.07%
	ANDAMIO TUBULAR COMPLETA EL CUADRO (2 PZA TUBULARES Y 2 PZA TIJERAS)	R/HR	$57.75	0.050000	$2.89	2.67%
	PINTURA ESMALTE COMEX 100	LTO	$127.05	0.220000	$27.95	25.78%
	Subtotal: MATERIALES				**$51.33**	47.35%
MANO DE OBRA						
02-0710	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.047242	$57.07	52.65%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$57.07**	52.65%
	Costo directo				**$108.40**	
	(* CIENTO OCHO PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo		cantidad	Importe	%

Análisis: 33-0522 **Unidad: M3-KM**
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION.

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CAMION DE VOLTEO DE 7 M3	HOR	$590.30	0.025000	$14.76	100.00%
Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$14.76**	100.00%
Costo directo				**$14.76**	

(* CATORCE PESOS 76/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0104 **Unidad: KG** ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON ALAMBRON #2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREOS EN 1ra. ESTACION.					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.27%
	ALAMBRON LISO DE 1/4# (No. 2)	KG	$26.93	1.070000	$28.82	62.83%
	Subtotal: MATERIALES				**$30.32**	66.10%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.012868	$15.55	33.90%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$15.55**	33.90%
	Costo directo				**$45.87**	
	(* CUARENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 6-0105 **Unidad: KG**					
	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION, CON VARILLA No.3 Fy=4,000 Kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, GANCHOS, DESPERDICIOS Y ACARREO EN 1ra. ESTACION					
MATERIALES						
	ALAMBRE RECOCIDO #18	KG	$50.00	0.030000	$1.50	3.06%
	VARILLA NO 3	KG	$35.20	1.070000	$37.66	76.83%
	Subtotal: MATERIALES				**$39.16**	79.89%
MANO DE OBRA						
02-0620	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 JOR AYUDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.008158	$9.86	20.11%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$9.86**	20.11%
	Costo directo				**$49.02**	
	(* CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: 7-0118 Unidad: M3					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, R.N., EN CIMENTACION,T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.					
MANO DE OBRA						
02-0420	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)	JOR	$2,982.40	0.156300	$466.15	13.01%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$466.15**	13.01%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	VIBRADOR PARA CONCRETO	HOR	$82.43	0.500000	$41.22	1.15%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$41.22**	1.15%
BASICOS						
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)	M3	$2,929.01	1.050000	$3,075.46	85.84%
	Subtotal: BASICOS				**$3,075.46**	85.84%
	Costo directo				**$3,582.83**	
	(* TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CIM-A-G **Unidad: M2**					
	CIMBRA APARENTE EN GUARNICION INCLUYE: HABILITADO.					
MATERIALES						
	DUELA D/3RA. 10 CM	PZA	$104.18	0.150000	$15.63	8.40%
	POLIN DE MADERA DE 4" X 4"	PZA	$300.00	0.050000	$15.00	8.06%
	BARROTE 3RA. 2"X4"	PZA	$150.00	0.300000	$45.00	24.19%
X	TRIPLAY DE PINO 16MM	PZA	$832.94	0.040000	$33.32	17.91%
	CLAVO 2 1/2" A 4"	KG	$50.00	0.150000	$7.50	4.03%
X	DIESEL	LTO	$22.96	0.400000	$9.18	4.93%
	Subtotal: MATERIALES				**$125.63**	67.53%
MANO DE OBRA						
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE JOR OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)		$1,208.04	0.050000	$60.40	32.47%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$60.40**	32.47%
	Costo directo				**$186.03**	
	(* CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CONCRETO F'C=250 **Unidad: M3**					
	CONCRETO F'c= 250 Kg/cm2, FABRICADO EN OBRA T.M.A. 3/4"(5 % DESP.)					
MATERIALES						
	CEMENTO GRIS NORMAL	TON	$4,750.00	0.411200	$1,953.20	66.68%
	AGUA	M3	$165.00	0.226700	$37.41	1.28%
	GRAVA CLASIFICADA 3/4"	M3	$660.00	0.647100	$427.09	14.58%
	ARENA DE RIO	M3	$500.00	0.545300	$272.65	9.31%
	Subtotal: MATERIALES				**$2,690.35**	91.85%
MANO DE OBRA						
02-1030	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE JOR REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)		$3,708.63	0.050000	$185.43	6.33%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$185.43**	6.33%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HOR HP		$106.46	0.500000	$53.23	1.82%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$53.23**	1.82%
	Costo directo				**$2,929.01**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 01/100 M.N. *)					

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU001 02-0010 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 01 (1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	88.49%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$404.35	0.100000	$40.44	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$444.79**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$404.35	0.030000	$12.13	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$12.13**	2.65%
	Costo directo				**$456.92**	
	(* CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU002 02-0410 Unidad: JOR					
	CUADRILLA No 02 (1 ALBAÑIL +1 PEON)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,021.89	0.100000	$102.19	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	53.48%
	PEON	JOR	$404.35	1.000000	$404.35	35.02%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,124.08**	97.34%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,021.89	0.030000	$30.66	2.66%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$30.66**	2.66%
	Costo directo				**$1,154.74**	

(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. *)

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU003 02-0420 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 03 (1 ALBAÑIL +5 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	PEON	JOR	$404.35	5.000000	$2,021.75	67.79%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$2,639.29	0.100000	$263.93	8.85%
	OF. ALBANIL	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	20.71%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$2,903.22**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$2,639.29	0.030000	$79.18	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$79.18**	2.65%
	Costo directo				**$2,982.40**	
	(* DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU004 02-0620 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 04 (1 OF. FIERRERO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. FIERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU005 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 05 (1 OF. CARPINTERO DE OBRA NEGRA + 1 AYUNDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU006 02-0840 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 06 (1 OF. ELECTRICISTA + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. ELECTRICISTA	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU007 02-0820 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 07 (1 OF. PLOMERO +1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	OF. PLOMERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU010 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 10 (1 OF. HERRERO EN CAMPO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. HERRERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU013 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 13 (1 OF. JARDINERO + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	OF. JARDINERO	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU014 02-0710 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 14 (1 OF. PINTOR + 1 AYUDANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	OF. PINTOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU016 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 16 (1 OF. COLOCADOR + 1 AYUANTE GENERAL)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$1,069.06	0.100000	$106.91	8.85%
	AYUDANTE GENERAL	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	37.38%
01-0740	OF. COLOCADOR	JOR	$617.54	1.000000	$617.54	51.12%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$1,175.97**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$1,069.06	0.030000	$32.07	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$32.07**	2.65%
	Costo directo				**$1,208.04**	
	(* UN MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 04/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU021 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 21 (2 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$808.70	0.100000	$80.87	8.85%
	PEON	JOR	$404.35	2.000000	$808.70	88.50%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$889.57**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$808.70	0.030000	$24.26	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$24.26**	2.65%
	Costo directo				**$913.83**	
	(* NOVECIENTOS TRECE PESOS 83/100 M.N. *)					

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia : H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DE BASICOS

Código	Concepto	Unidad	Costo	cantidad	Importe	%
	Análisis: CU027 02-1030 **Unidad: JOR**					
	CUADRILLA No 27 (1 OPERADORDE REVOLVEDORA DE 1 SACO + 7 PEONES)					
MANO DE OBRA						
	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	$3,281.97	0.100000	$328.20	8.85%
	PEON	JOR	$404.35	7.000000	$2,830.45	76.32%
01-0780	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	$451.52	1.000000	$451.52	12.17%
	Subtotal: MANO DE OBRA				**$3,610.17**	97.35%
EQUIPO Y HERRAMIENTA						
	HERRAMIENTA MENOR	(%)MO	$3,281.97	0.030000	$98.46	2.65%
	Subtotal: EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$98.46**	2.65%
	Costo directo				**$3,708.63**	
	(* TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 63/100 M.N. *)					

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
%MO01	MANDO INTERMEDIO	(%)MO	746.67	0.000000	0.00
MO001	PEON	JOR	228.57	1.769024	404.35
MO002	AYUDANTE GENERAL	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO	JOR	257.14	1.755940	451.52
MO010	OF. ALBANIL	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO011	OF. FIERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO013	OF. ELECTRICISTA	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO014	OF. PLOMERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO017	OF. HERRERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO020	OF. JARDINERO	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO021	OF. PINTOR	JOR	357.14	1.729120	617.54
MO023	OF. COLOCADOR	JOR	357.14	1.729120	617.54

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DIAS CALENDARIO	365.00
DIAGI	DIAS DE AGUINALDO	15.00
PIVAC	DIAS POR PRIMA VACACIONAL	3.00
	Prima dominical	
	Horas extras gravables en el SBC	
	Horas extras no gravables en el SBC	
Tp	**TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO** SUMA:	**383.00**
DIDOM	DIAS DOMINGO	52.00
DIVAC	DIAS DE VACACIONES	12.00
DIFEO	DIAS FESTIVOS POR LEY	7.00
DIPEC	DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)	1.00
DIPCO	DIAS POR COSTUMBRE	5.00
DIPEN	DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL	1.00
DISIN	DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)	
	Dias no Trabajados por Guardia	
DINLA	**DIAS NO LABORADOS AL AÑO** SUMA:	**78.00**
TI	**TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**	287.00
Tp / TI	DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS	1.334495
(Tp -Te) / TI	(DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE)/ DIAS LABORADOS	1.334495
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS	1.049315

TABLA DE SALARIOS REALES

UMA 2023 103.74
SALARIO MINIMO 2023 207.44
Porcentaje de pagos (Otros cargos) 2.00%

CLAVE	CATEGORIAS	Salario Nominal veces DF	Tp / TI	Obligacion Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp-Te)/TI	Otros Cargos	Fsr=[Ps (Tp-Te) / TI] + (Tp/TI)
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 2 %	H = D + F + G
MO001	PEON	2.203297	1.334495	0.310626	0.414529	0.020000	1.769024
MO002	AYUDANTE GENERAL	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO003	OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SAC	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940
MO010	OF. ALBANIL	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO011	OF. FIERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO012	OF. CARPINTERO O. NEGRA.	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO013	OF. ELECTRICISTA	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO014	OF. PLOMERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO017	OF. HERRERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO018	OF. SOLDADOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO020	OF. JARDINERO	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO021	OF. PINTOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO023	OF. COLOCADOR	3.442645	1.334495	0.280724	0.374625	0.020000	1.729120
MO032	OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR	2.478697	1.334495	0.300822	0.401445	0.020000	1.755940

H. AY[illegible]TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

U.M.A.	1.00	3 veces salario U.M.A.	3.00	25 veces U.M.A.	25.00	25 veces U.M.A.	25.00

Clave de Categoria	Salario Nominal veces DF	Factor Salario Base de Cotizacion	Salario Base de Cotización	Excedente de tres salarios mínimos DF	Aplicación IMSS al excedente	Cuota Fija	Prestaciones en especie pensionados	Prestaciones en dinero	Invalidez y vida	Cesantía en edad avanzada y vejez	Riesgos de trabajo	Guarderías	SAR	INFONAVIT	Suma prestaciones	Ps= Obligacion Obrero-Patronal
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			BxC	D-3SMDF	ExF	GxSMDF	HxD	IxD	JxD	KxD	LxD	MxD	NxD	OxD	SUMA(F:O)	P / D
	Sn	FSBC	SBC		1.1000%	20.4000%	1.0500%	0.7000%	1.7500%	3.1500%	7.58880%	1.00%	2.00%	5.00%	SP	SP/SBC
MO001	2.203297	1.0493	2.311953			0.204	0.024276	0.016184	0.040459	0.072827	0.175449	0.02312	0.046239	0.115598	0.718152	0.310626
MO002	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO003	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822
MO010	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO011	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO012	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO013	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO014	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO017	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO018	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO020	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO021	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO023	3.442645	1.0493	3.612419	0.612419	0.006737	0.204	0.03793	0.025287	0.063217	0.113791	0.274139	0.036124	0.072248	0.180621	1.014094	0.280724
MO032	2.478697	1.0493	2.600934			0.204	0.02731	0.018207	0.045516	0.081929	0.19738	0.026009	0.052019	0.130047	0.782417	0.300822

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO001**
CATEGORIA (S): **PEON**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.203297**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.311953**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.024276
0.7% Prestaciones en dinero	0.016184
2% Sar	0.046239
5% Infonavit	0.115598
1.75% Invalidez y vida	0.040459
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.072827
7.5888% Riesgos de trabajo	0.175449
1% Guarderias	0.02312
SP = Suma de Prestaciones	21.677112
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.310626

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.414529

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.769024**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO002**
CATEGORIA (S): **AYUDANTE GENERAL**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO003**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE REVOLVEDORA DE 1 SACO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO010**
CATEGORIA (S): **OF. ALBANIL**
UMA 2023 **103.74**

En Veces SMDF	
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO011**
CATEGORIA (S): **OF. FIERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO012**
CATEGORIA (S): **OF. CARPINTERO O. NEGRA.**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO013**
CATEGORIA (S): **OF. ELECTRICISTA**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO014**
CATEGORIA (S): **OF. PLOMERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO017**
CATEGORIA (S): **OF. HERRERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO018**
CATEGORIA (S): **OF. SOLDADOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO020**
CATEGORIA (S): **OF. JARDINERO**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar	
copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO021**
CATEGORIA (S): **OF. PINTOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal	
Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495	Tp / TI = 1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO023**
CATEGORIA (S): **OF. COLOCADOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**3.442645**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**3.612419**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.006737
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.03793
0.7% Prestaciones en dinero	0.025287
2% Sar	0.072248
5% Infonavit	0.180621
1.75% Invalidez y vida	0.063217
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.113791
7.5888% Riesgos de trabajo	0.274139
1% Guarderias	0.036124
SP = Suma de Prestaciones	21.973054
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.280724

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.374625

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.729120**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
.
LICITACION No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

Salarios Normales

CODIGO DE LA CATEGORIA: **MO032**
CATEGORIA (S): **OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR**
UMA 2023 **103.74**

	En Veces SMDF
Sal. Nominal (Sn)	**2.478697**
Salario Base deCotizacion (SBC)	**2.600934**
SALARIO MINIMO 2023	**207.44**

DIAS REALMENTE LABORADOS AL ANO	
Dias Calendario	365.00
Dias no Trabajados	
Domingos	52.00
Dias festivos por Ley	7.00
Dias por costumbre	5.00
Dias sindicato	0.00
Vacaciones	12.00
Permisos y Enfermedades	1.00
Condiciones Climatologicas	1.00
Horas inactivas por arrastre	
Dias no trabajados por guardia	0.00
TOTAL TI =	287.00

DIAS REALMENTE PAGADOS AL ANO	
Dias Calendario (DICAL)	365.00
Aguinaldo por Ley	15.00
Prima Vacacional 25% por Ley	3.00
Prima Dominical por Ley	0.00
Tiempo Extra	
Horas extras gravables en el SBC	0.00
Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Prestaciones por contrato (anexar copia del contrato y analisis correspon.)	
TOTAL Tp =	383.00
Porcentaje de pagos (Otros cargos)	0.02

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS	En Veces SMDF
Enfermedad y Maternidad	
Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	21.16296
1.1% excedente de 3 sal. Min D.F.	0.00
1.05% Prestaciones en especie a pensionados	0.02731
0.7% Prestaciones en dinero	0.018207
2% Sar	0.052019
5% Infonavit	0.130047
1.75% Invalidez y vida	0.045516
3.15% Cesantía en edad avanzada y vejez	0.081929
7.5888% Riesgos de trabajo	0.19738
1% Guarderias	0.026009
SP = Suma de Prestaciones	21.741377
Ps= Obligacion Obrero-Patronal Ps = Sp / SBC	0.300822

Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.334495
Fact. B.C = FSBC=(Tp-Te) / DICA	1.049315

Tp / TI = 1.334495
Ps x (Tp-Te) / TI = 0.401445

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI) **1.755940**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES C. EMILIA CALLADO BIBIANO
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQCAMION		
MAQUINA:	CAMION DE VOLTEO DE 7 M3		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$870,292.50	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$45,738.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	10,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	2,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 160 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): DIESEL	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$824,554.50	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $82,455.45	FACTOR DE OPERACION (Fo):	80.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	128.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$63.78	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.09375
SALARIO POR OPERACION(So):	$510.22	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.0035
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	36
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	200	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 824,554.50 - 82,455.45 / 10,000.00 =		$74.21	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$22.68	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (824,554.50 + 82,455.45) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$9.07	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 74.21 =		$59.37	
SUMA CARGOS FIJOS		**$165.33**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....DIESEL Co = Fc * Po * Pc = 0.09375 * 128.00 * 22.96 =		$275.52	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * 128.00) + 36 / 200] * $100/Lt. =		$62.80	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $45,738.00 / 2,000.00 =		$22.87	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$361.19**	
OPERACION			
CUADRILLA No 30 (1 OPERADOR MAQUINARIA JOR Po = Sr / (Ht) = $510.22/8 $63.78			
OPERACION		$63.78	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$63.78**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$590.30**	

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQPLAN		
MAQUINA:	PLANTA DE SOLDAR MILLER		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$24,750.00	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	5.00
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	1,600 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	8,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 0 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): $.00 / LTS.	
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$24,750.00	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE $00.00 / LTS.	
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $2,475.00	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.5
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$151.01	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$1,208.04	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	0
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):		FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 24,750.00 - 2,475.00 / 8,000.00 =		$2.78	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (24,750.00 + 2,475.00) * 0.10 / 2 * 1,600.00 =		$0.85	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (24,750.00 + 2,475.00) * 0.04 / 2 * 1,600.00 =		$0.34	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.50 * 2.78 =		$1.39	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.36**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE..... Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * .00 * 0 =		$0.00	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....ENERGIA ELECTRICA: = 7.02 * 1 = $7.02		$7.02	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * .00) + 0 /] * $0/Lt. =		$0.00	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$7.02**	
OTROS CONSUMOS			
SUMA DE OTROS CONSUMOS		**$0.00**	
OPERACION			
CUADRILLA No 11 (1 OF. SOLDADOR + 1 AY JOR Po = Sr / (Ht) = $1,208.04/8 $151.01			
OPERACION		$151.01	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$151.01**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$163.39**	

X JEFE DEL DEPTO. DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQREV		
MAQUINA:	REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO 8 DE HP		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$47,643.75	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$2,420.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	1,000 HRS.	POTENCIA NOMINAL 8 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$45,223.75	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $4,522.38	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	8.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	1
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 45,223.75 - 4,522.38 / 5,000.00 =		$8.14	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$1.24	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (45,223.75 + 4,522.38) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.50	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 8.14 =		$6.51	
SUMA CARGOS FIJOS		**$16.39**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 8.00 * 22.96 =		$27.81	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 8.00) + 1 / 100] * $100/Lt. =		$3.40	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $2,420.00 / 1,000.00 =		$2.42	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$33.63**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA			**$106.46**

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Ubicación: COL. JARDIN MANGOS

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA

DATOS GENERALES

CODIGO:	EQVIB		
MAQUINA:	VIBRADOR PARA CONCRETO		
MODELO:			
CAPACIDAD:			
PRECIO DE ADQUISICION:	$16,198.88	VIDA ECONOMICA EN AÑOS:	2.50
PRECIO JUEGO LLANTAS:	$00.00	HORAS POR AÑO (Hea):	2,000 HRS.
EQUIPO ADICIONAL:		VIDA ECONOMICA (Ve):	5,000 HRS.
VIDA ECONOMICA DE LLANTAS:	HRS.	POTENCIA NOMINAL 4 HP	
PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe):	$00.00	COSTO COMBUSTIBLE(Pc): GASOLINA	$22.96 / LTS.
VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va):	HRS.		
VALOR DE LA MAQUINA (Vm):	$16,198.88	COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE	$100.00 / LTS.
VALOR DE RESCATE (Vr):	10% $1,619.89	FACTOR DE OPERACION (Fo):	100.00%
TASA DE INTERES (i):	10%	POTENCIA DE OPERACION (Po):	4.00
PRIMA DE SEGUROS (s):	4%	FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):	0.8
SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr):	$56.44	COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):	0.1514
SALARIO POR OPERACION(So):	$451.52	COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):	0.003
HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):	8	CAPACIDAD DEL CARTER (CC):	5
TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca):	100	FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr):	1.0

	ACTIVA %	ESPERA %	RESERVA
CARGOS FIJOS			
a).- DEPRECIACION.....D = (Vm-Vr)/Ve = 16,198.88 - 1,619.89 / 5,000.00 =		$2.92	
b).- INVERSION.....Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.10 / 2 * 2,000.00 =		$0.45	
c).- SEGUROS.....Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (16,198.88 + 1,619.89) * 0.04 / 2 * 2,000.00 =		$0.18	
d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.80 * 2.92 =		$2.34	
SUMA CARGOS FIJOS		**$5.89**	
CONSUMOS			
a).- COMBUSTIBLE.....GASOLINA Co = Fc * Po * Pc = 0.1514 * 4.00 * 22.96 =		$13.90	
b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0		$0.00	
c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0030 * 4.00) + 5 / 100] * $100/Lt. =		$6.20	
d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 =		$0.00	
e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 =		$0.00	
SUMA DE CONSUMOS:		**$20.10**	
OPERACION			
OPERADOR DE MAQUINARIA MENOR JOR Po = Sr / (Ht) = $451.52/8 $56.44			
OPERACION		$56.44	
SUMA DE OPERACION POR HORA		**$56.44**	
COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA		**$82.43**	

X JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. EMILIA CALLADO BIBIANO

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Lugar: COL. JARDIN MANGOS

DESGLOSE DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 735,991.83

CONCEPTO	TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS			
	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION OFICINA DE CAMPO	
	MONTO	PORCENTAJE	MONTO	PORCENTAJE
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES				
a. Personal directivo incluye: Prestaciones	5,913.32	0.8034%		
b. Personal técnico incluye: Prestaciones	14,483.30	1.9679%	27,800.00	3.7772%
c. Personal administrativo incluye: Prestaciones	5,303.88	0.7206%	26,300.00	3.5734%
d. Cuota Patronal del Seguro Social del inciso a, b y c (consideradas)				
e. Prestaciones de la LFT del inciso a, b y c (consideradas)				
f. Pasajes y viáticos (consideradas)				
g. Los que deriven de suscripción de contratos de trabajo del inciso a,b y c.				
SUBTOTALES	**25,700.50**		**54,100.00**	
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS				
a. Edificios y Locales	1,471.98	0.2000%	735.99	0.1000%
b. Locales de Mantenimiento y Guarda	735.99	0.1000%	1,103.99	0.1500%
c. Bodegas	551.99	0.0750%	1,103.99	0.1500%
d. Instalaciones Generales	588.79	0.0800%	735.99	0.1000%
e. Muebles y enseres	331.20	0.0450%	368.00	0.0500%
f. Depreciación o Renta, y Operación de Vehículos	441.60	0.0600%	1,103.99	0.1500%
g. Campamentos			735.99	0.1000%
SUBTOTALES	**4,121.55**		**5,887.93**	
III. SERVICIOS				
a. Consultores,Asesores,Servicio y Laboratorios			1,471.98	0.2000%
b. Estudios e Investigación	1,471.98	0.2000%	1,103.99	0.1500%
SUBTOTALES	**1,471.98**		**2,575.97**	
IV. FLETES Y ACARREOS				
a. De Campamentos			551.99	0.0750%
b. De Equipo de Construcción				
c. De Plantas y elementos para Instalaciones				
d. De mobiliario			1,839.98	0.2500%
SUBTOTALES			**2,391.97**	
V. GASTOS OFICINA				
a. Papelería y útiles de escritorio	735.99	0.1000%		
b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio.	147.20	0.0200%		
c. equipo de computación				
d. Situación de fondos				
e. Copias y duplicados	184.00	0.0250%		
f. Luz, gas y otros consumos	331.20	0.0450%	73.60	0.0100%
g. Gastos de la licitación	625.59	0.0850%		
SUBTOTALES	**2,023.98**		**73.60**	
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	**625.59**	0.0850%	**73.60**	0.0100%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	**625.59**	0.0850%	**73.60**	0.0100%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS				
a. Primas por Seguro	2,207.98	0.3000%		
b. Primas por Fianzas	1,103.99	0.1500%	4,863.96	0.6609%
SUBTOTALES	**3,311.96**		**4,863.96**	
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES				
a. Construcción y conservación de caminos de acceso				
b. Montaje y desmantelamiento de equipo				
c. Construcción de Instalaciones generales				
1. De Campamentos			715.38	0.0972%
2. De equipo de construcción			635.90	0.0864%
3. De plantas y elementos para instalaciones			584.38	0.0794%
4. Letrero nominativo de obra			540.95	0.0735%
SUBTOTALES			**2,476.61**	
TOTALES	37,881.16	5.1470%	72,517.25	9.8530%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
C. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

TOTALES $ 110,398.41 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Lugar: COL. JARDIN MANGOS

RESUMEN DE COSTOS INDIRECTOS

MONTO DE LA OBRA A C.D. $ 735,991.83

CONCEPTO	ADMINISTRACION OFICINA CENTRAL		ADMINISTRACION DE CAMPO		TOTALES	
	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
I. HONORARIOS SUELDOS Y PRESTACIONES	25,700.50	3.4920%	54,100.00	7.3506%	79,800.50	10.8426%
II. DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS	4,121.55	0.5600%	5,887.93	0.8000%	10,009.49	1.3600%
III. SERVICIOS	1,471.98	0.2000%	2,575.97	0.3500%	4,047.96	0.5500%
IV. FLETES Y ACARREOS			2,391.97	0.3250%	2,391.97	0.3250%
V. GASTOS OFICINA	2,023.98	0.2750%	73.60	0.0100%	2,097.58	0.2850%
VI. CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	625.59	0.0850%	73.60	0.0100%	699.19	0.0950%
VII. SEGURIDAD E HIGIENE	625.59	0.0850%	73.60	0.0100%	699.19	0.0950%
VIII. SEGUROS Y FIANZAS	3,311.96	0.4500%	4,863.96	0.6609%	8,175.92	1.1109%
IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES			2,476.61	0.3365%	2,476.61	0.3365%
TOTALES	37,881.16	5.1470%	72,517.25	9.8530%	110,398.41	15.0000%

TOTALES $ 110,398.41 % INDIRECTO 15.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

LUGAR: COL. JARDIN MANGOS

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO (IMPORTE TOTAL DE OBRA)

COSTO DIRECTO DE LA OBRA:	735,991.83	TASA DE INTERES USADA (Anual)=	10.0000%	% APLICABLE AL PERIODO	
INDIRECTO DE OBRA:	15.0000%	+ PUNTOS DEL BANCO=	0.0000%	1.1233%	
COSTO DIRECTO +INDIRECTO:	846,390.60	TASA DE INTERES DIARIA =	0.0274%	LOP ART. 54 P. 1 y 2	
MONTO TOTAL DE LA OBRA:	931,034.48	DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES:	41		

ANTICIPOS		MONTO A EJERCER		IMPORTE DE ANTICIPOS		INDICADOR ECONOMICO
1a. ASIGNACION	2a. ASIGNACION	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	1er EJERCICIO	2do EJERCICIO	TIIE A 28 DIAS
30.00%	0.00%	931,034.48	0.00	279,310.34	0.00	

%Am1= AMORTIZACION	Spa1=Saldo por Amortizar del 1er. Ejercicio	%Am2= AMORTIZACION
1er Ejercicio	0.00	2do Ejercicio
%Am1= (Anticipo / 1er + 2do Ejercicio)	Ipa2=Importe por Amortizar en el 2do. Ejercicio	%Am2= Ipa2 / 2do. Ejercicio
30.0000%	Ipa2=Spa1+2do.anticipo 0.00	0.0000%

PERIODO DE COBRO 1a. ESTIMACION **1**
PERIODO DE ENTREGA DEL 2do ANTICIPO 0

PERIODO	INGRESOS				EGRESOS		IMPORTES		FINANCIAMIENTO
	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACION	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	ANTICIPO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	
0	279,310.34	0.00		279,310.34	0.00	0.00	279,310.34	279,310.34	0.00
SEM 1	0.00	16,671.10	5,001.33	11,669.77	15,155.47	**0.00**	-3,485.70	275,824.65	0.00
SEM 2	0.00	16,671.13	5,001.34	11,669.79	15,155.49	**0.00**	-3,485.70	272,338.94	0.00
SEM 3	0.00	34,742.85	10,422.86	24,320.00	31,584.25	**0.00**	-7,264.25	265,074.69	0.00
SEM 4	0.00	34,742.85	10,422.86	24,320.00	31,584.25	**0.00**	-7,264.25	257,810.44	0.00
SEM 5	0.00	130,002.68	39,000.80	91,001.88	118,183.64	**0.00**	-27,181.77	230,628.67	0.00
SEM 6	0.00	130,002.68	39,000.80	91,001.88	118,183.64	**0.00**	-27,181.77	203,446.91	0.00
SEM 7	0.00	154,108.17	46,232.45	107,875.72	140,097.61	**0.00**	-32,221.89	171,225.01	0.00
SEM 8	0.00	154,108.17	46,232.45	107,875.72	140,097.61	**0.00**	-32,221.89	139,003.12	0.00
SEM 9	0.00	77,704.49	23,311.35	54,393.14	70,640.08	**0.00**	-16,246.94	122,756.18	0.00
SEM 10	0.00	77,704.49	23,311.35	54,393.14	70,640.08	**0.00**	-16,246.94	106,509.25	0.00
SEM 11	0.00	47,450.48	14,235.14	33,215.34	43,136.58	**0.00**	-9,921.24	96,588.01	0.00
SEM 12	0.00	47,450.48	14,235.14	33,215.34	43,136.58	**0.00**	-9,921.24	86,666.77	0.00
SEM 13	0.00	9,674.91	2,902.47	6,772.44	8,795.33	**0.00**	-2,022.89	84,643.88	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	0.00

PERIODO	ANTICIPOS	ESTIMACIONES	AMORTIZACI	COBROS	GASTOS DE OBRA (CD+I)	AN .PO PROVEEDORES *	DIFERENCIA	DIFERENCIA ACUMULADA	FINANCIAMIENTO
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	279,310.34	931,034.48		931,034.48	846,390.60	0.00	0.00	0.00	0
				0.00					(-) 0.00

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO= INTERES NETO A PAGAR / GASTOS DE OBRA (COSTO DIRECTO +INDIRECTO) = 0.00 / 846,390.60 = %= **0.0000%**

* ANEXAR COMPROBANTES (CEDULA DE GASTOS DE ANTICIPOS)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. EMILIA CALLADO BIBIANO

JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA
Obra: REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS

Lugar: COL. JARDIN MANGOS

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	IMPORTE	%
CD	COSTO DIRECTO		735,991.83	
CI	I.-INDIRECTO		110,398.41	15.0000%
CF	II.-FINANCIAMIENTO			
Up%	**UTILIDAD PROPUESTA**			5.8000%
	ISR= IMPUESTO SOBRE LA RENTA		27,084.49	32.00%
	PTU= PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDAD		8,463.90	10.00%
%U	UTILIDAD NETA = Up% / [1- (ISR+PTU)]	%U =5.8 % / [1- (32%+ 10%)]		10.0000%
CU	CARGO POR UTILIDAD (Costo dir.Obra+Indirecto+Financiamiento)*% Utilidad Neta)	($ 735,991.83 + $ 110,398.41 + $ 0.00) * 10% =	84,639.02	
	TOTAL UTILIDAD		84,639.02	
	PORCENTAJE TOTAL DE UTILIDAD (%=Total utilidad * 100 / (CD+CI+CF))	[$ 84,639.02 / ($ 735,991.83 + $ 110,398.41 + $ 0.00)] * 100%		10.0000%

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

C. EMILIA CALLADO BIBIANO
JEFE DEL DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 1

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

ESTATAL:

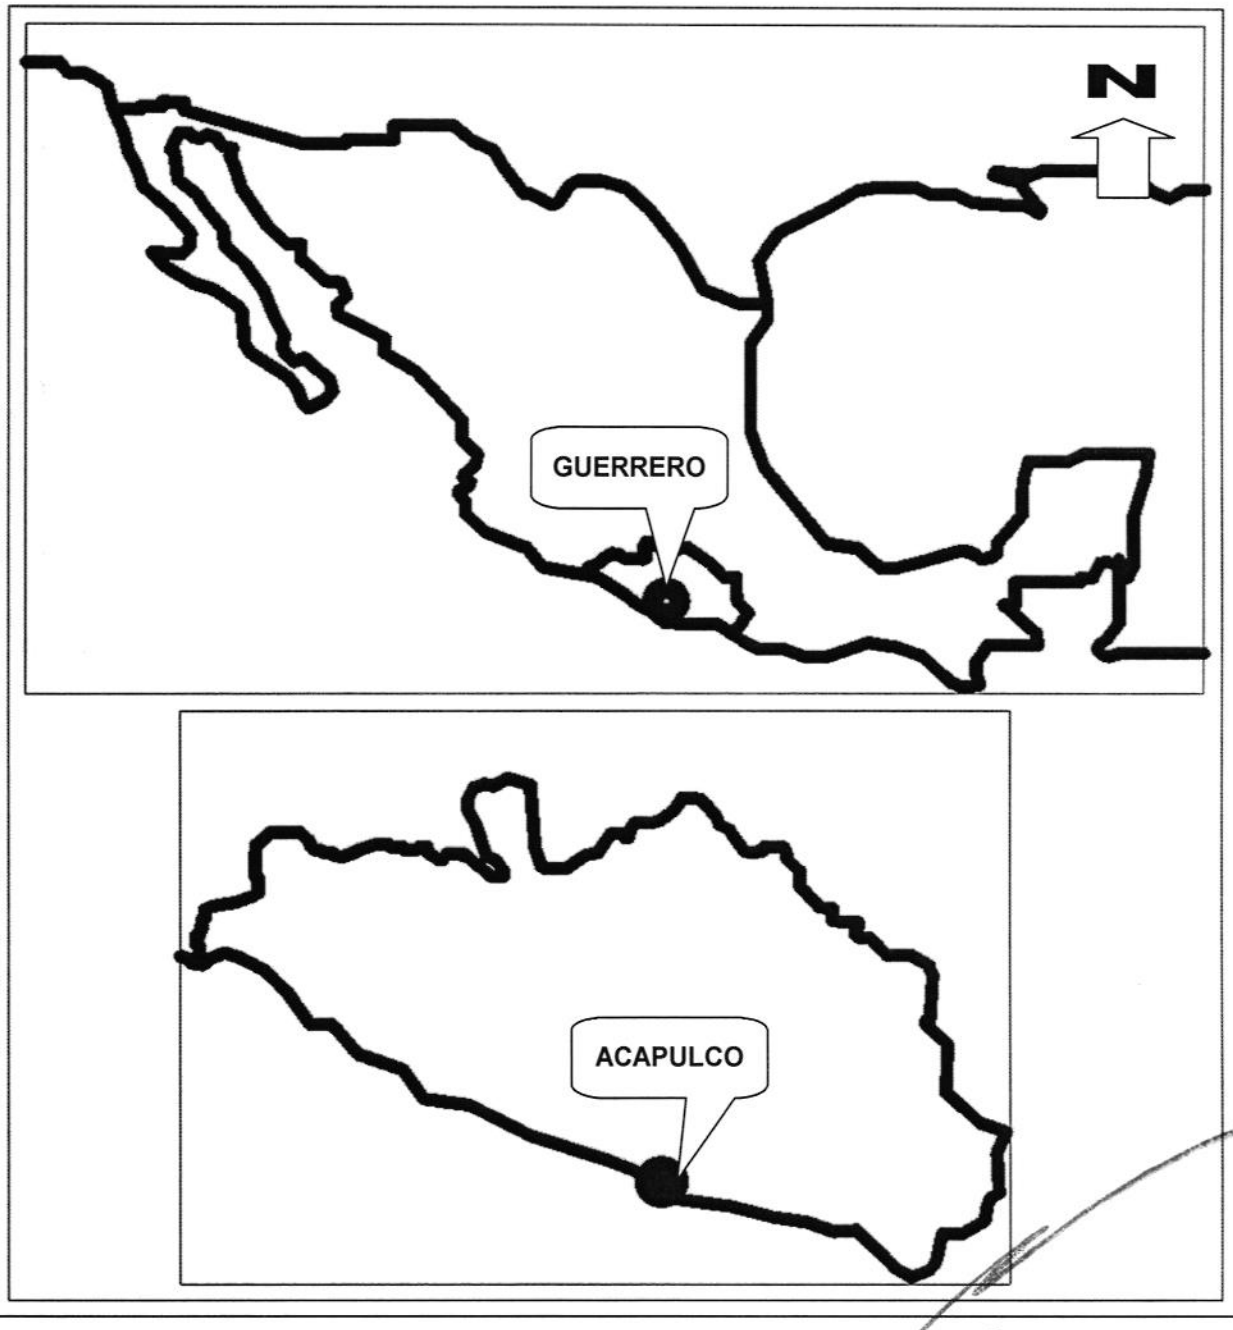

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ: CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 2

OBRA-. **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

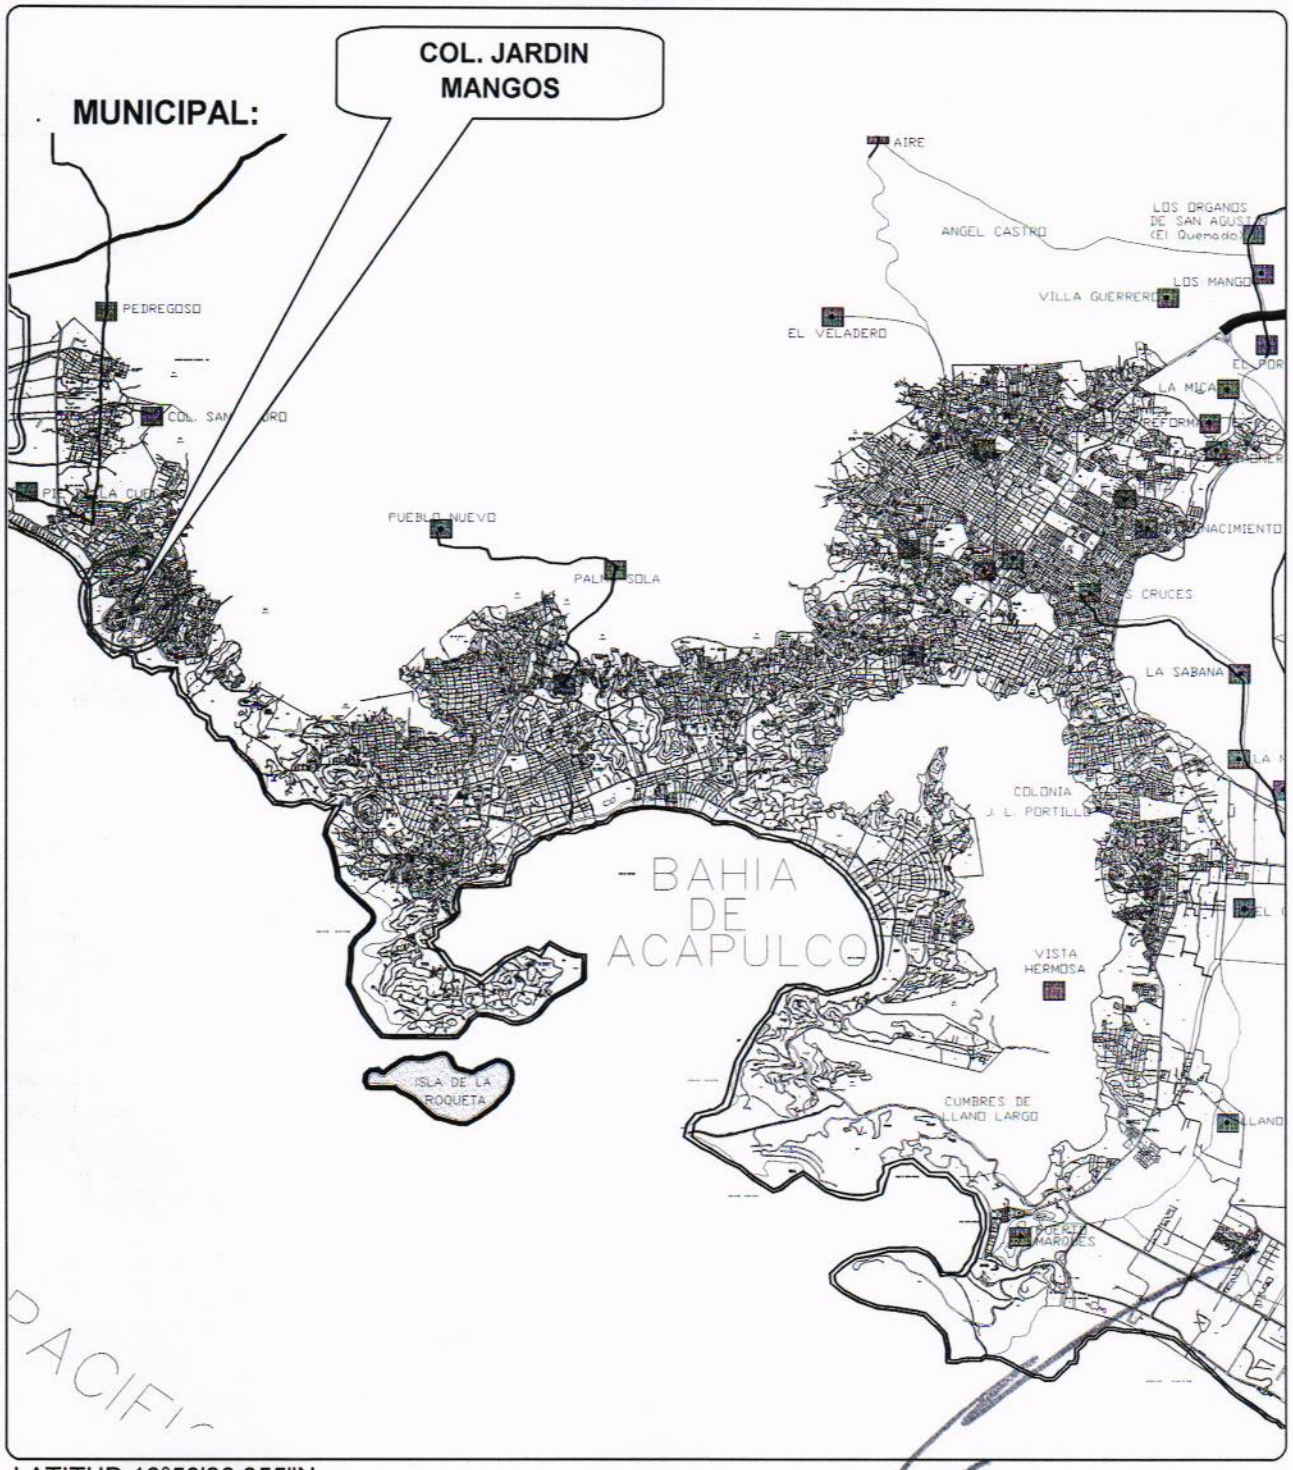

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ: CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION - 3

OBRA-. **REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS**
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: **COL. JARDIN MANGOS**

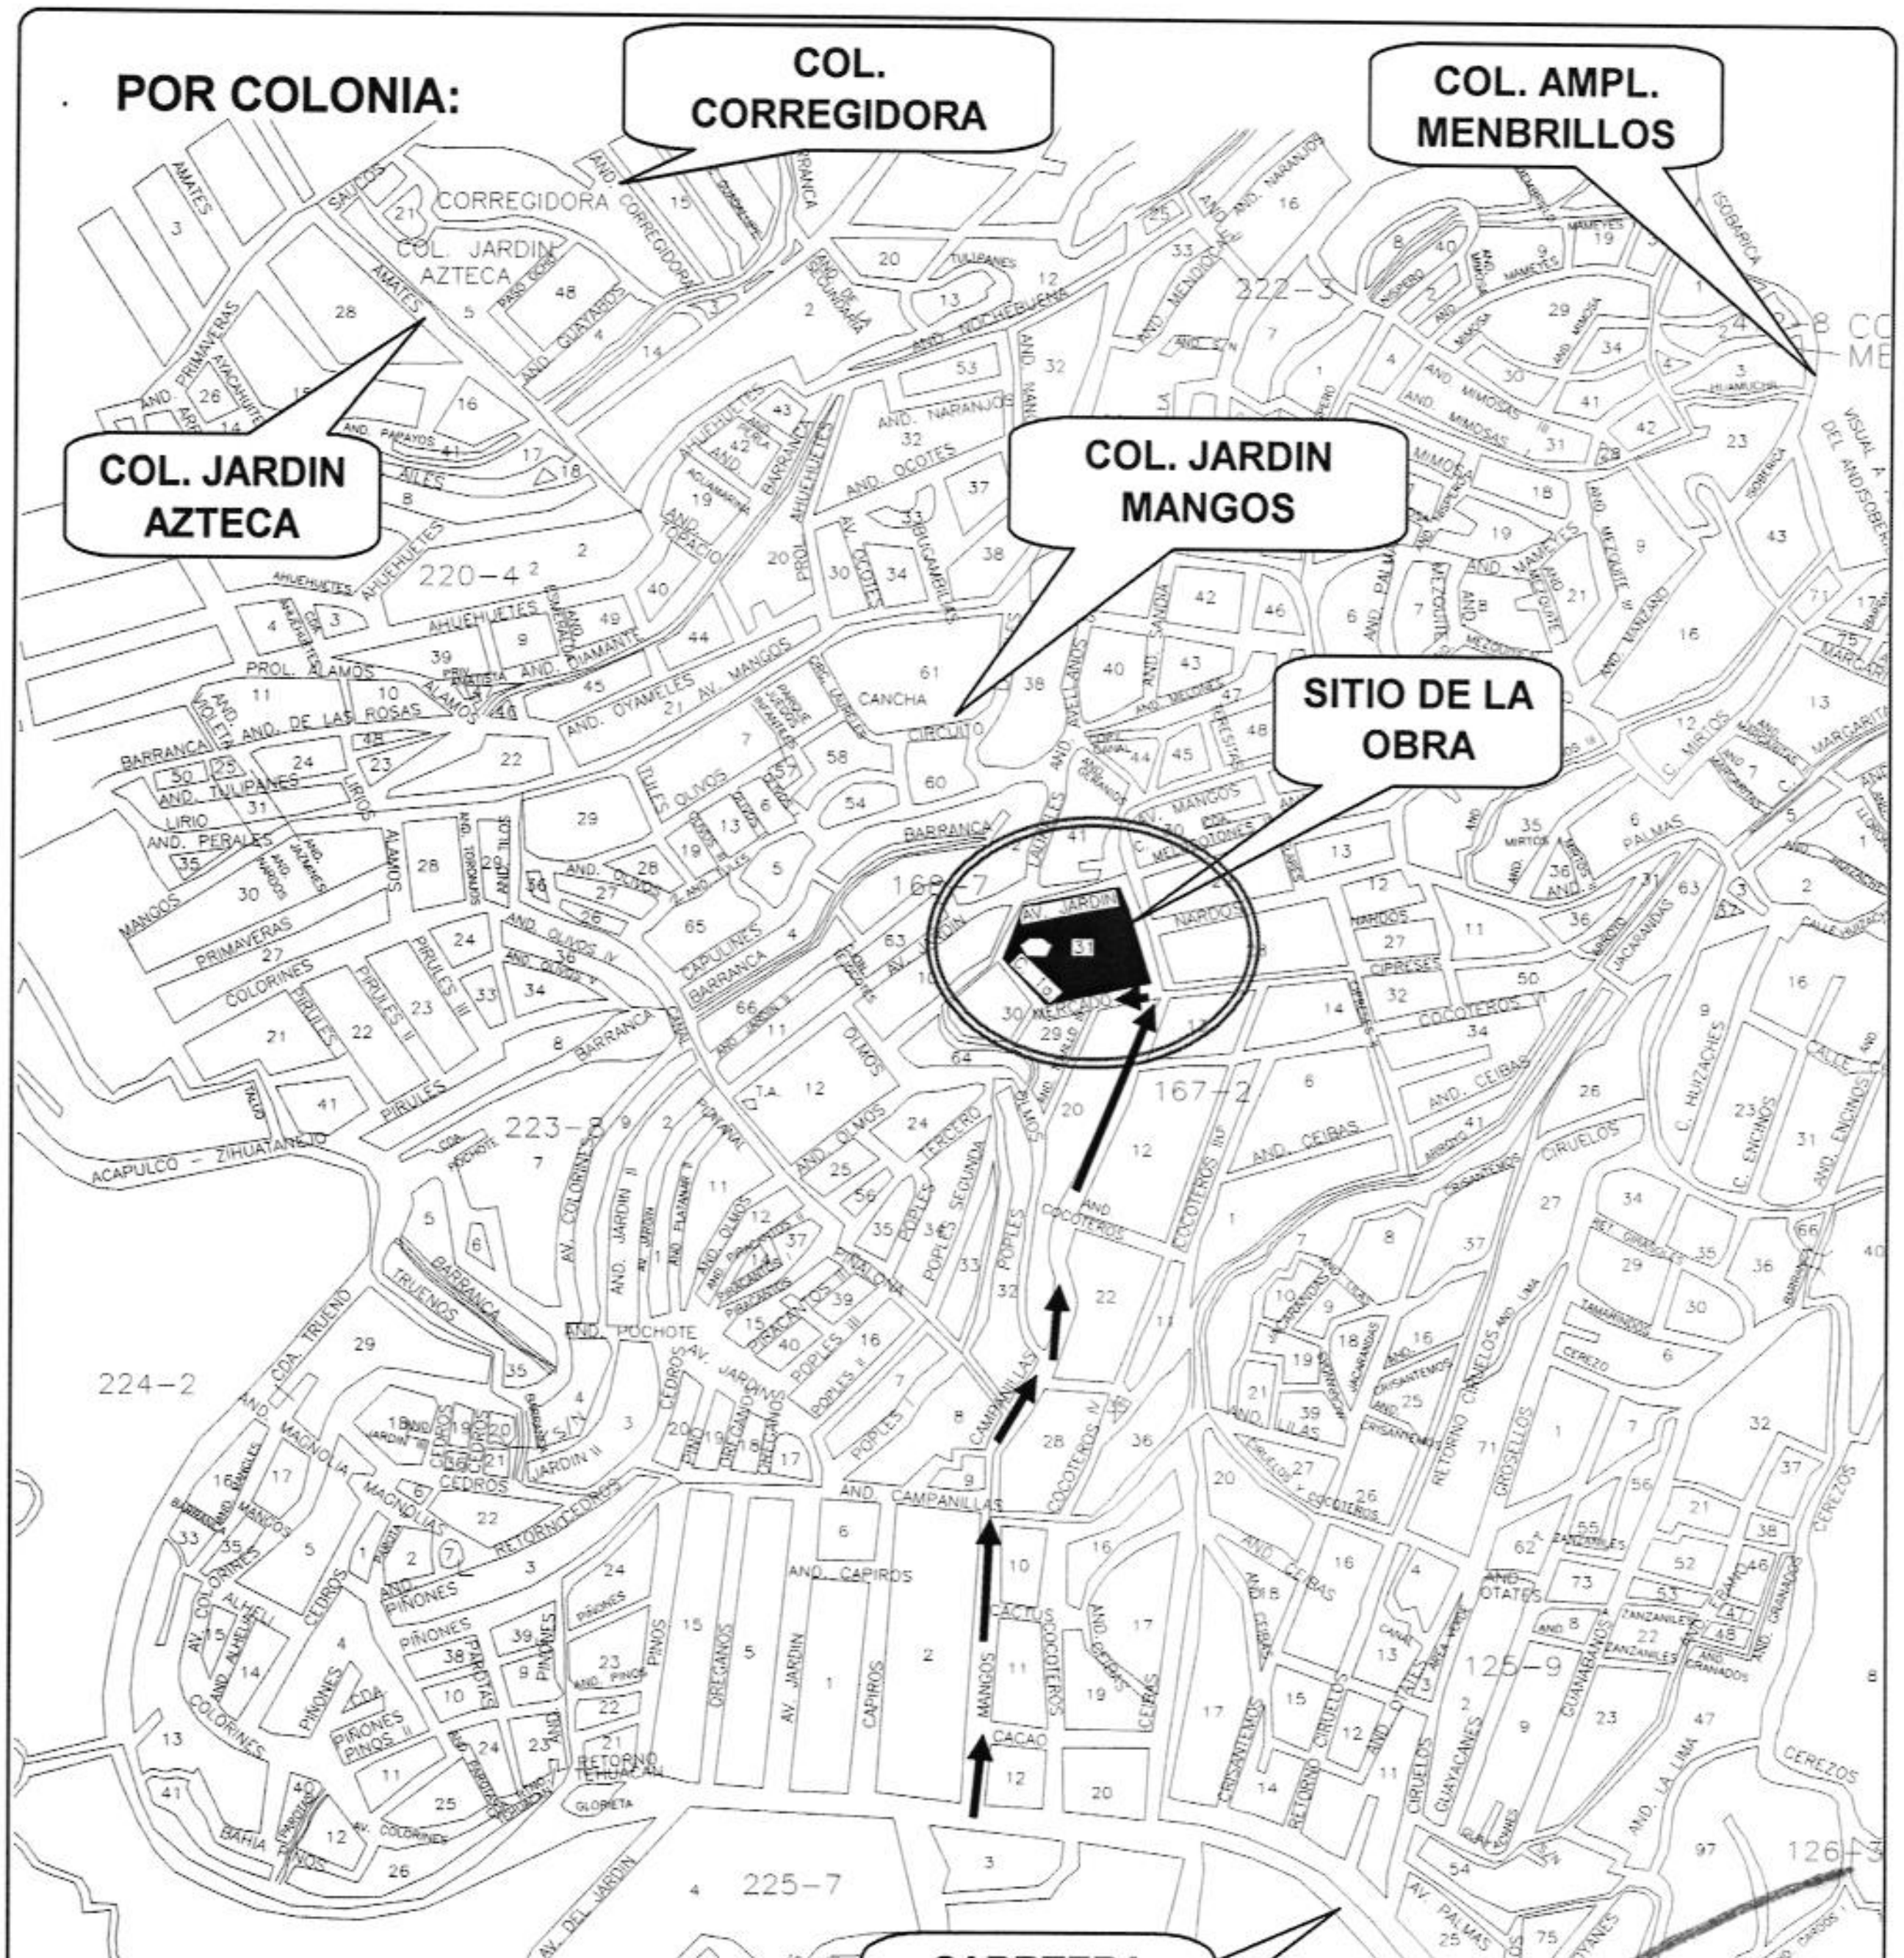

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ: CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 4

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS

POR REFERENCIA:

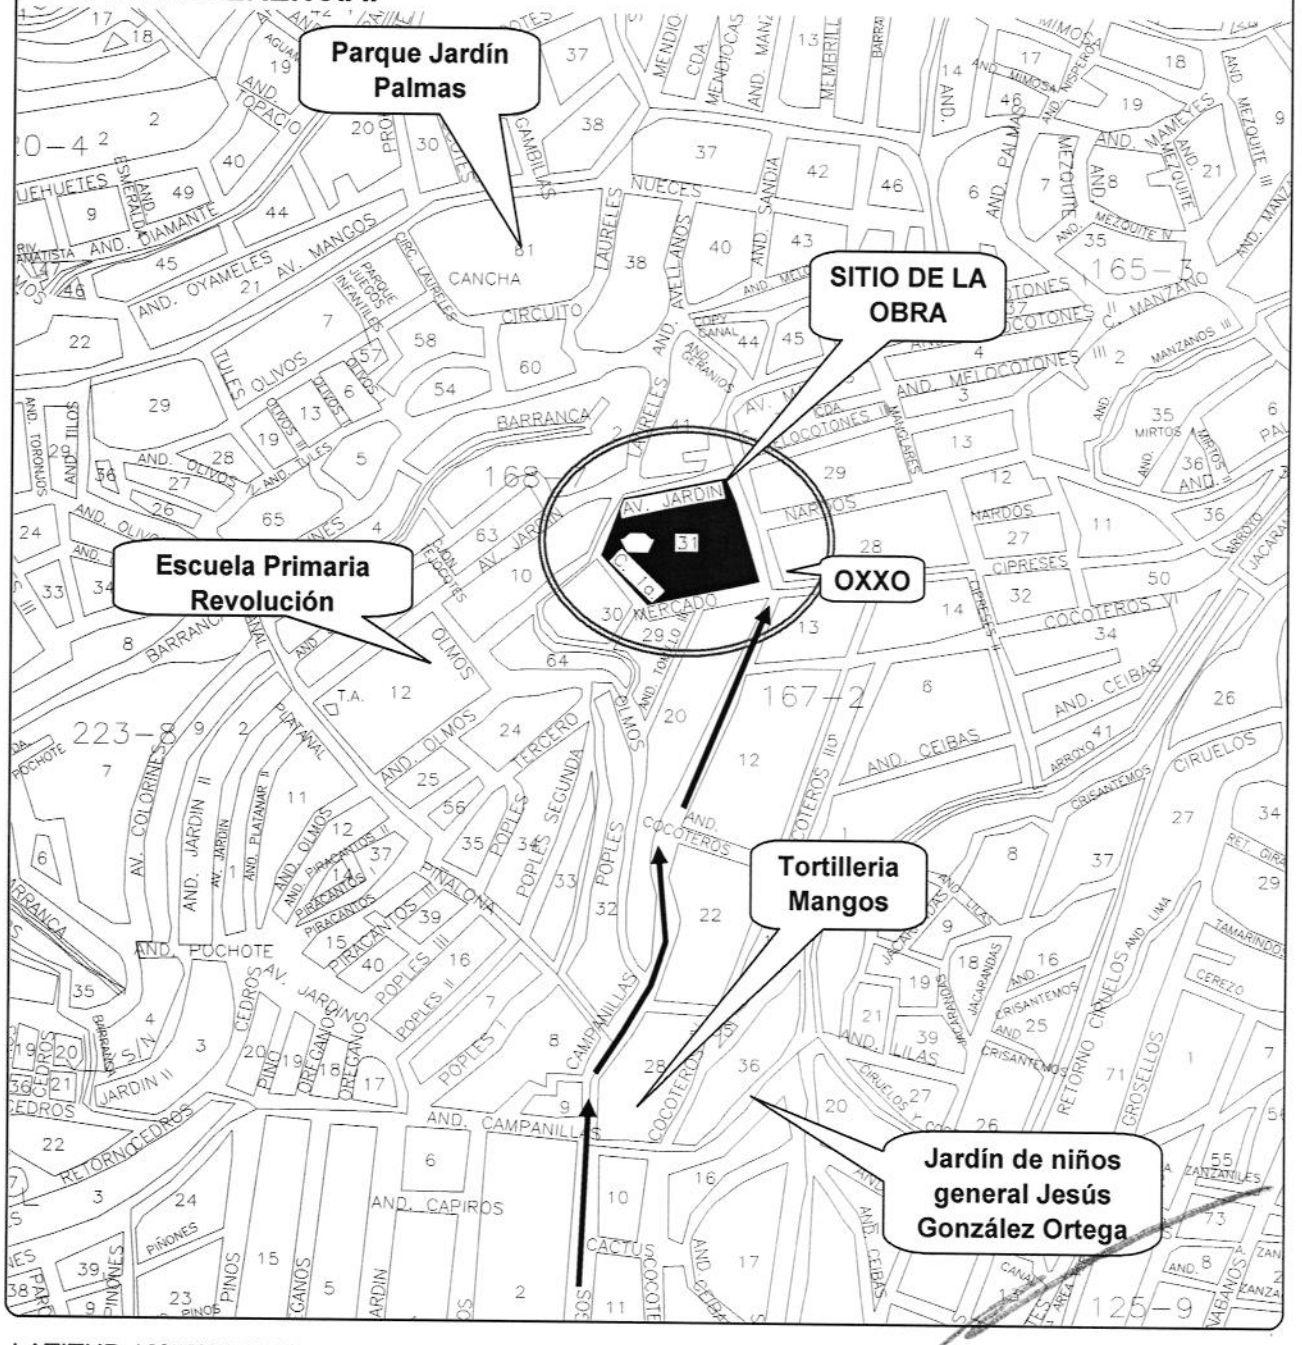

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ: CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION - 5

OBRA-. REHABILITACION DE PARQUE PÚBLICO JARDIN MANGOS
REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01-ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: COL. JARDIN MANGOS


POR CALLES Y AVENIDAS:

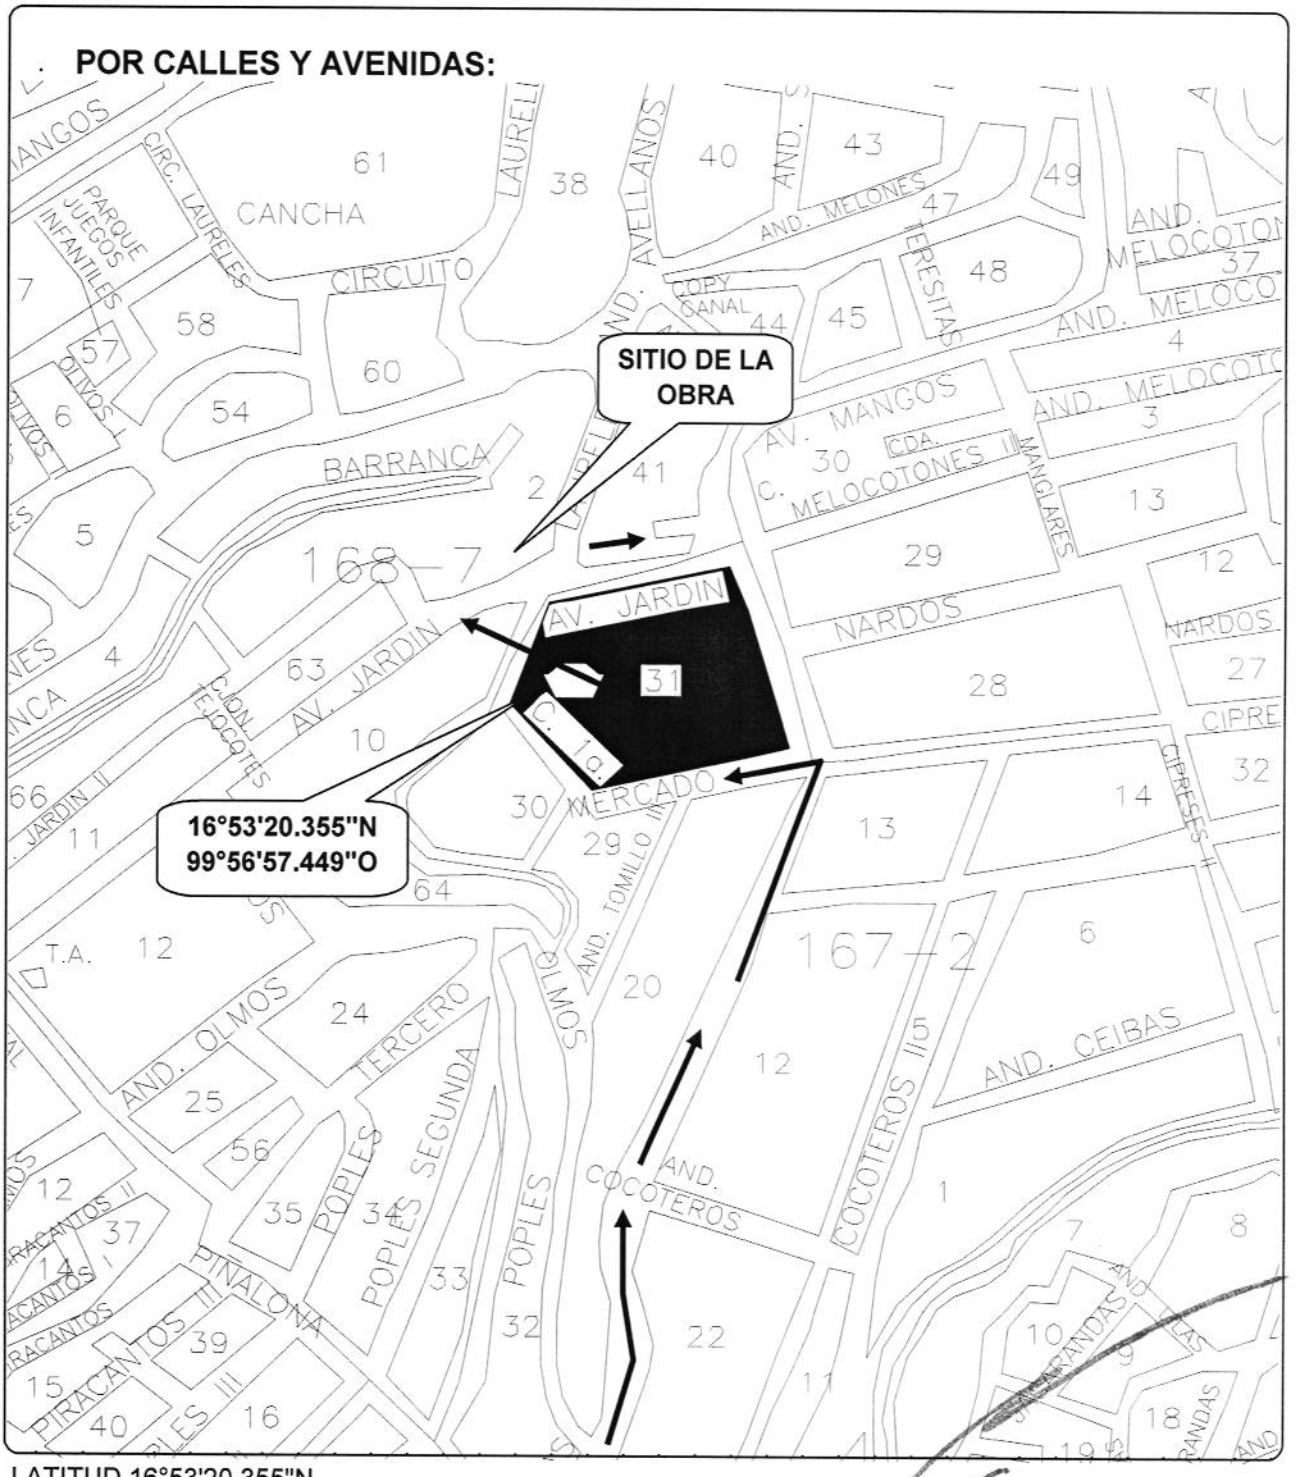

LATITUD 16°53'20.355"N
LONGITUD 99°56'57.449"O

JEFE DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA URBANA Y SUBURBANA ARQ: CARLOS ALEJANDRO RODRIGUEZ ROBLES

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

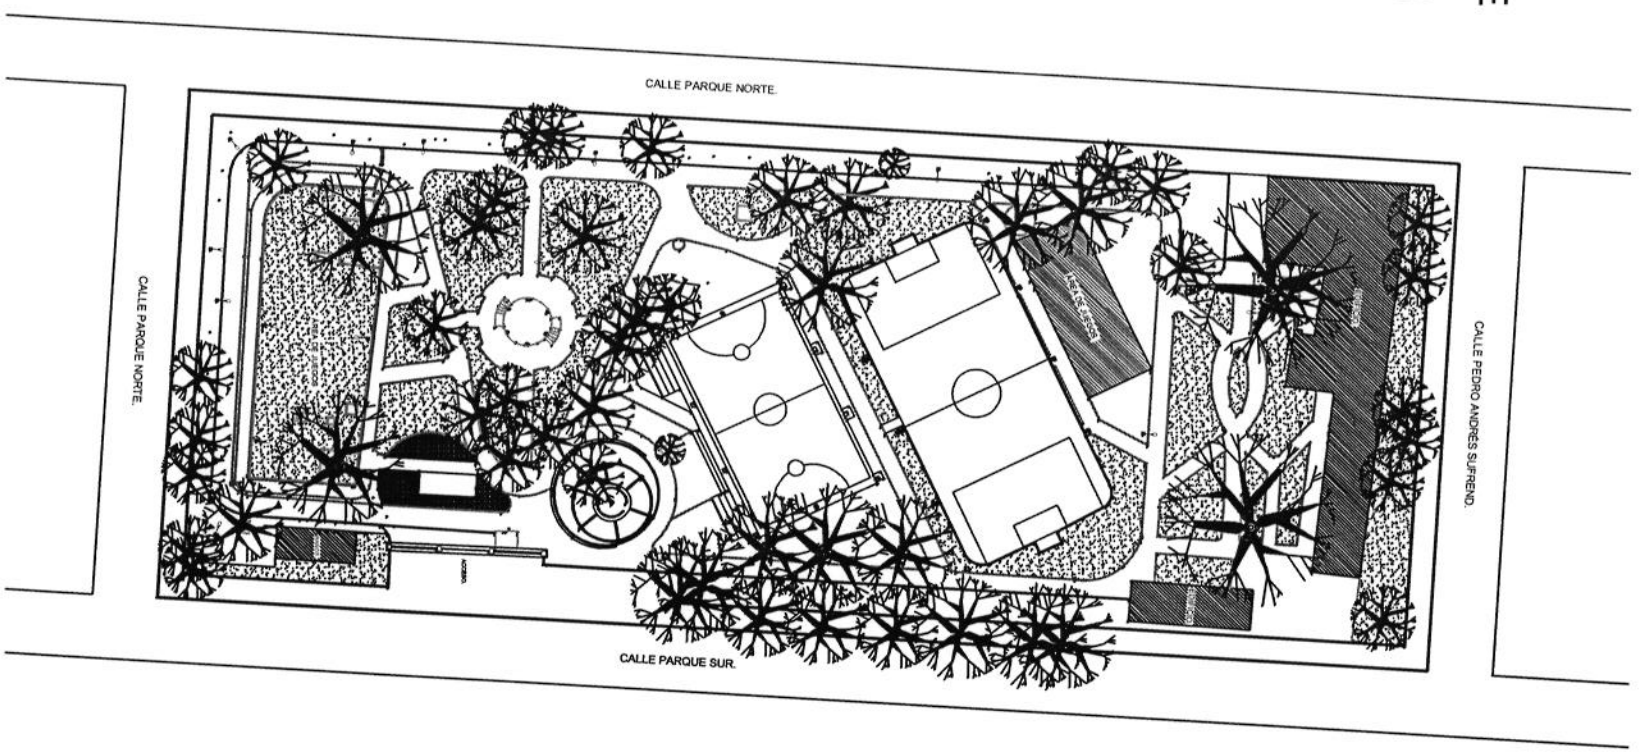

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MICROLOCALIZACIÓN

NOTAS:
Equipo utilizado: Estacion Total marca hi target hts-226R
Sistema de Posicionamiento Global (GPS).
Marca MAGELLAN Promark 3
Referenciado a la Red Geodésica Nacional Activa
Datum Cartografico: ITRF2008 época 2010.0
Sistema Geodésico de Referencia Oficial para México, publicado el 23 de diciembre de 2010 en el DOF.
Esferoide: GRS80 Proyección: UTM
Derivado de la Red Nacional Activa del INEGI

SIMBOLOGIA :



SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

NOMBRE DE LA OBRA:
REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO JARDIN MANGOS

UBICACIÓN:
COL. JARDIN MANGOS

FECHA: 10/OCTUBRE/2022

ESCALA: S/E ACOTACIÓN: METROS

NOMBRE DE PLANO: TOPOGRAFICO

CLAVE DEL PLANO: TOP-1
