H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

~~**ANTICIPO**~~

EST. 1 FINIQUITO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCIÓN" CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS .**

UBICACIÓN: **1.- POB. LA CONCEPCIÓN.**

CONTRATISTA: **BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 1992**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0098**

NUMERO DE (AGEB) **: 12001 0098 1992**

ORIGINAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**

OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCIÓN " CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA CONCEPCIÓN.**

CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	21-dic.-23	BOMBAS SUÁREZ., S.A DE C.V. FACT. No. 2394F	696,044.08	351,022.23	345,021.85
		SUBTOTAL $	**696,044.08**	**351,022.23**	**345,021.85**
		TOTAL $	**696,044.08**	**351,022.23**	**345,021.85**

jueves 21 de diciembre de 2023

2588

RFC emisor:	BSU000404GJ7	**Folio fiscal:**	35BF027A-B397-44DF-B0EA-6EF4A7E2394F
Nombre emisor:	BOMBAS SUAREZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000505879312
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	11850 2023-12-21 22:36:39
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Otra maquinaria y equipo.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
70171704		1.00	ACT	Actividad	600,038.00	600,038.00	300,019.00	Sí objeto de impuesto.

Descripción: ESTIMACION No. 01 (UNO Y FINIQUITO) NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS UBICADA EN POB. LA CONCEPCION CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/349 -2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	300,019.00	Tasa	16.00%	48,003.04

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 600,038.00
Forma de pago:	Por definir	**Descuento**		$ 300,019.00
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 48,003.04
		Total		**$ 345,021.85**

Complemento de Impuestos locales (V1.0):

Monto total retenido:		
3000.19		
Impuesto Local Retenido	**Tasa de Retención**	**Importe**
5% AL MILLAR	0.50 %	3000.19

OPERADO
FAISMUN - 2023

Sello digital del CFDI:

gJlry3w52X1G+U8WDozl+JCT6iQ9qpCUpP1qmDrgRUJjcvdVAp5cwVgaxTxBUEiREV4/8uyHV7pTylYDEHihZ2AFMKeAGv+50FAvStNrpAuG2KebvLgD6FTAVoG0f561eYr0tGYXWuH4NG
APYXJ6oC+VSGJ+C6rVpV+VHYT0Y+QbGmnUM0CRcmkKazlS39nu/feobPixMEjlyrTtlsNJe0zoarXZd4koGANWNr7y8gHJuJV8YFGN5KRSsMTF6Ae8lXpPR1h8wVR34XVce4K4gdKgmC/
ryazgk8P9lcfe4WspFORvKFSLXVl0qbDYSfZH/YgjewpA9HhmJjfFDrUI8Q==

Sello digital del SAT:

fVvkb1qujytAAtFjly5eDpPAIHOCR6S6qmfRrDjKtbSq8pVMbiINkzZmXYVkIC8LRgh63/16EgMat/+vu7a/FyKZJ0tEJIIjxMKKD1zmp8dRAGTLQI/sAJtNdx2DOZZ9JJ0lBtyvwralxZyl+W66yxtKw
zMvj9nt0RU8SQFsDI/dw6zliQ0QC7EtBPaFF2xEKw22JABGlstUlwNC0fOYGxMSrCoU/tTDUvqwp4pd6y9diA7+AzA2FCFd/qo8x+GQ0pDFTXTVtnY8l+j4xmV+WFkDTJHko1qTJGN/AFnwm
WQhiU+5H0SAjOme/QC8ZaSg6YuvvO44VaUt/wqNTxTFXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35BF027A-B397-44DF-B0EA-6EF4A7E2394F|2023-12-21T22:37:05|SAT970701NN3|gJlry3w52X1G+U8WDozl+JCT6iQ9qpCUpP1qmDrgRUJjcvdV
Ap5cwVgaxTxBUEiREV4/8uyHV7pTylYDEHihZ2AFMKeAGv+50FAvStNrpAuG2KebvLgD6FTAVoG0f561eYr0tGYXWuH4NGAPYXJ6oC+VSGJ+C6rVpV
+VHYT0Y+QbGmnUM0CRcmkKazlS39nu/feobPixMEjlyrTtlsNJe0zoarXZd4koGANWNr7y8gHJuJV8YFGN5KRSsMTF6Ae8lXpPR1h8wVR34XVce4K4gdK
gmC/ryazgk8P9lcfe4WspFORvKFSLXVl0qbDYSfZH/YgjewpA9HhmJjfFDrUI8Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-21 22:37:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C. BSU000404GJ7

OPERADO
FAISMUN - 2023

JOAQUIN A. PEREZ No. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CD. DE MEXICO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES C.P. 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
R.F.C: MAJ-010101-NA3.

NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACIÓN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO.

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023
METAS PROGRAMADAS: 1.00 EQUIPO
TIPO DE OBRA: OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO
CONTRATO No. **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.**
IMPORTE DEL CONTRATO GLOBAL CON IVA $1,638,121.03
IMPORTE DEL CONTRATO INDIVIDUAL CON IVA $696,044.08

PERIODO ESTIMADO: DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023
METAS ALCANZADAS: 1.00 EQUIPO
No. DE OBRA: MAJ/349
FECHA DE CONTRATO 26 DE JULIO DEL 2023.
IMPORTE DEL ANTICIPO GLOBAL CON IVA $819,060.52
IMPORTE DEL ANTICIPO INDIVIDUAL CON IVA $348,022.04

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** LA CANTIDAD DE: **$ 345,021.85 (TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 85/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PAGO **DE LA ESTIMACIÓN No. 01 (UNO Y FINIQUITO)** DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023 DE LA OBRA: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**, DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.**

DEDUCCIONES

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	$348,022.04
5 AL MILLAR DE INSP. DE OBRA:	$ 3,000.19
TOTAL DE DEDUCCIONES:	$351,022.23

CALCULO DE LA ESTIMACIÓN

IMPORTE ESTIMACIÓN C/IVA:	$696,044.08
MENOS DEDUCCIONES:	$351,022.23
SALDO APAGAR:	$345,021.85

CONSTRUCTORA

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNADEZ ALEMÁN
Por acuerdo delegatorio de fecha 15/noviembre/2023
SRIO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ

SUBTOTAL	$	300,019.00
RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	$	3,000.19
IVA	$	48,003.04
TOTAL	$	**345,021.85**

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 85/100 M.N.)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.


```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cartaporte30="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte30" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
Version="4.0" Fecha="2023-12-21T22:36:39"
Sello="gJlry3w52X1G+U8WDozl+JCT6iQ9qpCUpP1qmDrgRUJjcvdVAp5cwVgaxTxBUEiREV4/8uyHV7pTyIYDEHihZ2AFMKeAGv+50FAvStNrpAuG2KebvLgD6FTAVoG0f561eYr0tGYXWuH4NGAPYX
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505879312"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU4NzkzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklD
SubTotal="600038.00" Descuento="300019.00" Moneda="MXN" Total="345021.85" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="11850">
  <cfdi:Emisor Rfc="BSU000404GJ7" Nombre="BOMBAS SUAREZ" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="MAJ010101NA3" Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" DomicilioFiscalReceptor="39350" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I08"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="70171704" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ACT" Unidad="Actividad" Descripcion="ESTIMACION No. 01 (UNO Y FINIQUITO) NOMBRE
    DE LA OBRA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS UBICADA EN POB. LA CONCEPCION CON CARGO AL
    FONDO III-RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/349 -2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 05 DE
    AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023" ValorUnitario="600038" Importe="600038.00" Descuento="300019.00" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="300019.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="48003.04"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="48003.04">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="300019.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="48003.04"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="3000.19" TotaldeTraslados="0.00">
      <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="5% AL MILLAR" TasadeRetencion="0.50" Importe="3000.19"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="35BF027A-B397-44DF-B0EA-6EF4A7E2394F"
    FechaTimbrado="2023-12-21T22:37:05" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="gJlry3w52X1G+U8WDozl+JCT6iQ9qpCUpP1qmDrgRUJjcvdVAp5cwVgaxTxBUEiREV4/8uyHV7pTyIYDEHihZ2AFMKeAGv+50FAvStNrpAuG2KebvLgD6FTAVoG0f561eYr0tGYXWuH
    NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
    SelloSAT="fVvkb1qujytAAtFjly5eDpPAIHOCR6SGqmfRrDjKtbSq8pVMbiINkzZmXYVklC8LRgh63/16EgMat/+vu7a/FyKZJ0tEJIljxMKKD1zmp8dRAGTLQI/sAJtNdx2DOZZ9JJ0IBtyvwra
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BSU000404GJ7	BOMBAS SUAREZ	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
35BF027A-B397-44DF-B0EA-6EF4A7E2394F	2023-12-21T22:36:39	2023-12-21T22:37:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$345,021.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
FAISMUN - 2023

Imprimir

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTIMACION No. **01 (UNO Y FINIQUITO)**
NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACIÓN:	1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO	TIPO DE OBRA: **AGUA POTABLE**	DEL: **05 de agosto de 2023**
CONTRATISTA: **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL: **23 de octubre de 2023**

IMPORTE DEL CONTRATO GLOBAL CON IVA	**$ 1,638,121.03**	FECHA: **23 de octubre de 2023**	
IMPORTE DEL CONTRATO INDIVIDUAL CON IVA	PERIODO DEL CONTRATO	IMPORTE DEL ANTICIPO (CON IVA)	FECHA DE ANTICIPO
$ 696,044.08	**DEL 05 DE AGOSTO AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023**	**$ 348,022.04**	**31 de julio de 2023**

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (UNO Y FINIQUITO)	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023	600,038.00	96,006.08	0.00	3,000.19	348,022.04	351,022.23	345,021.85
	TOTAL	**600,038.00**	**96,006.08**	**0.00**	**3,000.19**	**348,022.04**	**351,022.23**	**345,021.85**
	SALDO	**$0.00**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$0.00**		

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas

Siendo el día 23 del mes de octubre del año 2023, a las 11:50 horas en el domicilio Pob. la concepción, localizado en el municipio Acapulco de Juarez, de la entidad federativa Guerrero, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	23 de octubre del 2023		
Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBOS. POB. LA CONCEPCIÓN.			
Folio asignado en la MIDS: 255146		Monto total planeado: $696,044.08	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 05 de Agosto	Fecha de conclusión: 23 de oct / 2023	
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco	Localidad: POB. la concepción	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.

COMISARIA MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN Jul 2023 Jun 2024

GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
DIRECCION DE PLANEACION

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE Acapulco de Juarez

M.C. Alejandro Diaz Lopez
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

COMISARIA MUNICIPAL
Jul 2023 Jun 2024
LA CONCEPCIÓN
GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juarez, Gro.

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Constantino Zotero Santos
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Guillermina Balente Flores
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Gaudencio Manzanarez-M
Vocal
Nombre completo y firma

JOSE OMAR BARTON MONTAÑEZ
Vocal
Nombre completo y firma

SAUL BASILIO del Prado
Vocal
Nombre completo y firma

Mª Zila Santiago S.
Testigo
Nombre completo y firma

Claudia Baleriano Francisco
Testigo
Nombre completo y firma

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado: 23 de octubre 2023		
Nombre de la obra: Equipamiento en Pozo de Agua "La concepción"		
Folio asignado en la MIDS: 255146	Monto total planeado: $696,044.08	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 05/Agosto/23	Fecha de conclusión: 23/oct/23
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco	Localidad: Pob. la concepción.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

4.2. REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR LOS COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
*Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

1. Indiquen el número veces que visitaron la obra durante su inicio, desarrollo y conclusión:

[1]

2. ¿La obra concluyó en la fecha en que informó la autoridad local?

a) Sí. [✓]
b) No, concluyó antes de la fecha informada. [ ]
c) No, concluyó después de la fecha informada. [ ]
d) No ha concluido. [ ]

2a. ¿En caso de que la obra no esté concluida, qué fecha tentativa informó la autoridad local para su conclusión?

---

3. ¿Ustedes (CPS) estuvieron presentes en la entrega de la obra? Sí [✓] No [ ]

3a. En caso de responder que no, ¿por qué no estuvieron presentes?

---

4. ¿La obra se entregó terminada y funcionando? Sí [✓] No [ ]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

COMISARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Jul 2023 Jun 2024
LA CONCEPCIÓN

GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Grp.

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4a. En caso de responder que no, ¿por qué no se terminó o por qué no funciona la obra?

5. ¿Ustedes (CPS) recibieron por parte de la autoridad local el acta entrega- recepción? Sí [✓] No [ ]

6. ¿La autoridad local colocó la placa de conclusión de la obra? Sí [✓] No [ ]

7. De los siguientes mecanismos, tachen aquellos que utilizaron para comunicar a la ciudadanía las actividades de seguimiento a las obras del FAISMUN:

a) No las comunicaron. [ ]
b) Juntas vecinales o comunitarias. [✓]
c) Carteles informativos. [ ]
d) Perifoneo (altavoces, etc.). [ ]
e) A través de redes sociales (Facebook, grupos de WhatsApp, etc.). [ ]
f) Otros. [ ]

7a. Si se utilizaron otros mecanismos, ¿cuáles fueron?

8. Mencionen dos resultados o beneficios obtenidos en su comunidad con el trabajo realizado por ustedes a través de su participación en el CPS del FAISMUN.

El Agua podra llegar hasta nuestras casas

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE [illegible]

COMISARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Jul 2023 Jun 2024
LA CONCEPCIÓN
GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPCIÓN SOCIAL

Constantino Solano Santos
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Guillermina Balente Flores
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Gabriela
Gaudencio Manzanarez A
Vocal
Nombre completo y firma

JOSE OMAR SOTO MANZANAREZ
Vocal
Nombre completo y firma

Saul
SAUL AGATON DELGADO
Vocal
Nombre completo y firma

Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

COMISARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Jul 2023 Jun 2024
LA CONCEPCIÓN
GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T A D O D E C U E N T A

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ			ESTIMACION No. **01 (UNO Y FINIQUITO)**
NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACIONES:	**1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION** 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO	TIPO DE OBRA: **AGUA POTABLE**	DEL: **05 de agosto de 2023**
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL: **23 de octubre de 2023**
IMPORTE DEL CONTRATO GLOBAL CON IVA	$ **1,638,121.03**	FECHA: **23 de octubre de 2023**	
IMPORTE DEL CONTRATO INDIVIDUAL CON IVA	$ **696,044.08**	PERIODO DEL CONTRATO	FECHA DE ANTICIPO
IMPORTE DEL ANTICIPO GLOBAL (CON IVA)	$ **819,060.52**	**DEL 05 DE AGOSTO AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2023**	**31 de julio de 2023**
IMPORTE DEL ANTICIPO INDIVIDUAL (CON IVA)	$ **348,022.04**		

ESTIMACION	PERIODO ESTIMACION	IMPORTE ESTIMACION	IVA	5 AL MILLAR C.M.I.C	5 AL MILLAR INSP. DE OBRAS	AMORTIZACION ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01 (UNO Y FINIQUITO)	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023	600,038.00	96,006.08	0.00	3,000.19	348,022.04	351,022.23	345,021.85
	TOTAL	**600,038.00**	**96,006.08**	**0.00**	**3,000.19**	**348,022.04**	**351,022.23**	**345,021.85**
	SALDO	**$0.00**		**SALDO POR AMORTIZAR**		**$0.00**		

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA
ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

R E S U M E N D E L A E S T I M A C I Ó N

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	**POB. LA CONCEPCION**	DEL:	05 de agosto de 2023
NOMBRE DE LA OBRA:	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**	FECHA:	**23 de octubre de 2023**	AL:	23 de octubre de 2023
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	ESTIMACION No.	01 (UNO Y FINIQUITO)
		TIPO DE OBRA:	**AGUA POTABLE**		

No.	P A R T I D A	IMPORTE
A	**MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION**	
A01	**BOMBAS Y EQUIPOS**	**$ 600,038.00**
	TOTAL DE PARTIDAS $	**600,038.00**
	SUBTOTAL $	**600,038.00**
	16 % IVA $	**96,006.08**
	TOTAL $	**696,044.08**

LA PRESENTE ESTIMACION IMPORTA LA CANTIDAD DE: $696,044.08 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTAY CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

AVANCE FISICO 100.00%

AVANCE FINANCIERO ANTERIOR 0.00%
AVANCE FINANCIERO ACTUAL 100.00%
AVANCE FINANCIERO TOTAL 100.00%

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA
ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

BIENESTAR

E S T I M A C I Ó N

ESTIMACIÓN: 01 (UNO Y FINIQUITO)

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		UBICACIÓN:	POB. LA CONCEPCION
NOMBRE DE LA OBRA:	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS	FECHA:	23 de octubre de 2023
CONTRATISTA:	BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
		TIPO DE OBRA:	AGUA POTABLE

DEL: 05 de agosto de 2023

AL: 23 de octubre de 2023

HOJA: 1 DE: 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VOLUMENES					IMPORTE ESTIMADO
				PRESUPUESTO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM	ACUMULADO	EXCEDENTE	
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION								
A01	BOMBAS Y EQUIPOS								
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)	PZA	33,339.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	33,339.00
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"	PZA	23,158.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	23,158.00
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	490,741.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	490,741.00
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	8,800.00	6.00	1.00	6.00	7.00	-1.00	52,800.00
	TOTAL BOMBAS Y EQUIPOS								**$ 600,038.00**
								TOTAL ESTIMADO ===>>>	**$ 600,038.00**

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA
ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DERARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO I

No. DE OBRA:	MAJ/349	NOMBRE DE LA OBRA:	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS	CONSTRUCTORA:	
LOCALIDAD:		POB. LA CONCEPCION	MUNICIPIO:	ACAPULCO DE JUÁREZ ,GRO	No. DE CONTRATO:
ESTIMACIONES QUE AMPARAN EL FINIQUITO:		ESTIMACION No. 01 (UNO Y FINIQUITO)	MONTO GLOBAL CONTRATADO:		MONTO INDIVIDUAL CONTRATADO: $
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:		ADJUDICACIÓN DIRECTA	$	1,638,121.03	MONTO TOTAL ESTIMADO: $

CLAVE	CONCEPTO / PARTIDAS	UNIDAD DE MEDIDA	CONTRATADO			ESTIMADO			VOLUME	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	PREC
A	**MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION**									
A01	**BOMBAS Y EQUIPOS**									
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)	PZA	1.00	33,339.00	33,339.00	1.00	33,339.00	33,339.00	0	3
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"	PZA	1.00	23,158.00	23,158.00	1.00	23,158.00	23,158.00	0	2
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	1.00	490,741.00	490,741.00	1.00	490,741.00	490,741.00	0	49(
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	6.00	8,800.00	52,800.00	6.00	8,800.00	52,800.00	0	8
	TOTAL BOMBAS Y EQUIPOS				600,038.00			600,038.00		
				SUBTOTAL	600,038.00			600,038.00		
				IVA	96,006.08			96,006.08		
				TOTAL	**696,044.08**			**696,044.08**		

SE EXTIENDE EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OB

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA **23 DE OCTUBRE DE 2023** Y HABIÉNDOSE VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** CONSISTENTE EN **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

SE PROCEDE A LEVANTAR LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA BAJO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES: LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ANTES CITADO, FUERON REALIZADOS POR LA EMPRESA DENOMINADA: BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V., HABIENDO ESTADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRA Y RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS MISMOS POR PARTE DE DICHA EMPRESA, EL: **ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO,** POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, ESTUVO COMO RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN Y VERIFICIACIÓN DE LA CORRECTA REALIZACIÓN DE LA OBRA EL: **ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ,** EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INDIVIDUAL FUE DE **$ 696,044.08 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.), IVA INCLUIDO**, EL IMPORTE TOTAL GLOBAL FUE DE **$ 1,638,121.03 (UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.)** I.V.A. INCLUIDO SIN HABER EXISTIDO NINGUN CONVENIO ADICIONAL.

EL PERIODO ORIGINAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ESPECIFICADO EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA FUE EL SIGUIENTE:

FECHA DE INICIO: **05 DE AGOSTO DE 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN**: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023.**

EL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE EL SIGUIENTE:
FECHA DE INICIO: **05 DE AGOSTO DE 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN: **23 DE OCTUBRE DE 2023.**

LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE REALIZARON A LA FECHA DE ESTA ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION SON LOS SIGUIENTES:

ESTIMACION No.: 0**1 (UNO Y FINIQUITO)** FECHA DE INICIO: **05 DE AGOSTO DE 2023.**
FECHA DE TERMINACIÓN: **23 DE OCTUBRE DE 2023**.
$ 696,044.08 IVA INCLUIDO

SE HACE CONSTAR EN ESTA ACTA POR AMBAS PARTES, QUE TODOS LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ENCUENTRAN EN PODER DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

ASÍ TAMBIÉN, SE MANIFIESTA QUE CON ESTA FECHA, INICIA EL PLAZO DE DOCE MESES EN EL QUE LA EMPRESA: **BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.** QUEDA OBLIGADA A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO NUM.: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO Y EN LA LEGISLACIÓN APLICABLE, QUEDANDO COMO GARANTÍA DE LO ANTES SEÑALADO, LA FIANZA NUM. **2880864,** EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA:

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A,

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA PÚBLICA

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

-SE SUMINISTRO, INSTALO Y PROBO 01 BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

-SE SUMINISTRO, INSTALO Y PROBO 01 CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

-SE SUMINISTRO, INSTALO Y PROBO 01 CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2" EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL MÁRGEN Y AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

MOT. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

M.D. MELISA CALDERÓN BAUTISTA.
REPRESENTANTE LEGAL

POR EL H. AYUNTAMIENTO:

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA ZONA RURAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

CON FUNDAMENTO EN EL PARRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL ARTICULO 172 DE SU REGLAMENTO; SE PROCEDE A LEVANTAR ESTA ACTA ADMINISTRATIVA EN LA CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No.: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** RELATIVO A LA OBRA **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: BOMBA SUÁREZ S.A DE C.V.

INFORMACION BASICA INICIAL

ÁREA ENCARGADA DE LA OBRA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

OBJETO DEL CONTRATO: " EL ORGANISMO " encomienda a **" EL CONTRATISTA"** la realización de una obra consistente en **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS,** en el **POB. LA CONCEPCION,** y este se obliga a realizar hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de Declaraciones de **" EL CONTRATISTA "**, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

ENTIDAD FEDERATIVA DONDE SE LOCALIZAN LOS TRABAJOS: GUERRERO.

ANTECEDENTES:

NÚMERO DEL OFICIO DE AUTORIZACION:

FECHA DE ADJUDICACION: 26 DE JULIO DE 2023.

NUMERO DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD

FECHA INICIACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 05 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA TERMINACIÓN SEGÚN BITÁCORA DE OBRA: 23 DE OCTUBRE DE 2023.

I.- EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SIENDO LAS **11:30** HORAS DEL DIA **13 DE NOVIEMBRE DE 2023**, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA RESIDENCIA DE OBRA, CITA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N COL. CENTRO C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.

II.- QUE PARA REALIZAR EL ACTO SEÑALADO SE ENCUENTRA REUNIDAS LAS PERSONAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, LOS SERVIDORES PUBLICOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS EN SU PERSONALIDAD Y ACTUANDO CONFORME A LA DELEGACION DE FACULTADES EN PRESENTACION **M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,** ARQ. CARLOS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROBLES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA URBANA Y SUBURBANA Y/O ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL. **Y VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y POR LA OTRA PARTE PERSONA FISICA O MORAL BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA,** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL.

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN.

INFRAESTRUCTURA: -SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 01 BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 01 CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBA DE 01 CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2" EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" UBICADO EN POB. LA CONCEPCION

SUB-ESTRUCTURA
SUPERESTRUCTURA
TERRACERIAS
PAVIMENTOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS:

IV.- DESCRIPCION DE LAS MODIFICACIONES.

MEDIANTE ESCRITO DE FECHA_____, LA EMPRESA CONTRATISTA SOLICITA MEDIANTE OFICIO, SE LE AUTORICE LA EJECUCION DE CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NO CONTEMPLADOS EN EL CATALAGO DE CONCEPTOS ORIGINAL DEL CUAL SE AUTORIZO MEDIANTE NOTA DE BITACORA _____., REFERENTE.. _____ ,ASI COMO TAMBIEN, OBRA ADICIONAL EN LOS CONCEPTOS _____.

RELACION DE OBLIGACIONES Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON.

FIRMA DE CONTRATO: 26 DE JULIO DEL 2023
FIRMA DE CONVENIO:
ANTICIPO: 31 DE JULIO DEL 2023

FIANZAS:

CONTRATO

- DE CUMPLIMIENTO: **2880864** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2023.**
- DE ANTICIPO: **2880826** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2023.**
- DE VICIOS OCULTOS: **2880864** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2023.**

CONVENIO

- DE CUMPLIMIENTO: _____ DE FECHA _____
- DE ANTICIPO: _____ DE FECHA _____
- DE VICIOS OCULTOS: _____ DE FECHA _____

TERMINACION DE TRABAJOS: 23 DE OCTUBRE DEL 2023
FINIQUITO: 23 DE OCTUBRE DEL 2023
ENTREGA - RECEPCION: 23 DE OCTUBRE DEL 2023

MONTO DEL CONTRATO GLOBAL ORIGINAL: $ 1,638,121.03 I.V.A INCLUIDO.
MONTO DEL CONTRATO INDIVIDUAL: $ 696,044.08 I.V.A INCLUIDO.
MONTO DE LAS AMPLIACIONES:

MONTO TOTAL GLOBAL CONTRATADO: $ 1,638,121.03 I.V.A INCLUIDO
SANCIONES: NO SE PRESENTARON

V.- **LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR CUANTO A LAS FIANZAS No. **2880864** DE FECHA **26 DE JULIO DE 2023** POR CONCEPTO DE VICIOS OCULTOS POR SU PARTE LA PERSONA FISICA O MORAL **BOMBAS SUÁREZ S.A DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. MELISA CALDERÓN BAUTISTA,** EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO SE RESERVA ACCION NI TIENE RECLAMACION ALGUNA CON POSTERIORIDAD A LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA, POR LO CUAL SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA No. **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** Y CONVENIO No.: _____-

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR QUE TRATAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTICION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DIA **13 DE NOVIEMBRE DE 2023** FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMÁN

POR LA EMPRESA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
C.LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL.

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 5 DE AGOSTO DE 2023.

CARTA DE RECEPCION DEL SITIO DE LA OBRA

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN.
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO CONSTAR QUE LA OBRA DENOMINADA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS** UBICADA EN: **POB. LA CONCEPCION** SE INICIA CON FECHA **5 DE AGOSTO DE 2023** POR LO QUE HACEMOS LA RECEPCION DE LA MISMA.

AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA A LA PRESENTE, NOS DESPEDIMOS DE USTED

CONTRATISTA

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO
BOMBAS SUÁREZ, S.A DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACAPULCO, GRO. A 18 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE RECEPCION DE FINIQUITO DE LA OBRA

MELISA CALDERÓN BAUTISTA.
BOMBAS SUÁREZ, S.A DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO QUE SE PRESENTE EL DIA **23 DE OCTUBRE DE 2023** A LAS **14:00 HRS**. EN EL SITIO DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS** UBICADA EN: **POB. LA CONCEPCION** PARA CONCILIAR VOLUMENES DE LA OBRA PARA LA ELABORACION DEL FINIQUITO. CONFORME AL ARTÍCULO 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

Atentamente

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL.

Atentamente

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ
RESIDENTE DE OBRA

C.C.P.- M.I. Vladimir Hernández Alemán. - Director de Obras Públicas.
C.C.P.- Archivo / Minutario.

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

CARTA DE ENTREGA ESTIMACION

ACAPULCO, GRO. A 23 DE OCTUBRE DEL 2023.


M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E


POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. **01 (UNO Y FINIQUITO).** CORRESPONDIENTE A LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS** UBICADA EN **POB. LA CONCEPCION**, CON NÚMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD,** PARA SU REVISIÓN.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

A T E N T A M E N T E

MELISA CALDERÓN BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL


CALDERON
BAUTISTA
MELISA


IDMEX119944101616<<1061023656483
8205199M2412311MEX<03<<08183<0
CALDERON<BAUTISTA<<MELISA<<<<<

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 23 DE OCTUBRE DE 2023.

CARTA DEL REPRESENTANTE TECNICO

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ


P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE LES HAGO ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN DE OBRA No. **01 (UNO Y FINIQUITO).** CORRESPONDIENTE A LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS** UBICADA EN **POB. LA CONCEPCION** CON NÚMERO DE CONTRATO **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**, LA CUAL HA SIDO REVISADA POR EL SUSCRITO COMO REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA ANTE EL MUNICIPIO Y CON LA CUAL ESTOY DE ACUERDO, ASÍ MISMO, CERTIFICO QUE HE REVISADO FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS TERMINADOS COMPRENDIDOS EN ESTA ESTIMACIÓN Y ESTOY DE ACUERDO EN QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDAD REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO.

A T E N T A M E N T E

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO

No. DE CÉDULA PROFESIONAL 7392514

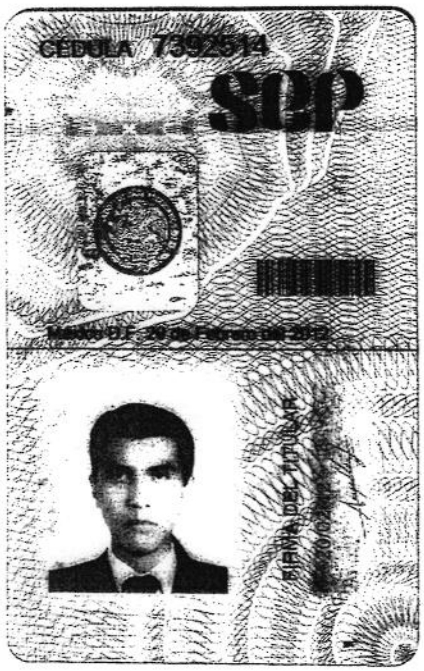
CEDULA 7392514
SEP


SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 23 DE OCTUBRE DEL 2023.

CARTA DE TERMINO DE OBRA

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
P R E S E N T E

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS RESPETUOSA ME DIRIJO A USTED, PARA COMUNICARLE LO SIGUIENTE:

QUE EL CONTRATO **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** DE LA EMPRESA **BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.** RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS** UBICADA EN: **POB. LA CONCEPCION** HA SIDO CONCLUIDA AL **100%** TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE.

POR LA ATENCION QUE SIRVA BRINDAR A LA PRESENTE CARTA, ANTICIPO A USTED LAS GRACIAS

ATENTAMENTE

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880826
MOVIMIENTO
EMISION

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	DOCUMENTO
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 26 DE JULIO DE 2023	3660777

MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$819,060.52	$819,060.52	**PESOS**	14	2317

RAMO	SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS	OBRA

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$819,060.52 (***OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.***)

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, R.F.C. MAJ-010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN JOAQUIN A. PEREZ NO. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO, Y R.F.C. BSU000404GJ7; LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $819,060.52 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARÍA MEREZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: : 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGADA A LA EMPRESA BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DE QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEAA RESCINDIDO EL CONTRATO,
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO NO. 179. DEL CITADO ORDENAMIENTO.
G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADOS DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR. LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL.***
FIN DE TEXTO ***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA



SELLO DIGITAL

0CyfzZpjQtlILIwPMCpVHEwXiB7sofkoTkE3oOIQZi2Ow9IVaqcFR+RJ18rA/0VhUSZon1ywHmKvoZ3QF0AdLLCL5PNWpUOsUvxpW/Uovm4reQivdeS1UnDPltRfBFzUg/Pv6Tw+qXhOVO3xpTE7F63MyMkczj+V0CRPKHA0DxU=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602880826NINPHS** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602880826NINPHS

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0206-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0196-2020."

SOFIMEX®

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

FIANZA:	2880826
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	0602880826NINPHS

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 92 y 183 de la L.I.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN. conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX. INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S..A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880864
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3660843

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 26 DE JULIO DE 2023				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$163,812.10	$163,812.10	**PESOS**	14	2317
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$163,812.10 (***CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.***)

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. R.F.C. MAJ-010101NA3

PARA GARANTIZAR POR BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN JOAQUIN A. PEREZ NO. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO, Y R.F.C. BSU000404GJ7, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;
B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDOS LOS IMPORTES DE ACUERDOS CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;
D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE,
E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
F) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;
G) QUE LA FIANZA OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CONRRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;
H) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ÉSTA CONTITNUARÁ VIGENTE;
I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO;
J) LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA



SELLO DIGITAL

MYJtE+EG2c1yyw/XThN6Ko+yCuuOZnPD6lx5nGBqlo28MnI21uu55+N1MyLmGQ80PfQORIXAORi+pBAdqgETh111iqLWlW198J9wFRl6r0QLc5XBlcDLrGEbU1HMXS2ick7Y6YiX4JxS6yM46lYJXbGwgo3wOlSHkpL6BKTCm0=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **06028808646GXYEL** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06028808646GXYEL

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880864
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3660843

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 26 DE JULIO DE 2023				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$163,812.10	$163,812.10	**PESOS**	14	2317
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$163,812.10 (***CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.***)

CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE;
K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO INCUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE SE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERÁ A HACERSE EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE A ESTA PÓLIZA DE FIANZA;
L) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
M) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS NO. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO NO. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR. LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL.***
FIN DE TEXTO ***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA



SELLO DIGITAL

MYJtE+EG2c1yyw/XThN6Ko+yCuuOZnPD5lx5nG8qlo28MnI2'uu55+N1MyLmGQ80PfQORlXAORi+tpBAdgpETh111iqLWW1S8J9wFRl6r0QLc5XBlsDLrGEbU1HMX92iok7Y6YiX4JxS6yM46fYJXbGwgo3wOlSHkpL6BKTCm0=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **06028808646GXYEL** 2

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06028808646GXYEL

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."

SOFIMEX®

FIANZA:	2880864
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	06028808646GXYEL

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguira si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F.. Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Articulo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S..A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.

19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

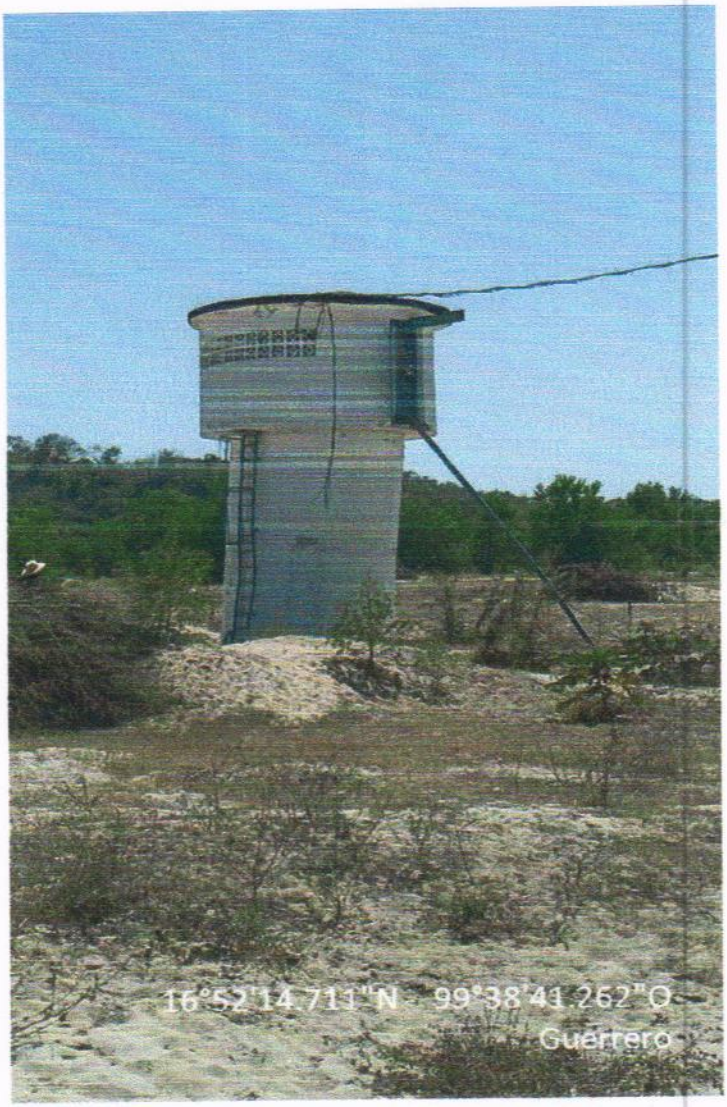


FOTO DE INICIO DE OBRA

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBEN ÁNGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL ARQ. JOSÉ [illegible] FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
		PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO Y FINIQUITO)
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	FECHA	23 de octubre de 2023

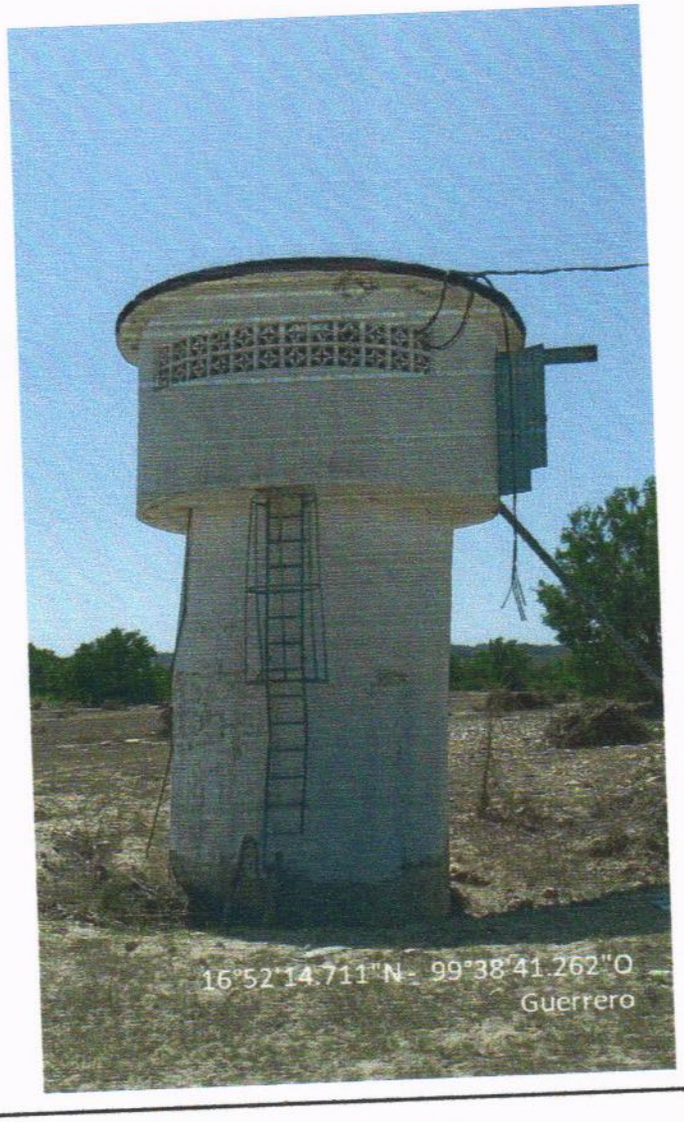


FOTO DE INICIO DE OBRA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

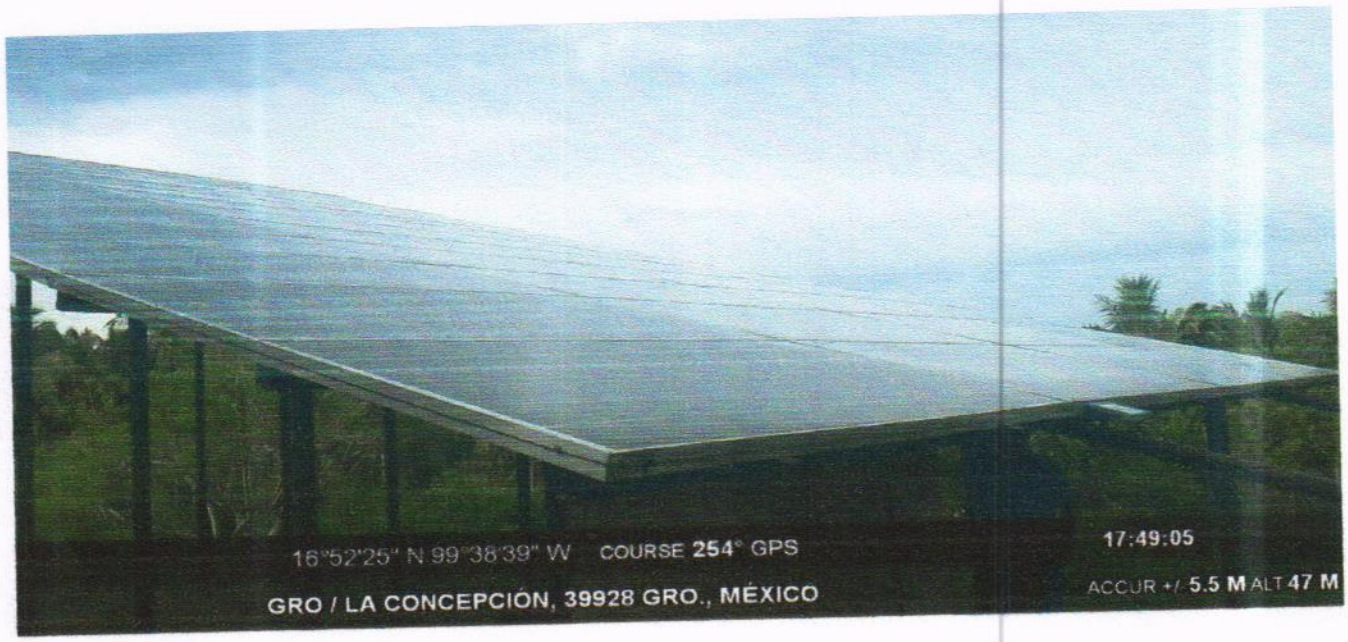


FOTO DE INICIO DE OBRA

BOMBAS SUÁREZ S/A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO	ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



FOTO DE PROCESO DE OBRA

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBEN ÁNGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

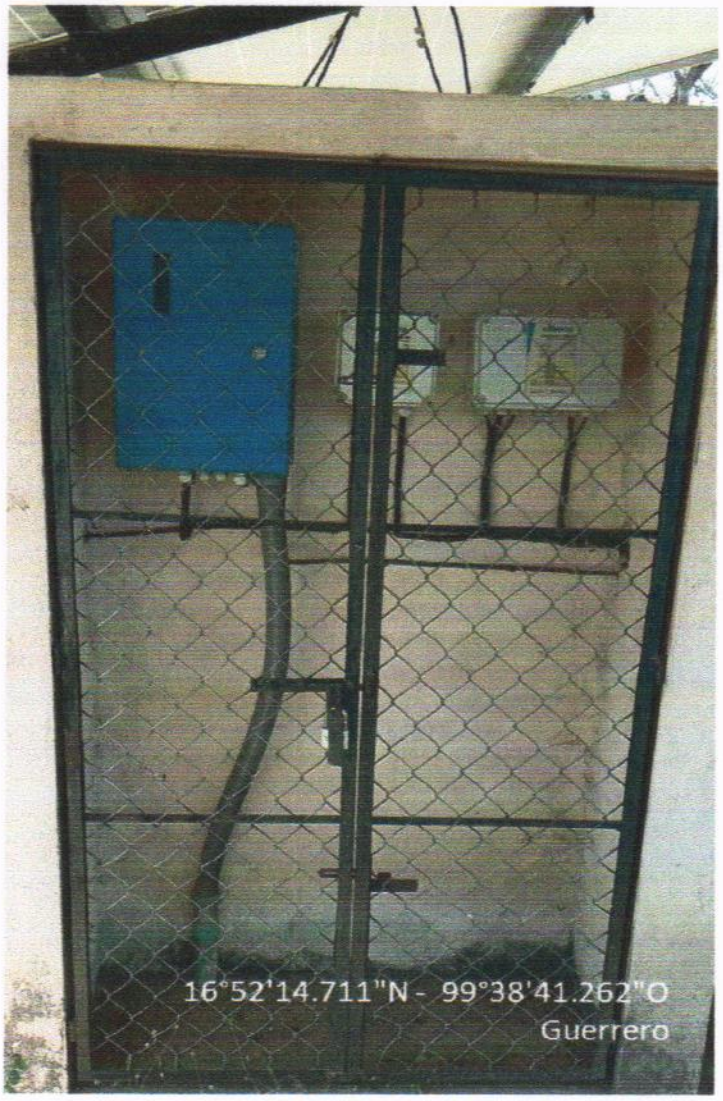


FOTO DE PROCESO DE OBRA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBÉN ANGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DELEGACIÓN RURAL ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



FOTO DE PROCESO DE OBRA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DIRECCIÓN RURAL
ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO	ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



FOTO DE TERMINO

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO	ING. GERARDO CATALAN QUIROZ	ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



FOTO DE TERMINO

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO	ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	ARQ. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



FOTO DE TERMINO

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBÉN ANGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALAN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023




LONA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBEN ÁNGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

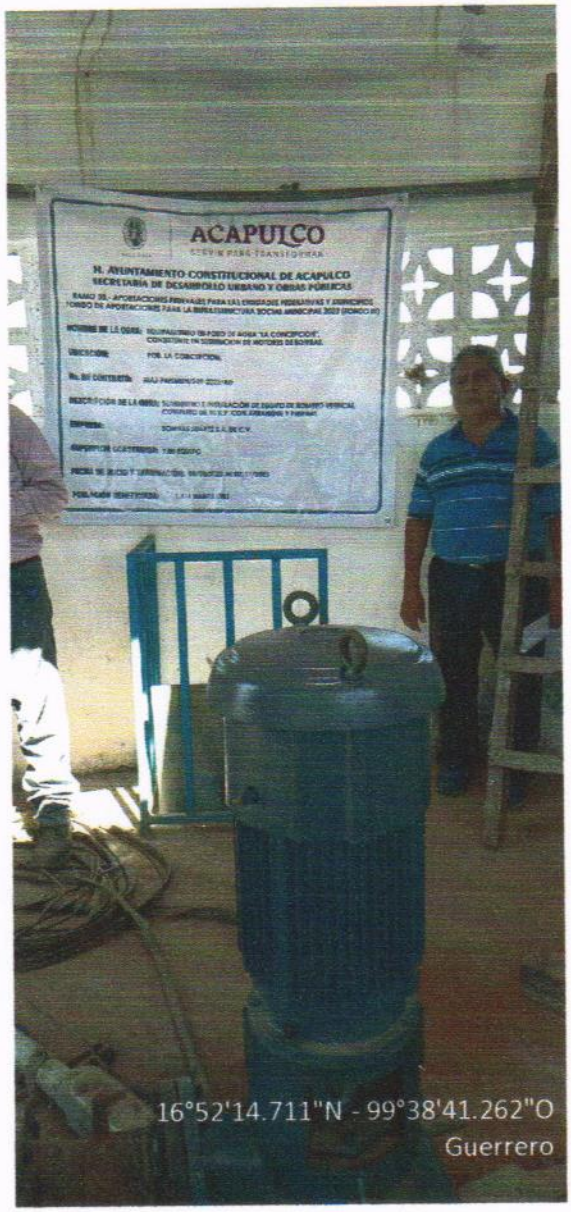


LONA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO	ING. GERARDO CATALAN QUIROZ	ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**PERIODO ESTIMADO**	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

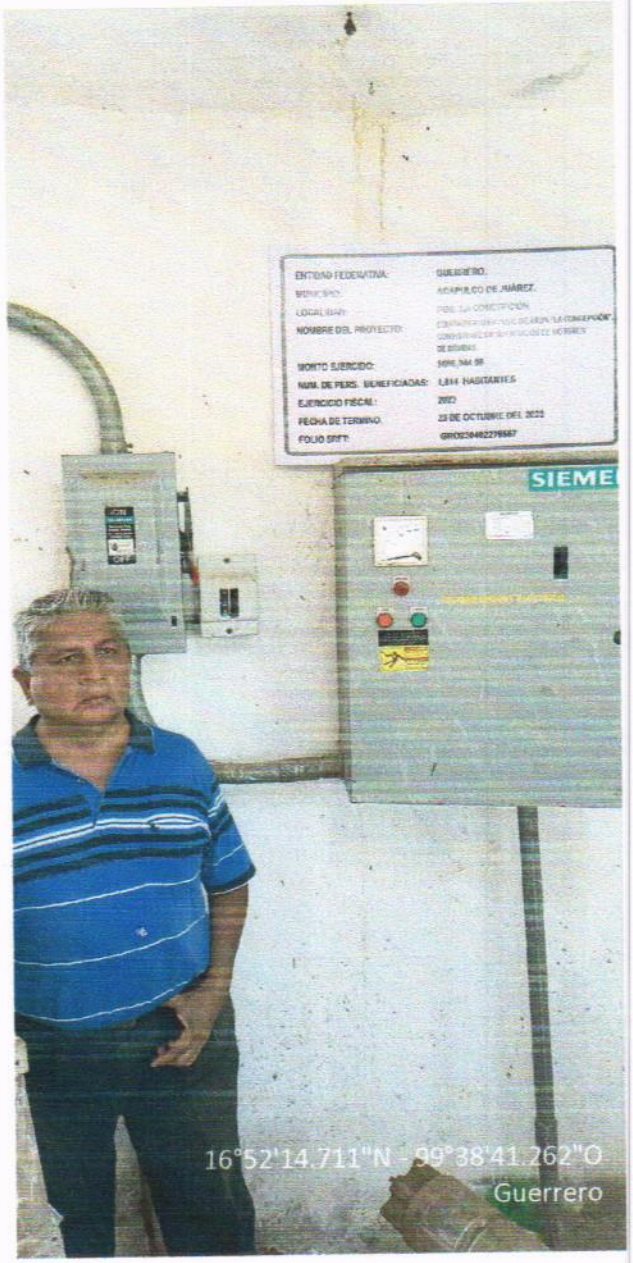


PLACA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALAN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITÁCORA FOTOGRÁFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**NO. DE CONTRATO**	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
		PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	**No. ESTIMACIÓN**	01 (UNO Y FINIQUITO)
MUNICIPIO	ACAPULCO DE JUÁREZ	**FECHA**	23 de octubre de 2023

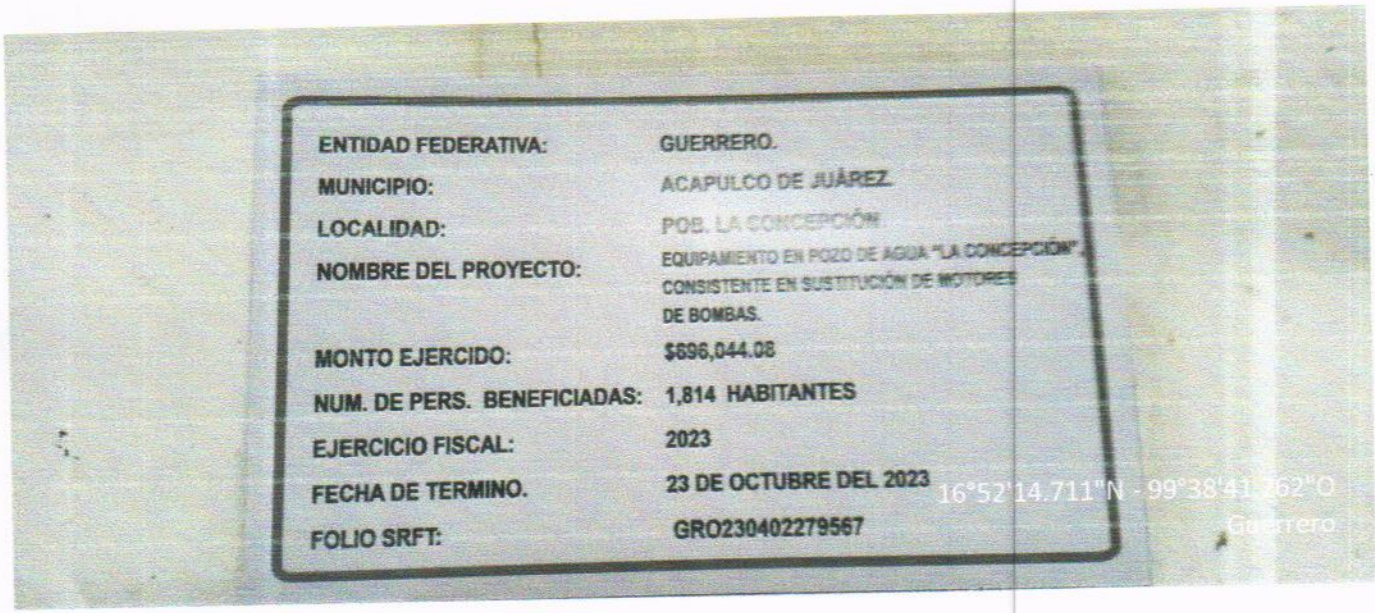

PLACA

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V. SUPERINTENDENTE DE OBRA ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO	RESIDENTE DE OBRA ING. GERARDO CATALAN QUIROZ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA ZONA RURAL ARQ. JOSE SERGIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES				ESTADO:	GUERRERO
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	MAJ/349	ESTIMACIÓN No.	01 (UNO Y FINIQUITO)
NOMBRE DE LA OBRA:	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	TIPO DE OBRA:	AGUA POTABLE	DEL:	05 de agosto de 2023
UBICACIÓN:	POB. LA CONCEPCION	FECHA:	23 de octubre de 2023	AL:	23 de octubre de 2023
CONTRATISTA:	BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.	No. CONTRATO:	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION									
A01	BOMBAS Y EQUIPOS									
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)	N/A	N/A	1.00				PZA	1.00	
							TOTAL	PZA	1.00	

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZAÑO

RESIDENTE DE OBRA
ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S					
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/349**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**	TIPO DE OBRA:	**AGUA POTABLE**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**POB. LA CONCEPCION**	FECHA:	**23 de octubre de 2023**	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL:	23 de octubre de 2023

C R O Q U I S

A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION
A01	BOMBAS Y EQUIPOS
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

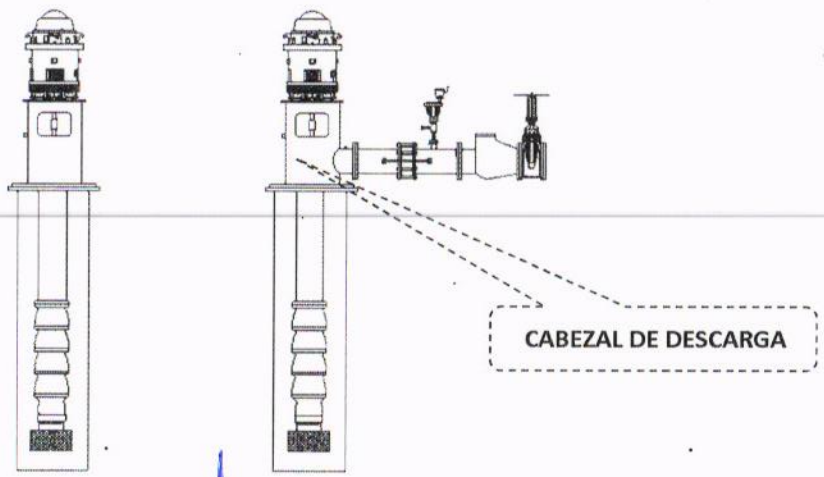

CORTE X - X' CORTE Y - Y'

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO HERNANDEZ VERDIZ

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO, GRO.	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



INS-CAB5 - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)



INS-CAB5 - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBÉN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: **MAJ/349**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**	TIPO DE OBRA: **AGUA POTABLE**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN: **POB. LA CONCEPCION**	FECHA: **23 de octubre de 2023**	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA: **BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL:	23 de octubre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION									
A01	BOMBAS Y EQUIPOS									
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"	N/A	N/A	**1.00**	-	-	-	**PZA**	**1.00**	
							TOTAL	**PZA**	**1.00**	

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)


C R O Q U I S					
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/349**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**	TIPO DE OBRA:	**AGUA POTABLE**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
UBICÀCIÓN:	**POB. LA CONCEPCION**	FECHA:	**23 de octubre de 2023**	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL:	23 de octubre de 2023

C R O Q U I S

A MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION

A01 BOMBAS Y EQUIPOS

INS-CC SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

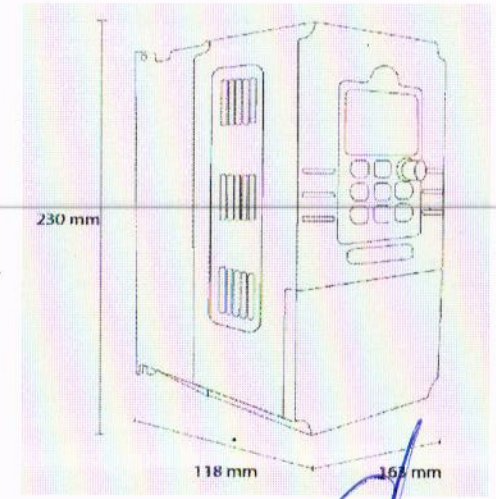

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA


ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL


ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO, GRO.	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023

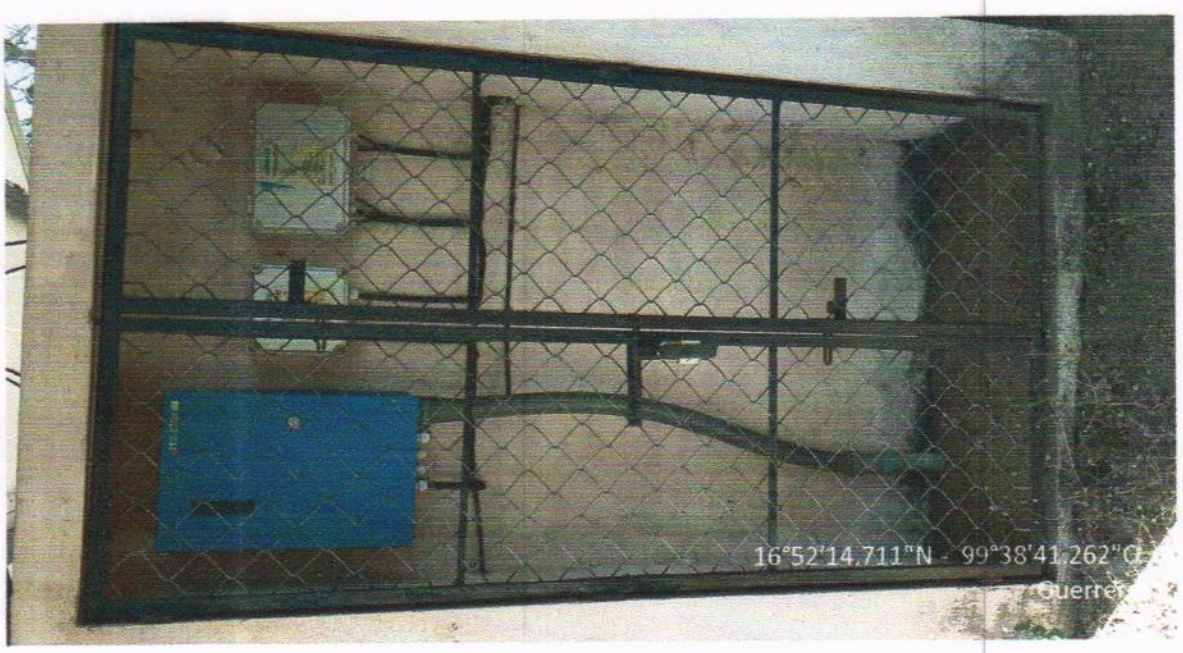

INS-CC - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

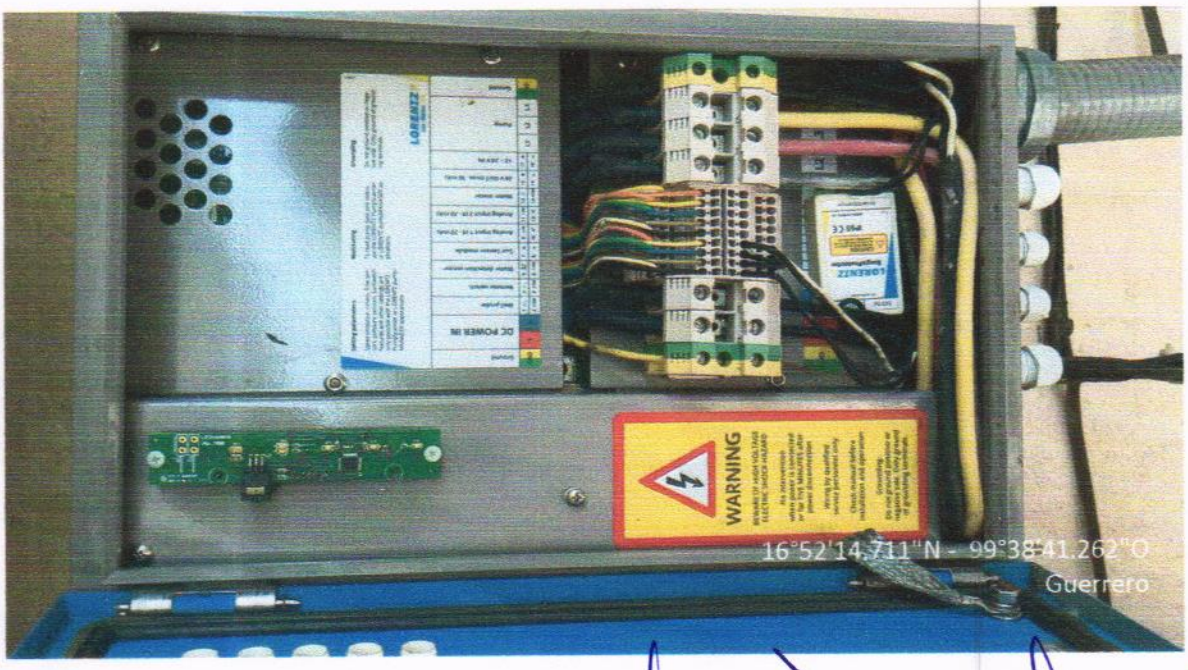

INS-CC - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

NÚMEROS GENERADORES			
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ	No. DE OBRA: MAJ/349	ESTADO:	GUERRERO
NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	TIPO DE OBRA: AGUA POTABLE	ESTIMACIÓN No.	01 (UNO Y FINIQUITO)
UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION	FECHA: 23 de octubre de 2023	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA: BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.	No. CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD	AL:	23 de octubre de 2023

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION									
A01	BOMBAS Y EQUIPOS									
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	N/A	N/A	1.00	-	-	-	PZA	1.00	
							TOTAL	PZA	1.00	

BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA
ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA
ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S					
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/349**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**	TIPO DE OBRA:	**AGUA POTABLE**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**POB. LA CONCEPCION**	FECHA:	**23 de octubre de 2023**	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL:	23 de octubre de 2023

C R O Q U I S

A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION
A01	BOMBAS Y EQUIPOS
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

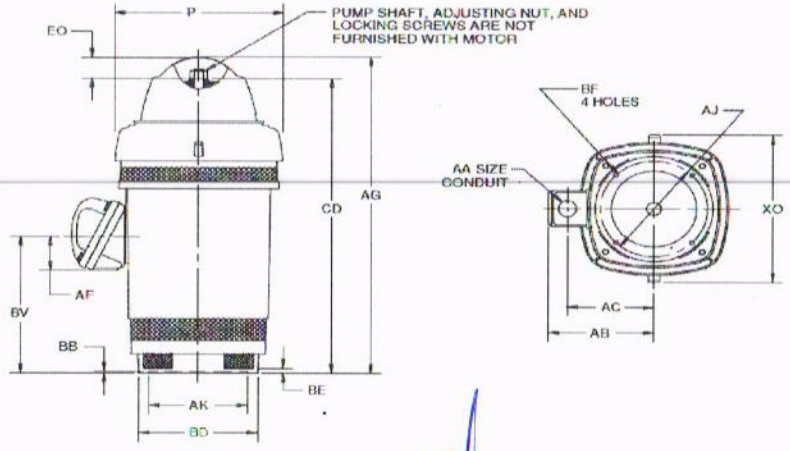

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBÉN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL


ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
MUNICIPIO	ACAPULCO, GRO.	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO Y FINIQUITO)
		FECHA	23 de octubre de 2023



EQB-10 - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

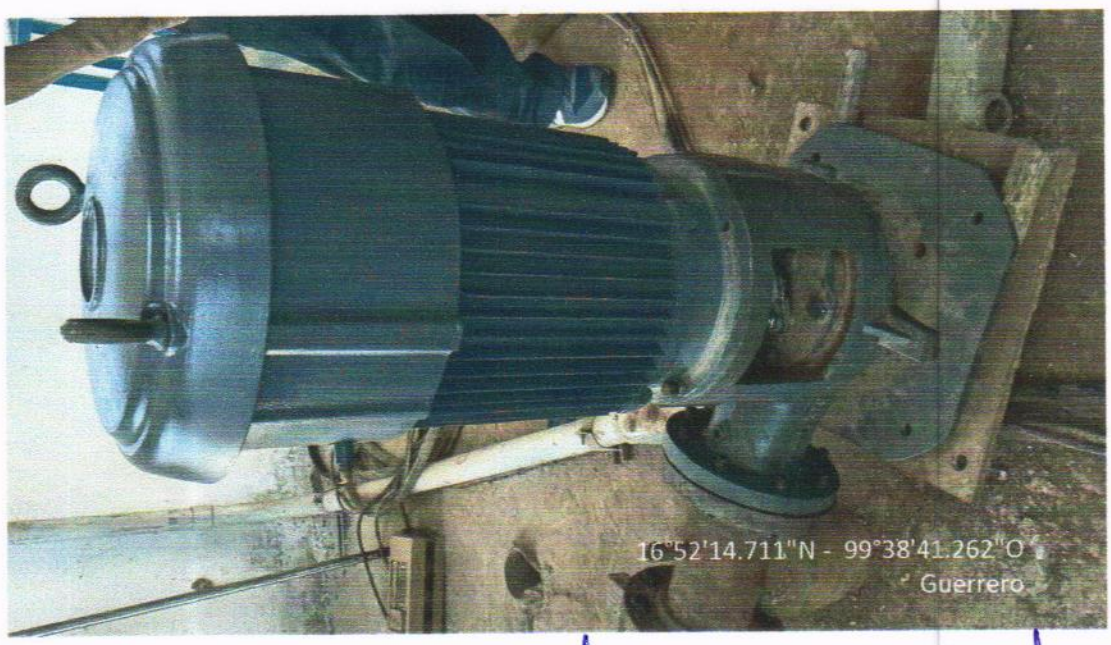

EQB-10 - SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

	NÚMEROS GENERADORES			ESTADO:	**GUERRERO**
	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA: **MAJ/349**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
	NOMBRE DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**		TIPO DE OBRA: **AGUA POTABLE**	DEL:	05 de agosto de 2023
	UBICACIÓN: **POB. LA CONCEPCION**		FECHA: **23 de octubre de 2023**	AL:	23 de octubre de 2023
	CONTRATISTA: **BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**		No. CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**		

CLAVE	CONCEPTO	EJE	TRAMO	PIEZAS	LARGO	ANCHO	ALTO	U	SUBTOTAL	REFERENCIA
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION									
A01	BOMBAS Y EQUIPOS									
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	N/A	N/A	**6.00**	-	-	-	**PZA**	**6.00**	
							TOTAL	**PZA**	**6.00**	

BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ


SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III)

C R O Q U I S					
MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ		No. DE OBRA:	**MAJ/349**	ESTADO:	**GUERRERO**
NOMBRE DE LA OBRA:	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION**	TIPO DE OBRA:	**AGUA POTABLE**	ESTIMACIÓN No.	**01 (UNO Y FINIQUITO)**
UBICACIÓN:	**POB. LA CONCEPCION**	FECHA:	**23 de octubre de 2023**	DEL:	05 de agosto de 2023
CONTRATISTA:	**BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.**	No. CONTRATO:	**MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**	AL:	23 de octubre de 2023

C R O Q U I S	
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION
A01	BOMBAS Y EQUIPOS
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

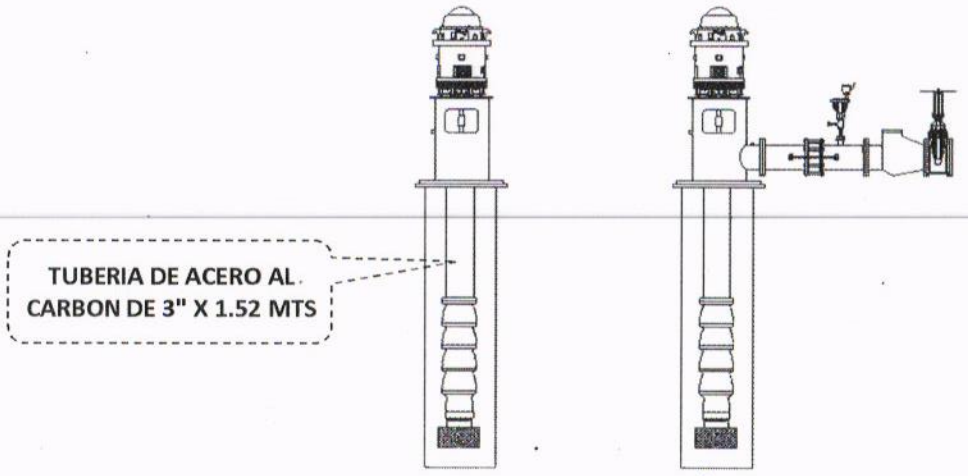

CORTE X - X' CORTE Y - Y'

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VERDIZ

BITACORA FOTOGRAFICA

OBRA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	NO. DE CONTRATO	MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
		PERIODO ESTIMADO	DEL 05/08/2023 AL 23/10/2023
UBICACIÓN	POB. LA CONCEPCION	No. ESTIMACIÓN	01 (UNO Y FINIQUITO)
MUNICIPIO	ACAPULCO, GRO.	FECHA	23 de octubre de 2023



TUBR-03 - SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.



TUBR-03 - SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.
SUPERINTENDENTE DE OBRA


ARQ. RUBÉN ÁNGEL MONTERO LOZANO

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

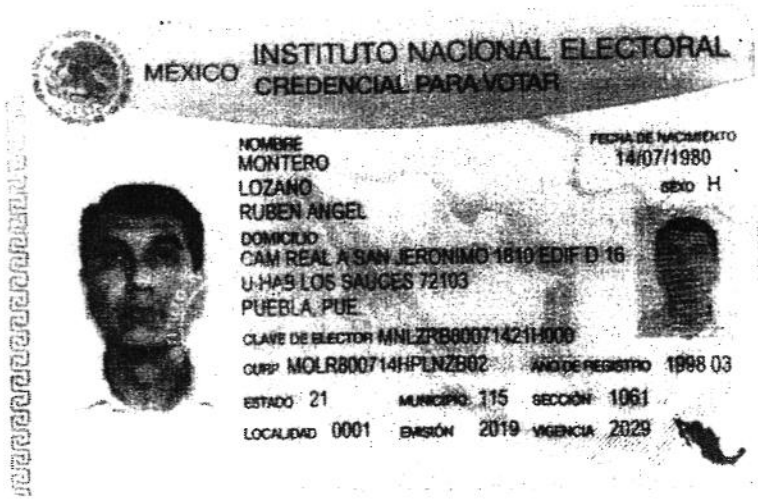

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MONTERO
LOZANO
RUBEN ANGEL

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/1980

SEXO H


DOMICILIO
CAM REAL A SAN JERONIMO 1810 EDIF D 16
U HAB LOS SAUCES 72103
PUEBLA, PUE.

CLAVE DE ELECTOR MNLZRB80071421H000

CURP MOLR800714HPLNZB02 AÑO DE REGISTRO 1998 03

ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1061

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

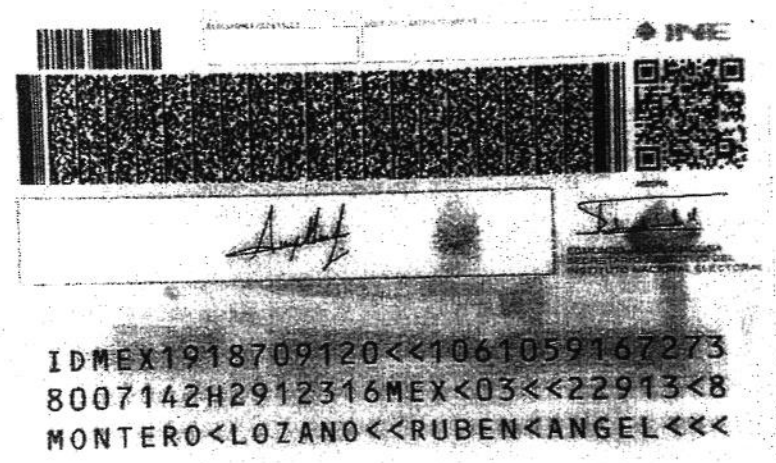

INE

IDMEX191870912O<<1061059167273
8007142H2912316MEX<03<<22913<8
MONTERO<LOZANO<<RUBEN<ANGEL<<<

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FAISMUN-FONDO III)
EJERCICIO FISCAL 2023

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

REPORTE DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

CONTRATISTA: BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.

CONTRATO No.: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD

UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION

IMPORTE DE CONTRATO: $ 696,044.08

PERIODO: DE REPORTE DEL 05-ago-23 AL 31-ago-23

PERIODO: CONTRATADO DEL 05-ago-23 AL 02-nov-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION BOMBAS Y EQUIPOS		14%


AVANCE TOTAL
14%




SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3 DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE



SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3 DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE

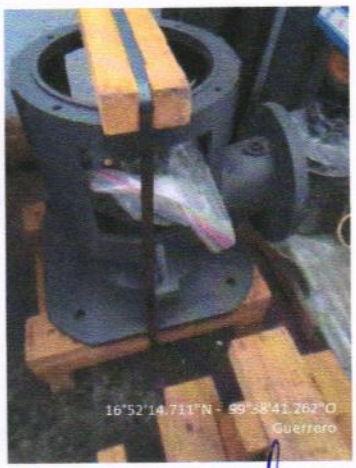

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA

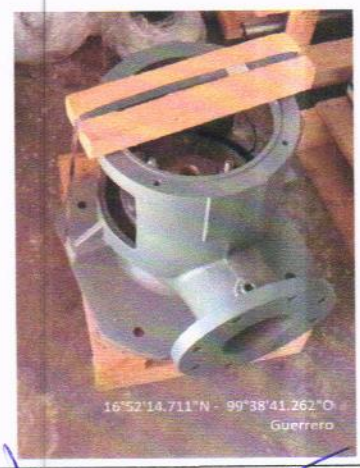

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FAISMUN-FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

LOS REPORTES DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

CONTRATISTA: BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/349-2023/AD

IMPORTE DE CONTRATO: $ 696,044.08

UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION

PERIODO: DE REPORTE DEL 01-sep-23 AL 30-sep-23

PERIODO: CONTRATADO DEL 05-ago-23 AL 02-nov-23

AVANCES POR PARTIDAS:

1	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION BOMBAS Y EQUIPOS		96%

AVANCE TOTAL
96%



SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS



SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
(FAISMUN-FONDO III)

EJERCICIO FISCAL 2023

LOS REPORTES DE SUPERVISIÓN CON SOPORTE FOTOGRÁFICO.

NOMBRE DE LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

CONTRATISTA: BOMBAS SUÁREZ, S.A. DE C.V.

CONTRATO No. : MAJ-FAISMUN/349-2023/AD

IMPORTE DE CONTRATO: **$ 696,044.08**

PERIODO: DE REPORTE **DEL** 01-oct-23 **AL** 23-oct-23

PERIODO: CONTRATADO **DEL** 05-ago-23 **AL** 02-nov-23

UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION

AVANCES POR PARTIDAS:

1	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION		100%
	BOMBAS Y EQUIPOS		

AVANCE TOTAL
100%



SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD



SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD

RESIDENTE DE OBRA

ING. GERARDO CATALÁN QUIROZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL

ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

BITACORA DE OBRA

REGISTRO DE FIRMAS

EL CONTRATISTA
SUPERINTENDENTE

Arq. Ruben Angel Montero Lozano

EL RESIDENTE DE OBRA
POR EL MUNICIPIO

Ing. Gerardo Catalan Pinon

FOLIO: Nº 313321

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA CONCEPCION

FECHA: 05 AGOSTO 2023

NOTA 1:

Con esta fecha y números de nota la supervisión de la SDUOP y la contratista BOMBAS SUAREZ SA DE CV

Nos encontramos reunidos en el sitio de la obra denominada EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS

La cual se encuentra ubicada en POB. LA CONCEPCIÓN

Para efecto de llevar acabo la apertura de la presente Bitácora de Obra acordando los siguientes datos:

- No. de contrato. MAS-FAISMUN/349-2023/AD
- Nombre y Teléfono del ó la Contratista BOMBAS SUAREZ SA DE CV 2224663723
- Nombre del Representante legal MELISA CALDERON BAUTISTA
- Nombre y Teléfono del Superintendente de Obra RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO 2221397102

Los cuales presentaron credencial expedida por el (IFE,INE) para identificarse y darle la legalidad necesaria a la apertura de la bitácora convencional. Solicitando la siguiente información del contrato otorgado por la dirección de obras públicas.

- Periodo contractual. 05 AGOSTO 2023 – 02 NOVIEMBRE 2023
- Fecha de inicio. 05 AGOSTO 2023
- Monto del contrato. $ 696,044.08 CON IVA
- Fecha del anticipo. 31 DE JULIO 2023
- Monto del anticipo. $ 348,022.04

ING. GUSTAVO GONZALEZ G.
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

Arq. Ruben Angel Montero Lozano
SUPERINTENDENTE

Nº 313322

FOLIO:

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSIS
FECHA: 05 AGOSTO 2022 TENTE EN SUSTITUCION DE MO-
TORES DE BOMBAS POR 2A
CONCEPCION

NOTA 2:

En cumplimiento a los artículos 53, 64, 65, 66 y 67 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, del Estado de Guerrero No. 266. Y los artículos 93, 94, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124 y 125 del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. El día de hoy los que intervienen y firman la presente Bitacora de Obra, nos encontramos reunidos en el lugar de ejecución de los trabajos por parte del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Gro.

El Residente de Obra Ing./Arq. GERARDO CATALAN QUIROZ

El supervisor asignado para esta obra el Ing./Arq. _____

Por parte del(a) Contratista el Superintendente de Construcción Ing./Arq. Ruben Angel Montero Lozano

Con la finalidad de definir los alcances y el trazo de la Obra antes mencionada.

También se acuerda como máximo un periodo de tres días hábiles para la contestación y/o petición de las notas que se asientan en esta Bitacora de Obra. También se informa a la contratista que las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una anticipación no mayor a un mes. El contratista deberá presentar a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Dependencia.

ANOTACIONES GENERALES:

1. Los números generadores deberán concordar con los croquis, los cuales estarán referenciados con las cotas de las plantas de conjunto y detalles elaborando un croquis por cada concepto que se genere.

2. Presentar reporte fotográfico y explicativo de cada concepto por estimar (inicio, proceso y terminación). Cada fotografía deberá ser horizontal y estar geo-referenciada.

3. La contratista elaborará la Bitácora Social (Rotulo de Obra) que se colocará desde el inicio de los trabajos hasta la revisión por parte de la Contraloría General y los órganos verificadores de acuerdo a la procedencia del Recurso origen de la Obra.

4. Para la ejecución de las obras, se considera que la Bitácora deberá permanecer siempre disponible durante la ejecución de la obra.

5. Todo evento relevante de obra o cambio en el proyecto y proceso de la misma deberá ser autorizado por bitácora por parte de la residencia de Obra antes de llevarse a cabo.

ING. GERARDO CATALAN Q. — RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

Arq. Ruben Angel Montero Lozano — SUPERINTENDENTE

FOLIO: Nº 313323

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POR LA CONCEPCIÓN

FECHA: 05 AGOSTO 2023

ANOTACIONES PARTICULARES:

1. El uso de la Bitácora es obligatorio en cada uno de los contratos de Obra y Servicios; debiendo permanecer en la Residencia de Obra, a fin de que las consultas requeridas se efectuen en el sitio, sin que la Bitácora pueda ser extraida del lugar de los trabajos. En casos necesarios de no contar con una oficina con la seguridad necesaria, la Bitácora de Obra permanecerá bajo la custodia del supervisor de la SDUOP durante el periodo de ejecución de la Obra.

2. Respecto al procedimiento constructivo de los materiales y acabados de cada uno de los conceptos así como sus especificaciones deberán apegarse al proyecto y presupuesto autorizado en el contrato. De no ejecutarse así se procederá a su corrección inmediatamente sea cual fuera el concepto en cuestión y bajo su propia responsabilidad económica.

3. Todas las autorizaciones en Bitácora de Obra, deberán ser firmadas por ambas partes de la emisora (cualquiera de las dos partes) como responsable de la nota y la receptora de enterado o conforme. En caso de inconformidad se contestara en la siguiente nota, por tanto SE CONCEDE UN PLAZO DE 48 HORAS PARA FIRMAR. De no hacerlo se acepta automáticamente el contenido de la nota en cuestión, perdiendo el derecho de inconformidad o a la aceptación bajo protesta.

NOTA 3

Con esta misma fecha y número de nota se hace del conocimiento del contratista los siguientes puntos:

- Que mediante notas de bitácoras se deberá registrar el proceso de la obra así como el avance físico semanal.
- Que para evitar accidentes o cualquier situación de riesgo, el contratista deberá colocar todas las señalizaciones preventivas y restrictivas que permitan a los habitantes tomar las preocupaciones necesarias al momento de transitar por el lugar de los trabajos.
- Como medida de prevención, todo el personal que se encuentre trabajando en la obra deberá contar con el equipo de seguridad como cascos, botas y chalecos.
- Que toda omisión de estas medidas son responsabilidad para el contratista y el desacato implicará la suspensión de la obra hasta que se cumplan con los puntos anteriores.

ING. GERMAN CISNEROS Q.
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

ARQ. ROBERT ANGEL MONTES LORENZO
SUPERINTENDENTE

FOLIO № 313324

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

FECHA: 5 de Agosto de 2020

Nota No. 04

Con esta fecha se realiza el recorrido al sitio de obra en compañía del superintendente de la obra el Arq. Rubén Angel Montero Lozano, el técnico instalador Fredy Antonio Hernández Pineda, el ing Gerardo Catalán Quiroz residente de la obra y el ing. Roberto Santiago como representante de la CAPAMA; para indicar la ubicación exacta del sitio de los trabajos a realizarse.

Se le indica al contratista presentar las especificaciones técnicas para verificar se cumplan las especificaciones del catálogo autorizado. Se le indica también que notifique mediante bitácora la fecha de recepción del equipo correspondiente.

Se le instruye al contratista que al final de los trabajos se entregue el acta de entrega-recepción firmada por las partes involucradas.

La presente bitácora es un documento técnico oficial que servirá como medio de comunicación técnica entre el contratante y el contratista. Unicamente personal autorizado podrá hacer uso de la presente bitácora.

RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

Arq Ruben Angel Montero L.
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 313325

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION
FECHA: 5 de Agosto de 2023
NOTA No. 05

Con esta fecha se informa a la supervisión que el pasado 31 de julio de 2023 se recibió el pago correspondiente del anticipo al contrato No. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD para la obra EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION, ubicada en el POB. LA CONCEPCION del municipio de Acciquico de Juarez.

Por lo que la contratista da inicio con la producción del equipo de bombeo para el sitio de obra

Ing. Gerardo Antonio G.

Arq. Ruben Angel Montero Lazaro

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
FECHA: 31 de Agosto de 2023
NOTA NO. 06

Con esta fecha se realiza el suministro de los siguientes materiales de descritos en el contrato de obra No. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD para el pozo del POB. LA CONCEPCION:

- SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE.
- SUMINISTRO DEL CABEZA DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2".

Ing. Gerardo Antonio G.
RESIDENTE DE OBRA

Arq. Ruben Angel Montero L.
SUPERVISOR

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 313326

EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE

OBRA: EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

FECHA: 31 de Agosto de 2023

Nota No. 07

Se realiza recorrido en conjunto con la contratista para verificar los avances a los trabajos del suministro de materiales.

SUMINISTRO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE3"X 1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE.

SUMINISTRO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1½".

ING. Gerardo Cárcamo Q. — Arq. Rubén Angel Montero Lemus

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

FECHA: 29 de septiembre de 2023

NOTA NO. 08

Con esta fecha se realiza el suministro e instalación de los siguientes materiales descritos en el contrato de obra No. MAT-FAISMUN/3149-2023/AD para el pozo del Pob. La Concepcion:

- SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUBRAGUA MOD 5A6XL-8 DESCAR 3" MCA 45 PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10 HP 2 POLOS 230/460V ARMAZON ZSTP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS.
- INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE (DESCARGA) 3DE3"x1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE.
- INSTALACION SUMINISTRO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1½"

ING. Gerardo Cárcamo Q. — RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

Arq. Rubén Angel Montero L. — SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 313327

EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE EN

OBRA: SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

FECHA: 29 de septiembre de 2023

NOTA No. 09

Se realiza recorrido en conjunto con el contratista para verificar los avances a los trabajos del suministro de materiales.

SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA TURBINA LUB. AGUA MOD 5A8L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2 POLOS 230/460 ARMAZON ODP TIPO TUS 3600 RPM EF PREM UM MCA US MOTORS.

INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3" DE 3" X 1.22 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE.

INSTALACION SUMINISTRO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1½"

Se ha verificado su correcta instalación en el sitio de obra.

Ing. Genaro Espinosa G.

Arq. Ruben Angel Martinez Lazaro

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION, CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

FECHA: 10 de octubre de 2023

Nota No. 10

Con esta fecha se realiza el suministro e instalación de los siguientes materiales descritos en el contrato de obra No. MAT-FAISMUN/349-2023/AD para el pozo POB. La Concepción:

- SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN.

Con lo que se terminan los trabajos de suministro e instalación en el pozo del POB. LA Concepción y se solicita a la supervisión se programe la visita correspondiente para la conciliación de volúmenes de obra.

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Genaro Espinosa G.

SUPERVISOR

Arq. Ruben Angel Martinez L.

SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

FOLIO Nº 313328

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
FECHA: 18 de octubre de 2023
Nota No. 11

Se realizo recorrido en conjunto con la contratista para verificar los avances a los trabajos del suministro de materiales:

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN

Y se informa que el dia 23 de octubre de 2023 se realizara la visita de campo correspondiente para la conciliación de los volúmenes finales de la obra.

Ing. Germán [illegible] R. Arq. Ruben Angel Montes Lozano

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
FECHA: 23 de Octubre de 2023
Nota No.: 12

Con esta fecha se a realizado la conciliación de los volúmenes de obra, quedando terminado satisfactoriamente al 100% todos los trabajos de los conceptos de la obra: EQUIPAMIENTOS EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA CONCEPCION ubicada en el POB LA CONCEPCION del municipio de Acapulco de Juárez, No. de contrato: MAT-FAISMUN/3ml-2023/AD obra iniciada el pasado 05 de Agosto de 2023, y terminada el 23 de octubre de 2023.

E I E A R E D E B I T A C O R A D E O B R A

Asi mismo se hace entrega a la supervisión de la Estimación 01 (UNO Y Finiquito) para su revisión y posterior autorización.

Ing. Germán [illegible] R. Arq. Ruben Angel Montes Lozano
RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR SUPERINTENDENTE

FOLIO No. 313329

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCION CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS. POB. LA CONCEPCIÓN.

FECHA: 23 de octubre de 2023

Nota No. 13

CIERRE DE BITACORA

Con esta Fecha y número de nota se realiza un ultimo recorrido del sitio de trabajos en conjunto con la contratista para verificar que todos los trabajos estén terminados y finiquitados al 100% como lo estipula el catalogo autorizado, no teniendo problema alguno en la obra se cierra la presente bitácora de la obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA LA CONCEPCIÓN CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS. POB. LA CONCEPCIÓN ubicada en el Pob. LA CONCEPCION con el No de Contrato MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.

Recordando a la contratista que el H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero se reserva el derecho de hacer reclamaciones por vicios ocultos dentro de la obra de acuerdo a lo estipulado en el contrato correspondiente.

Ing. Cornelio Garcia Q.
RESIDENTE DE OBRA

SUPERVISOR

Arq. Ruben Angel Molina Lopez
SUPERINTENDENTE

ESOR-02
REV.02

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN 2021-2024

EJERCICIO 2023

ANTICIPO

SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII.**

CONTRATO: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.**

OBRA/PROYECTO/ACCIÓN: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCIÓN" CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS .**

UBICACIÓN: **1.- POB. LA CONCEPCIÓN.**

CONTRATISTA: **BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.**

NUMERO DE ZONA DE ATENCIÓN PRIORITARIA: **(ZAP) 1992**

CLAVE DE LA LOCALIDAD: **12001 0098**

NUMERO DE (AGEB) **: 12001 0098 1992**

ORIGINAL.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO ECONOMICO

COMPARATIVO PRESUPUESTAL

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
OF. AUTORIZACION:

SUBMODALIDAD: **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**
OF. APROBACION:

PROGRAMA: **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**
PROYECTO SOCIAL:

SUBPROGRAMA:
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

ESTADO: **12 GUERRERO**
No. DE OBRA:

MUNICIPIO: **001 ACAPULCO DE JUAREZ**

AVANCE FISICO: _____ AVANCE FINANCIERO: _____

LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	INVERSION			SALDO
		APROBADA	COMPROBADA	ACUMULADA	
POB. LA CONCEPCION	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS	696,044.08	348,022.04	348,022.04	348,022.04

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

REMISION DE DOCUMENTOS

MODALIDAD: **CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 2023**
SUBMODALIDAD: **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) RAMO XXXIII**
OBRAS : **1. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCIÓN " CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS POB. " LA CONCEPCIÓN " 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " APALANI " CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS POB. " APALANI " 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " POCHOTLAXO " CONSISTENTE EN SUSTITUCIÓN DE MOTORES DE BOMBAS POB." POCHOTLAXCO"**
CONTRATO No.: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**
DOCUMENTOS REMITIDOS A LA: **AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO**
DEPENDENCIA EJECUTORA: **12M01 H. A. ACAPULCO**

No. PROG.	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE		
			TOTAL	RETENCIONES	NETO
1	28-jul.-23	BOMBAS SUÁREZ, S.A DE C.V. FACT. 943F	980,781.74		980,781.74
		SUBTOTAL $	980,781.74	-	980,781.74
		TOTAL $	980,781.74	-	980,781.74

viernes 28 de julio de 2023

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C. BSU00404GJ7

JOAQUIN A. PEREZ No. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CD. DE MEXICO

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ

AV. CUAUHTEMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO COL. HORNOS INSURGENTES C.P. 39350 ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. R.F.C: MAJ-010101-NA3.

NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACIÓN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO

PERIODO DEL CONTRATO: DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

OPERADO
FAISMUN - 2023

TIPO DE OBRA: OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO

GEORREFERENCIAS: OBRA 1.- LATITUD 16°52´14.711" N LONGITUD: 99°38´41.262" O
OBRA 2.- LATITUD 16°52´7.472" N LONGITUD: 99°37´27.200" O
OBRA 3.- LATITUD 16°56´47.662" N LONGITUD: 99°38´21.052" O

METAS PROGRAMADAS: OBRA 1.- 1 EQUIPO
OBRA 2.- 1 EQUIPO
OBRA 3.- 1 EQUIPO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

POBLACIÓN BENEFICIADA: OBRA 1.- 1,814 HABITANTES
OBRA 2.- 1,516 HABITANTES
OBRA 3.- 618 HABITANTES

No. DE OBRA: MAJ/349

CONTRATO No.	*FECHA DE CONTRATO*	*IMPORTE CON I. V. A.*	*ANTICIPO CON I V A.*
MAJ-FAISMUN/349-2023/AD	**26 DE JULIO DEL 2023**	**$ 1,638,121.03**	**$819,060.52**

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, A TRAVES DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023 (FONDO III) QUE TIENE COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL RAMO XXXIII.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** LA CANTIDAD DE: **$ 819,060.52 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE PAGO DEL **ANTICIPO** CORRESPONDIENTE AL 50% EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; 20% PARA INICIO DE LA OBRA Y 30% PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LAS OBRAS : **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,GRO. DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO No. **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD.**

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C. BSU00404GJ7

CONSTRUCTORA

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
BOMBAS SUAREZA, S.A DE C.V.

SRIA. DE DES. URB. Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUIS ARMANDO MERAZA RADILLA

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

L.C. ERIC ROMERO MORALES

SRIO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. CARLOS ARMANDO MORILLÓN RAMÍREZ

SUBTOTAL	$	706,086.66
IVA	$	112,973.86
TOTAL	$	819,060.52

OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.

OPERADO
FAISMUN - 2023

1210

RFC emisor:	BSU000404GJ7	**Folio fiscal:**	19ABC7AC-310E-4A4A-B063-A75550B0943F
Nombre emisor:	BOMBAS SUAREZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000505879312
RFC receptor:	MAJ010101NA3	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	11850 2023-07-28 16:19:21
Nombre receptor:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	39350	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Otra maquinaria y equipo.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
70171704		1.00	E25	Unidad activa	706,086.656	706,086.66		Sí objeto de impuesto.

Descripción: ANTICIPO NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACION: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCION " CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. POCHOTLAXCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/349-2023/ AD DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	706,086.66	Tasa	16.00%	112,973.86

Número de pedimento	Número de cuenta predial

OPERADO
FAISMUN - 2023

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 706,086.66
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 112,973.86
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 819,060.52**

Sello digital del CFDI:

GqMxsq5lFHMjAopJw5YSDCaXcBDlfVOEW3Rxlr2ntsi9lCfyQLrMUwX6iA8U0IS5Gtf9l8deAlMj5x1mqa/iqQJTqfLA9LrP0bFAicQJhPmhv4aUV9b+3KBS/okr7VI17JX+TaVqlRtA2n74Sq5nSimrB/fPgVKnFkGUdBI88+YGZlELaCkcwBZvu9O2f8Pq6w+SMEc5igb9Gcj1fGv3aUonjfXFbtqxfT7qBdyNcXOxSe+sdWhG7tc6nbsYPvqw4d3mMp//LgeRa+qVedH+t2m8nlPoWl2w5A54S5vZv3qBZFCH4eduBFVUlGj/w3VgbNfzg1iKi0XiK5JRIfsDCA==

Sello digital del SAT:

cEB8o698g72OaBAGC4LQajQQPQmyndozfwm2t+lJj7fA/JF616443Fcli96Bd+B7HDNnDJC/KsacF+LWP0iqjib5q1KHYRxdTDJTzMGbsJtXYj3lhYpMSZdg99fvvKULpud2Nruo+JtH3djUiKwjijw9YhPa7S6mO1/UdfM7OlFi2/emlVpRqUnlHUQdXN32EXFPnUj6BNYSXXPanK/2rPN8xJpAFH51TPYP0o8p4YqR5QjmGDOVx3hha4ZTEjd8viRo1XedtmyFEITlvfubKP1NAL2sxOFOHYral0uHBYktvV6+513M6j1B5TUc7szDdpIg1bAQN+tEO6NVMsdqcw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19ABC7AC-310E-4A4A-B063-A75550B0943F|2023-07-28T16:19:51|SAT970701NN3|GqMxsq5lFHMjAopJw5YSDCaXcBDlfVOEW3Rxlr2ntsi9lCfyQLrMUwX6iA8U0IS5Gtf9l8deAlMj5x1mqa/iqQJTqfLA9LrP0bFAicQJhPmhv4aUV9b+3KBS/okr7VI17JX+TaVqlRtA2n74Sq5nSimrB/fPgVKnFkGUdBI88+YGZlELaCkcwBZvu9O2f8Pq6w+SMEc5igb9Gcj1fGv3aUonjfXFbtqxfT7qBdyNcXOxSe+sdWhG7tc6nbsYPvqw4d3mMp//LgeRa+qVedH+t2m8nlPoWl2w5A54S5vZv3qBZFCH4eduBFVUlGj/w3VgbNfzg1iKi0XiK5JRIfsDCA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-28 16:19:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ORDENAMIENTO URBANO 2021 2024

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="11850"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="819060.52" Moneda="MXN" SubTotal="706086.66"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU4NzkzMTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQU
NoCertificado="00001000000505879312" FormaPago="03"
Sello="GqMxsq5lFHMjAopJw5YSDCaXeBDlfVOEW3Rxlr2ntsi9lCfyQLrMUwX6iA8U0IS5Gtf9I8deA1Mj5x1mqa/iqQJTqfLA9LrP0bFAicQJhPmhv4aUV9b+3KI
Fecha="2023-07-28T16:19:21" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BOMBAS SUAREZ" Rfc="BSU000404GJ7"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ" Rfc="MAJ010101NA3" UsoCFDI="I08" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="39350"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="706086.66" ValorUnitario="706086.656" Descripcion="ANTICIPO NOMBRE DE LAS OBRAS Y UBICACION:
      1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA " LA CONCEPCION " CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA
      CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB.
      APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB.
      POCHOTLAXCO CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023 SEGUN CONTRATO MAJ-FAISMUN/349-
      2023/ AD DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2023 PERIODO DE CONTRATO DEL 05 DE AGOSTO DEL 2023 AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023"
      Unidad="Unidad activa" ClaveUnidad="E25" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="70171704">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="112973.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="706086.66"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="112973.86">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="112973.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="706086.66"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
        http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
        SelloSAT="cEB8o698g72OaBAGC4LQajQQPQmyndozfwm2t+Ij7fA/JF616443FcFi96Bd+B7HDNnDJC/KsacF+LWP0iqjib5q1KHYRxdTDJTzMGb
        NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
        SelloCFD="GqMxsq5lFHMjAopJw5YSDCaXeBDlfVOEW3Rxlr2ntsi9lCfyQLrMUwX6iA8U0IS5Gtf9I8deA1Mj5x1mqa/iqQJTqfLA9LrP0bFAicQJhl
        RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-07-28T16:19:51" UUID="19ABC7AC-310E-4A4A-B063-A75550B0943F"
        xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```


OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

HACIENDA | SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BSU000404GJ7	BOMBAS SUAREZ	MAJ010101NA3	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Folio fiscal	**Fecha de expedición**	**Fecha certificación SAT**	**PAC que certificó**
19ABC7AC-310E-4A4A-B063-A75550B0943F	2023-07-28T16:19:21	2023-07-28T16:19:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	**Efecto del comprobante**	**Estado CFDI**	**Estatus de cancelación**
$819,060.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
FAISMUN - 2023

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
REVISIÓN FISCAL POSITIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN JUSTIFICATIVO

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA JUSTIFICACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL 50% DE ANTICIPO DE LAS OBRAS CONSISTENTES EN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCIÓN; 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", COSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI; 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

F U N D A M E N T O J U R I D I C O

VISTO PARA EL DICTAMEN JUSTIFICATIVO CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTÍCULOS 61 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 138 SEGUNO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY ALUDIDA, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTICULO 61. El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente:

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo caso será necesaria la autorización escrita del titular de la dependencia, entidad o ayuntamiento, o de la persona en quien éste haya delegado tal facultad;

ARTÍCULO 138.- Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgarán conforme al presente artículo, las dependencias y entidades deberán tener en cuenta las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los que tendrán por objeto apoyar la debida ejecución y continuidad de las obras y servicios.

R E S U L T A N D O S

PRIMERO. - QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO.- QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DICTAMEN TIENEN LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 115, FRACCIÓN III Y V, INCISO G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTICULO 27 FRACCIONES XVI, XX, XIV, XXI, XXII, XXV, XIX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL RELACIONADOS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIOS DE FACULTADES DE LA C. MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

TERCERO. - QUE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN JUSTIFICATIVO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADO EN LOS ARTÍCULOS 61 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 138 SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY ALUDIDA.

CUARTA. - QUE LOS TRABAJOS DE: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION; 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", COSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI; 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE

EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO. UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. REQUIERE UN PORCENTAJE DEL 50% PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, A LA EMPRESA CONTRATISTA DENOMINADA BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA C. MELISA CALDERON BAUTISTA, A QUIEN LE FUE ADJUDICADA LA OBRA RELACIONADA CON EL CONTRATO MAJ-FAISMUN/349-2023/AD, POR UN MONTO TOTAL DE $1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.), ESTO DERIVADO QUE EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL, INCLUYEN CONCEPTOS QUE REQUIEREN EQUIPO E INSTALACIONES ESPECIALIZADAS, PARA LOS CUALES EXISTEN POCOS PROVEEDORES Y LAS CONDICIONES QUE MANEJA SON DE PAGO ANTICIPADO, CUBRIENDO EL MONTO COMPLETO Y LA ENTREGA ES DE 4 A 6 SEMANAS, POR LO QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA REALIZAR LA COMPRA DE INMEDIATO, YA QUE DICHO FLUJO DE FONDOS IMPACTA EN FORMA IMPORTANTE DEBIDO A QUE ESAS PARTIDAS NO SON SUSCEPTIBLES DE INCLUIRSES EN LAS ESTIMACIONES AUNADO A ESO EL TIEMPO DE ENTREGA DE LA OBRA ES DE 90 DIAS NATURALES,

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y

C O N S I D E R A N D O S

1.- QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN JUSTIFICATIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA CONSISTENTE EN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION; 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", COSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI; 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO. UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. REQUIERE UN PORCENTAJE DEL 50% PARA EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO, A LA EMPRESA CONTRATISTA.

2.- QUE LA SECRETARIA EN COMENTO Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES DE LEY, DETERMINO PROCEDENTE OTORGAR 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA

CONCEPCION; 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", COSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI; 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO. UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. DERIVADO DEL RESULTANDO CUARTO DE ESTE DICTAMEN POR UN MONTO DE $819,060.52 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.).

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 61 FARCCION IV Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

S E R E S U E L V E

UNICO. – QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÔMICOS PARA EL OTORGAMIENTO AL 50% DE ANTICIPO DE LA OBRA: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION; 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", COSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI; 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO. UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 61 FRACCION IV DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 138 SEGUNDO PARRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY ALUDIDA, SE AUTORIZA LA APLICACIÓN DEL ANTICIPO EN UN 50% DEL MONTO TOTAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD Y EN EL TIEMPO ESTIPULADO DEL CONTRATO.

ASÍ LO DICTAMINÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

A T E N T A M E N T E

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LMMR/LAAT/tho.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA

DICTAMEN QUE EMITE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, POR EL CUAL SE DETERMINA LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION, 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI, 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN POB. POCHOTLAXCO** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO.

F U N D A M E N T O J U R Í D I C O

VISTO PARA EL DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, QUE EL PRIMERO A LA LETRA DICE:

ARTÍCULO 29: LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PODRÁN REALIZAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. POR CONTRATO; O

II. POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

ASÍ MISMO EL ARTÍCULO 39 DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, NOS MENCIONA, QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS, MEDIANTE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN:

I. LICITACIÓN PÚBLICA;

II. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS; O

III. ADJUDICACIÓN DIRECTA.

POR OTRO LADO, EN SU ARTÍCULO 54 FRACCION I, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE LOS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, Y TRATÁNDOSE DE OBRAS PÚBLICAS, SIEMPRE QUE EL MONTO DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, NO EXCEDA DE **VEINTE MIL VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN**;

ASIMISMO, ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PUBLICARÁ **EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN** EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. CONCORDANTE CON LO ANTERIOR EL **10 DE ENERO DEL 2023**, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFIA DA A CONOCER QUE EL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN ES DE: $103.74 PESOS MEXICANOS LOS CUALES ESTARAN VIGENTES APARTIR DEL 1ro. DE FEBRERO DEL AÑO 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 5, DE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION, QUE SIRVE DE BASE PARA CALCULAR EL MONTO MÁXIMO PARA QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS PUEDAN CONTRATAR BAJO SU RESPONSABILIDAD OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

R E S U L T A N D O S

PRIMERO.- QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES UNA DEPENDENCIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, Y ES COMPETENTE PARA COORDINAR LA POLÍTICA DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y DEMÁS, DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL, DIRIGIR PROYECTAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

SEGUNDO.- QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE DICTAMEN TIENEN LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELLO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III Y V, INCISO G DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 170 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE GUERRERO, ASI COMO EL ARTÍCULO 27 FRACCIONES XVI, XX, XIV, XXI, XXII, XXV, XIX DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL RELACIONADOS MEDIANTE EL ACUERDO DELEGATORIOS DE FACULTADES DEL C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ.

TERCERO.-QUE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DIRECTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA EN LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

CUARTO.- PARA EFECTUAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA OBRA DE QUE SE TRATA, SE TOMO EN CUENTA LO QUE ESTABLECE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY EN COMENTO, SIENDO SELECCIONADA LA EMPRESA CONTRATISTA, **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A LA C. MELISA CALDERON BAUTISTA,** QUE CUENTA CON LA SOLVENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, EL EQUIPO MAYOR Y MENOR ES EL ADECUADO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS Y EL PERSONAL TÉCNICO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBJETO DEL CONTRATO, Y SE COMPROMETE A CUMPLIR CON EL PERIODO DE EJECUCIÓN QUE SE PACTE EN EL CONTRATO, YA QUE EN SU CURRICULUM CUENTA LA EXPERIENCIA EN CUANTO A OBRAS SIMILARES Y OBRAS DE MAYOR MAGNITUD.

QUINTO.-QUE LOS TRABAJOS DE: 1.- **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA**

CONCEPCION, 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI, 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN POB. POCHOTLAXCO ASCIENDE A UN MONTO DE: **$1,412,173.30 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

SEXTO.- QUE EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 266, NOS HACE MENCIÓN QUE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AYUNTAMIENTOS, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁN CONTRATAR OBRAS PÚBLICAS O SUS SERVICIOS, SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS O **DE ADJUDICACIÓN DIRECTA**, SIENDO LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACION DE: $103.74 (CIENTO TRES PESOS 74/100 M.N.), RESULTANDO EL SIGUIENTE MONTO MÁXIMO PARA LA ADJUDICACIÓN:

103.74*20,000= 2,074.800.00

VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 ES DE: **$103.74** QUE MULTIPLICADO POR VEINTE MIL, NOS DA COMO RESULTADO EL IMPORTE DE: **$2,074,800.00 (DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100M.N.),** POR LO QUE DICHO IMPORTE ES TOMADO COMO BASE PARA CUMPLIR CON LO PRECEPTUADO EN EL REFERIDO ARTÍCULO, Y ASÍ OTORGAR LOS TRABAJOS DE: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION, 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI, 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN POB. POCHOTLAXCO,** QUE ASCIENDE A UN MONTO DE: **$1,412,173.30 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.),** EL CUAL NO INCLUYE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NI EL CARGO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS PROPIO DEL AYUNTAMIENTO, CONCLUYENDO CON ESTO QUE EL COSTO DE LA OBRA NO REBASA EL MONTO SEÑALADO EN EL CITADO ARTÍCULO.

LA PRESENTE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SE FUNDA EN CRITERIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y ECONOMÍA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ LOS CUALES SE ACREDITAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

A).- DE ECONOMIA: POR TRATARSE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR MONTOS DE ACTUACIÓN, ESTA SE REALIZA CON LOS PRECIOS DE TABULADOR DETERMINADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, LO QUE REPRESENTA EL INDICADOR MÁS ADECUADO DE LA PROPORCIÓN SEGÚN LOS PARÁMETROS DE INVERSIÓN, COSTO DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y VIDA ÚTIL, Y EN ESTE MISMO SENTIDO LOS MEJORES PRECIOS PARA EL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ.

B).- DE EFICACIA: SE INVITO A LA EMPRESA QUE CUENTA CON EXPERIENCIA DEMOSTRADA, CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA Y DE RESPUESTA INMEDIATA NECESARIAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TIEMPO PREESTABLECIDO. CON EL HECHO DE RECURRIR AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, SE ATIENDE CON MAYOR RAPIDEZ LA DEMANDA DE LAS INSTALACIONES QUE REQUIERE UN EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA ADEMAS, AL

ASEGURARNOS QUE LA EMPRESA SELECCIONADA PARA ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ANTES DESCRITOS Y NOS FACILITA EL PROCESO DE CONTRATACION, EFICIENTANDO CON ELLO LA EJECUCION DE LA OBRA. CON ESTO SE CUMPLE CON EL PROPOSITO PERSEGUIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, QUE ES EN ESTE CASO, EL ADJUDICAR EN FORMA OPORTUNA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EL OBJETO DE UN CONTRATO.

C).- DE EFICIENCIA:CON LA MODALIDAD ELEGIDA SE PRETENDE DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON EL COSTO ACEPTABLE ASIGNANDO EL CONTRATO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS CON QUE SE CUENTA PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS QUE PERMITAN LOGRAR LOS OBJETIVOS EN LAS MEJORES CONDICIONES TANTO TÉCNICAS COMO ECONÓMICAS, EL CUAL SE TIENE COMO OBJETIVO COMBATIR LOS ÍNDICES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y REZAGO, POR LO QUE SON COBERTURA DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, COINCIDIENDO CON ALGUNOS DE LOS SEÑALADOS EN EL SISTEMA NACIONAL PARA LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE.

D).- DE IMPARCIALIDAD: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZO CON EL ÚNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA QUE EXISTA UNA POBLACIÓN SIN ÍNDICES DE POBREZA, MARGINACIÓN, REZAGO Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA, HABIÉNDOSE SELECCIONADO CON IMPARCIALIDAD A UNA EMPRESA CUYA CAPACIDAD NOS GARANTIZA QUE CUMPLIRÁ CON EL COMPROMISO CONTRACTUAL DE ACUERDO CON SU CURRICULUM COMO EMPRESA Y LA CURRICULA DE SU PERSONAL Y SIN MEDIAR OTRO TIPO DE RAZONES. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA SELECCION DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICACION DIRECTA, SE REALIZO CON EL UNICO OBJETIVO DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, POR LO QUE SE REALIZO CON IMPARCIALIDAD QUE JUSTIFICA Y PERMITE LLEVAR A CABO LA CONTRATACION A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, DICHA IMPARCIALIDAD SE REFIERE A ECONOMIA, EFICACIA Y EFICIENCIA, QUE GARANTIZAN Y SATISFACEN EN FORMA FEHACIENTE LOS OBJETIVOS Y REQUERIMIENTOS DE LA IDONEA CONTRATACION QUE SE PRETENDE.

E).- DE HONRADEZ: LA SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, SE REALIZA CON HONRADEZ, TODA VEZ QUE EL PROCEDIMIENTO QUE SE PLANTEO SE LLEVO A CABO CON TODA TRANSPARENCIA AL ACREDITARSE LOS CRITERIOS QUE SE JUSTIFICAN, REALIZÁNDOSE EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA EMPRESA QUE CUMPLE LAS CONDICIONES QUE SE REQUIEREN OBTENIÉNDO ASÍ LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO. HABIÉNDOSE EVALUADO ADMINISTRATIVAMENTE A LA EMPRESA SELECCIONADA POR LO QUE NO SE ENCONTRÓ IMPEDIMENTO DE ESTE CARÁCTER PARA SU CONTRATACIÓN.

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y

C O N S I D E R A N D O

1.- QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS ES COMPETENTE PARA EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN Y CELEBRAR EL CONTRATO

RESPECTIVO, CUYO OBJETO SE ENCUENTRA PREVISTO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO Y SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA SU REALIZACIÓN.

2.- QUE ESTA DEPENDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LAS FORMALIDADES DE LEY, DETERMINO PROCEDENTE ADJUDICAR EL CONTRATO EN LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, POR RAZONES QUE DE ACUERDO A EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021 - 2024 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, CONTEMPLA MEJORAR INTEGRALMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL; SIENDO UNAS DE LAS DEMANDAS MÁS SOLICITADAS, LA DE CONSTRUCCIÓN DE MUROS, ANDADORES, ESCALERAS Y PRINCIPALMENTE LA DE PAVIMENTAR CON CONCRETO HIDRÁULICO SUS ACCESOS PRINCIPALES, OBTENIENDO CON ELLO SER INCLUIDOS DENTRO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS, CONTAR CON EL SUMINISTRO SERVICIOS GENERALES, COMO SON: GAS, AGUA ENVASADA, ENTRE OTROS. ASÍ COMO PODER ACCEDER A LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE DAN SOPORTE DE VIDA, SIENDO ESTOS: AGUA POTABLE, DRENAJE, SEGURIDAD PÚBLICA, SALUD Y ELECTRICIDAD, LOGRANDO CON ELLO INCREMENTAR LA COBERTURA DE CARÁCTER SOCIAL.

3.- POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.

SE RESUELVE

PRIMERO. – QUE UNA VEZ VALORADOS LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA, EL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, Y EN COORDINACION CON LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29, 39 Y 54 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y HABIÉNDOSE SATISFECHO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLE EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DETERMINA ADJUDICAR A LA EMPRESA **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., TENIENDO COMO REPRESENTANTE LEGAL A LA C. MELISA CALDERON BAUTISTA,** PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION, 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI, 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, UBICADA EN POB. POCHOTLAXCO** QUE CONSTA DE UN MONTO TOTAL DE: **$1,412,173.30 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.),** MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE: **$225,947.73 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.),** DANDO UN TOTAL DE: **$1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.),** POR LO QUE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO SERÁ DEL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023.**

SEGUNDO.-NOTIFÍQUESE LO ANTERIOR AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO.

ASÍ LO DICTAMINÓ LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EL DÍA VEINTISEIS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.

A T E N T A M E N T E

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARÍA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PÚBLICAS

LMMR/LAAT/FCHO/aaha.

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

CÉDULA DE REGISTRO DEL PADRÓN MUNICIPAL DE CONTRATISTA

REGISTRO: 4635
FOLIO ANUAL: 310

ESPECIALIDADES:
* Prestador de servicios profesionales

REGISTRO: PERSONA MORAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:	**BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE LEGAL:	**MELISA CALDERON BAUTISTA**
DOMICILIO:	JOAQUIN A. PEREZ NO. 3, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850, CD. DE MÉXICO.
TELÉFONO:	222 466 3723
CORREO ELECTRÓNICO:	mcalderon@bombassuarez.com.mx
RFC:	BSU000404GJ7
IMSS:	Y60 42410 10 7
INFONAVIT:	Y60 42410 10 7
REPRESENTANTE TÉCNICO:	**ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO**
CÉDULA PROFESIONAL:	7392514
FECHA DE CÉDULA:	20 DE FEBRERO DEL 2012
RFC:	MOLR800714
TELÉFONO:	222 466 3723
CORREO ELECTRONICO:	mcalderon@bombassuarez.com.mx
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	**27 DE JUNIO DEL 2023**
AFILIACIÓN:	**NO APLICA**

ESCRITURA PÚBLICA

LICENCIADO:	JAIME DE ANDA CABRERA
NOTARÍA:	TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 1
CIUDAD:	CELAYA, GTO.
No. DE ACTA:	1510 FECHA: 13 DE MARZO DEL 2000
No. REG. PUB.:	287434 FECHA: 17 DE ABRIL DEL 2002

VIGENCIA: 27 DE JUNIO DE 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2024

MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

M. I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AOBR-01
REV. 02

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
CALDERON
BAUTISTA
MELISA

FECHA DE NACIMIENTO
19/05/1982

SEXO M

DOMICILIO

FRACC LOS SAUCES 72103
PUEBLA, PUE




CLAVE DE ELECTOR CLBTML82051909M600

CURP CABM820519MDFLTL09 AÑO DE REGISTRO 2000 03

ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1061

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024



IDMEX1199441016<<1061023656483
8205199M2412311MEX<03<<08183<0
CALDERON<BAUTISTA<<MELISA<<<<<

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ORDEN DE TRABAJO	Contrato No. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
4635 **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.** Registro Nombre o razón social **MELISA CALDERON BAUTISTA** Representante legal **JOAQUIN A. PEREZ NO. 3, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850, CD. DE MÉXICO.** Dirección social R.F.C. **BSU000404GJ7** IMSS **Y60 42410 10 7** TEL. **222 466 3723**	**1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION** **2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI** **3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO** Nombre y ubicacion de la Obra **ACAPULCO DE JUAREZ** Localidad y Entidad federativa
Rgtro. Sria. De Prog. Ppto.	Contrato de Obra Publica

Num. De Obra: **MAJ/349** Oficio: **SEPLADE/321/2023**	Autorización de Inversión: **RAMO 33 (FONDO 3)** Fecha: **08 de Mayo de 2023**

ADJUDICACION DIRECTA No. MAJ/349

1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION	**$ 600,038.00**
2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI	**$ 619,872.30**
3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO	**$ 192,263.00**

Nombre y ubicación de la Obra

DESCRIPCION DE LA OBRA:	SUBTOTAL	$ 1,412,173.30
Ver. Especif. de Conceptos en Presupuesto Anexo.	16% IVA	$ 225,947.73
	TOTAL	**$ 1,638,121.03**

NOTAS IMPORTANTES

Fecha de inicio: 05 de Agosto del 2023	Fecha de terminación: 02 de Noviembre del 2023

Forma de pago contra la presentación de estimaciones debidamente autorizadas.

Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas

Acapulco, Gro., 26 de Julio del 2023

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA

PCOR-01
REV. 02

CONTRATO N°. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD,** RELATIVO A LA OBRA: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO**, EN ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE**, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO**, A QUIEN SE DENOMINARÁ "**LA SECRETARÍA", REPRESENTADA POR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA,** EN SU CARÁCTER DE **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS**, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. Y POR LA OTRA **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.,** REPRESENTADA POR EL C. **MELISA CALDERON BAUTISTA, CON NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS 4635,** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL** A QUIEN SE DENOMINARÁ **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA "LA SECRETARÍA" MEDIANTE SUS REPRESENTANTES.

1.- QUE EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL **ARTÍCULO 115, FRACCIONES I, II y III A), D), E), F), G), H), I), Y IV B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS** Y ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, ES UN MUNICIPIO GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INVESTIDO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD, SIN MÁS LÍMITES QUE LOS SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN LAS LEYES APLICABLES.

1.1.- **QUE CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 170 NUMERAL 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO**; 26, 29, 30, 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GUERRERO, Y; 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ES EL ÓRGANO DE GOBIERNO A CUYA DECISIÓN SE SOMETEN LOS ASUNTOS DE LA VIDA PÚBLICA MUNICIPAL Y LOS DE SU PROPIA ADMINISTRACIÓN QUE LAS LEYES PREVÉN, ASÍ COMO LA DE EJERCER VIGILANCIA DIRECTA DE LOS ACTOS DE SUS MIEMBROS EN TODO MOMENTO, CUYAS FACULTADES DE EJECUCIÓN ESTÁN DEPOSITADAS EN EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

1.2.- QUE EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 29 FRACCIONES I, V, Y VII DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO EN VIGOR, TUVO A BIEN DESIGNAR COMO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS**

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PÚBLICAS A LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, Y POR ENDE, LA FACULTAD Y REPRESENTACIÓN LEGAL PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SUS SERVICIOS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 72 Y 73 FRACCIONES IX Y X DE LA LEY ORGÁNICA INVOCADA EN RELACIÓN CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO **27 FRACCIONES XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIV, XXVIII, Y 28 DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ,**

GUERRERO. EN VIRTUD DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, ES LA ENTIDAD MUNICIPAL ENCARGADA DE ORDENAR LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REGULAR EL DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO CONDUCIR, NORMAR, PROYECTAR Y EJECUTAR LAS OBRAS PÚBLICAS, INSERTAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES EN LA MATERIA.

1.3.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA AV. CUAUHTÉMOC S/N INTERIOR PARQUE PAPAGAYO, COL. HORNOS INSURGENTES, ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO. C. P. 39350.

1.4.- PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN MEDIANTE EL **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023. AUTORIZADO MEDIANTE EL OFICIO SEPLADE/321/2023, DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023.** CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE A SU VEZ SE HAYA INCLUIDO EN EL PROGRAMA DE OBRAS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2023.

1.5.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICÓ A **"EL CONTRATISTA"** PARA LLEVAR A CABO LAS OBRAS A QUE SE DESTINA LA INVERSIÓN AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA DECLARACIÓN 1.4, A TRAVÉS DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA**, TAL COMO LO SEÑALA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 EN EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN III.

2. "EL CONTRATISTA" DECLARA:

2.1.- ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1510 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2000,** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JAIME DE ANDA CABRERA TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 1, CELAYA, GTO.** CON REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO **287434 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2002.**

2.2.- EL C. **MELISA CALDERON BAUTISTA,** QUIEN SE IDENTIFICA CON **CREDENCIAL DE ELECTOR**, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO **1510 DE FECHA 13 DE MARZO DEL 2000** OTORGADA ANTE LA FE DEL **LIC. JAIME DE ANDA CABRERA TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NO. 1, CELAYA, GTO.** INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO, BAJO EL FOLIO **287434** DE FECHA **17 DE ABRIL DEL 2002.** MANDATO QUE A LA FECHA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

2.3.- TENER ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **JOAQUIN A. PEREZ NO. 3, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, C.P. 11850, CD. DE MÉXICO.,** MISMO QUE SEÑALA PARA QUE SE LE PRACTIQUEN LAS NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SEÑALE POR ESCRITO OTRO DISTINTO, PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS DE ESTE CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

2.4.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO.

2.5.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A EMPLEAR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

2.6.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO BAJO PENA DE PERDER, EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA, TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

2.7.- QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL CUENTA CON LOS REGISTROS QUE SE CITAN A CONTINUACIÓN, LOS CUALES ESTÁN VIGENTES.

- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO N°. **BSU000404GJ7.**

- REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ N°. **4635.**

- REGISTRO, ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INSTITUTO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES N°. **Y60 42410 10 7.**

2.8.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA SOCIEDAD DESEMPEÑA ALGÚN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO, ASÍ COMO QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO QUE LE IMPOSIBILITE A OBLIGARSE EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO.

2.9.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS APLICABLES.

2.10.- CONOCER EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y CONSECUENTEMENTE, HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

3. AMBAS PARTES DECLARAN:

3.1.- SUJETARSE ESTRICTAMENTE A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO; ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO EL MANUAL ÚNICO DE OPERACIÓN DEL RAMO XXXIII.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

3.2.- QUE EL PRESENTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

3.3.- CONOCER EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTENIDO DE

LOS ANEXOS QUE FUERON DEBIDAMENTE FIRMADOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** Y QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS DECLARACIONES Y DEFINICIONES ANTERIORES, SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" ENCOMIENDA A **"EL CONTRATISTA"** LA REALIZACIÓN DE LA OBRA: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO,** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, **CONSISTENTE EN: CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2", MOTOR VERTICAL 10 HP 2 POLOS 230/460 V ARMAZON 215 TP TIPO TUS 3600 RPM, CABEZAL ESTRUCTURAL 3 X 4 X 16 1/2 WL, BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3", INVERSOR DE FRECUENCIA HC AL VCD MOD FDRIVE SOLAR-2418, INSTALACION DE EQUIPO VERTICAL DE 10 HP, MOTOR SUMERGIBLE 30 HP 6" 3F 460 V 60 HZ REBOBINABLE, CABLE FOTOVOLTAILCO 10 AWG (2000 V), TABLERO GENERAL DE SERIES CON CLEMAS E INTERRUPTORES EN GABINETE, LOTE DE MATERIAL ELECTRICO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 30 HP, INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO SOLAR E INVERSOR.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LA DECLARACIÓN 3.3 DE ESTE CONTRATO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO; SIENDO **"EL CONTRATISTA"** RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE ÉSTOS CUMPLAN CON TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS POR **"LA SECRETARÍA",** COMO SON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA **(ANEXO I)** EL CUAL CONTIENE: EL CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, GENERADORES, PROGRAMA DE OBRA, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMA DE OBRA Y PLANOS DEL PROYECTO.

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA CUYA EJECUCIÓN SE CONTRATA ES POR LA CANTIDAD DE: **$1,412,173.30 (UN MILLON CUATROCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)** MÁS IMPUESTO AL VALOR AGREGADO **$225,947.73 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N.)** CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO RESULTA DE **$1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03 /100 M.N.),** DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE OBRA PRESENTADO.

EL MONTO TOTAL DE LA OBRA MATERIA DE ESTE CONTRATO CUBRE A **"EL CONTRATISTA"** TODAS LAS PRESTACIONES, GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA MISMA, INCLUYENDO LOS IMPUESTOS O DERECHOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE CAUSEN, SIENDO IMPROCEDENTE EL INCREMENTO AL PRECIO DE OPERACIÓN ESTABLECIDO.

"LA SECRETARÍA" LLEVARÁ A CABO LAS RETENCIONES FISCALES CORRESPONDIENTES, QUE SE ORIGINEN POR CONCEPTO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ES DE **90 DIAS** NATURALES, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **05 DE AGOSTO DEL 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **02 DE NOVIEMBRE DEL 2023,** DE CONFORMIDAD CON EL

PROGRAMA DE OBRA PRESENTADO POR **"EL CONTRATISTA"**. TODOS LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERÁN COMO DÍAS CALENDARIO, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY SEAN INHÁBILES PERO CUANDO UN PLAZO TERMINE EN UN DÍA INHÁBIL, CONCLUIRÁ A LAS 24 HORAS DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE.

ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE EL DÍA DE INICIO DE LOS TRABAJOS LA **RESIDENCIA**, HAGA LA APERTURA A LA BITÁCORA DE OBRA, INSTRUMENTO EN EL QUE DEBERÁN REFERIRSE LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y POR MEDIO DE ELLA, DAR INSTRUCCIONES Y RECIBIR SOLICITUDES QUE SE FORMULEN ENTRE **LA RESIDENCIA Y LA SUPERINTENDENCIA**, EL USO DE LA BITÁCORA SE REGIRÁ CONFORME AL CAPÍTULO IV, SECCIÓN II, ARTÍCULOS 122, 123, 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:

"LA SECRETARÍA" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA",** PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO; EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EL DIFERIMIENTO SE CONSIGNARÁ EN EL CONVENIO QUE PARA TAL EFECTO CELEBREN LAS PARTES.

ASÍ MISMO, **"LA SECRETARIA",** DEBERÁ TRAMITAR Y OBTENER DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, ASÍ COMO LA PROPIEDAD O LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INCLUYENDO DERECHOS DE VÍA Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES SOBRE LOS CUALES SE EJECUTARÁN LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PREVISTAS POR LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PROTECCIÓN AL AMBIENTE, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERA PARA LA INICIACIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS POR EL PRESENTE CONTRATO.

QUINTA: ANTICIPO, PORCENTAJE, AMORTIZACIÓN Y COMPROBACIÓN.

PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INICIO DE TRABAJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL **50 % (CINCUENTA POR CIENTO)** DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE **$706,086.66 (SETECIENTOS SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 66/100 M.N.)** MAS EL I.V.A.

DICHO ANTICIPO SE OTORGARÁ EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA PARA SU CORRECTA APLICACIÓN, DEBIENDO SER PAGADO EL MISMO, CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA POR **"EL CONTRATISTA"** QUE ACREDITE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADA. PARA EL CASO DE QUE **"LA SECRETARÍA"**, POR CAUSAS IMPUTABLES A LA MISMA, NO ENTREGASE A **"EL CONTRATISTA"** EL ANTICIPO EN LA FECHA PREVISTA, SE PODRÁ DIFERIR SIN MODIFICAR EL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA, PARA CUYO EFECTO DEBERÁ SUSCRIBIRSE ENTRE LAS PARTES EL CONVENIO DE DIFERIMIENTO RESPECTIVO, EL QUE CONTENDRÁ LAS NUEVAS FECHAS DE INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA OBRA.

LA FALTA DE EXHIBICIÓN OPORTUNA DE LA FIANZA O SU PRESENTACIÓN EN TÉRMINOS DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS, ACARREARAN AUTOMÁTICAMENTE EL ATRASO EN LA FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO Y EN TAL EVENTO NO SERÁ PROCEDENTE EL OTORGAMIENTO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO, POR LO TANTO **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ INICIAR LA OBRA EN LA FECHA ESTABLECIDA EN LA CLÁUSULA TERCERA.

"LA SECRETARÍA", PODRÁ PRACTICAR REVISIONES Y AUDITORIAS EN CUALQUIER TIEMPO PARA COMPROBAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL ANTICIPO, PARA TAL EFECTO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A DAR LAS FACILIDADES NECESARIAS Y ACREDITAR FEHACIENTEMENTE LA APLICACIÓN DEL MISMO, EXHIBIENDO LAS FACTURAS DE LOS PAGOS EFECTUADOS A SUS PROVEEDORES DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

SI **"EL CONTRATISTA"** DESTINA EL IMPORTE DEL ANTICIPO A FINES DISTINTOS A LOS CONSIGNADOS, **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁ OPTAR POR EXIGIR DE INMEDIATO A **"EL CONTRATISTA"** LA DEVOLUCIÓN DEL MISMO, Y ADEMÁS, OPTAR POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.

EL ANTICIPO DEBERÁ SER AMORTIZADO PROPORCIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIÉNDOSE LIQUIDAR EL REMANENTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN FINAL.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR, SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE

LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARÁ DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL TÉRMINO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**,

EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A REINTEGRAR A **"LA SECRETARÍA"**, EL SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN MEDIANTE LA QUE SE DA POR RESCINDIDO ESTE CONTRATO, PARA LO CUAL SE LE RECONOCERÁN LOS MATERIALES QUE TENGA EN OBRA O EN PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS A SATISFACCIÓN DE **"LA RESIDENCIA"**, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADO, A LOS DATOS BÁSICOS DE PRECIOS DEL CONCURSO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE LA RESCISIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA CALIDAD REQUERIDA, PUEDAN UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS Y **"EL CONTRATISTA"** SE COMPROMETA A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ÉSTE SE OBLIGA A PAGAR GASTOS FINANCIEROS, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES; DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA".**

LA PÓLIZA DE FIANZA DEL ANTICIPO, QUE GARANTICE LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE:

a) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGA A LA EMPRESA **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.** Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;

c) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

d) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO, **"LA SECRETARÍA"**, QUE LA PRODUCIRÁ CUANDO EL IMPORTE DEL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.

e) QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE.

f) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

g) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADO GUERRERO, RENUNCIANDO CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO. FIN DEL TEXTO

SEXTA: FORMA DE PAGO.

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES SUJETAS AL AVANCE DE LOS TRABAJOS CON BASE EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, QUE ABARCARÁN PERIODOS NO MAYOR DE UN MES CALENDARIO Y SERÁN PRESENTADAS POR **"EL CONTRATISTA"** A **LA RESIDENCIA**, DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE CORRESPONDIENTE, CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN. CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE **"LA SECRETARÍA"**, INICIE SU TRÁMITE DE PAGO.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN DE PAGARSE POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRATISTA HAYA PRESENTADO LAS CORRECCIONES OBSERVADAS Y SE VALIDE LA FACTURA CORRESPONDIENTE POR EL AREA DE CONTROL ADMINISTRATIVO. EL PERIODO DE VEINTE DIAS PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES, SE CONTABILIZARA A PARTIR QUE EL CONTRATISTA ENTREGUE LAS CORRECCIONES AL ÁREA CORRESPONDIENTE.

EL RESIDENTE DE OBRA EFECTUARA LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 DÍAS NATURALES CONTADOS APARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTE DE COSTOS POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, ÉSTA A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, PAGARÁ GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"EL CONTRATISTA".**

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO **"EL CONTRATISTA",** ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA DEPENDENCIA".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE **"LA SECRETARÍA."** TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

SI **"EL CONTRATISTA"** REALIZA TRABAJOS EXCEDENTES O EXTRAORDINARIOS, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE PARTE DEL **"RESIDENTE Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS"**, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI LA MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS. PARA QUE **"EL CONTRATISTA"** PUEDA CANCELAR SU(S) FACTURA(S) UNA VEZ QUE SE HA(N) VALIDADO LA(S) MISMA(S), SERÁ NECESARIO CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE **"LA SECRETARIA".** LA CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS SIN ESTE REQUISITO, LIBERA AL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ DE LA OBLIGATORIEDAD DEL PAGO. SE GIRARA OFICIO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE DICHA CANCELACIÓN PARA LO CONDUCENTE.

SÉPTIMA: LUGAR DE PAGO:

EL PAGO POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS, LOS EFECTUARÁ **LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, UBICADA EN COSTERA MIGUEL ALEMÁN No. 315 COL. CENTRO. C.P. 39300 EN ACAPULCO DE JUÁREZ GUERRERO A TRAVÉS DE LA FORMA: TRANSFERENCIA BANCARIA MEDIANTE VÍA ELECTRÓNICA O CHEQUE NOMINATIVO. EL PLAZO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SE RIGE POR EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

OCTAVA: GARANTÍAS.

A) GARANTÍA DE LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CARTA DE ADJUDICACIÓN, DEBERÁ PRESENTAR A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DEL **MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ**, FIANZA POR EL TOTAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO MAS I.V.A., OTORGADA POR INSTITUCIONES DE FIANZAS, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

LA GARANTÍA OTORGADA PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS ANTICIPOS, SE CANCELARÁ CUANDO **"EL CONTRATISTA"** HAYA AMORTIZADO EL IMPORTE TOTAL DE LOS MISMOS, PREVIA AUTORIZACIÓN ESCRITA DE "**LA SECRETARÍA**" EN EL CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** NO HAYA DEVUELTO EL SALDO DEL ANTICIPO NO AMORTIZADO EN LA FECHA SEÑALADA EN LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE, SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA Y SE LE PENALIZARÁ CON LOS GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARAN SOBRE EL SALDO NO AMORTIZADO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA LA CANTIDAD A DISPOSICIÓN DE "**LA SECRETARÍA**"

ESTA GARANTÍA SOLAMENTE SE LIBERARÁ CUANDO SE HAYA AMORTIZADO TOTALMENTE EL ANTICIPO CONCEDIDO.

B) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE HABER RECIBIDO LA CARTA DE ADJUDICACIÓN A CONSTITUIR UNA FIANZA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE SU PROPOSICIÓN, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, MISMA QUE ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DE **"EL CONTRATISTA"**, Y ÉSTE HAGA PAGO DE LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS EN FORMA INCONDICIONAL DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FINIQUITO, "**LA SECRETARÍA**" DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA; EN CASO CONTRARIO, "**LA SECRETARÍA**" PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

C) GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** MEDIANTE FIANZA EQUIVALENTE AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO MAS I.V.A. EXPEDIDA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN CONTRAVENCIÓN AL CONTENIDO DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS DATOS DEL PROYECTO ANEXO A ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, ASÍ COMO LOS NUMERALES 89, 94, 95, 96, 97 Y 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

LA PÓLIZA DE FIANZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS QUE.

a) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;

b) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;

c) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;

d) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE

e) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"**

f) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE **"LA SECRETARÍA"**, HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;

g) QUE LA FIANZA SE OTORGA TAMBIÉN PARA GARANTIZAR LA CORRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

h) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y, EN CONSECUENCIA, ÉSTA CONTINUARÁ VIGENTE; Y,

i) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUÉ LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, **"LA SECRETARÍA"**, DEBERÁ LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS

j) LA FIANZA CONTINUARA EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, **"EL CONTRATISTA"** GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 95 DEL REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA"**, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA"**, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE.

k) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL **"CONTRATISTA"** PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"**, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA;

l) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.

m) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA A **"EL CONTRATISTA"** LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;

SI **"EL CONTRATISTA"** NO PRESENTARA LAS GARANTÍAS EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS.

LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO Y AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE.

PARA OBTENER EL AJUSTE DE LOS PRECIOS UNITARIOS SE CONSIDERARAN LOS TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS SIGUIENTES:

I.- LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

II.- LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y

III.- EN CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

A) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL "PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO" EN EL CONTRATO O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "**EL CONTRATISTA**", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.

CUANDO POR CAUSA IMPUTABLE AL **"CONTRATISTA"** EXISTIERA ATRASO, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA PRESENTADO EN SU PROPUESTA.

B) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIO PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA **"EL CONTRATISTA"** Y **"LA SECRETARÍA"** NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO **"LA SECRETARÍA"** POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;

C) LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA; Y

D) A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA CONTRALORÍA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE "**LA SECRETARÍA**" A SOLICITUD DE **"EL CONTRATISTA"** A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE "**LA SECRETARÍA**" RESUELVA POR ESCRITO SOBRE LA PROCEDENCIA DE SU PETICIÓN. APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE CONCEDIDOS DEBERÁN ACUMULARSE. EN CASO DE PRESENTARSE REDUCCIÓN EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SE PRACTICARÁ UNA REVISIÓN, Y DE SER PROCEDENTE, SE EFECTUARÁ EL AJUSTE CORRESPONDIENTE.

DECIMA: SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

"**LA SECRETARÍA**" A TRAVÉS DEL REPRESENTANTE QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, TENDRÁ EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A **"EL CONTRATISTA"** POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO LE SEAN ORDENADAS.

POR SU PARTE "**LA SECRETARÍA"** EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266 Y 112 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DESIGNA COMO SU REPRESENTANTE DIRECTO EN LA OBRA PARA PODER TRATAR LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON, O DERIVADOS DE, LOS TRABAJOS A **EL C. ING. GERARDO CATALAN QUIROZ, "LA SECRETARÍA"** DESIGNARA POR ESCRITO AL **RESIDENTE** RESPONSABLE DE LA OBRA, CON LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 113 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

"**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS CUANDO **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLA LAS ESTIPULACIONES DE ESTE CONTRATO O EN SU CASO, A LAS INSTRUCCIONES RECIBIDAS POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA DE OBRA POR PARTE DEL **RESIDENTE**, DEBIENDO **"EL CONTRATISTA"** REALIZARLAS POR SU CUENTA Y SIN DERECHO A RETRIBUCIÓN ALGUNA. ASÍ MISMO "**LA SECRETARÍA**" PODRÁ ORDENAR LA **SUSPENSIÓN** TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA CONTRATADA, EN TANTO SE LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN O REPOSICIÓN, SIN QUE SEA MOTIVO DE AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS.

"LA CONTRATISTA" DEBERA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES PARA LAS PRUEBAS DE SUS OBRAS, EL CUAL DEBERÁ ESTAR ACREDITADO ANTE "**LA SECRETARIA"**. NO SE ACEPTARÁN PRUEBAS DE LABORATORIOS QUE NO ESTEN ACREDITADOS.

PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS OBRAS CONTRATADAS, **"LA SECRETARIA"** CONTARÁ CON LOS SERVICIOS DE UN LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES EXTERNO, EL CUAL ELABORARÁ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, REVENIMIENTO, RESISTENCIA DE LOS CONCRETOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LAS OBRAS CONTRATADAS.

DÉCIMA PRIMERA: REPRESENTANTE DEL "CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER LA RESIDENCIA DE OBRA DEBIENDO ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE SERA EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN Y PARA TAL EFECTO **"EL CONTRATISTA"** DESIGNA AL **ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO** CON CÉDULA PROFESIONAL No. **7392514** EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES EL **20 DE FEBRERO DEL 2012,** REGISTRADO COMO **"SUPERINTENDENTE",** EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES TÉCNICAS EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

QUE DEBERÁ CONOCER CON AMPLITUD LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA, PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN Y NORMAS DE CALIDAD, BITÁCORA, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DESIGNADO POR **"EL CONTRATISTA"**, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE CONOCER EL CONTRATO, EL PROYECTO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEBERÁ ESTAR FACULTADO PARA DIRIGIR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA ACEPTAR U OBJETAR LAS ESTIMACIONES DE OBRA QUE SE FORMULEN Y, EN GENERAL, PARA ACTUAR A NOMBRE DEL **"CONTRATISTA"** CON LAS FACULTADES LEGALES NECESARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

EL **SUPERINTENDENTE** DE CONSTRUCCIÓN DEBE ESTAR FACULTADO POR **"EL CONTRATISTA"**, PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, ASÍ COMO CONTAR CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, Y DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO, Y **"EL CONTRATISTA"** EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS NATURALES TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOMBRAR A OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA.

DÉCIMA SEGUNDA: RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL.

"EL CONTRATISTA" CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN QUEDA EXCLUIDO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ANTE RECLAMACIONES JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES.

DE IGUAL FORMA, **"EL CONTRATISTA"** RESPONDERÁ POR CUALQUIER RELACIÓN JURÍDICA QUE SE ORIGINE POR ACTOS JURÍDICOS CONTRAÍDOS CON PROVEEDORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y DEMÁS OPERARIOS QUE CONTRATE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA: RESPONSABILIDADES DEL "CONTRATISTA".

CON EL OBJETO DE LLEVAR UNA PERMANENTE VIGILANCIA DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN **"EL CONTRATISTA"** DEBERÁ RESPONDER POR LA DEBIDA CAPACIDAD Y PROFESIONALISMO DE SUS TÉCNICOS Y TRABAJADORES QUE EJECUTEN LA OBRA, PERMITIENDO EN TODO MOMENTO Y OTORGANDO TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS AL PERSONAL TÉCNICO DE **"LA SECRETARÍA"** PARA REALIZAR LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN, PROPORCIONANDO TODA LA INFORMACIÓN QUE SEA REQUERIDA DE IGUAL FORMA.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS, Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE **"LA SECRETARÍA";** ASÍ, COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A **"LA SECRETARÍA",** O A TERCEROS; EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR SU MONTO TOTAL.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

IGUALMENTE, **"EL CONTRATISTA"** SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES Y TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARAN ESTE CONTRATO (ESTIMACIONES DE OBRA, FACTURAS O CONTRA RECIBOS) SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE **"LA SECRETARÍA".**

"EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SUBCONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O PARTE DE LA MISMA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUANDO ÉSTOS NO SE HAYAN REALIZADO CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE POR ESCRITO LE PROPORCIONE **"LA SECRETARÍA" (CATALOGO DE CONCEPTOS)** ÉSTE ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA Y SERÁN POR CUENTA DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE A LAS DISPOSICIONES DE SEGURIDAD QUE **"LA SECRETARÍA"** TENGA ESTABLECIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, A LOS DEMÁS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CAUSE A **"LA SECRETARÍA"** O A TERCERAS PERSONAS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS POR NO AJUSTARSE AL CONTRATO, POR INOBSERVANCIA DE LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES. LOS RIESGOS Y LA CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A **"LA SECRETARÍA",** SERÁN A CARGO DE **"EL CONTRATISTA".**

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE TODOS LOS ADEUDOS QUE FRENTE AL FISCO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL TENGA, CON MOTIVO DE CONTRIBUCIONES QUE SE CAUSEN COMO CONSECUENCIA Y EN EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE CONTRATAN (IMPUESTOS, DERECHOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL)

DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR ESTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTOS CONVENIOS DEBERÁN SER SUSCRITOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE HAYAN FIRMADO EL CONTRATO O QUIENES LOS SUSTITUYAN EN EL CARGO. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO, AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIEREN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

LAS MODIFICACIONES A ESTE CONTRATO PODRÁN REALIZARSE LO MISMO EN AUMENTO QUE EN REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN O MONTO DEL MISMO. SI SE MODIFICA EL PLAZO, LOS PERIODOS SE EXPRESARÁN EN DÍAS NATURALES, Y LA DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VARIACIÓN SE HARÁ CON RESPECTO DEL PLAZO PACTADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO; EN TANTO QUE SI ES AL MONTO, LA COMPARACIÓN SERÁ CON BASE EN EL MONTO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA.

LAS MODIFICACIONES AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁN INDEPENDIENTES A LAS MODIFICACIONES AL MONTO, DEBIENDO CONSIDERARSE EN FORMA SEPARADA, AÚN CUANDO PARA FINES DE SU FORMALIZACIÓN PUEDAN INTEGRARSE EN UN SOLO DOCUMENTO.

LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO LAS PARTES CONVIENEN EN QUE **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SOLICITAR POR ESCRITO UNA AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, SIEMPRE QUE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR, CASOS FORTUITOS O CUALESQUIERA OTRA CAUSA NO IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA",** LE FUERE IMPOSIBLE CUMPLIR CABALMENTE EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

LAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN QUE **"LA SECRETARÍA"** TIENE LA FACULTAD DE AUTORIZAR O DENEGAR LA SOLICITUD, CUANDO A SU JUICIO EXISTAN LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN FEHACIENTEMENTE O NO LA PROCEDENCIA.

SE DEBERÁ SUSTENTAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE ORIGINEN LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES, SEGÚN SEA EL CASO, CONSIDERÁNDOSE ÉSTOS PARTE DE ESTE CONTRATO Y OBLIGATORIAS PARA **"EL CONTRATISTA"** Y "**LA SECRETARÍA**" LAS ESTIPULACIONES QUE EN LOS MISMOS SE ESTABLEZCAN.

DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.

"**LA SECRETARÍA**" EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LO CUAL SE ELABORARÁ UN DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN, ESTABLECIENDO EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN, QUE PODRÁ PRORROGARSE SI LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LA INTERRUPCIÓN PERSISTEN, DEBIENDO INFORMAR EL CONTENIDO DE ESTA RESOLUCIÓN A **"EL CONTRATISTA"**; EN ESTE CASO SE INTERRUMPIRÁ EL CALENDARIO ORIGINALMENTE PREVISTO PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN QUE ESTO IMPLIQUE LA CANCELACIÓN, EXTINCIÓN O DISMINUCIÓN DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS.

CUANDO OCURRA LA SUSPENSIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR "**LA SECRETARÍA**" NOTIFICARÁ POR ESCRITO A **"EL CONTRATISTA"**, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE DEBE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** HAYA SUSPENDIDO LOS TRABAJOS, CON BASE A LA INSTRUCCIÓN RECIBIDA POR ESCRITO, LA FECHA DE TERMINACIÓN SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, FORMALIZÁNDOLA MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN, LA QUE CONTENDRÁ COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 147 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"**, DEBIENDO ÚNICAMENTE SUSCRIBIR UN CONVENIO DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO. SIN EMBARGO, CUANDO LOS TRABAJOS RESULTEN DAÑADOS O DESTRUIDOS Y ÉSTOS REQUIERAN SER REHABILITADOS O REPUESTOS, DEBERÁN RECONOCERSE Y PAGARSE MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, SIEMPRE QUE NO SE CELEBRÉ EL CONVENIO PARA CORREGIR DEFICIENCIAS O INCUMPLIMIENTOS ANTERIORES, IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"**.

NO SERÁ MOTIVO DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL SUMINISTRO DEFICIENTE DEL PROVEEDOR DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, CUANDO DICHO SUMINISTRO SEA RESPONSABILIDAD DE **"EL CONTRATISTA"**.

EN EL CASO DE QUE NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SI LA SUSPENSIÓN EXCEDE SEIS MESES **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ DERECHO A SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO EN CONCRETO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

"LA SECRETARÍA" PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL MUNICIPIO; O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS. DE PRESENTARSE ESTA SITUACIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PAGARÁ A **"EL CONTRATISTA"** LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

DE IGUAL FORMA, CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"EL CONTRATISTA"** PODRÁ SUSPENDER LAS OBRAS EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR SU SOLICITUD A **"LA SECRETARÍA"**, QUIEN RESOLVERÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA MISMA, EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE **"EL CONTRATISTA"** OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL CORRESPONDIENTE LA DECLARATORIA RESPECTIVA.

SE ENTIENDE POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, AQUELLOS FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DE PERSONAS CON AUTORIDAD PÚBLICA, GENERAL, INSUPERABLE, IMPREVISIBLE, O QUE PREVIÉNDOSE NO SE PUEDAN EVITAR, Y QUE ORIGINEN QUE UNA PERSONA REALICE UNA CONDUCTA DAÑOSA, CONTRARIA A UN DEBER JURÍDICO O A UNA OBLIGACIÓN. FENÓMENOS DE LA NATURALEZA O HECHOS DEL HOMBRE, TALES COMO (ENUNCIATIVAMENTE MAS NO LIMITATIVA) MOTINES, ACTOS DE TERRORISMO, CUARENTENAS, EPIDEMIAS, GUERRAS (DECLARADAS O NO), DISTURBIOS CIVILES, INSURRECCIONES, INCENDIOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

(CUANDO NO SE HAYA DADO CAUSA O CONTRIBUIDOS A ELLOS), TORMENTAS, IMPIDIÉNDOLE TEMPORALMENTE O DEFINITIVAMENTE EN FORMA ABSOLUTA EL CUMPLIMIENTO PARCIAL O TOTAL DE LA OBLIGACIÓN, SIN QUE TALES HECHOS LE SEAN IMPUTABLES DIRECTA O INDIRECTAMENTE Y CUYA AFECTACIÓN NO PUEDE EVITARSE CON LOS INSTRUMENTOS DE QUE NORMALMENTE SE DISPONGA, YA PARA PREVENIR EL ACONTECIMIENTO O PARA OPONERSE A EL Y RESISTIRLO.

ASÍ MISMO, LA EXTINCIÓN O PÉRDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE **"EL CONTRATISTA"** DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO, SE DEBERÁN REALIZAR LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LA BITÁCORA, DEBIENDO **"LA SECRETARÍA"** LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE CONTENGAN COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 151 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

UNA VEZ NOTIFICADA POR OFICIO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE ESTE CONTRATO A **"EL CONTRATISTA"** POR **"LA SECRETARÍA"** ÉSTA PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS Y EN SU CASO, PROCEDER A SUSPENDER LOS TRABAJOS, LEVANTANDO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A DEVOLVER A **"LA SECRETARÍA"** EN UN TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DEL OFICIO DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE ÉSTA LE HUBIERE ENTREGADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO SE DÉ POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, DEBERÁ ELABORARSE EL FINIQUITO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 168,169, 170, 171 y 172 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

LA SECRETARÍA" PODRÁ, EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS, CONFORME A LO QUE ESTABLECE EL ART. 72 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, Y 154, 155, Y 157 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y EN SU CASO, DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DARÁN LUGAR A DETERMINAR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA EN LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

I. POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA JUSTIFICADA CONFORME A

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS;

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE;

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS;

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA;

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;

XI. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y

XII. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO.

LAS CAUSALES REFERIDAS DAN LUGAR A LA RESCISIÓN INMEDIATA DE ESTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA **"LA SECRETARÍA"**, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A **"EL CONTRATISTA"** LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO, INDEPENDIENTEMENTE DE HACER

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO Y APLICARSE EN SU CASO A **"EL CONTRATISTA"** LOS DEMÁS CARGOS QUE PROCEDAN.

"LAS PARTES "CONVIENEN QUE EN CASO DE QUE **"EL CONTRATISTA"** SE ENCUENTRE EN ALGUNA DE LAS CAUSALES INDICADAS EN LA CLÁUSULA ANTERIOR, EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. EL PROCEDIMIENTO INICIARÁ A PARTIR DE QUE **"LA SECRETARÍA"** LE NOTIFIQUE A "**EL CONTRATISTA"** POR OFICIO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, SEÑALANDO LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVARON SU DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, RELACIONÁNDOLO CON LAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS QUE SE CONSIDEREN HAN SIDO INCUMPLIDAS, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

2. TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL NUMERAL ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER **"EL CONTRATISTA".**

3. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO POR PARTE DE **"LA SECRETARÍA",** DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 1(UNO) DE ESTA CLÁUSULA.

UNA VEZ NOTIFICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, **"LA SECRETARÍA"** SE ABSTENDRÁ, COMO MEDIDA PRECAUTORIA, DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE RESCISIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS.

EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME EL PROGRAMA VIGENTE, ATENDIENDO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 162 Y 163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO **"LA SECRETARÍA"** LE HAYA ENTREGADO A **"EL CONTRATISTA"**, ASÍ COMO CONSIDERAR EN SU INTEGRACIÓN LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HAYA REALIZADO **"EL CONTRATISTA"** HASTA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO LOS EQUIPOS, MATERIALES QUE SE HUBIERAN INSTALADO EN LA OBRA O SE ENCUENTREN EN PROCESO DE FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SEAN SUSCEPTIBLES DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE REALIZAR, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y 161 DEL REGLAMENTO.

EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS GARANTÍAS, PENAS CONVENCIONALES Y DEMÁS CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

COMUNICADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, Y EN SU CASO PROCEDERÁ A SUSPENDER

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

LOS TRABAJOS, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE **"EL CONTRATISTA"**, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRE LA OBRA.

INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ANTES DE SU CONCLUSIÓN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ A SU JUICIO, SUSPENDER EL TRÁMITE DEL CITADO PROCEDIMIENTO, CUANDO SE HUBIERE INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL PRESENTE CONTRATO. EN EL CASO DE QUE SE DETERMINE NO RESCINDIR EL CONTRATO, SE REPROGRAMARÁN LOS TRABAJOS UNA VEZ NOTIFICADA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE POR **"LA SECRETARÍA"** A **"EL CONTRATISTA".**

"LA SECRETARÍA" PODRÁ OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNAS O DE OTRO.

DECIMA OCTAVA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE ESTE CONTRATO, **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** CONVIENEN LA APLICACIÓN DE LAS SIGUIENTES RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES:

A).-"LA SECRETARÍA" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR MENSUALMENTE SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR **"EL CONTRATISTA"** DE ACUERDO CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO; PARA LO CUAL, **"LA SECRETARÍA"** COMPARARÁ EL AVANCE MES A MES CONTRA EL PROGRAMA, Y LOS TRABAJOS EFECTIVOS EJECUTADOS.

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES MENOR DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LAS FECHAS EN QUE SE DETERMINEN LOS ATRASOS, POR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 5% (CINCO POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES POR EL NÚMERO DE MESES TRANSCURRIDOS, DESDE LA FECHA DEL ATRASO EN EL PROGRAMA, HASTA LA DE REVISIÓN. LAS RETENCIONES SERÁN DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO OPORTUNAMENTE CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIDO, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

CUANDO **"EL CONTRATISTA"** REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PODRÁ RECUPERAR LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HAYAN EFECTUADO, POR LO QUE **"LA SECRETARÍA"** LE REINTEGRARÁ EL IMPORTE DE LAS MISMAS QUE AL MOMENTO DE LA REVISIÓN TUVIERA ACUMULADAS.

LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO.

B).- SI **"EL CONTRATISTA"** NO CONCLUYE LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO Y EN EL PROGRAMA DE TRABAJO, **"LA SECRETARÍA"** LE APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES QUE RESULTEN DE MULTIPLICAR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS QUE NO SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA MES O FRACCIÓN QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE SU TERMINACIÓN. DICHAS PENAS NO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DE LAS RETENCIONES SE DESCONTARÁN ADMINISTRATIVAMENTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN Y EL DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, Y SE APLICARÁN, SIEMPRE Y CUANDO EL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SEA POR CAUSAS IMPUTABLES A **"EL CONTRATISTA"** Y QUE NO HAYA SIDO RESULTADO DE LA DEMORA MOTIVADA POR CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL QUE A JUICIO DE **"LA SECRETARÍA"** NO SE ATRIBUYA A CULPA DE **"EL CONTRATISTA"**.

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RETENCIONES O DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLIQUEN, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, O BIEN, LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL MISMO, HACIENDO EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA GARANTÍA DEL ANTICIPO, TOTAL O PARCIALMENTE, SEGÚN PROCEDA EN LA RESCISIÓN, EN EL CASO DE QUE EL ANTICIPO NO SE ENCUENTRE TOTALMENTE AMORTIZADO.

SI **"LA SECRETARÍA"** OPTA POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA DE ESTE CONTRATO.

DECIMA NOVENA: TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" COMUNICARÁ A TRAVÉS DE LA BITÁCORA O POR ESCRITO A **"LA SECRETARÍA"** SOBRE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS ANEXANDO LOS DOCUMENTOS QUE LO SOPORTEN E INCLUIRÁ UNA RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS, MONTO EJERCIDO Y CRÉDITOS A FAVOR O EN CONTRA, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SALVO QUE SE PACTE EXPRESAMENTE OTRO PLAZO, QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, **"LA SECRETARÍA"** ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A **"EL CONTRATISTA"** SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ÉSTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. EN TAL CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERIODO QUE ACUERDEN **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE **"LA SECRETARÍA"** OPTE POR LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO.

UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO ANTERIOR **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, SUSCRIBIENDO EL **"ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN"** EN LA QUE CONSTE ESTE HECHO, DEBIENDO CONTENER COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 166 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A PRESENTAR **A "LA SECRETARÍA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE **A "LA SECRETARÍA"** HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN REAL DE LOS TRABAJOS, TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL **FINIQUITO DEL CONTRATO**, INCLUYENDO ESTIMACIONES POR CONCEPTO DE OBRA EJECUTADA, CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA FUERA DE CATÁLOGO, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, SOLICITUD DE AJUSTE A LOS COSTOS POR CONCEPTO DE IMPACTO INFLACIONARIO (EN CASO DE EXISTIR) Y **PLANO DE OBRA TERMINADA** EN EL QUE SE PLASMEN TODAS LAS MODIFICACIONES Y ADECUACIONES AL PROYECTO ORIGINAL PROPORCIONADO **"EL CONTRATISTA"** PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, TODO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN POR PARTE DE **A "LA SECRETARÍA".**

"LA SECRETARÍA" NO ESTARÁ OBLIGADA A DAR TRÁMITE A LAS SOLICITUDES O DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTE SI **"EL CONTRATISTA"** NO CUMPLIESE CON LA ENTREGA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLÁUSULA.

VIGÉSIMA: FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.

PARA DAR POR TERMINADOS, PARCIAL O TOTALMENTE, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, SE DEBERÁ ELABORAR EL **FINIQUITO DE OBRA** CORRESPONDIENTE, ANEXANDO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS.

"LA SECRETARÍA" DEBERÁ NOTIFICAR POR OFICIO A **"EL CONTRATISTA"** LA FECHA, LUGAR Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO EL FINIQUITO; **"EL CONTRATISTA"** TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ACUDIR AL LLAMADO QUE SE LE HAGA MEDIANTE EL OFICIO RESPECTIVO. EL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS QUE SE INDICAN EN EL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS POR **" LA SECRETARIA"** EL FINIQUITO DEBERÁ SER ELABORADO POR **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE, DEBIENDO EXPONER, EN SU CASO, LAS RAZONES DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, **"EL CONTRATISTA"** NO ACUDA CON **"LA SECRETARÍA"** PARA SU ELABORACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, **"LA SECRETARÍA"** PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR POR OFICIO SU RESULTADO A **"EL CONTRATISTA"** DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A **"EL CONTRATISTA"**, ÉSTE TENDRÁ EL TÉRMINO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"EL CONTRATISTA"**, **"LA SECRETARÍA"** DEBERÁ LIQUIDARLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES. SI RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE **"LA SECRETARÍA"** EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO FUERAN SUFICIENTES ÉSTOS, DEBERÁ EXIGIRSE POR OFICIO SU REINTEGRO, MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE **"LA SECRETARÍA",** EN CASO DE NO OBTENERSE EL REINTEGRO, **"LA SECRETARÍA"** PODRÁ HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES. EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, LA QUE DEBERÁ REUNIR COMO MÍNIMO LOS REQUISITOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 172 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

CUANDO LA LIQUIDACIÓN DE LOS SALDOS SE REALICE DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL FINIQUITO, EL DOCUMENTO DONDE CONSTE EL FINIQUITO PODRÁ UTILIZARSE COMO EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO, DEBIENDO AGREGAR ÚNICAMENTE UNA MANIFESTACIÓN DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** DE QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO SE TENDRÁN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA ESTE CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN. AL NO SER FACTIBLE EL PAGO EN EL TÉRMINO INDICADO, SE PROCEDERÁ A ELABORAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE **"LA SECRETARÍA"** Y **"EL CONTRATISTA"** EN ESTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, LO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

- **EL 0.005** (CINCO AL MILLAR) PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES AFILIADAS A LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE FECHA **02 DE MAYO DE 2022**, CELEBRADO POR LA MENCIONADA CÁMARA Y EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN CON **"LA SECRETARÍA"**, CON EL OBJETO DE APOYAR LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

VIGÉSIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS Y PREVISIBLES DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

"LAS PARTES" CONVIENEN, QUE EN EL CASO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SURJAN DISCREPANCIAS RELATIVAS A CONCEPTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ÉSTAS DEBERÁN REGISTRARSE E INFORMARSE POR **"LAS PARTES"** MEDIANTE NOTA EN BITÁCORA, ACORDANDO QUE RESOLVERÁN LA DISCREPANCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE DICHO REGISTRO, EN CONSECUENCIA, LA SOLUCIÓN Y LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR, DE IGUAL FORMA SE ASENTARÁN POR **"LAS PARTES"** EN LA BITÁCORA. SI NO SE RESOLVIERA LA CONTROVERSIA EN

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

EL PERIODO SEÑALADO, SE TURNARÁ AL DIRECTOR DE OBRA PARA QUE RESUELVA LA CONTROVERSIA EN EL MOMENTO.

VIGÉSIMA TERCERA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES CON SEDE EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, POR LO TANTO, **"EL CONTRATISTA"** RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LEÍDO POR LAS PARTES QUE EN EL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONTRATO AL CALCE Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD Y PUERTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; EL DÍA **26 DE JULIO DEL 2023.**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2021 - 2024

POR "LA SECRETARÍA"

C. ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA.
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

"EL CONTRATISTA"

MELISA CALDERON BAUTISTA
BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
Calle Roberto Posada y Comonfort S/N, Col Centro | Acapulco Guerrero | C.P.39300 |
Tel.74 44 40 70 00 ext. 4228 | Gobierno Municipal de Acapulco

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880826
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3660777

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 31 DE JULIO DE 2023				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$819,060.52	$819,060.52	**PESOS**	14	2317
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$819,060.52 (***OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.***)

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, R.F.C. MAJ-010101NA3.

PARA GARANTIZAR POR BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN JOAQUIN A. PEREZ NO. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO, Y R.F.C. BSU000404GJ7; LA CORRECTA INVERSIÓN, EXACTA AMORTIZACIÓN Y EN SU CASO, DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $819,060.52 (OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SESENTA PESOS 52/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, Y EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, RESPECTO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR LA C. ING. LUZ MARÍA MEREZA RADILLA EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, CUYO OBJETO CONSISTE EN: : 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD Y ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO DE LA CONTRATANTE OTORGADA A LA EMPRESA BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA CANTIDAD DE QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEAA RESCINDIDO EL CONTRATO,
B) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE;
C) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DEBERA LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA SIEMPRE Y SEA PROCEDENTE EN LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTIPULADOS;
D) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, QUE LA PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO O DEVUELTO EN SU TOTALIDAD Y SE HAYAN PAGADO, EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
E) QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
F) LA COMPAÑÍA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LOS ARTICULOS NO. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO NO. 179. DEL CITADO ORDENAMIENTO.
G) QUE PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO SE SOMETE A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL ESTADOS DE GUERRERO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRA QUE TUVIERE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO OFICIAL, EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR. LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL.*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA



SELLO DIGITAL

9CytzZpjQ8HLHvPMCpVHEwXjB7acBkoTkE3oOlQZi2Ow9tVaqcFR+RJ1ArA/0VhUSZon1ywHmKvoZ3QF9AdLLCL5PNWpUOaUvqcWUovm4reQlvdeS1UnOPtlRfBFzUgPv6Tw+qXhOVO3xpTE7F63MyMkczj+V0CRPKHA6DxU=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602880826NINPHS** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602880826NINPHS

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."

SOFIMEX®

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

FIANZA:	2880826
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	0602880826NINPHS

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.,A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.


19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.



SOFIMEX

Nuestro servicio es su mejor garantía

Validación de la Fianza 2818275

MONTO:	819,060.52
MONEDA:	PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO:	EMISION
FIADO:	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
OBJETO GARANTIZADO:	1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORE S DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO UBICADOS EN ACAPULCO DE JUAREZ CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
FECHA DE EXPEDICION:	26/07/2023

VISUALIZAR XML | VISUALIZAR PDF

Anote este número de validación: 06348407001

VALIDAR OTRA FIeS | TERMINAR

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880864
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3660843

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 28 DE JULIO DE 2023				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$163,812.10	$163,812.10	**PESOS**	14	2317
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$163,812.10 (***CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.***)

ANTE: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ. R.F.C. MAJ-010101NA3

PARA GARANTIZAR POR BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO FISCAL EN JOAQUIN A. PEREZ NO. 3 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC C.P. 11850 CIUDAD DE MEXICO, Y R.F.C. BSU000404GJ7, EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. MAJ-FAISMUN/349-2023/AD DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA, CUYO OBJETO CONSISTE EN: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,638,121.03 (UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 03/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266, Y EL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS Y DEMAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA MATERIA EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA LEY, LA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE:

A) LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD;
B) LA FIANZA GARANTIZA EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS;
C) CUANDO LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO SE REALICEN EN MÁS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, ÉSTA FIANZA SE SUBSTITUIRÁ EN EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS POR OTRO U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDOS LOS IMPORTES DE ACUERDOS CON LOS AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS Y MODIFICACIONES CONVENIDAS SI LAS HUBIERE;
D) EN EL CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA POLIZA Y PARA EL CASO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA, AUN CUANDO HAYAN SIDO SOLICITADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE,
E) LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
F) ÉSTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DESDE SU FECHA DE EXPEDICIÓN Y DURANTE LA SUBTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR PARTE DEL CONTRATISTA O DE LA (LA CONVOCANTE), HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, DE FORMA TAL QUE SU VIGENCIA NO PODRÁ ACORTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL O FUENTE DE LAS OBLIGACIONES, O CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA;
G) QUE LA FIANZA OTORGA TAMBIEN PARA GARANTIZAR LA CONRRECCIÓN DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE RESULTEN, DE LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS;
H) LA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO EL CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE (LA CONVOCANTE), SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE FIANZA Y EN CONSECUENCIA ÉSTA CONTITNUARÁ VIGENTE;
I) CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO RESULTEN SALDOS A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE DESARROLLO;
J) LA FIANZA CONTINUARÁ EN VIGOR POR 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LA OBRA, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NO. 266 Y ARTICULO 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARIA DE DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PARA CANCELAR LA FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE CONTAR CON EL ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, O BIEN, EL FINIQUITO Y, EN CASO DE EXISTIR SALDOS A CARGO DEL

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

MYJtE+EG2c1yyw/XThN5Ko+yCuuOZnPD6lx5nGBqlo28Mnl21uu55+N1MyLmGQ80PfQORfXAORi+tpBAdggETh111kjLWW198J9wFRi6r0QLc5XBIeDLrGEbU1HMX9Ziok7Y6YiX4JxS6yM46fYJXbGwgo3wOlSHkpL6BKTCm0=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **06028808646GXYEL** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802558, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 06028808646GXYEL

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2880864
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3660843

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN				
CIUDAD DE MEXICO CDMX, A 28 DE JULIO DE 2023				
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA	AGENTE
$163,812.10	$163,812.10	**PESOS**	14	2317
RAMO	SUBRAMO			
ADMINISTRATIVAS	OBRA			

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$163,812.10 (***CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 10/100 M.N.***)

CONTRATISTA LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE;
K) EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO INCUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ LO COMUNICARÁ DE INMEDIATO Y POR ESCRITO A LA AFIANZADORA A EFECTO DE QUE ÉSTA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARA POR ESCRITO AL CONTRATISTA PARA QUE ÉSTE SE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES, TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HUBIEREN REALIZADO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ PROCEDERÁ A HACERSE EFECTIVA ESTA FIANZA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA NOTIFICADO AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. SI LA CORRECCIÓN O REPOSICIÓN REQUIERE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE A ESTA PÓLIZA DE FIANZA;
L) LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO;
M) LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTÍCULOS NO. 178, 279, 280 Y 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; OTORGANDO LA AFIANZADORA EL CONSENTIMIENTO A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTICULO NO. 179 DEL CITADO ORDENAMIENTO.
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPAÑANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE COMPRUEBEN LA EXISTENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON INDEPENDENCIA DE LO ANTERIOR. LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION O DOCUMENTACION QUE SEAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL.***
FIN DE TEXTO ***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA



SELLO DIGITAL

MYJtE+EG2c1yyw/XThN5Ko+yCuuOZnPD6lx5nGBqlo28MnI21uu55+N1MyLmGQ80PfQORfXAORi+tpBAdggETh111qLWlW16&J9wFRl6r0QLc5XBIeDLrGEbU1HMX92iok7YSYlX4JxS6yM46fYJXbGwgo3wOlSHkpL6BKTCm0=
PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA

1 LINEA DE VALIDACIÓN **06028808646GXYEL** 2

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la linea de validación: 06028808646GXYEL

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."

SOFIMEX®

FIANZA:	2880864
LÍNEA DE VALIDACIÓN:	060288086466XYEL

NORMAS REGULADORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS.

1.- Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos, haciéndose constar con exactitud la cuantía de la fianza, el nombre completo DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y el DEL (DE LOS) FIADO (S); la obligación principal afianzada y la de SOFIMEX con sus propias estipulaciones. Artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (L.I.S.F.). Las primas derivadas de la expedición de fianzas en moneda extranjera, se cubrirá a SOFIMEX en la misma moneda de expedición de la póliza. El pago de comisiones y otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se cubrirá por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeras, se realice en moneda extranjera.

2.- El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o disminución de la cuantía de la fianza, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá (n), conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) y deberá (n) presentarlos para el ejercicio de sus derechos ante las autoridades competentes. En caso de pérdida o extravió El (LOS) BENEFICIARIO (S) podrán exigir a SOFIMEX que le proporcionen a su costa duplicado de la póliza. La devolución de la póliza a SOFIMEX es presunción legal de extinción de la fianza y de la liberación de las obligaciones en ellas contraídas, salvo prueba en contrario. Artículo 166 de la L.I.S.F.

3.- Los derechos y las obligaciones derivadas de esta fianza se reputan actos de comercio para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO (S), FIADO (S), SOLICITANTE (S), CONTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a favor de SOFIMEX, con excepción de la garantía hipotecaria que por la fianza hayan otorgado, y estarán regidos por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y en lo que no provea por la legislación mercantil y por el Código Civil Federal (C.C.F.). Artículos 32 y 183 de la L.I.S.F.

4.- SOFIMEX se considera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. Artículo 16 de la L.I.S.F.

5.- La fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o prestamos en dinero, con excepción de las autorizadas y emitidas en términos del Título 19, Capítulo 19.1, disposiciones, 19.1.6, 19.1.7. y 19.1.8.. de la Circular Única de Seguros y Fianzas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de Diciembre de 2014, que a continuación se transcriben:

" 19.1.6 En ningún caso podrán expedirse fianzas de crédito, si no se comprueba ante la Institución que se cuenta con pólizas de seguros sobre los bienes materia del contrato que origine la expedición de la fianza de crédito respectiva, expedidas a favor de la Institución. Cuando el fiado sea persona física deberá contar, adicionalmente, con un seguro de vida a favor de la Institución, que cubra cuando menos el saldo insoluto del crédito. No se requerirá contar con el seguro de vida a que se refiere el párrafo anterior, cuando el fiado tenga 65 años de edad o más, y éste otorgue garantías suficientes que apoyen la recuperación.

19.1.7. En el caso de que los fiados ya cuenten con los seguros a que se refiere la Disposición 19.1.6, deberán obtener de la Institución de Seguros respectiva el endoso preferente a favor de la Institución que otorgue la fianza.

19.1.8. Las Instituciones deberán autorizar el pago de las sumas aseguradas convenidas en los contratos de seguro a que hacen referencia las Disposiciones 19.1.6 y 19.1.7, según corresponda, a favor del fiado o sus beneficiarios, siempre y cuando no exista incumplimiento de éste respecto a las obligaciones afianzadas, y sin que se incumpla lo previsto en este Capítulo. "

6.- SOFIMEX está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La fianza no se extinguirá aún cuando el acreedor no requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplimiento de la obligación afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el juicio promovido en su contra. Artículo 178 de la L.I.S.F.

7.- La obligación de SOFIMEX contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) ACREEDOR (ES) BENEFICIARIO (S), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) prórroga o espera sin consentimiento por escrito de SOFIMEX. Artículo 179 de la L.I.S.F.

8.- La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la fianza si SOFIMEX no da su consentimiento para esa novación, y para garantizar con la misma fianza la obligación novatoria. Artículo 2220 del C.C.F.

9.- La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la fianza en la misma proporción y la extingue si por esas causas dicha obligación principal la fiada queda sujeta a nuevos gravámenes o condiciones. Artículo 2847 del C.C.F.

10.- Las Acciones del (los) BENEFICIARIO (S) de la fianza en contra de SOFIMEX prescriben en tres años contados a partir del día en que se haya hecho exigible su obligación. Artículo 175 de la L.I.S.F.

11.- Cuando la fianza sea a favor de particular (es) podrá (n) reclamar su pago directamente ante SOFIMEX. En caso de que esta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribunales Federales o Comunes. Artículo 279 y 280 de la L.I.S.F., Asimismo el usuario podrá presentar la reclamación ante la unidad especializada de esta INSTITUCIÓN, conforme a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

12.- Si la fianza garantiza obligaciones fiscales a favor de la Federación a cargo de terceros su procedimiento de cobro estará regido por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Artículo 282 de la L.I.S.F.

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formular reclamación, deberá de presentarla en el domicilio de las oficinas o Sucursales de SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.,A. en original y con firma autógrafa del beneficiario o su Representante legal, debiendo contener como mínimo los siguientes requisitos:

a) Fecha de Reclamación;
b) Número de Póliza de Fianza relacionado con la reclamación recibida;
c) Fecha de Expedición de la Fianza;
d) Monto de la Fianza;
e) Nombre o denominación del Fiado;
f) Nombre o denominación del beneficiario, y en su caso, de su Representante legal acreditado;
g) Domicilio del Beneficiario para oír y recibir notificaciones
h) Descripción de la obligación garantizada;
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, Número de Contrato, etc.);
j) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado, y el
k) Importe originalmente reclamado como suerte principal,

15.- SOFIMEX podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales haya otorgado esta fianza en todo lo que se relacione a las responsabilidades que dé ésta derive así como en los procesos que se sigan al fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A petición de parte, SOFIMEX será llamada a dicho proceso o juicio para que este a sus resultas. Artículo 287 de la L.I.S.F.

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar a SOFIMEX los datos que les soliciten relativos a antecedentes personales y económicos de quienes le hayan solicitado la fianza y de informarle sobre la situación del asunto, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya otorgado, y de acordar, dentro de los 30 días naturales siguientes, la solicitud de cancelación de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante. Artículo 293 de la L.I.S.F.

17.- Las autoridades, federales estatales, o locales, están obligadas a admitir las fianzas de las instituciones autorizadas por el Gobierno Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificar ni exigir la constitución de depósito, ni otorgamiento de fianza, ni comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica, y será suficiente para que las acepten que la póliza esté firmada por las personas autorizadas por el Consejo de Administración de SOFIMEX cuya firma esté registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Artículo 18 y 165 de la L.I.S.F.

18.- Las autoridades mencionadas en el punto anterior no podrán fijar mayor importe a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos en dinero u otras formas de garantía. Artículo 18 de la L.I.S.F.


19.- El pago de la fianza subroga a SOFIMEX por Ministerio de Ley en todos los derechos, acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (es) se le (s) haya pagado, derivados de la obligación afianzada. La obligación fiadora se extinguirá si por causas imputables al (los) acreedor (es) SOFIMEX no puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) DEUDOR (ES) FIADO (S). Artículo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F.

20.- Si SOFIMEX tuviere que pagar la cantidad reclamada derivada de la presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (O) (S) SOLIDARIO (S) contraen la obligación de reintegrarle el importe cubierto inmediatamente que se les requiera y a pagarle intereses moratorios desde la fecha en que SOFIMEX les haya notificado el pago de la fianza hasta que le reintegren el importe reclamado de acuerdo a la tasa pactada. El pago de reclamaciones que realice SOFIMEX en el extranjero, se efectuará por conducto de las instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la póliza.

21.- Si la Institución de Fianzas no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a cubrir su obligación de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 283 de la L.I.S.F.

22- Para conocer y resolver de las controversias derivadas de ésta póliza de fianza serán competentes las autoridades mexicana, en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y los usos y costumbres internacionales.

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020.



SOFIMEX

Nuestro servicio es su mejor garantía

Validación de la Fianza 2818270

MONTO:	163,812.10
MONEDA:	PESOS
TIPO DE MOVIMIENTO:	EMISION
FIADO:	BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
OBJETO GARANTIZADO:	: 1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO UBICADOS EN ACAPULCO DI JUAREZ CON CARGO AL FONDO III RAMO XXXIII EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
FECHA DE EXPEDICION:	28/07/2023

VISUALIZAR XML | VISUALIZAR PDF

Anote este número de validación: 06348406501

VALIDAR OTRA FIeS | TERMINAR

H. AYUNTAMIE... ITUCIONAL
DE ACAPULC... EZ, GRO.
SECRETARÍA DE DESARROLLO
URBANO Y OBRAS PUBLICAS
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ 2021-2024

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

2023 AÑO DE Francisco VILLA

CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD
ASUNTO: ADJUDICACION DE OBRA
ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023

BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.
Nombre O Razón Social
MELISA CALDERON BAUTISTA
Representante legal

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EN BASE A LOS ARTÍCULOS 39 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266, Y HABIENDO VERIFICADO LOS DATOS QUE CONSTAN EN NUESTRO ARCHIVO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS MUNICIPAL, TIENE A BIEN SELECCIONAR A LA EMPRESA **BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.** PARA ADJUDICARLE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, REFERENTE A: **1.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION 2.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "APALANI", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. APALANI 3.- EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "POCHOTLAXCO", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. POCHOTLAXCO** EN **ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.,** SE AUTORIZO LA INVERSION MEDIANTE EL FONDO **RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO 3) 2023.**

EN CASO DE ACEPTAR LA ADJUDICACIÓN REMITIDA, DEBERÁ ENTREGAR EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN **CALLE ROBERTO POSADA Y COMONFORT S/N, COL CENTRO, CODIGO POSTAL 39300 DE ACAPULCO, GRO.** (ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL) EN IDIOMA ESPAÑOL, EL EXPEDIENTE TÉCNICO CORRESPONDIENTE PARA SER OBJETO DE SU REVISIÓN Y CONTRATACIÓN.

HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EXPRESARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS.

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

CARTA DE ACEPTACIÓN DE OBRA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE AGRADEZCO SE ME HAYA ASIGNADO LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION. No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**, DE ESTE MUNICIPIO, LA CUAL ACEPTO RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

CARTA DE PROTESTA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO Y BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD MANIFIESTO A USTED QUE NO ME ENCUENTRO EN LOS SUPUESTOS DEL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

FIRMO HACIENDOME RESPONSABLE DE CAULQUIER ACLARACIÓN QUE PUDIERA FALTAR A LA VERDAD AFIRMANDO QUE SOY EL REPRESENTANTE LEGAL PARA LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION. No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**, SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

CARTA DE SOLVENCIA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

COMO REPRESENTANTE O APODERADO DE LA EMPRESA: **BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.**, MANIFIESTO Y PROTESTO LO NECESARIO QUE MI REPRESENTADA TIENE SOLVENCIA ECONÓMICA PARA RESPONDER A LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS, CON RELACIÓN A LA OBRA PÚBLICA ASIGNADA CON EL NOMBRE DE LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION. No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** EN EL MUNICIPIO DE ACAPULCO, GRO., POR LA CONFIANZA REITERADA QUIERO RECALCAR QUE SOMOS UNA EMPRESA CON AMPLIA SOLVENCIA MORAL Y ECONÓMICA, COMO SE MUESTRA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS Y EN BASE A LOS SALDOS QUE REPORTA NUESTRA CUENTA, QUE NOS DA CAPACIDAD SUFICIENTES.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, RECIBA MIS SALUDOS.

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

CARTA DE VISITA

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE EN MI CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V., HAGO** CONSTAR QUE SE VISITO LA OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION. No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ Y A SU VEZ SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO DEL CUÁL SE DERIVA EL PRESUPUESTO DE OBRA QUE CONTIENE TODOS LOS CONCEPTOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.
R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

CARTA DE INICIO

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE INFORMO QUE CON FECHA: **05 DE AGOSTO DEL 2023** ESTA EMPRESA DARA INICIO CON RECURSOS PROPIOS A LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION. No. DE CONTRATO: MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** RESPETANDO LOS REGLAMENTOS INTERNOS DE ESTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, LE REITERO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Ubicación: POB. LA CONCEPCION.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION**					
A01	**BOMBAS Y EQUIPOS**					
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)	PZA	1.00	33,339.00	33,339.00	6%
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"	PZA	1.00	23,158.00	23,158.00	4%
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	1.00	490,741.00	490,741.00	81%
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	6.00	8,800.00	52,800.00	9%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA	**600,038.00**	**100%**
SUBTOTAL	**600,038.00**	
I.V.A. 16.00%	**96,006.08**	
Total del presupuesto	**$696,044.08**	

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

BOMBAS SUÁREZ S.A. DE C.V.

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

Ubicación: POB. LA CONCEPCION.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código	Concepto		Importe
A	MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION		
A01	BOMBAS Y EQUIPOS		600,038.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA	600,038.00
SUBTOTAL	600,038.00
I.V.A. 16.00%	96,006.08
Total del presupuesto	$696,044.08

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.)

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

ESTATAL

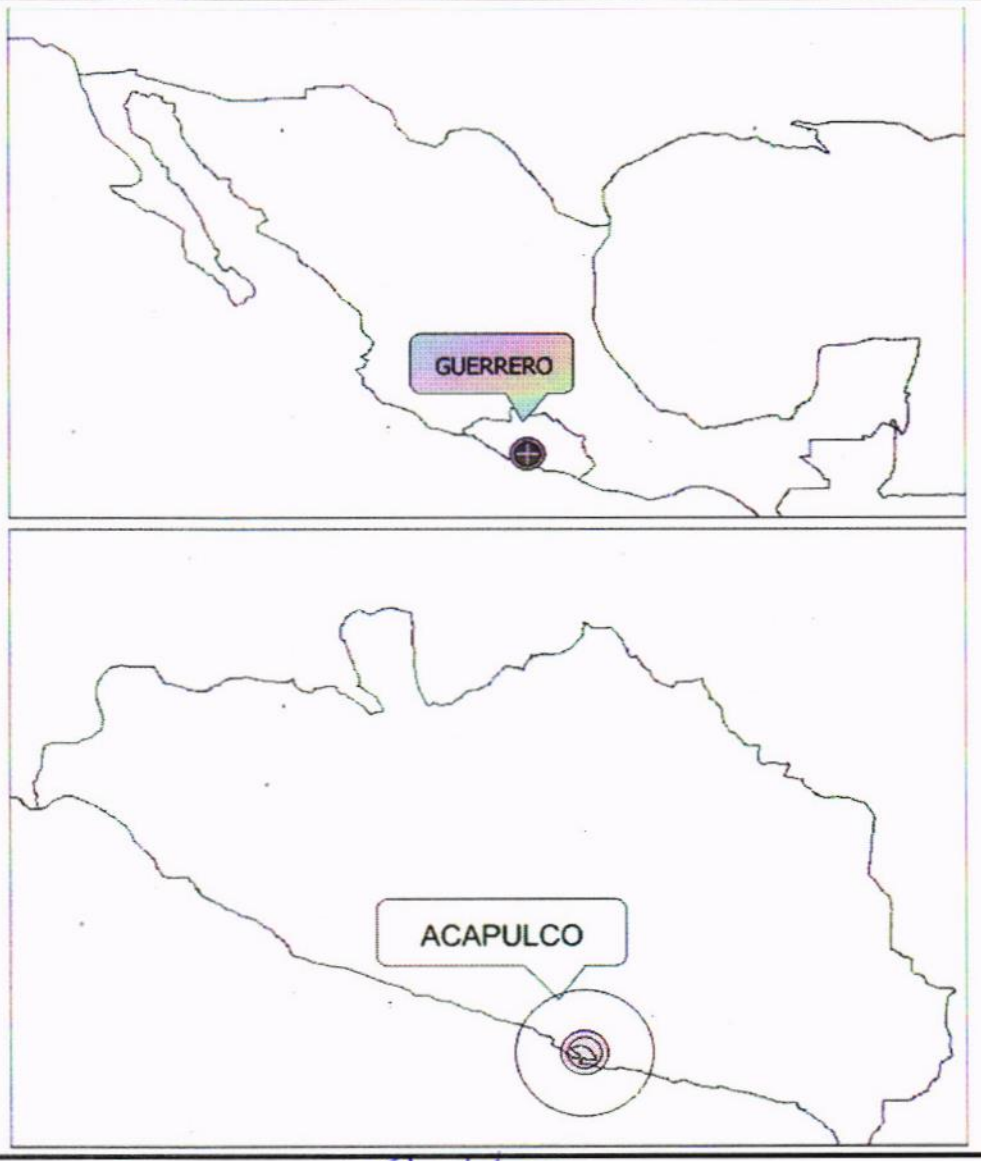

LATITUD: 16°52'14.711"N LONGITUD: 99°38'41.262"O

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

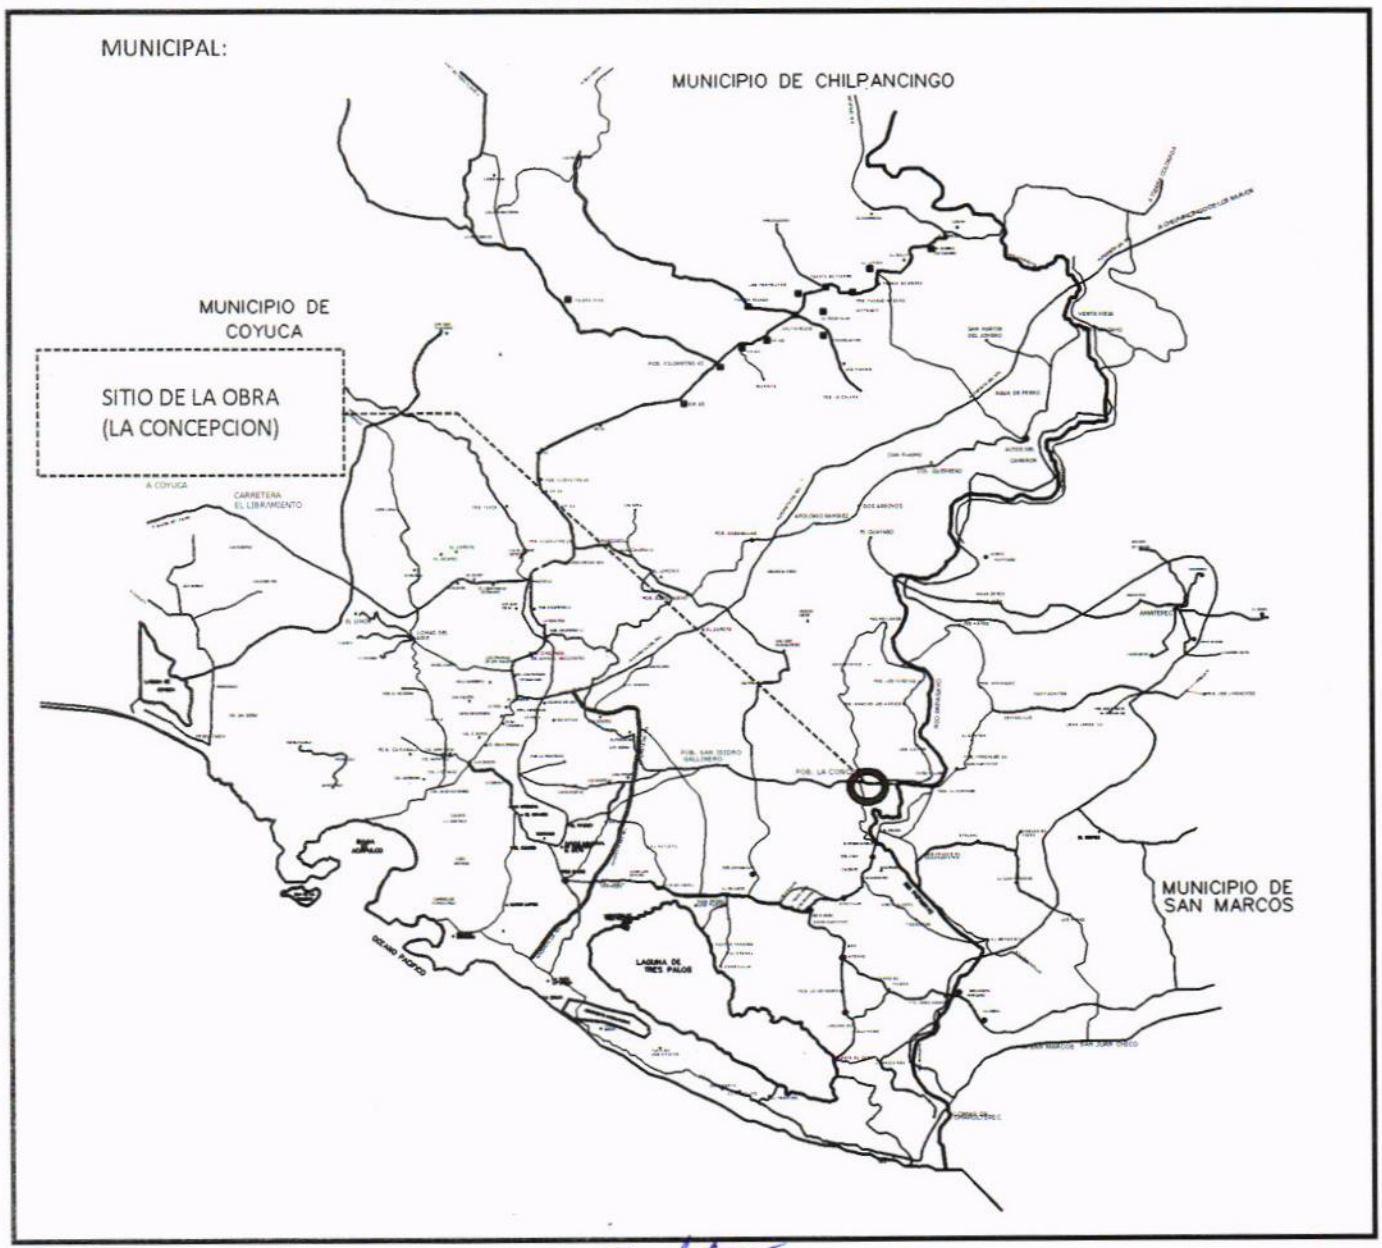

LATITUD: 16°52'14.711"N

LONGITUD: 99°38'41.262"O

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3


OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR COLONIA:

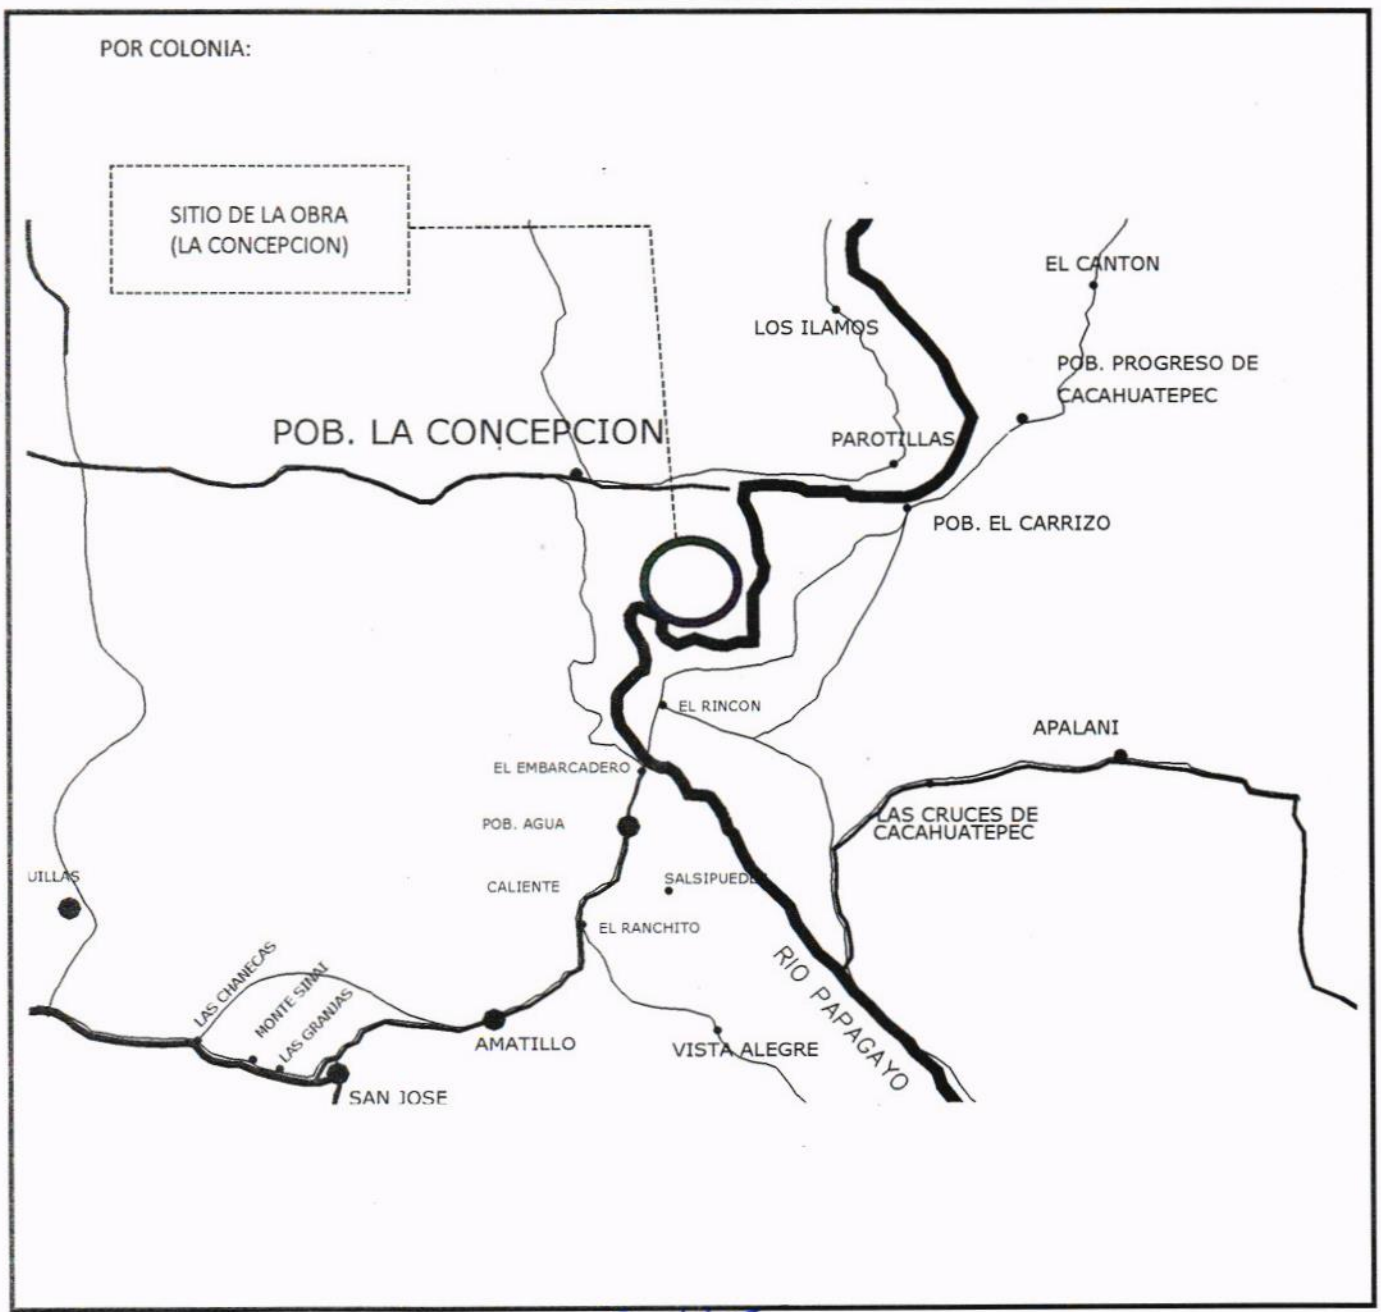

LATITUD: 16°52'14.711"N

LONGITUD: 99°38'41.262"O

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN PÒZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR REFERENCIA:

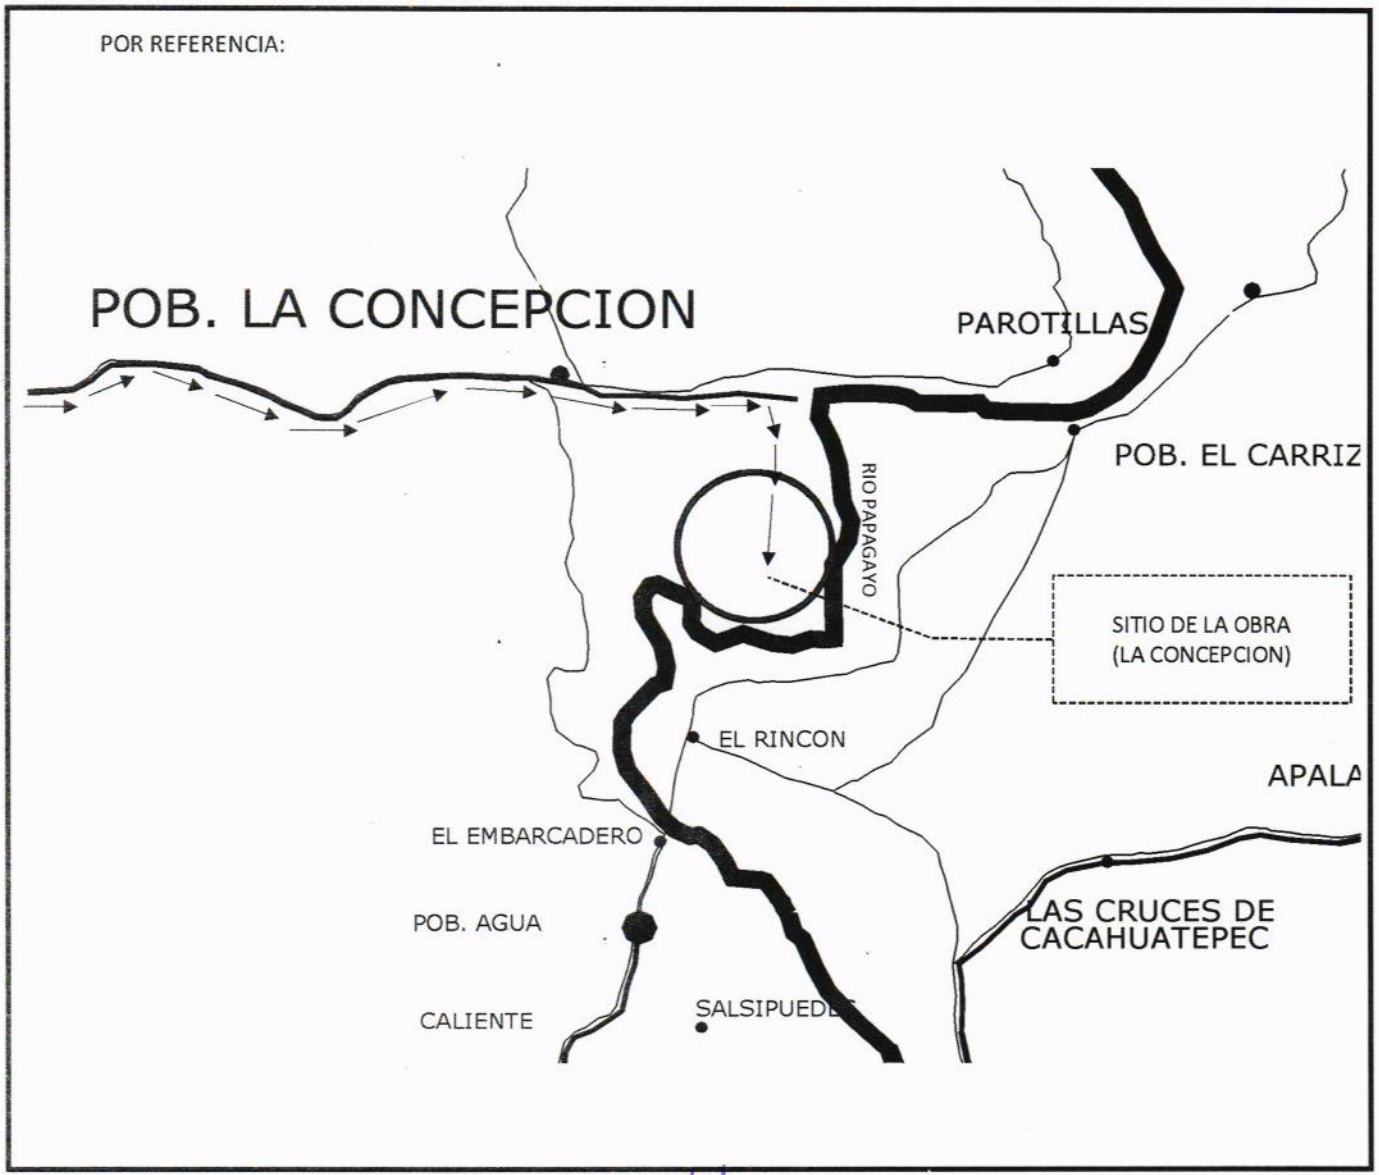

LATITUD: 16°52'14.711"N LONGITUD: 99°38'41.262"O

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5


OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR CALLES Y AVENIDAS:

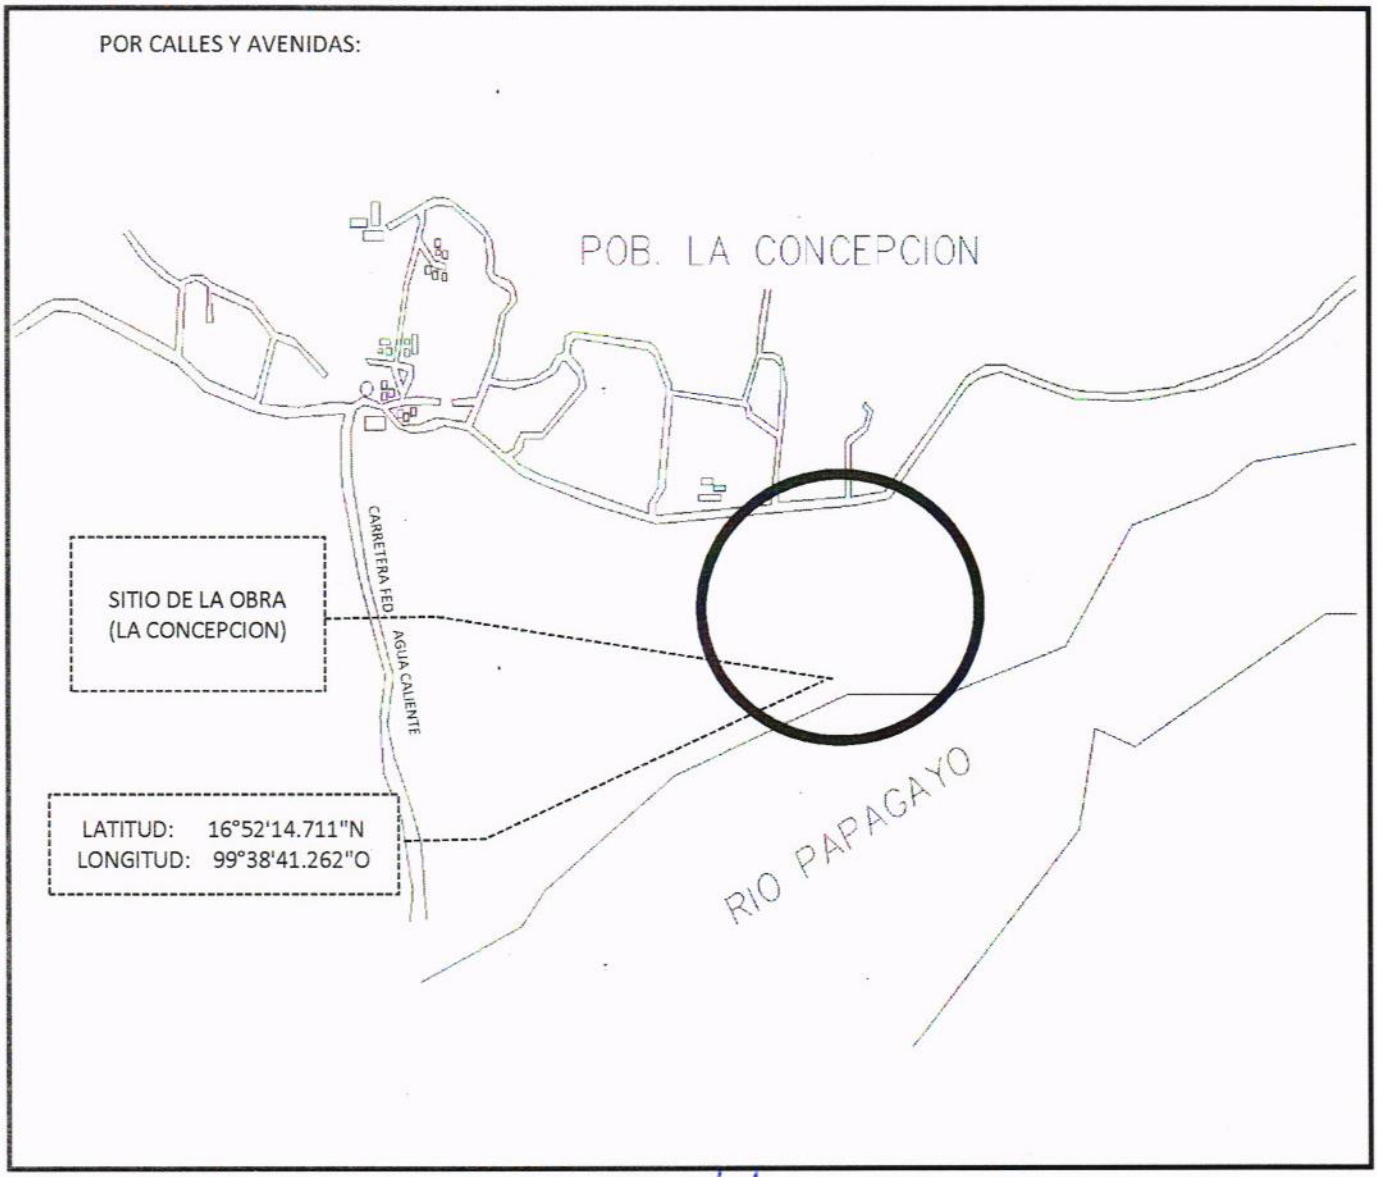

LATITUD: 16°52'14.711"N LONGITUD: 99°38'41.262"O

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. MELISA CALDERÓN BAUTISTA

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio	Clave R.F.C.
23NC2777619	BSU000404GJ7

Nombre, Denominación o Razón social

BOMBAS SUAREZ SA DE CV

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que se revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO. La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 13 de julio de 2023, a las 11:36 horas

Notas

1.-Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.28. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

2.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

3.-La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente esté inscrito y no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 12 de la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

4.-Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomará como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||BSU000404GJ7|23NC2777619|13-07-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

U1FOGBsBDcKW3VN0IZ4VezRq0oQNgo+Noht5LDgkdHUltKlnEP5TNF5xbv767KP6FQzdLIMX9QrSpMKd7Y8aZcOTU
plk+/4Yty9WTvSG6Lqv3VVHrIABLsNwvuG25WydVDFX3ifvjw0dKGRFSTJ5fsaRCpHH/I9nmEtbw5vJSUva2X+6v9
x3ch3dTqLhbg6+xpZ/2m+WME2Fn8Y+C6bO+k80hpf3qWCFXzrn114oQlwZsXQBsuGiY1OLo2VmjMzcWErEYPORl6n
ToRVn6hHCBQBmj7LUcP5Ev/h2GombO520c7q6sVoTJbUPtKu/7AcxcV+Fuv+aDzJyxEfRz3Q==

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

gob mx

Servicio de Administración Tributaria

Notas

5.-La opinión que se genere indicando que es INSCRITO SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública

6.-El procedimiento para obtener la opinión se realiza conforme a lo previsto en la regla 2.1.37. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023 y de acuerdo a lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||BSU000404GJ7|23NC2777619|13-07-2023|P||00001088888800000031||

Sello Digital

U1FOGBsBDcKW3VN0lZ4VezRq0oQNgo+Noht5LDgkdHUltKlnEP5TNF5xbv767KP6FQzdLIMX9QrSpMKd7Y8aZcOTU
plk+/4Yty9WTvSG6Lqv3VVHrIABLsNwvuG25WydVDFX3ifvjw0dKGRFSTJ5fsaRCpHH/l9nmEtbw5vJSUva2X+6v9
x3ch3dTqLhbg6+xpZ/2m+WME2Fn8Y+C6bO+k80hpf3qWCFXzrn114oQlwZsXQBsuGiY1OLo2VmjMzcWErEYPORl6n
ToRVn6hHCBQBmj7LUcP5Ev/h2GombO520c7q6sVoTJbUPtKu/7AcxcV+Fuv+aDzJyxEfRz3Q==

GOBIERNO DE MÉXICO | HACIENDA | SAT

Contacto:
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300, Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 627 22 728, desde Estados Unidos y Canadá 01 877 44 88 728.

BOMBAS SUAREZ, S.A DE C.V.

R.F.C: R.F.C. BSU000404GJ7

ACAPULCO, GRO. A 26 DE JULIO DEL 2023.

M.I. VLADIMIR HERNANDEZ ALEMAN
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.

En relación al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, Numero: **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD** que comprende EL NOMBRE DE LA OBRA **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS., UBICADA EN EL POB. LA CONCEPCION.** por un monto de **$ 696,044.08 (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.), IVA INCLUIDO** celebrado entre la Secretaría Desarrollo Urbano y Obras Públicas y la empresa que legalmente represento, en particular al Artículo 24, Fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que se aplica de manera supletoria al de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.


Por este conducto le comunico que el Superintendente de Construcción por parte de esta Empresa será el **ARQ. RÚBEN ÁNGEL MONTERO LOZANO,** con los siguientes datos.

1. **Nombre Completo: RÚBEN ÁNGEL MONTERO LOZANO**
2. **RFC: MOLR800714M94**
3. **Correo electrónico: ruben.angel9998@gmail.com**
4. **Dirección› CAM REAL A SAN JERONIMO 1810 EDIF D 16 U HAB LOS SAUCES C.P. 72103**
5. **N. Cedula Profesional: 7392514**
6. **Número telefónico: 2221397102**

Lo anterior le informo a usted a efecto de que se me sirva dar el inicio correspondiente de la obra; así mismo para cumplir con la utilización de "Bitácora de Obra".

ATENTAMENTE

LIC. MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL

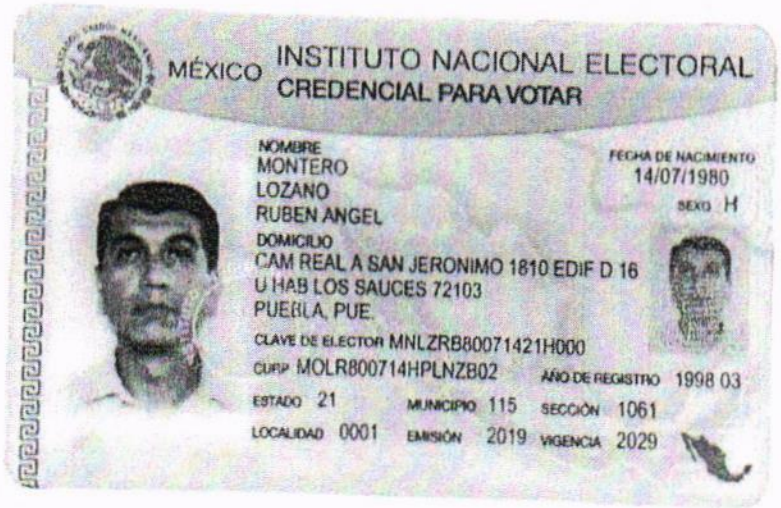

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MONTERO
LOZANO
RUBEN ANGEL

FECHA DE NACIMIENTO
14/07/1980

SEXO H

DOMICILIO
CAM REAL A SAN JERONIMO 1810 EDIF D 16
U HAB LOS SAUCES 72103
PUEBLA, PUE.

CLAVE DE ELECTOR MNLZRB80071421H000

CURP MOLR800714HPLNZB02

AÑO DE REGISTRO 1998 03

ESTADO 21 MUNICIPIO 115 SECCIÓN 1061


LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029



EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1918709120<<1061059167273
8007142H2912316MEX<03<<22913<8
MONTERO<LOZANO<<RUBEN<ANGEL<<<


CÉDULA 7392514
SEP
México D.F. 20 de Febrero del 2012
FIRMA DEL TITULAR

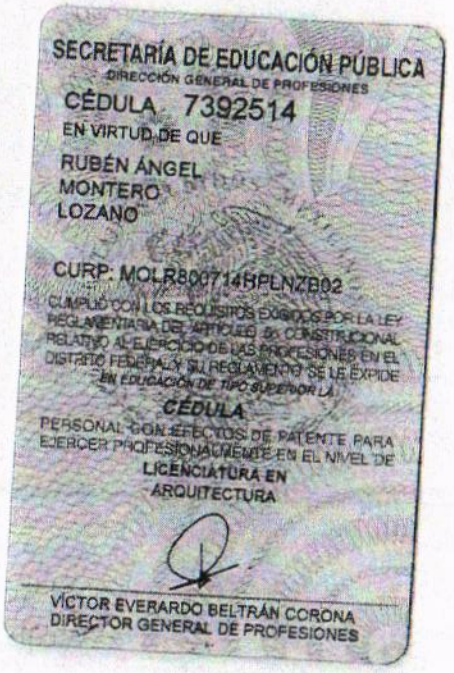

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7392514

EN VIRTUD DE QUE

RUBÉN ÁNGEL
MONTERO
LOZANO

CURP: MOLR800714HPLNZB02

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
RAMO: ADMINISTRATIVO
OFICIO No. DOP/1429/2023
ASUNTO: **Asignación de Residente**

Acapulco, Gro., a 26 de Julio del 2023

BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.
MELISA CALDERON BAUTISTA
REPRESENTANTE LEGAL
P r e s e n t e.

Por este medio informo a usted que el Residente asignado a la obra: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS,** ubicada en el **POB. LA CONCEPCION,** con número de contrato **MAJ-FAISMUN/349-2023/AD**, estará a cargo del **ING.** / ARQ. **GERARDO CATALAN QUIROZ;** así mismo le solicito, por medio de oficio, el nombre del **Representante Técnico (con su no. de cédula) y del Superintendente de construcción.**

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando de usted para cualquier aclaración.

A T E N T A M E N T E.

M.I. VLADIMIR HERNÁNDEZ ALEMÁN
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ VERDIZ
JEFE DEL DEPTO. DE SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA RURAL

ING. GERARDO CATALAN QUIROZ
RESIDENTE DE OBRA

C.C.P.-ARCHIVO
JIFV/EPM

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

FAISMUN-2023

FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: EQUIPAMIENTO

OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **POB. LA CONCEPCION**

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

RAMO 33

APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN-2023
FONDO III

EXPEDIENTE TECNICO

MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO: EQUIPAMIENTO

OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

No. DE OBRA:

LOCALIDAD: **POB. LA CONCEPCION**





ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

TIPO DEL PROYECTO	OBRA DE IMPACTO REGIONAL
RUBRO DEL GASTO	APO.- AGUA POTABLE
SUBCLASIFICACION DEL PROYECTO	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA
MODALIDAD POR TIPO DE PROYECTO	EQUIPAMIENTO
CONTRIBUCION DEL PROYECTO A LA POBREZA	SERVICIO BASICO DE LA VIVIENDA
INCIDENCIA DEL PROYECTO	DIRECTA
NOMBRE DEL PROGRAMA	RED DE AGUA POTABLE
NOMBRE DEL SUBPROGRAMA	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA

ACAPULCO,GRO. 2023

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
RAMO 33
APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
FAISMUN 2023

I.- PRESENTACION

II.- DATOS BASICOS GENERALES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

IX.- PRESUPUESTO

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

XI.- PROGRAMA DE OBRA

XII.- NUMEROS GENERADORES

XIII.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS

I.- PRESENTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

P R E S E N T A C I O N

POR SU FUNCION ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL, ACAPULCO ES UNO DE LOS MUNICIPIOS MAS IMPORTANTES DEL ESTADO DE GUERRERO. SU UBICACIÓN GEOGRAFICA ASI COMO LAS PECULIARIDADES DE SU DEVENIR HISTORICO LE HAN PERMITIDO TENER UN RELEVANTE PROGRESO ECONOMICO Y SOCIAL NO EXENTO DE CONTRADICCIONES COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA DE UNA PLANEACION URBANA. ES POR ELLO QUE LA ACTUAL ADMINISTRACION TIENE COMO PRIORIDAD **DOTAR DE SERVICIOS BASICOS A LA CIUDADANIA Y BENEFICIAR EL MEDIO AMBIENTE E IMPEDIR Y REDUCIR LA PROPAGACION DE ENFERMEDADES RELACIONADAS POR LA FALTA DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE**, ES ASI COMO A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, SUMANDO LOS ESFUERZOS DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO EN CONJUNCION CON LA ENTUSIASTA PARTICIPACION CIUDADANA, SE PRETENDE DAR SOLUCION AL PROGRAMA DE URBANIZACION. ESTO PARA LOGRAR EL BIENESTAR DE SUS POBLADORES Y LA CONSOLIDACION DE LA IMAGEN Y EL DESARROLLO.

II.- DATOS BASICOS GENERALES

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DATOS BASICOS GENERALES

GENERALES

MODALIDAD DEL PROYECTO: **EQUIPAMIENTO**

LOCALIZACION: **POB. LA CONCEPCION**

REGION: **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO: **01.- ACAPULCO** LOCALIDAD: **ACAPULCO**

BARRIO, COLONIA O EJIDO: **POB. LA CONCEPCION**

TIPO DE OBRA : EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS

NUEVA (**X**) EN PROCESO ( ) AMPLIACION ( )

REHABILITACION ( ) EQUIPAMIENTO ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

1.00 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

1.00 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

1.00 PZA. SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

6.00 PZAS. SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3 DE 3" X 1.52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): **1,000** HABITANTES

III.- CEDULA DE REGISTRO POR OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE REGISTRO

NUMERO DE OBRA :

DEPENDENCIA EJECUTORA : **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**

OBJETIVO : **EQUIPAR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES**

PROGRAMA : RED DE AGUA POTABLE

SUBPROGRAMA : EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA

PROYECTO Y/O NOMBRE DE LA OBRA : **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

R E G I O N : **07.- ACAPULCO**

MUNICIPIO : **01.- ACAPULCO**

LOCALIDAD : **ACAPULCO** **POB. LA CONCEPCION**

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION : **$ 696,044.08**

FEDERAL :	$ -	ESTATAL:	$ 696,044.08	BENEFICIARIOS :	$ -
CREDITO :	0.00	MUNICIPAL :	0.00	SUMA :	**$ 696,044.08**

DE CONSTRUCCION		DE OPERACION		DE IMPACTO	
1.00	EQUIPO	**1.00**	EQUIPO	1,000	HABITANTES

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS : 1,000 HABITANTES

PROGRAMA DE EJECUCION :

CONCEPTOS DE LA OBRA	TIEMPO DE EJECUCION	
BOMBAS Y EQUIPOS	agosto , 2023	noviembre , 2023

FORMA DE EJECUCION DE LA OBRA : **CONTRATO**

FECHA DE INICIO : **agosto-2023**

FECHA DE TERMINACION : **noviembre-2023**

JORNALES A GENERAR : 141

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CEDULA DE INFORMACION BASICA POR PROYECTO
EJERCICIO : 2023

I.- UBICACION

	CLAVE :	FONDO :
FONDO :	III	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023
ESTADO :	012	GUERRERO
ZONA PRIORITARIA .		
REGION :	007	ACAPULCO
MUNICIPIO :	001	ACAPULCO
LOCALIDAD :		ACAPULCO
BARRIO, COLONIA, RANCHERIA, ETC. :		POB. LA CONCEPCION
CABECERA MUNICIPAL :	SI X	NO
TIPO DE LOCALIDAD :	CP X	PR ZI ( )

II.- IDENTIFICACION

	CLAVE	NOMBRE
Nº DE OBRA		
PROGRAMA :	RED DE AGUA POTABLE	
SUBPROGRAMA :	EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA	
MODALIDAD DEL PROYECTO :	EQUIPAMIENTO	
NOMBRE DE LA OBRA :	**EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**	
	POB. LA CONCEPCION	

TIPO DE OBRA	NUEVA(X)	AMPLIACION( )	REHABILITACION( )	PROCESO( )	EQUIPAMIENTO( )
MODALIDAD DE EJECUCION	C (X)	AM ( )	AD ( )	AC ( )	M ( ) EQ ( )
INSTANCIA EJECUTORA :	**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**				

III.- INVERSIONES

INVERSION EJERCIDA AL 31 DE DIC. DEL 2023	$ - TOTAL	$ - FEDERAL	$ - ESTATAL	$ - MUNICIPAL	$ - BENEFICIARIOS	$ - CREDITO	$ - OTROS
CONCEPTO							
INVERSION APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2023	**$ 696,044.08**	0.00	**$ 696,044.08**	0.00	$ -	0.00	0.00
CUATRIMESTRE							
PRIMERO							
SEGUNDO	$ 208,813.22		$ 208,813.22				
TERCERO	$ 487,230.86		$ 487,230.86				

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

APROBADAS				ALCANZADAS			
METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS		METAS		BENEFICIARIOS DIRECTOS	
CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	U. DE MEDIDA
1.00	EQUIPO	1,000	HABITANTES	**1.00**	EQUIPO	1,000	HABITANTES

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS): 1

JORNALES A GENERAR : 141

EETR-03
REV-02

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

V.- AVANCE FISICO-FINANCIERO PROGRAMADO

TRIMESTRE	FISICO(%)	FINANCIERO(%)
PRIMERO	0	0
SEGUNDO	30	30
TERCERO	70	70

VI.- PERIODO DE EJECUCION

PROGRAMADO:	FECHA DE INICIO:	agosto-2023	FECHA DE TERMINACION:	noviembre-2023
REAL (CIERRE)	FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACION:	
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION	SI:		NO:	FECHA:

VII.- SITUACION FISICA DE LA OBRA: (FECHA: _____)

TERMINADO Y OPERANDO:		TERMINADAS SIN OPERAR:
NO INICIADA:	EN PROCESO:	SUSPENDIDA:

VIII.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA (FECHA_____)

OPERA ADECUADAMENTE ( ) OPERA CON DEFICIENCIA ( ) NO OPERA ( )

EN SU CASO, CAUSAS POR LAS QUE NO OPERA O LO HACE CON DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES:

IV.- VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

VALIDACION Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE :

EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS

POB. LA CONCEPCION

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA FEDERAL NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCION, COMPROMETIENDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD NORMATIVA

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LUGAR: ACAPULCO, GUERRERO

FECHA: agosto-2023

INFORMACION ADICIONAL :
LA DEPENDENCIA EJECUTORA CUENTA CON LOS PLANOS Y PROYECTOS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA OBRA.

V.- ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD

FECHA: agosto-2023

La comunidad de: **POB. LA CONCEPCION** del Municipio de **ACAPULCO** Declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideracion, la realizacion del Proyecto denominado:

EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS

el cual consta de las siguientes carácteristicas:

1.00 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

1.00 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

1.00 PZA. SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

6.00 PZAS. SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3 DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o aportar mano de obra, recursos economicos y/o materiales de la region, en un % del costo total de la obra como a continuación se desglosa:

CONCEPTO	PORCENTAJE	OBSERVACIONES

Asimismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecucion de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolucion de la problemática que se presenta durante la ejecucion.

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

EETR-03
REV-02

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ACAPULCO

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, (FAISMUN)
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD 2023

FECHA: 26 de Julio de 2023

LA COMUNIDAD DE: Pob. La Concepcion

DEL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ, DECLARA QUE HA SIDO DE SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y/O PROYECTO DENOMINADO Equipamiento en pozo de agua "La Concepcion" Consistente en EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: Sustitucion de motores de bombas; POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS, ACEPTAN EL PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR YA SEA EN MANO DE OBRA, RECURSOS ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN, EN UN _____ % DEL COSTO TOTAL DE LA OBRA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESGLOSA:

CONCEPTO	PORCENTAJE (%)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA		
RECURSOS ECONOMICOS		
RECURSOS MATERIALES		

ASIMISMO, SE COMPROMETEN A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA UBICACIÓN DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES PARA LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN.

POR EL COMITÉ COMUNITARIO PRESENTE

Constantino Solano Santiago
PRESIDENTE (A) DE (CPS)

POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL DE ACAPULCO

SECRETARÍA DE ECONÓMICO

FAISMUN/349/1

255146

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 año de Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Siendo el día 31 del mes de Julio del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Pob. la concepción., localizado en el municipio Acapulco, de la entidad federativa Guerrero, nos encontramos reunidos para celebrar la instalación del Comité de participación social que dará seguimiento y verificación a la obra de nombre Equipamiento en Pozo de Agua "la concepción" a realizarse con recursos del FAIS correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

DATOS DE LA OBRA *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:		
Nombre de la obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS. POB. LA CONCEPCION		
Folio asignado en la MIDS: 255146	Monto total planeado: $696,044.08	
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: 05 de Agosto	Fecha de conclusión: 02 de Nov. 2023
Entidad: Guerrero	Municipio: Acapulco	Localidad: Pob. la concepción.
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

CONSIDERANDOS

Que las autoridades locales, enlaces FAISMUN y personas servidoras públicas que apoyen en los procesos relacionados con el FAIS, deberán:

- Promover la participación de la población beneficiaria a través de la integración de los Comités de participación social (CPS) durante los procesos de identificación de necesidades, planeación, ejecución y seguimiento de las obras a realizar con el FAIS conforme al artículo 33, apartado B, fracción II, inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscal.

- Capacitar a los CPS sobre los objetivos del FAIS, su población objetivo, labores y responsabilidades de los CPS.

COMISARIA MUNICIPAL LA CONCEPCION Jul 2023 Jun 2024

GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

- Registrar los anexos de participación social en el módulo de participación social de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).

Que los Comités de participación social (CPS):

- Son órganos de participación y representación ciudadana rural, urbana, indígena o afromexicana, integrados equitativamente por mujeres y hombres en la mayoría de sus diversidades, electos de manera democrática para dar seguimiento a las obras financiadas con recursos del FAIS. También se reconocen como tales a las distintas formas de organización ciudadana con las que ya cuenta una localidad, siempre y cuando se apeguen a los criterios de la Guía de participación social vigente publicada por Bienestar.

- Su objetivo es dar seguimiento al inicio, desarrollo y conclusión de las obras/acciones a realizar con recursos del FAISMUN, para contribuir a que los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, economía, eficacia, legalidad y honradez.

- Deberán estar conformados por personas de la localidad donde se realice la obra y que no estén desempeñando un cargo público.

- La participación de la ciudadanía en los CPS no es remunerada; se trata de cargos honoríficos de servicio a la comunidad.

Que las actividades de los CPS son:

- Participar en la capacitación que brindará el gobierno local sobre las responsabilidades como integrantes de los CPS y de las obras a las que darán seguimiento.

- Participar en los procesos de planeación de proyectos en coordinación con las autoridades locales, mientras se apeguen a los Lineamientos del FAIS y a la disponibilidad de recursos.

- Realizar visitas a las obras e informar de sus avances, así como de la conclusión de las mismas a la ciudadanía.

- Registrar el seguimiento de las obras mediante el correcto llenado de los anexos de participación social vigentes publicados por Bienestar.

COMISARIA MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN Jul 2023 Jun 2024
GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

ACUERDO ÚNICO

Se declara formalmente instalado el Comité de participación social conformado por las personas que al calce de este documento firman en conjunto con la persona enlace FAISMUN.

COMISARIA MUNICIPAL LA CONCEPCIÓN Jul 2023 Jun 2024

GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

FIRMAS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

Constantino Santiago
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Guillermina Balente Flores
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Esteban Cio Manzanarez D.
Vocal
Nombre completo y firma

JOSE OMAR AGATON MANZANAREZ
Vocal
Nombre completo y firma

SAUL AGATON del SAC
Vocal
Nombre completo y firma

Alejandro Sol Leal
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Mª Zila Santiago S.
Testigo
Nombre completo y firma

Claudia Baleriano Francisco
Testigo
Nombre completo y firma

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL



ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

1.2. REPORTE DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL FAISMUN

DATOS DE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha y hora de la capacitación: 28 de Sep. del 2023		
Lugar de la capacitación: Pob. La Concepción, Acapulco de Juárez		
Nombre y cargo de la persona facilitadora:		
Número de asistentes a la capacitación	Mujeres: 3	Hombres: 4

INFORMACIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN *Esta sección deberá ser llenada a mano por el CPS

Responda las siguientes preguntas tachando el recuadro correspondiente:

1. ¿La obra fue acordada con las personas del CPS y de la localidad beneficiaria? Sí [✓] No [ ]

2. Indique cuáles de los siguientes temas les fueron proporcionados durante la capacitación:

   a) ¿Qué es el FAIS, a quiénes beneficia, qué tipos de obras se pueden realizar con él y cuál es la importancia de que la ciudadanía participe? Sí [✓] No [ ]
   b) ¿Cuáles son sus actividades y responsabilidades como integrantes del CPS? Sí [✓] No [ ]
   c) ¿Cómo se realiza el correcto llenado y uso de los APS? Sí [✓] No [ ]
   d) Características básicas de la obra: cuándo inicia, cuándo termina, cuánto va a costar, cómo quedará al finalizar. Sí [✓] No [ ]
   e) ¿Se entregaron los trípticos de participación social y de información del FAIS a todo el CPS? Sí [✓] No [ ]

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

COMISARIA MUNICIPAL
LA CONCEPCIÓN
Jul 2023 – Jun 2024

GUILLERMINA
BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

BIENESTAR

FAIS

2023 Francisco VILLA

ANEXO 1 ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

FOTOGRAFÍAS DE LA CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ.

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION ACAPULCO DE JUAREZ

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA. "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS POB. LA CONCEPCION.









BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

2023 AÑO DE Francisco VILLA

ANEXO 1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REPORTE DE CAPACITACIÓN

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Nombre de C. Presidenta/e: Constantino Solano S.
Domicilio y número telefónico:
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [✓] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Secretaria/o: Guillermina Balente Flores
Domicilio y número telefónico:
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [✓] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Gavencio M.
Domicilio y número telefónico:
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [✓] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: José Omar
Domicilio y número telefónico:
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [✓] NO En caso de responder sí, indique a cuál.
Nombre de C. Vocal: Saúl Osaton
Domicilio y número telefónico:
¿Se considera parte de algún pueblo indígena y/o afromexic[ ]? [✓] NO En caso de responder sí, indique a cuál.

¿Para qué utilizaremos sus datos personales?

La Secretaría de Bienestar utiliza los datos personales para dar seguimiento a la participación social mediante mecanismos internos apegados a los Lineamientos del Fondo, no se harán públicos y serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

COMISARIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Jul 2023 Jun 2024
LA CONCEPCIÓN

GUILLERMINA BALENTE FLORES
INICIO: JULIO 2023
TERMINO: JUNIO 2024
Municipio de Acapulco de Juárez, Gro.

VI.- DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL

ACAPULCO BIENESTAR FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DICTAMEN SOBRE IMPACTO AMBIENTAL

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA COMO PUEDE INFLUIR EN LA REALIZACION DE LA OBRA, Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR, DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.

LOS ABAJO FIRMANTES, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS

POB. LA CONCEPCION

CONTEMPLADO EN EL PROGRAMA Y QUE SE LLEVARA A CABO EN BENEFICIO DE LA POBLACION RURAL Y DE LAS COLONIAS POPULARES URBANAS, CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (N.O.M.) POR LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, Y RECURSOS NATURALES, Y LA SECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN VIRTUD DE QUE DICHA OBRA NO ALTERA EL MEDIO AMBIENTE NI SU FUNCIONAMIENTO, NI EL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL AREA.

POR EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO

LIC. JESUS CASTILLO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO. DIRECCIÓN GENERAL DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE 2021-2024

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. LUZ MARIA MERAZA RADILLA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 2021 - 2024

VII.- INGENIERIA DE PROYECTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS

ANTECEDENTES :

NOMBRE DE LA LOCALIDAD : **POB. LA CONCEPCION**

MUNICIPIO : ACAPULCO **ESTADO : GUERRERO**

POBLACION : 1,000 HABITANTES

DISPONIBILIDAD DEL TERRENO: SI **SUPERFICIE :** **1.00** EQUIPO

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO

VER GENERADOR VER GENERADOR VER GENERADOR

DIM: EQUIPO **LARGO:** **ANCHO:** **PZA:**

CANTIDAD PRESUPUESTADA **1.00** EQUIPO

ARMADOS: **ESTRUCTURA:**

CANCELERIA: **ALUMBRADO:**

CIMENTACION: **CUBIERTA:**

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

INFORMACION TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, EMPEDRADOS Y GUARNICIONES

I.- ANTECEDENTES

MODALIDAD DEL PROYECTO

EQUIPAMIENTO

NOMBRE DE LA LOCALIDAD

POB. LA CONCEPCION

MUNICIPIO

01.- ACAPULCO

ESTADO

GUERRERO

LONGITUD DEL TRAMO:

TAMAÑO: **1.00** **EQUIPO**

SERVICIO CON QUE CUENTA EL TRAMO:

ALCANTARILLADO: **SI**

AGUA POTABLE : **SI**

OTROS: **ALUMBRADO PUBLICO**

II.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO

TOPOGRAFIA (PORCENTAJE DE PENDIENTE)

PLANO 80 % **LOMERIO** 20 %

TIPO DE MATERIAL:

A: 0 % B: 100 % C: _____ %

BANCOS DE MATERIALES EXISTENTES Y DISTANCIAS DE LA OBRA

GRAVA 35 KM ARENA 35 KM AGUA LOCAL KM

VIII.- ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA

ACAPULCO
SERVIR PARA TRANSFORMAR

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

Fecha: 26 Julio 2023

NOMBRE DE LA OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES Y BOMBAS

UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION

RESIDENTE DE OBRA: ING. GERARDO CATALAN PEREZ

SUPERINTENDENTE DE OBRA:

EMPRESA CONTRATISTA: BOMBAS SUAREZ S.A. DE C.V.

REQUISITOS:

A. CROQUIS DE LOCALIZACION DE LA OBRA A REALIZAR

B. VISUALIZACION Y PUNTUALIZACION DE LOS CONCEPTOS A EJECUTARSE EN EL LUGAR DE VISITA.

C. ALINEAMIENTO: CHECAR LOS LINEAMIENTOS EN PLANO REGULADOR , ASI COMO CONFIRMAR SI ES ZONA REGULAR O NO, PARA EVITAR POSIBLES INVASIONES EN VIA PUBLICA, O BIEN PARA EVITAR CONSTRUIR EN ZONA FEDERAL PROTEGIDA.

EN VIALIDADES:

C.1. CONFIRMAR LA MEDIDA REAL DEL ANCHO DE L CALLE EN LA VISITA DE OBRA

C.2. VERIFICAR EL ANCHO DE LA CALLE EN LOS PLANOS DEL DEPARTAMENTO DE PLANO REGULADOR

EN ESCUELAS:

C.3. ALINEAMIENTO EN PLANO REGULADOR (ZONA URBANA)

C.4. PLANO AUTORIZADO POR EL COMISARIO EJIDAL (ZONA RURAL)

D. RECOLECTAR LAS COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR SOLO DE LAS PERSONAS QUE VIVAN EN EL LUGAR DE LA OBRA, PARA VERIFICAR LA DIRECCION CORRECTA DE LA MISMA.

E. VERIFICAR QUE EL COMITÉ CORRESPONDA A LA OBRA SOLICITADA, EN SU DEFECTO, FORMAR EL COMITÉ EN ESE MOMENTO Y VERIFICAR CON EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA PUBLICA QUE ES GESTOR DE LA OBRA CITADA.

F. APOYARSE CON LA DIRECCION DE ECOLOGIA PARA DETERMINAR QUE ARBOLES SE PUEDEN TALAR.

G. APOYARSE CON LA DIRECCION DE CAPAMA PARA CUESTIONES TECNICAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

H. MOVER LOS POSTES ELECTRICOS EN CASO DE SER NECESARIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA C.F.E.

NOTA (1): LA RESPUESTA A LOS REQUISITOS REQUERIDO SE ANEXARAN A LA PRESENTE ACTA, ASI COMO LA HOJA DE ASIGNACION ENTREGADA EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION DE OBRA.

NOTA (2): EL CONTRATISTA TIENE LA OBLIGACION DE PROPORCIONAR DATOS VERIDICOS, ASI COMO ACREDITAR A SU SUPERINTENDENTE DE OBRA ANTE EL H. AYUNTAMIENTO, MISMO QUE DEBERA ESTAR DE TIEMPO COMPLETO EN LA OBRA, PARA CUALQUIER ACLARACION. BAJO NINGUN MOTIVO SE ACEPTARA COMO REPRESENTANTE TECNICO Y/O SUPERINTENDENTE A CUALQUIER PERSONA AJENA A LA CONSTRUCCION.

OBSERVACIONES: CON ESTA FECHA SE REALIZO LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA JUNTO CON LA EMPRESA CONTRATISTA, PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS CONSISTENTE EN CAMBIOS DE BOMBAS Y ACONDICIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO Y TABLEROS POR LO QUE ESTA RESIDENCIA CONSIDERA FACTIBLE LA EJECUCION DE LA OBRA POR LO QUE SE INDICA AL CONTRATISTA ELABORAR PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA PARA SU CONTRATACION DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

FIRMA DEL RESIDENTE

ING. GERARDO CATALAN PEREZ

FIRMA DEL SUPERINTENDENTE

ARQ. RUBEN ANGEL MONTERO LOZANO

IX.- PRESUPUESTO

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

REGION: 07.- ACAPULCO **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: **POB. LA CONCEPCION**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	IMPORTE
BOMBAS Y EQUIPOS	$ 600,038.00

TOTAL: $ 600,038.00

D E S G L O S E

SUBTOTAL	$	600,038.00
IVA 16%	$	96,006.08
TOTAL	**$**	**696,044.08**

POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL

MTRA. ABELINA LOPEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SECRETARIA DE LANEACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Ubicación: POB. LA CONCEPCION.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2021-2024

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	**MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION**					
	BOMBAS Y EQUIPOS					
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)	PZA	1.00	$33,339.00	$33,339.00	5.56%
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"	PZA	1.00	$23,158.00	$23,158.00	3.86%
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	0 PZA	1	$490,741.00	$490,741.00	81.78%
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.	PZA	6.00	$8,800.00	$52,800.00	8.80%

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA	**$600,038.00**	**100.00%**
SUBTOTAL	**$600,038.00**	
I.V.A. 16.00%	**$96,006.08**	
Total del presupuesto	**$696,044.08**	

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.**)**

JEFE DE DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Dependencia: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No.: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Ubicación: POB. LA CONCEPCION.

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Código	Concepto		Importe
A	**MANTENIMIENTO DE PLANTAS Y EQUIPOS POB. LA CONCEPCION**		$600,038.00
	BOMBAS Y EQUIPOS		

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA	**$600,038.00**
SUBTOTAL	**$600,038.00**
I.V.A. 16.00%	**$96,006.08**
Total del presupuesto	**$696,044.08**

IMPORTE CON LETRA

(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 08/100 M.N.**)**

JEFE DE DEPTO DE COSTOS PRESUPUESTOS Y LICITACIONES: C. JOSÉ ANTONIO CARRILLO ZAMORA

X.- EXPLOSION DE INSUMOS

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

REGION: 07.- ACAPULCO

LOCALIDAD: **POB. LA CONCEPCION** **MUNICIPIO:** 01.- ACAPULCO DE JUAREZ

RESUMEN DE EXPLOSION DE INSUMOS

CAPITULO			IMPORTE
MATERIALES		$	420,066.20
MANO DE OBRA		$	43,965.50
EQUIPO Y HERRAMIENTA		$	2,198.30
SUB-TOTAL		**$**	**466,230.00**
INDIRECTOS	**17.00%**	$	79,259.10
SUMA		$	545,489.10
FINANCIAMIENTO	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	545,489.10
UTILIDAD	**10.0000%**	$	54,548.91
SUMA		$	600,038.00
CARGOS ADICIONALES	**0.0000%**	$	-
SUMA		$	600,038.00
I . V. A	**16.00%**	$	96,006.08
TOTAL		**$**	**696,044.08**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	MATERIALES					
013-SERVICIO-3	CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2"	PZA	1.00	$16,689.15	$16,689.15	3.58%
013-SERVICIO-4	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER CON PASTILLA 2P X 15AMP	PZA	1.00	$1,958.00	$1,958.00	0.42%
013-SERVICIO-5	BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS	PZA	1.00	$94,840.00	$94,840.00	20.34%
2823008110	CAJA DE CONTROL STANDARD 1 1/2 HP 230 V 60HZ MCA FRANKLIN ELECTRIC	PZA	1.00	$4,406.03	$4,406.03	0.95%
CD03WASACI	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 3X3 PESADO MCA AS PUMPS	PZA	1.00	$61,163.89	$61,163.89	13.12%
COCOAC17	COLADOR CONICO ACERO AL CARBON 3"	PZA	0.96	$3,100.00	$2,976.00	0.64%
F-DRIVESOLAR:	VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAR MULTIPOWER 3F 230/460V 18 AMP MCA CONNERA	PZA	1.00	$85,000.00	$85,000.00	18.23%
FBAI416A	FLECHA MOTRIZ DE ACERO INOXIDABLE 416 1" X 0.64 MTS	PZA	1.00	$7,346.00	$7,346.00	1.58%
FBAI416A-I	FLECHA INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE 416 1" X 3.05 MTS	PZA	1.00	$13,000.00	$13,000.00	2.79%
FJ80	MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON H215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US	PZA	1.00	$72,450.00	$72,450.00	15.54%
FSEN-FDS14-50	FILTRO PARA ARMONICOS 3F P/14A DIST. MAX. 500M MCA CONNERA	PZA	1.00	$39,868.00	$39,868.00	8.55%
KITEMP10	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 8 10 12 Y 14 MCA AS PUMPS	PZA	1.00	$250.00	$250.00	0.05%
MLBR1709	MARIPOSA LISA DE BRONCE 3 X 1 3/4"	PZA	0.96	$3,100.00	$2,976.00	0.64%
T17SRRD	TUBO DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE	PZA	3.60	$4,761.98	$17,143.13	3.68%
	TOTAL MATERIALES				**$420,066.20**	
	MANO DE OBRA					

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	30.00	$542.89	$16,286.70	3.49%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	3.00	$840.78	$2,522.34	0.54%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	8.00	$955.31	$7,642.48	1.64%
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	22.00	$796.09	$17,513.98	3.76%
	TOTAL MANO DE OBRA				**$43,965.50**	
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	1318.96	$1.00	$1,318.96	0.28%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	879.33	$1.00	$879.33	0.19%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$2,198.29**	
				SUBTOTAL	**$466,229.99**	**100.00%**
			INDIRECTO	17.00%	$79,259.10	
				SUBTOTAL	$545,489.09	
			UTILIDAD	10.00%	$54,548.91	
				TOTAL	$600,038.00	
			IVA	16.00%	$96,006.08	
				GRAN TOTAL	**$696,044.08**	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	30.00	$542.89	$16,286.70	3.49%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	3.00	$840.78	$2,522.34	0.54%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	8.00	$955.31	$7,642.48	1.64%
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	22.00	$796.09	$17,513.98	3.76%
	TOTAL MANO DE OBRA				**$43,965.50**	**9.43%**
	EQUIPO Y HERRAMIENTA					
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	1318.96	$1.00	$1,318.97	0.28%
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	879.33	$1.00	$879.33	0.19%
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$2,198.30**	**0.47%**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

RESUMEN DE LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe	% Incidencia
	TOTAL MATERIALES				**$420,066.20**	**90.10%**
	TOTAL MANO DE OBRA				**$43,965.50**	**9.43%**
	TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA				**$2,198.29**	**0.47%**
				SUBTOTAL	**$466,229.99**	**100.00%**
			INDIRECTO	17.00%	$79,259.10	
				SUBTOTAL	$545,489.09	
			UTILIDAD	10.00%	$54,548.91	
				TOTAL	$600,038.00	
			IVA	16.00%	$96,006.08	
				GRAN TOTAL	**$696,044.08**	



JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XI.- PROGRAMA DE OBRA

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

PROGRAMA DE OBRA FISICO - FINANCIERO
(CALENDARIO DE EJECUCION)

OBRA: **EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS**

UBICACIÓN: **POB. LA CONCEPCION** FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION FISICO	PONDERACION FINANC.	MESES 6	7	8	9	10	11
BOMBAS Y EQUIPOS	$ 600,038.00	100.00%	100.00%						
SUBTOTAL	$ 600,038.00	100%	100%						
16 % IVA	$ 96,006.08								
TOTAL	**$ 696,044.08**	**100%**	**100%**						

OBSERVACIONES:

ACAPULCO

BIENESTAR

FAIS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ
RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

CALENDARIO DE MINISTRACION DE RECURSOS

PROGRAMA: **RED DE AGUA POTABLE**
MUNICIPIO: **ACAPULCO DE JUAREZ**
FECHA DE INICIO: **agosto-2023**

CONCEPTO	COSTO $	PONDERACION		MESES											
		FISICO	FINANC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS															
POB. LA CONCEPCION	$ 600,038.00	100%	100%								■	■	■	■	
SUBTOTAL	$ 600,038.00														
IVA	$ 96,006.08														
TOTAL	**$ 696,044.08**	**100%**	**100%**												

OBSERVACIONES:

XII.- NUMEROS GENERADORES

ACAPULCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

BIENESTAR

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	CROQUIS
INS-CAB5	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)							1.00	1.00	PZA	
								TOTAL	1.00	PZA	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

BIERNO DEL ESTADO DE GUERRE)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

INS-CAB5 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

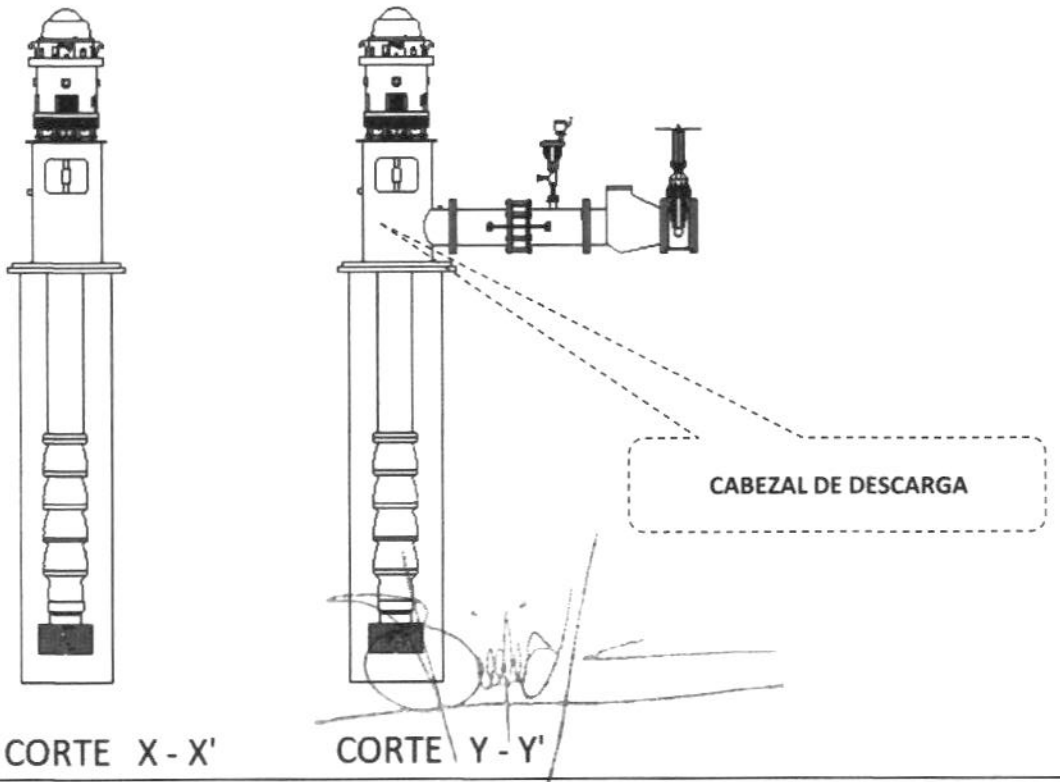

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	CROQUIS
INS-CC	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"							1.00	1.00	PZA	
								TOTAL	**1.00**	**PZA**	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

BIERNO DEL ESTADO DE GUERRE)

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

INS-CC SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"

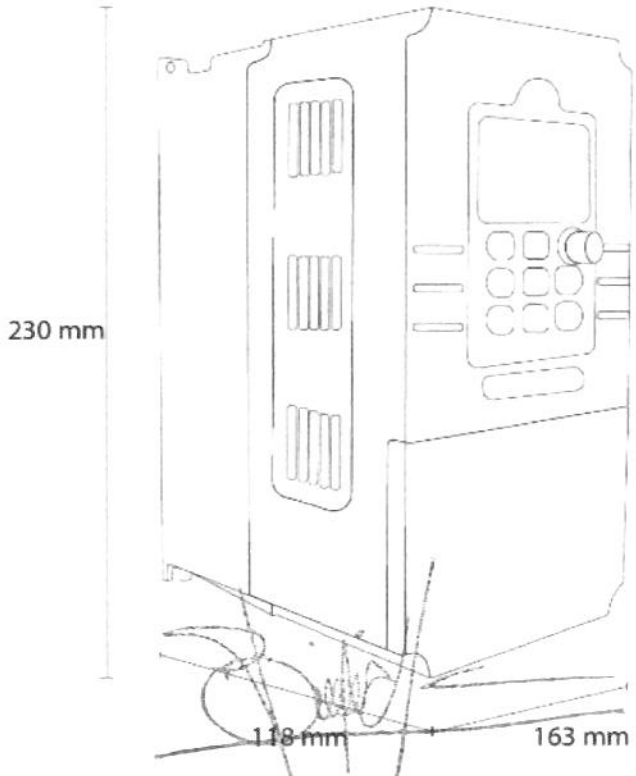

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	CROQUIS
EQB-10	SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.							1.00	1.00	PZA	
								TOTAL	**1.00**	**PZA**	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

BIERNO DEL ESTADO DE GUERRE O

BIENESTAR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

EQB-10 SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

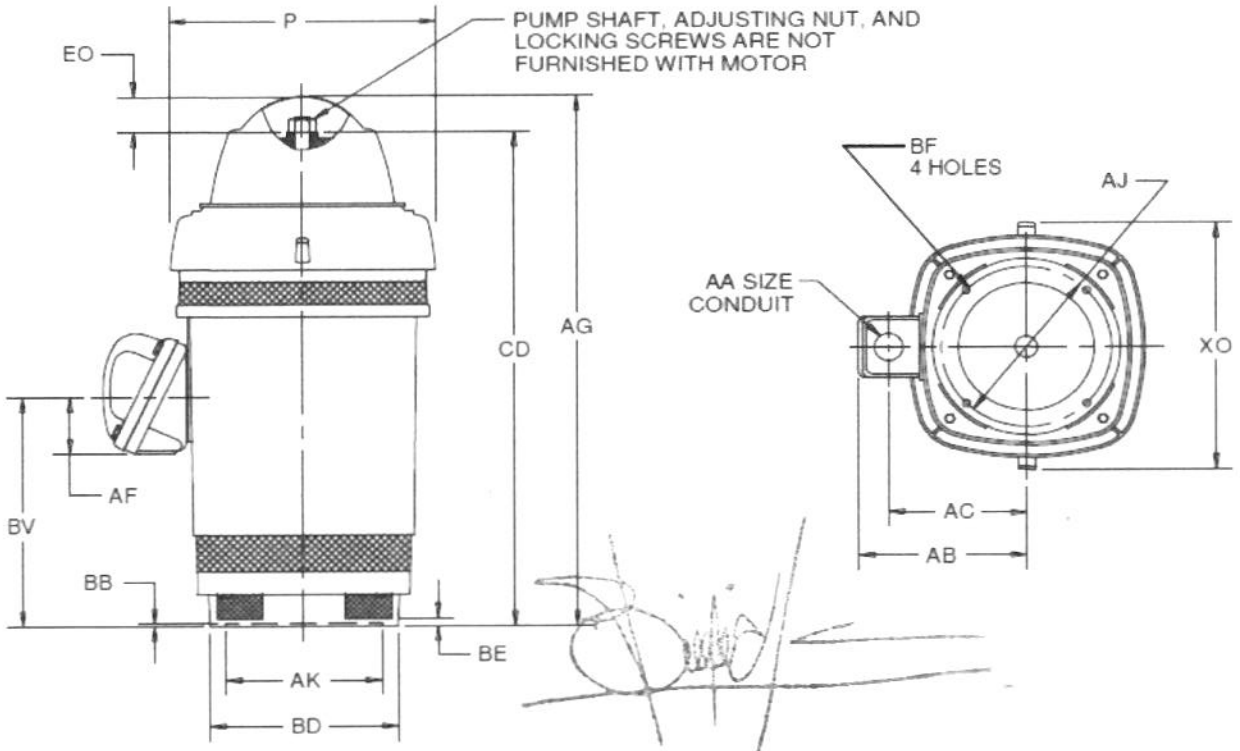

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

Números Generadores

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
ACAPULCO DE JUAREZ
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

CLAVE	CONCEPTO Y LOCALIZACION	EJE	TMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO / KG/ML.	PIEZAS	CANTIDAD	UNIDAD	CROQUIS
TUBR-03	SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.							6.00	6.00	PZA	
								TOTAL	**6.00**	**PZA**	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

ACAPULCO

BIERNO DEL ESTADO DE GUERRE O

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

BIENESTAR

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) 2023

CROQUIS

HOJA No. _____ DE _____

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE

ACAPULCO DE JUAREZ


DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

MUNICIPIO: ACAPULCO DE JUAREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION.

TUBR-03 SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

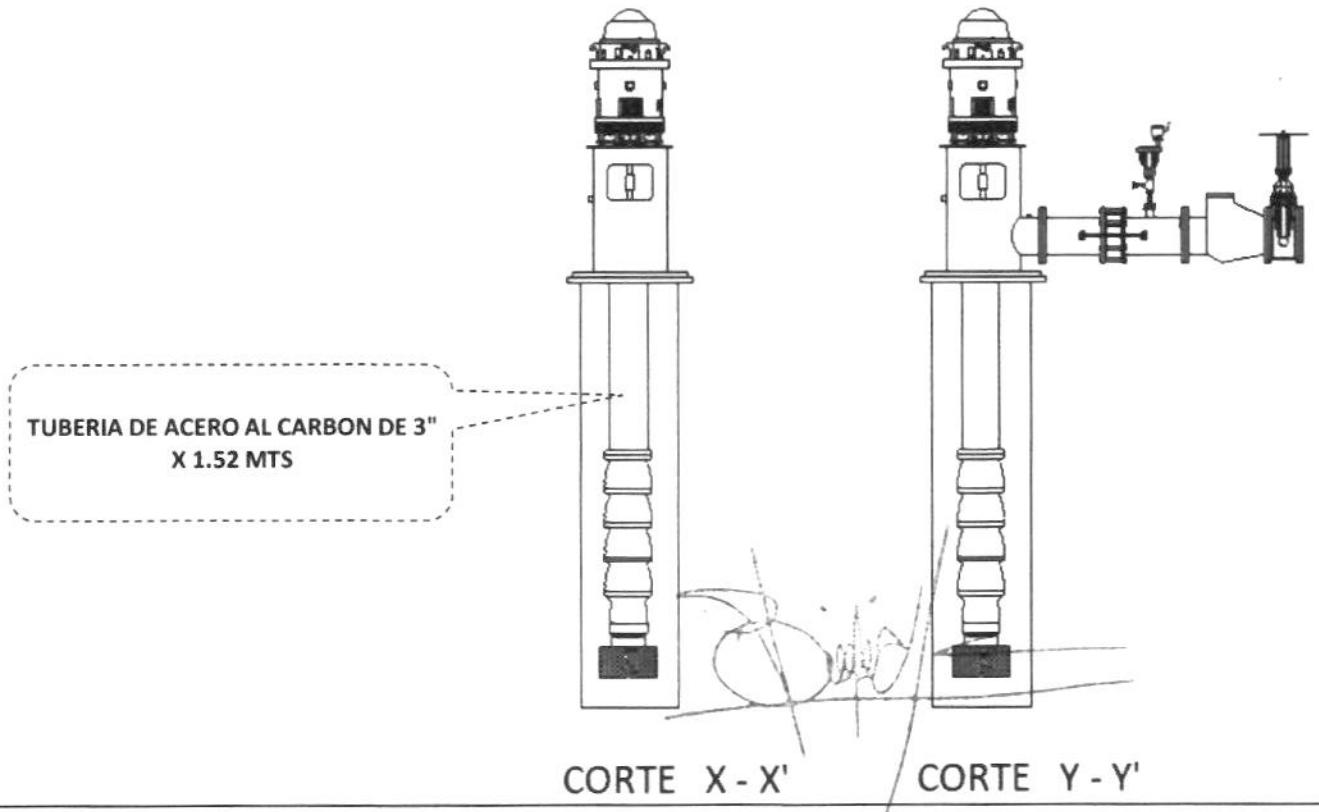

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL
ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

XIII- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

Análisis: **INS-CAB5** **PZA**

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2") PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION". (INCLUYE KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE MARCA AS PUMPS)

MATERIALES							
KITEMP10	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CALIBRE 8 10 12 Y 14 MCA AS PUMPS	PZA	$250.00	*	1.000000	$250.00	0.97%
013-SERVICIO-3	CABEZAL DE DESCARGA Y MULTIPLE DE SUCCION DE 5 VIAS CON VALVULA ROSCABLE DE 1/2"	PZA	$16,689.15	*	1.000000	$16689.15	64.43%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$16939.15**	**65.39%**
MANO DE OBRA							
1T2A-U	**CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AYUDANTES TUBERO)**	**JOR**					
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	$796.09	*	1.000000	$796.09	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	
	Importe:					$1423.06	
	Volumen:				6.000000	$8538.36	32.96%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$8538.36**	**32.96%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$8,538.36	*	0.020000	$170.77	0.66%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$8,538.36	*	0.030000	$256.15	0.99%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$426.92**	**1.65%**
	COSTO DIRECTO					**$25,904.43**	**100.00%**
	INDIRECTOS				17.0000%	$4,403.75	
	SUBTOTAL1					$30,308.18	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					$30,308.18	
	UTILIDAD				10.0000%	$3,030.82	
	SUBTOTAL3					$33,339.00	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						
	PRECIO UNITARIO					**$33,339.00**	

(* TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. *)

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021 - 2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**INS-CC**		**PZA**				
SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, Y PUESTA EN SERVICIO DE CAJA DE CONTROL STANDARD MARCA FRANKLIN, CON CENTRO DE CARGA PARA LA CORRECTA INSTALACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP. EXISTENTE EN SITIO DE POZO DE AGUA "LA CONCEPCION"							
MATERIALES							
2823008110	CAJA DE CONTROL STANDARD 1 1/2 HP 230 V 60HZ MCA FRANKLIN ELECTRIC	PZA	$4,406.03	*	1.000000	$4406.03	24.49%
013-SERVICIO-4	CENTRO DE CARGA DE SOBREPONER CON PASTILLA 2P X 15AMP	PZA	$1,958.00	*	1.000000	$1958.00	10.88%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$6364.03**	**35.37%**
MANO DE OBRA							
1E1E	**CUADRILLA No 19 (1 ELECTRICO+AYUDANTE ELECTRICO)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	$955.31	*	1.000000	$955.31	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	
	Importe:					$1582.28	
	Volumen:				7.000000	$11075.96	61.55%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$11075.96**	**61.55%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$11,075.96	*	0.020000	$221.52	1.23%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$11,075.96	*	0.030000	$332.28	1.85%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$553.80**	**3.08%**
	COSTO DIRECTO					**$17,993.79**	**100.00%**
	INDIRECTOS				17.0000%	$3,058.94	
	SUBTOTAL1					$21,052.73	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					$21,052.73	
	UTILIDAD				10.0000%	$2,105.27	
	SUBTOTAL3					$23,158.00	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						
	PRECIO UNITARIO					**$23,158.00**	
	(* VEINTITRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. *)						

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%

Análisis: **EQB-10** **PZA**

SUMINISTRO, INSTALACION, CONEXIÓN, PUESTA EN SERVICIO Y PRUEBA DE BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS CON MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON 215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US MOTORS. 4.6 LPS / 108 MTS. PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCIÓN" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.

MATERIALES							
FJ80	MOTOR VERTICAL 10HP 2POLOS 230/460V ARMAZON H215TP TIPO TUS 3600RPM EF PREMIUM MCA US	PZA	$72,450.00	*	1.000000	$72450.00	19.00%
CD03WASACI	CABEZAL DESCARGA LUBRICACION 3X3 PESADO MCA AS PUMPS	PZA	$61,163.89	*	1.000000	$61163.89	16.04%
FBAI416A	FLECHA MOTRIZ DE ACERO INOXIDABLE 416 1" X 0.64 MTS	PZA	$7,346.00	*	1.000000	$7346.00	1.93%
FBAI416A-I	FLECHA INTERMEDIA DE ACERO INOXIDABLE 416 1" X 3.05 MTS	PZA	$13,000.00	*	1.000000	$13000.00	3.41%
013-SERVICIO-5	BOMBA TURBINA LUB AGUA MOD 5AS1L-8 DESC EN 3" MCA AS PUMPS	PZA	$94,840.00	*	1.000000	$94840.00	24.87%
F-DRIVESOLAR2	VARIADOR DE FRECUENCIA SOLAR MULTIPOWER 3F 230/460V 18 AMP MCA CONNERA	PZA	$85,000.00	*	1.000000	$85000.00	22.29%
FSEN-FDS14-50(	FILTRO PARA ARMONICOS 3F P/14A DIST. MAX. 500M MCA CONNERA	PZA	$39,868.00	*	1.000000	$39868.00	10.46%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$373667.89**	**98.00%**
MANO DE OBRA							
1E1E	**CUADRILLA No 19 (1 ELECTRICO+AYUDANTE ELECTRICO)**	**JOR**					
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	$955.31	*	1.000000	$955.31	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	
	Importe:					$1582.28	
	Volumen:				1.000000	$1582.28	0.41%
1T2A-U	**CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AYUDANTES TUBERO)**	**JOR**					
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	$796.09	*	1.000000	$796.09	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	
	Importe:					$1423.06	
	Volumen:				4.000000	$5692.24	1.49%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$7274.52**	**1.91%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$7,274.52	*	0.020000	$145.49	0.04%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$7,274.52	*	0.030000	$218.24	0.06%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$363.73**	**0.10%**
	COSTO DIRECTO					**$381,306.14**	**100.00%**
	INDIRECTOS				17.0000%	$64,822.04	
	SUBTOTAL1					$446,128.18	

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					$446,128.18	
	UTILIDAD				10.0000%	$44,612.82	
	SUBTOTAL3					$490,741.00	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						
	PRECIO UNITARIO					**$490,741.00**	

(* CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. *)

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**TUBR-03.**		**PZA**				
SUMINISTRO Y PUESTO EN SITIO DE TUBERIA ACERO AL CARBON DE 3DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE PARA EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION" INCLUYE CARGA Y DESCARGA EN ALMACEN DE OBRA.							
MATERIALES							
T17SRRD	TUBO DE 3" X 1,52 MTS ROSCA RECTA C-40 C/COPLE	PZA	$4,761.98	*	0.600000	$2857.19	41.79%
VLBR1709	MARIPOSA LISA DE BRONCE 3 X 1 3/4"	PZA	$3,100.00	*	0.160000	$496.00	7.25%
COCOAC17	COLADOR CONICO ACERO AL CARBON 3"	PZA	$3,100.00	*	0.160000	$496.00	7.25%
SUBTOTAL:	**MATERIALES**					**$3849.19**	**56.29%**
MANO DE OBRA							
1T2A-U	**CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AYUDANTES TUBERO)**	**JOR**					
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	$796.09	*	1.000000	$796.09	
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	
	Importe:					$1423.06	
	Volumen:				2.000000	$2846.12	41.62%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$2846.12**	**41.62%**
EQUIPO Y HERRAMIENTA							
%MO5	EQUIPO DE SEGURIDAD	%	$2,846.12	*	0.020000	$56.92	0.83%
%MO1	HERRAMIENTA MENOR	%	$2,846.12	*	0.030000	$85.38	1.25%
SUBTOTAL:	**EQUIPO Y HERRAMIENTA**					**$142.30**	**2.08%**
	COSTO DIRECTO					**$6,837.61**	**100.00%**
	INDIRECTOS				17.0000%	$1,162.39	
	SUBTOTAL1					$8,000.00	
	(CF) FINANCIAMIENTO						
	SUBTOTAL2					$8,000.00	
	UTILIDAD				10.0000%	$800.00	
	SUBTOTAL3					$8,800.00	
	CARGOS ADICIONALES						
	(CA) Cargos Adicionales x SUBTOTAL3						
	PRECIO UNITARIO					**$8,800.00**	
	(* OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)						

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1E1E**		**JOR**				
CUADRILLA No 19 (1 ELECTRICO+AYUDANTE ELECTRICO)							
MANO DE OBRA							
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	34.31%
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	$955.31	*	1.000000	$955.31	60.38%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	5.31%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1,582.28**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1,582.28**	**100.00%**

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

ANALISIS DE BÁSICOS

Código	Concepto	Unidad	P. Unitario	Op.	Cantidad	Importe	%
Análisis:	**1T2A-U**		**JOR**				
CUADRILLA No 87 (1 TUBERO + 2 AYUDANTES TUBERO)							
MANO DE OBRA							
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	$796.09	*	1.000000	$796.09	55.94%
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$542.89	*	1.000000	$542.89	38.15%
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$840.78	*	0.100000	$84.08	5.91%
SUBTOTAL:	**MANO DE OBRA**					**$1,423.06**	**100.00%**
	Costo Directo:					**$1,423.06**	**100.00%**

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No: ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Lugar: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

TABULADOR DE SALARIO BASE DE MANO DE OBRA E INTREGRACION DE SALARIOS

Código	Concepto	Unidad	Salario Base por Jornal	Factor Salario Real	Salario Real
	MANO DE OBRA				
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	JOR	$330.00	1.64512	$542.89
MO082	CABO DE OFICIOS	JOR	$530.00	1.58639	$840.78
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	$600.00	1.59219	$955.31
MO086	OFICIAL TUBERO	JOR	$500.00	1.59219	$796.09
	TOTAL MANO DE OBRA				

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: ADJUDICACION DIRECTA

OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

LUGAR: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO Nombre del Licitante	**C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA** JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

DICAL	DÍAS CALENDARIO		365.00
DIAGI	DÍAS DE AGUINALDO		15.00
PIVAC	DÍAS POR PRIMA VACACIONAL		1.50
	Prima dominical		
Tp	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO**	SUMA:	**381.50**
DIDOM	DÍAS DOMINGO		53.00
DIVAC	DÍAS DE VACACIONES		6.00
DILUN	DÍAS LUNES		
DIFEO	DÍAS FESTIVOS POR LEY		5.00
DIPEC	DÍAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS)		
DIPCO	DÍAS POR COSTUMBRE		
DIPEN	DÍAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL		
DISIN	DÍAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO)		
DINLA	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO**	SUMA:	**64.00**
TI	**TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA)**		301.00
Tp / TI	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS		1.267442
FSBC	FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN (Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS		1.045205

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

TABLA DE SALARIOS REALES

SALARIO MINIMO $: 207.44

Otros cargos

CLAVE	CATEGORÍAS	Salario Nominal $	Tp / TI	Obligación Obrero Patronal Ps= IMSS e INFONAVIT	Ps x (Tp/TI)	Otros cargos	Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp/TI)+G
A	B	C	D	E	F = E x D	G = 0 %	H = D + F + G
MO031	AYUDANTE ESPECIALIZADO	330.00	1.267442	0.297982	0.377675		1.645117
MO082	CABO DE OFICIOS	530.00	1.267442	0.251643	0.318943		1.586385
MO084	OFICIAL ELECTRICISTA	600.00	1.267442	0.242856	0.307806		1.575248
MO086	OFICIAL TUBERO	500.00	1.267442	0.256219	0.324743		1.592185

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
UBICACION: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANALISIS PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORIA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces salario mínimo	622.32	Limite Superior 2:	25 veces salario minimo	5,186.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario minimo	5,186.00

JORNADAS LABORABLES DE 8 HORAS (SALARIOS NORMALES)

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO031**
CATEGORÍA (S): **AYUDANTE ESPECIALIZADO**
Salario Nominal Vigente (en $): **207.44**

Sal. Nominal (Sn) **330.00**
Salario Base deCotizacion (SBC) **344.92**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	53.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	0.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	5.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	0.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	0.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**64.00**		
TOTAL TI =	301.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.267442	**Tp / TI = 1.267442**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.377675	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I		0.5% Riesgos de trabajo	1.72
II		**Enfermedad y Maternidad**	
		Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	42.32
		1.5% excedente de 3 sal. Min.	0.00
		0.95% Prestaciones en dinero	3.28
		1.425% Gastos médicos pensionados	4.92
III		2.375% Invalidez y vida	8.19
IV		2 % Retiro (SAR)	6.90
		4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	14.75
V		1% Guarderias y prestaciones sociales	3.45
		5 % Infonavit	17.25
		0% Impuesto Sobre Nómina	0.00
		SP = Suma de Prestaciones	102.78
		Ps= Obligación Obrero-Patronal	
		Ps = Sp / SBC	**0.297982**

FACTOR DE SALARIO REAL Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos **1.645117**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMOR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces salario minimo	622.32	Limite Superior 2:	25 veces salario minimo	5,186.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario minimo	5,186.00

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO086** — Sal. Nominal (Sn): **500.00**
CATEGORÍA (S): **OFICIAL TUBERO** — Salario Base deCotizacion (SBC): **522.60**
Salario Nominal Vigente (en $): **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	53.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	0.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	5.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	0.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	0.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**64.00**		
TOTAL TI =	301.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.267442	**Tp / TI = 1.267442**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.324743	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I		0.5% Riesgos de trabajo	2.61
II		**Enfermedad y Maternidad**	
		Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	42.32
		1.5% excedente de 3 sal. Min.	0.00
		0.95% Prestaciones en dinero	4.96
		1.425% Gastos médicos pensionados	7.45
III		2.375% Invalidez y vida	12.41
IV		2 % Retiro (SAR)	10.45
		4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	22.34
V		1% Guarderias y prestaciones sociales	5.23
		5 % Infonavit	26.13
		0% Impuesto Sobre Nómina	0.00
		SP = Suma de Prestaciones	133.90
		Ps= Obligación Obrero-Patronal	
		Ps = Sp / SBC	**0.256219**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.592185**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Articulo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMOF
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces salario mínimo	622.32	Limite Superior 2:	25 veces salario mínimo	5,186.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario mínimo	5,186.00

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO084** — Sal. Nominal (Sn): **600.00**
CATEGORÍA (S): **OFICIAL ELECTRICISTA** — Salario Base deCotizacion (SBC): **627.12**
Salario Nominal Vigente (en $): **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO	
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00
Domingos	53.00	Aguinaldo por Ley	15.00
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50
Días Lunes	0.00	Prima Dominical por Ley	0.00
Días festivos por Ley	5.00	Tiempo Extra	
Condiciones Climatológicas	0.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00
Días por costumbre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00
Permisos y Enfermedades	0.00		
Días sindicato	0.00		
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	0.00%
		Otros cargos	0.00%
Días No Laborables al Año	**64.00**		
TOTAL TI =	301.00		
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.267442	**Tp / TI = 1.267442**	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.307806	

CALCULO DE PRESTACIONES IMSS			En Pesos $
I		0.5% Riesgos de trabajo	3.14
II		**Enfermedad y Maternidad**	
		Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	42.32
		1.5% excedente de 3 sal. Min.	0.07
		0.95% Prestaciones en dinero	5.96
		1.425% Gastos médicos pensionados	8.94
III		2.375% Invalidez y vida	14.89
IV		2 % Retiro (SAR)	12.54
		4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	26.81
V		1% Guarderias y prestaciones sociales	6.27
		5 % Infonavit	31.36
		0% Impuesto Sobre Nómina	0.00
		SP = Suma de Prestaciones	152.30
		Ps= Obligación Obrero-Patronal	
		Ps = Sp / SBC	**0.242856**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.575248**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.
Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.
TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMOR
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPENDENCIA: **H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO**
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

LICITACIÓN No: ADJUDICACION DIRECTA
OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.
UBICACIÓN: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍA

SALARIO MINIMO $:	207.44	3 veces salario mínimo	622.32	Limite Superior 2:	25 veces salario minimo	5,186.00
				Limite Superior 1:	25 veces salario minimo	5,186.00

CÓDIGO DE LA CATEGORÍA: **MO082** — Sal. Nominal (Sn): **530.00**
CATEGORÍA (S): **CABO DE OFICIOS** — Salario Base deCotizacion (SBC): **553.96**
Salario Nominal Vigente (en $): **207.44**

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO		DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO		CALCULO DE PRESTACIONES IMSS		En Pesos $
Días no Laborado al Año		Días Calendario (DICAL)	365.00	I	0.5% Riesgos de trabajo	2.77
Domingos	53.00	Aguinaldo por Ley	15.00	II	**Enfermedad y Maternidad**	
Vacaciones	6.00	Prima Vacacional 25% por Ley	1.50		Cuota fija(20.4% sal. Min*dias cal/dias trab)	42.32
Días Lunes	0.00	Prima Dominical por Ley	0.00		1.5% excedente de 3 sal. Min.	0.00
Dias festivos por Ley	5.00	Tiempo Extra			0.95% Prestaciones en dinero	5.26
Condiciones Climatológicas	0.00	Días Equivalentes por Horas extras gravables en el SBC	0.00		1.425% Gastos médicos pensionados	7.89
Días por costumbre	0.00	Días Equivalentes por Horas extras no gravables en el SBC	0.00	III	2.375% Invalidez y vida	13.16
Permisos y Enfermedades	0.00			IV	2 % Retiro (SAR)	11.08
Días sindicato	0.00				4.275% Cesantía en edad avanzada y vejez	23.68
Horas inactivas por arrastre	0.00	**TOTAL Tp =**	381.50	V	1% Guarderias y prestaciones sociales	5.54
Días no trabajados por guardia	0.00	Impuesto Sobre Nómina	0.00%		5 % Infonavit	27.70
		Otros cargos	0.00%		0% Impuesto Sobre Nómina	0.00
Días No Laborables al Año	**64.00**					
TOTAL TI =	301.00				SP = Suma de Prestaciones	139.40
Tp /TI = DIAS PAG. / DIAS LAB.	1.267442	**Tp / TI = 1.267442**			Ps= Obligación Obrero-Patronal	
FSBC=(Tp-Te) / DICAL	1.045205	Ps x (Tp-Te) / TI = 0.318943			**Ps = Sp / SBC**	**0.251643**

FACTOR DE SALARIO REAL — Fsr= [Ps(Tp-Te)/TI]+ (Tp/TI)+Otros cargos — **1.586385**

Fórmula Fsr= Ps (Tp / TI) + (Tp / TI) Artículo 160 RLOPySRM

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los días realmente pagados durante un periodo anual.

TI = Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual. Para su determinación, únicamente se deberán considerar aquellos días que estén dentro del periodo anual referido y que, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y los Contratos Colectivos, resulten pagos obligatorios, aunque no sean laborables.

El factor de salario real deberá incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES: C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMOF
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SIGNATARIO

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

XIV.- ANALISIS DE INDIRECTOS Y UTILIDAD

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION.

Ubicada: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

CALCULO DE INDIRECTOS

COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA : **$466,229.99**

C O N C E P T O	IMPORTE POR ADMINISTRACION		%
	CENTRAL	OBRA	
HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES			
1.- PERSONAL DIRECTIVO	2,000.00	4,000.00	
2.- PERSONAL TÉCNICO	3,000.00	10,000.00	
3.- PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,500.00	3,500.00	
4.- PERSONAL EN TRÁNSITO	0.00	0.00	
5.- CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL PAGADA PARA LOS CONCEPTOS 1 AL 4	2,500.00	5,500.00	
6.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA LOS CONCEPTOS 1 AL 4	0.00	0.00	
7.- PASAJES Y VIÁTICOS	1,000.00	1,500.00	
(SUBTOTALES)	**13,000.00**	**24,500.00**	**8.04%**
DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS			
1.- EDIFICIOS Y LOCALES	1,500.00	2,500.00	
2.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA	0.00	0.00	
3.- BODEGAS	2,500.00	0.00	
4.- INSTALACIONES GENERALES	0.00	0.00	
5.- MUEBLES Y ENCERES	0.00	0.00	
6.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOS	0.00	1,000.00	
7.- CAMPAMENTOS	0.00	0.00	
(SUBTOTALES)	**4,000.00**	**3,500.00**	**1.61%**
FLETES Y ACARREOS			
1.- DE CAMPAMENTOS	0.00	0.00	
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500.00	1,500.00	
3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES	0.00	1,500.00	
4.- DE MOBILIARIO	0.00	0.00	
(SUBTOTALES)	**500.00**	**3,000.00**	**0.75%**
GASTOS DE OFICINA			
1.- PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	1,500.00	
2.- CORREOS, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS Y RADIO	1,500.00	1,500.00	
3.- SITUACIÓN DE FONDOS	2,500.00	5,000.00	
4.- COPIAS Y DUPLICADOS	0.00	0.00	
5.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS	259.10	500.00	
(SUBTOTALES)	**7,259.10**	**8,500.00**	**3.38%**
SEGUROS Y FIANZAS			
1.- PRIMAS POR SEGUROS	2,500.00	1,500.00	
2.- PRIMAS POR FIANZAS	8,500.00	2,500.00	
(SUBTOTALES)	**11,000.00**	**4,000.00**	**3.22%**
COSTOS TOTALES DE INDIRECTOS : SUMAS =	**35,759.10**	**43,500.00**	**17.00%**

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

ATENTAMENTE

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO

Cliente: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Concurso No. ADJUDICACION DIRECTA

Obra: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA

Ubicada: POB. LA CONCEPCION

Ciudad: ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero

DETERMINACION DEL CARGO POR UTILIDAD

CLAVE	CONCEPTO	FORMULA	DESGLOSE	VALORES
	Datos básicos			
A	Costo Directo	C->OBRCOS	$ 466,229.99	$ 466,229.99
B	Mano de obra sin prestaciones	C->OBRMOGRA + C->OBRMOGIND	$ 28,523.64	$ 28,523.64
H	% de utilidad neta propuesta			6.56
	Calculos			
I	Indirectos	A*(C+C1)/100	$ 79,259.10	$ 79,259.10
J	Financiamiento	(A+I)*D/100		
K	Costo directo + indirectos +financiamiento	A+I+J	$ 545,489.09	$ 545,489.09
L	Utilidad neta	k*h/100	$ 35,784.08	$ 35,784.08
	Otras aportaciones			
M	Aportacion por concepto de SAR	L*0.34	$ 12,166.59	$ 12,166.59
N	Aportacion por concepto de INFONAVIT	L*0.10	$ 3,578.41	$ 3,578.41
O	**SUBTOTAL**	K+L+M+N	$ 597,018.17	$ 597,018.17
O1	Aportaciones por concepto de servicio, vigilancia,			
P	inspeccion y control (SECODAM)	O/(1-G/100)-O	$ 3,000.09	$ 3,000.09
Q	Total de utilidad	L+M+N+P	$ 54,548.91	$ 54,548.91
Z	**% de utilidad total**	Q/K*100	10.00	**10.00**

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez
DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2021-2024

C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS** **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**	LICITACION ADJUDICACION DIRECTA LUGAR DE CELEBRACION ACAPULCO DE JUAREZ	
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	OBRA: EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION. LUGAR: POB. LA CONCEPCION, ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO Razón Social delLicitante	C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES	

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO

PERIODO DE COBRO PRIMERA ESTIMACION: 1

CONCEPTO	PERIODOS														TOTAL
	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana5	Semana6	Semana7	Semana8	Semana9	Semana10	Semana11	Semana12	Semana13	Semana14	
INGRESOS															
ESTIMACIONES DE OBRA A IMPORTE TOTAL	13,334.06	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	26,667.06	600,038.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES CON ANTICIPO AMORTIZADO	13,334.06	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	46,669.74	26,667.06	600,038.00
ANTICIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS ACUMULADOS	13,334.06	60,003.80	106,673.54	153,343.28	200,013.02	246,682.76	293,352.50	340,022.24	386,691.98	433,361.72	480,031.46	526,701.20	573,370.94	600,038.00	
EGRESOS															
COSTO DIRECTO	10,360.57	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	36,262.43	20,720.26	466,229.99
COSTO INDIRECTO	17.0000%														
COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO	12,121.87	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	42,427.04	24,242.74	545,489.09
ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS ACUMULADOS	12,121.87	54,548.91	96,975.95	139,402.99	181,830.03	224,257.07	266,684.11	309,111.15	351,538.19	393,965.23	436,392.27	478,819.31	521,246.35	545,489.09	
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS	1,212.19	5,454.89	9,697.59	13,940.29	18,182.99	22,425.69	26,668.39	30,911.09	35,153.79	39,396.49	43,639.19	47,881.89	52,124.59	54,548.91	
COSTO FINANCIAMIENTO PARCIAL (INTERESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTOS FINANCIAMIENTO ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA: 11.5499%
PUNTOS DE INTERMEDIACIÓN DE LA BANCA: 0.0000%
TASA DE INTERES DIARIA: 0.0316%
DIAS PARA PAGO DE ESTIMACIONES: 30
% APLICABLE AL PERIODO: 0.9493%
0.0000%
0.0000%
0.0000%

PORCENTAJE DE FINANCIEAMIENTO= COSTO FINANCIAMIENTO ACUMULADO / COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO = 0.00 / 545,489.09 = 0.000000%

ESTE PORCENTAJE ESTÁ CALCULADO SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO MAS INDIRECTOS.

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

JEFE DE DEPARTAMENTO DE COSTOS Y LICITACIONES
C. JOSE ANTONIO CARRILLO ZAMORA

XV.- CROQUIS DE MACRO Y MICROLOCALIZACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-1

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

ESTATAL

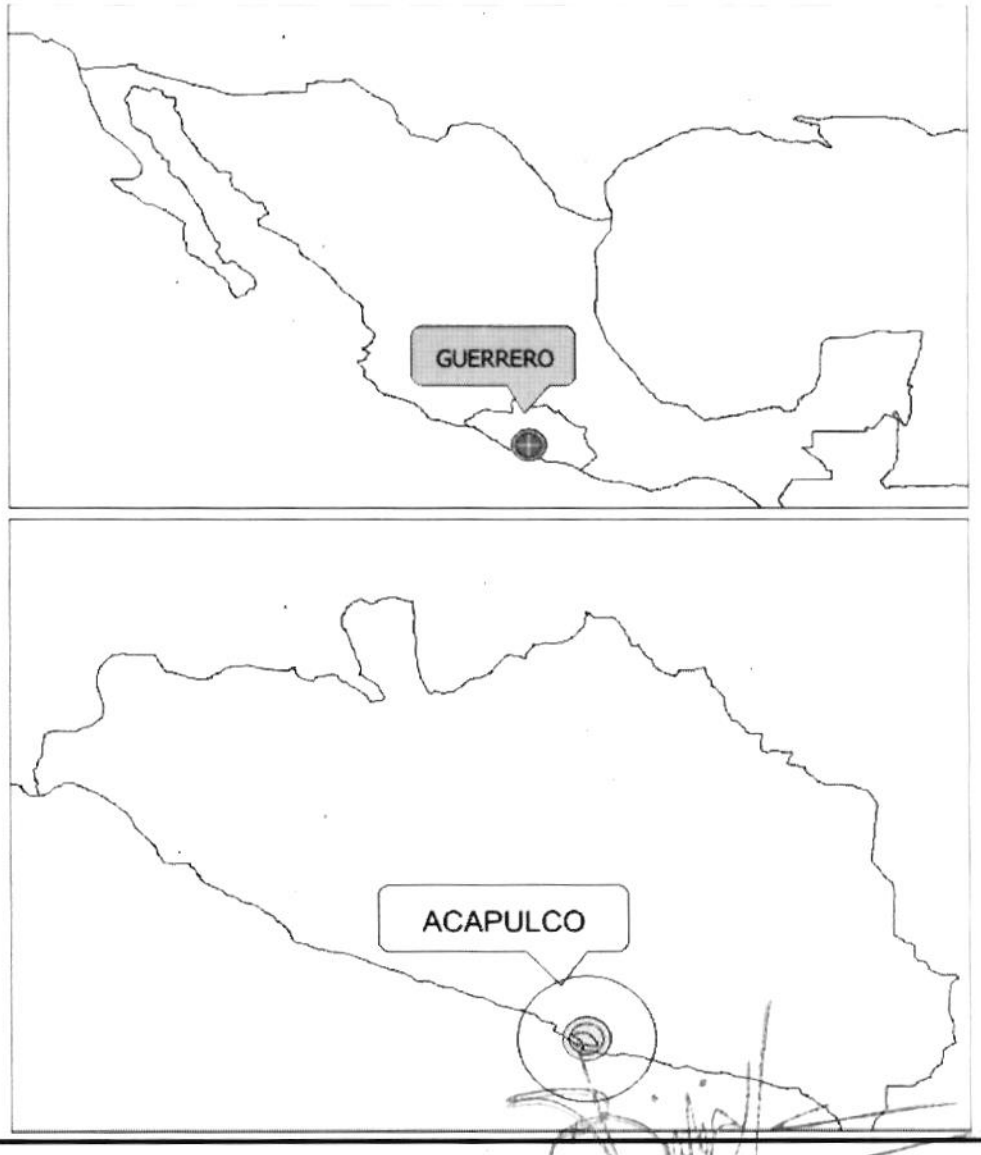

LATITUD: 16°52'14.711"N

LONGITUD: 99°38'41.262"O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL: ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023


CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-2

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO

MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ

LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

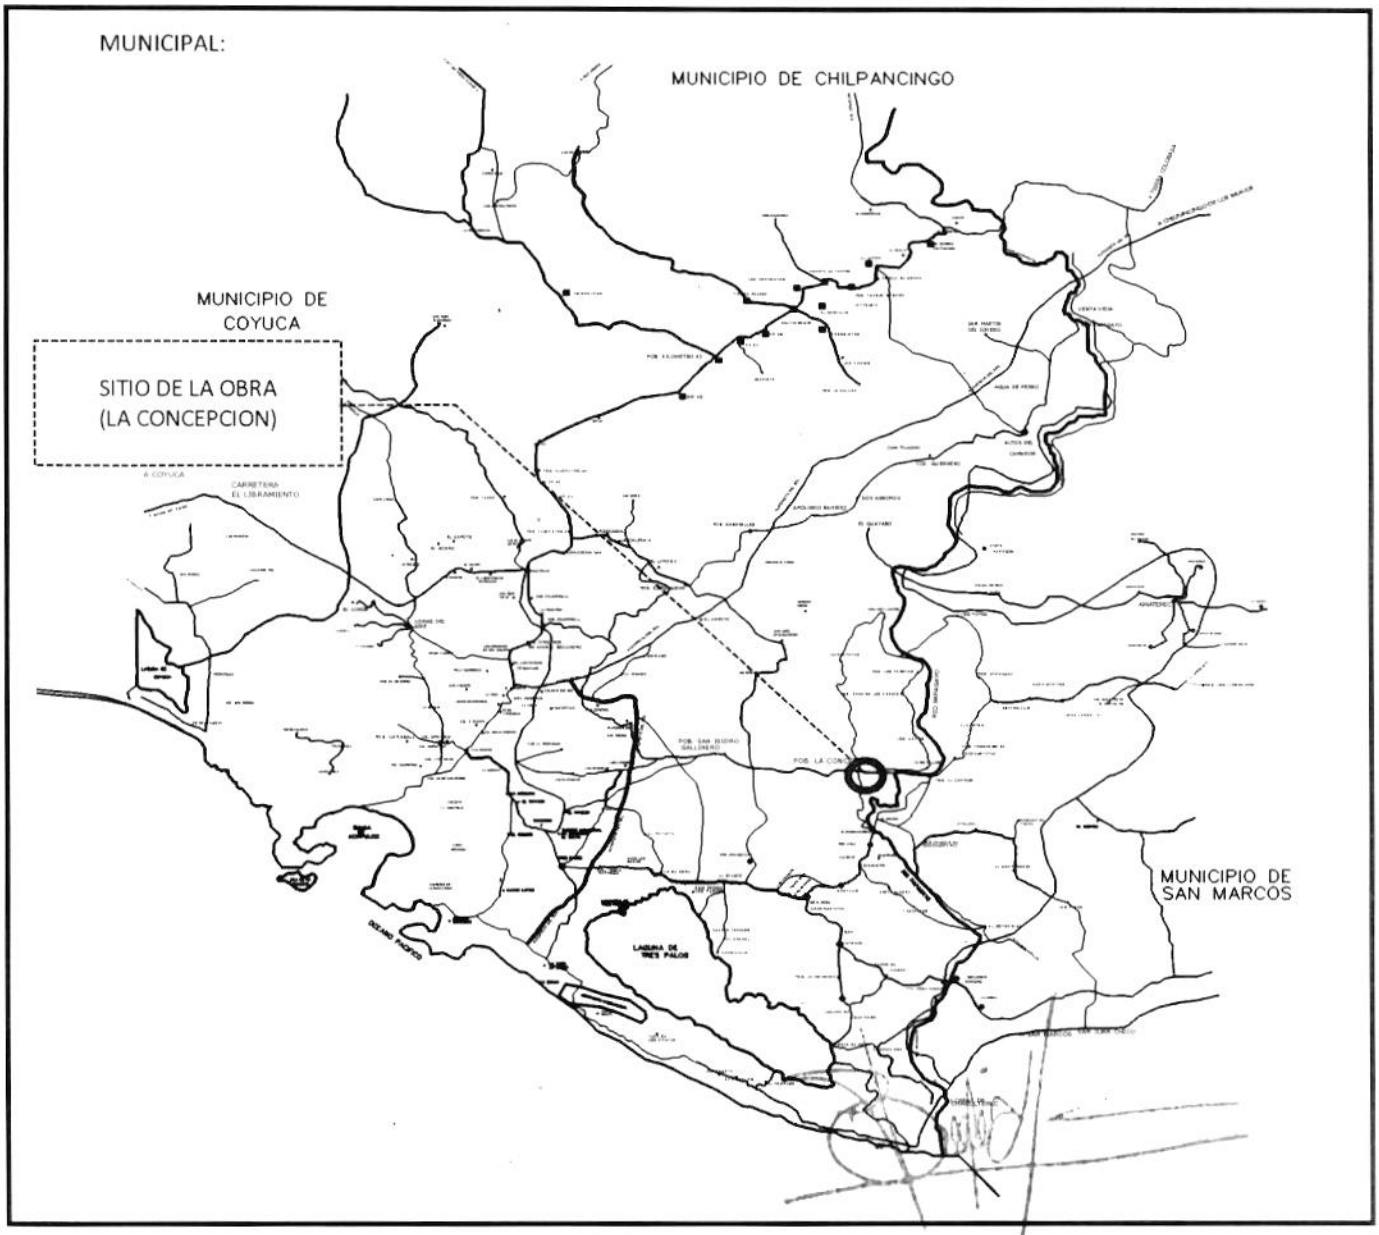

LATITUD: 16°52'14.711"N

LONGITUD: 99°38'41.262"O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL: ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MACROLOCALIZACION-3

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR COLONIA:

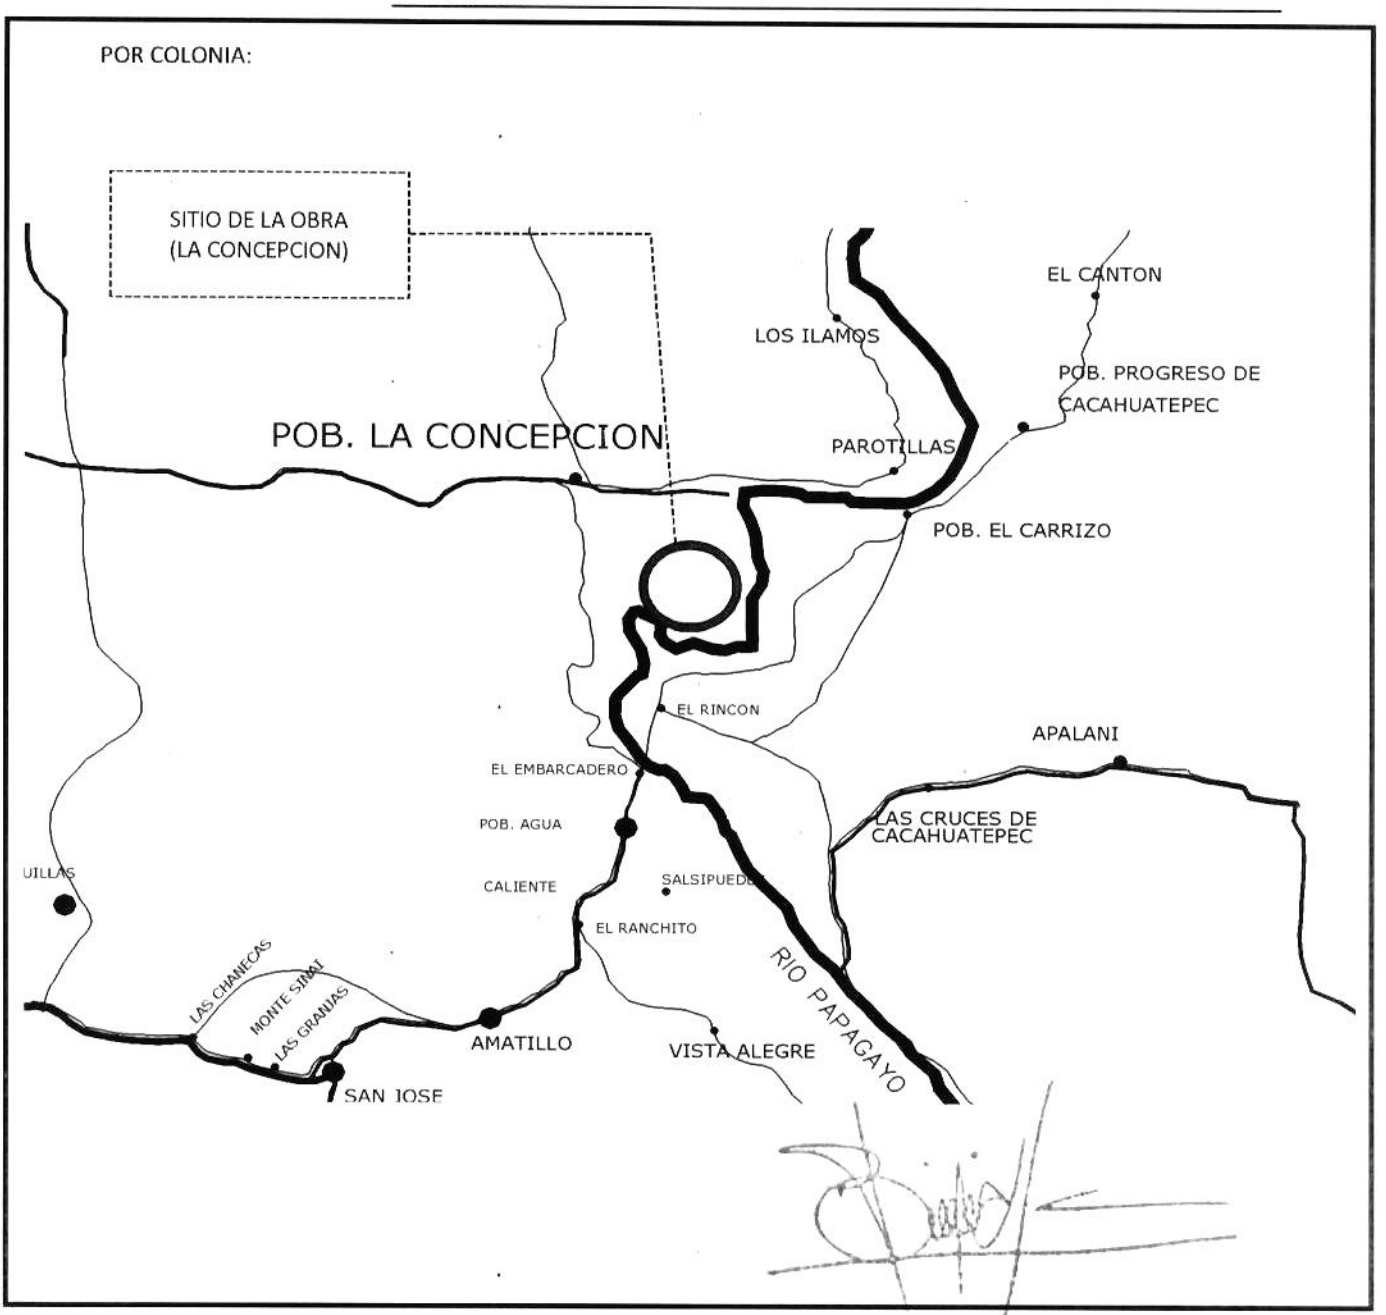

LATITUD: 16°52'14.711"N

LONGITUD: 99°38'41.262"O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL: ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-4

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR REFERENCIA:

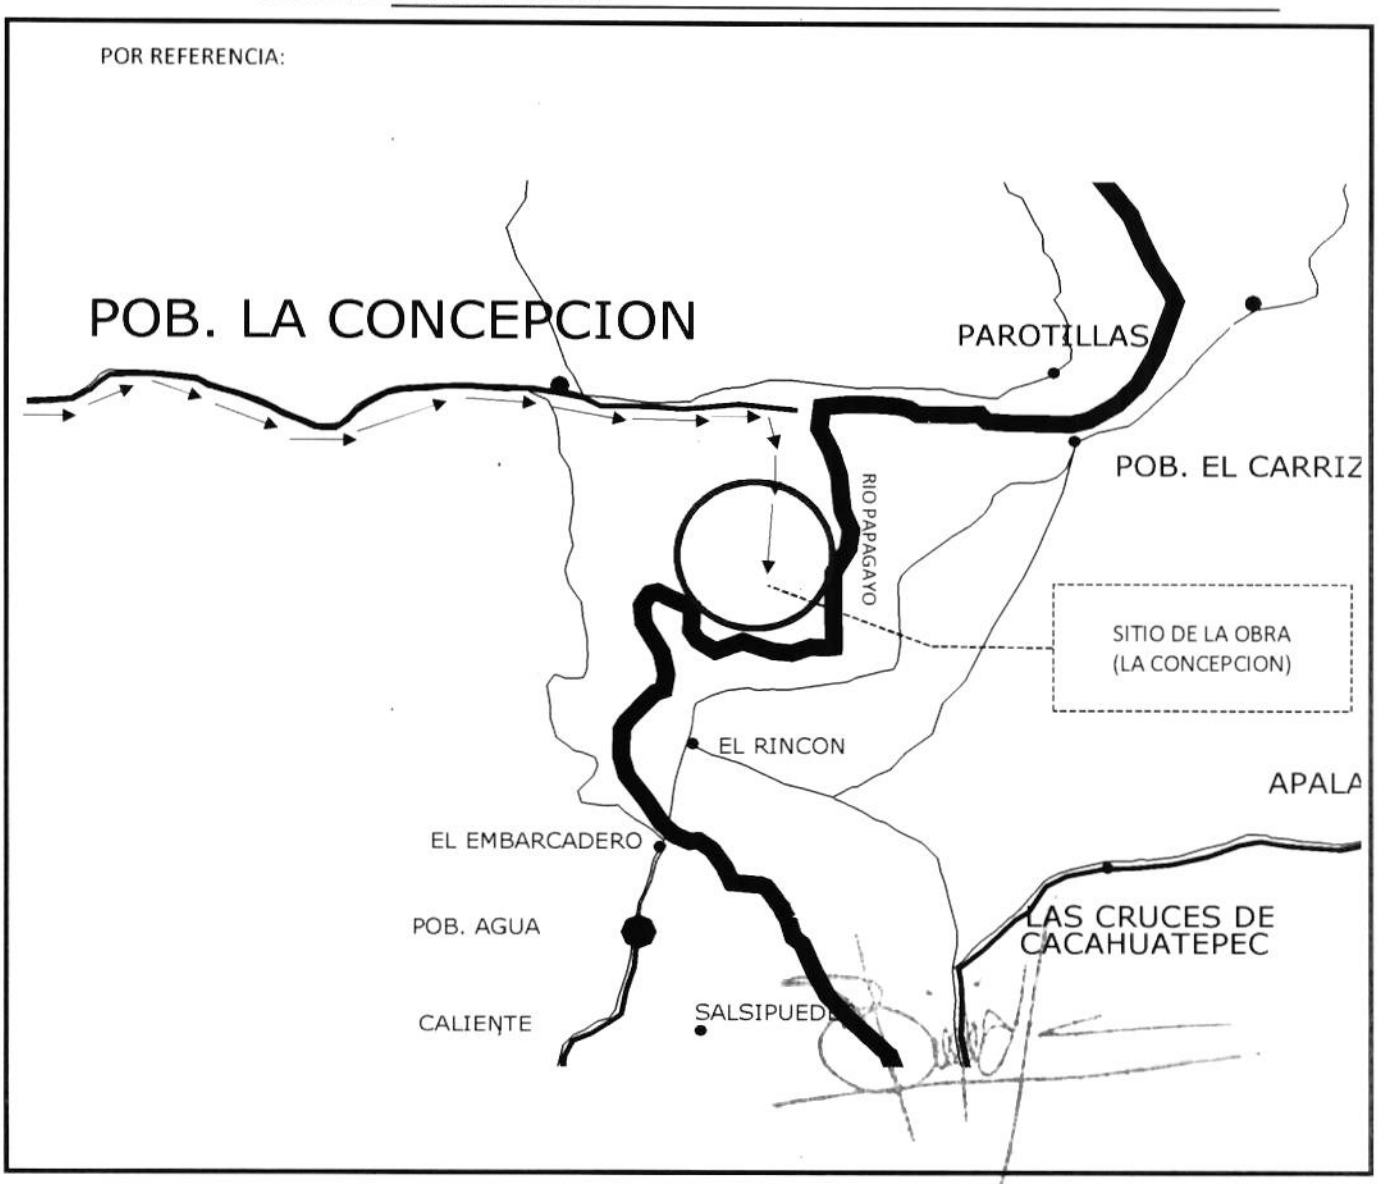

LATITUD: 16°52'14.711"N LONGITUD: 99°38'41.262"O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL: ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL FONDO III 2023

CROQUIS DE MICROLOCALIZACION-5

OBRA-. EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA "LA CONCEPCION", CONSISTENTE EN SUSTITUCION DE MOTORES DE BOMBAS, POB. LA CONCEPCION

REGION: 07 ACAPULCO
MUNICIPIO: 01 ACAPULCO DE JUÁREZ
LOCALIDAD: POB. LA CONCEPCION

POR CALLES Y AVENIDAS:

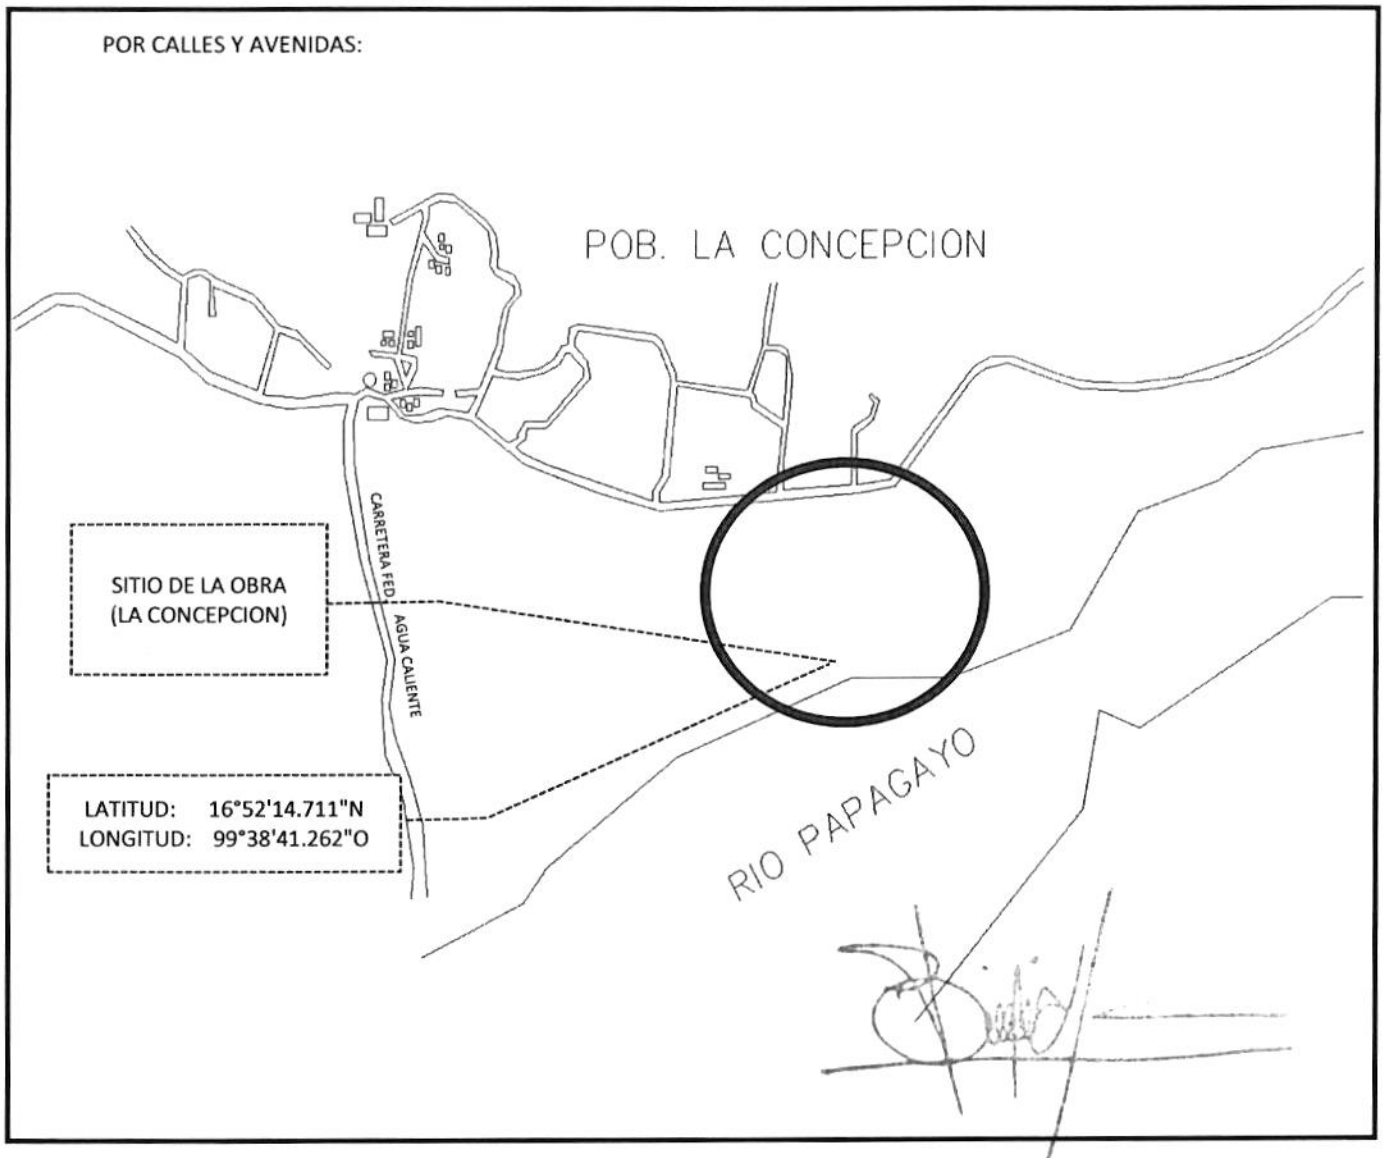

LATITUD: 16°52'14.711"N LONGITUD: 99°38'41.262"O

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE OBRA PÚBLICA DE ZONA RURAL: ARQ. JOSE IGNACIO FERNANDEZ VERDIZ

XVI.- PLANOS Y PROYECTOS
